


FASE 6:



FASE 7:

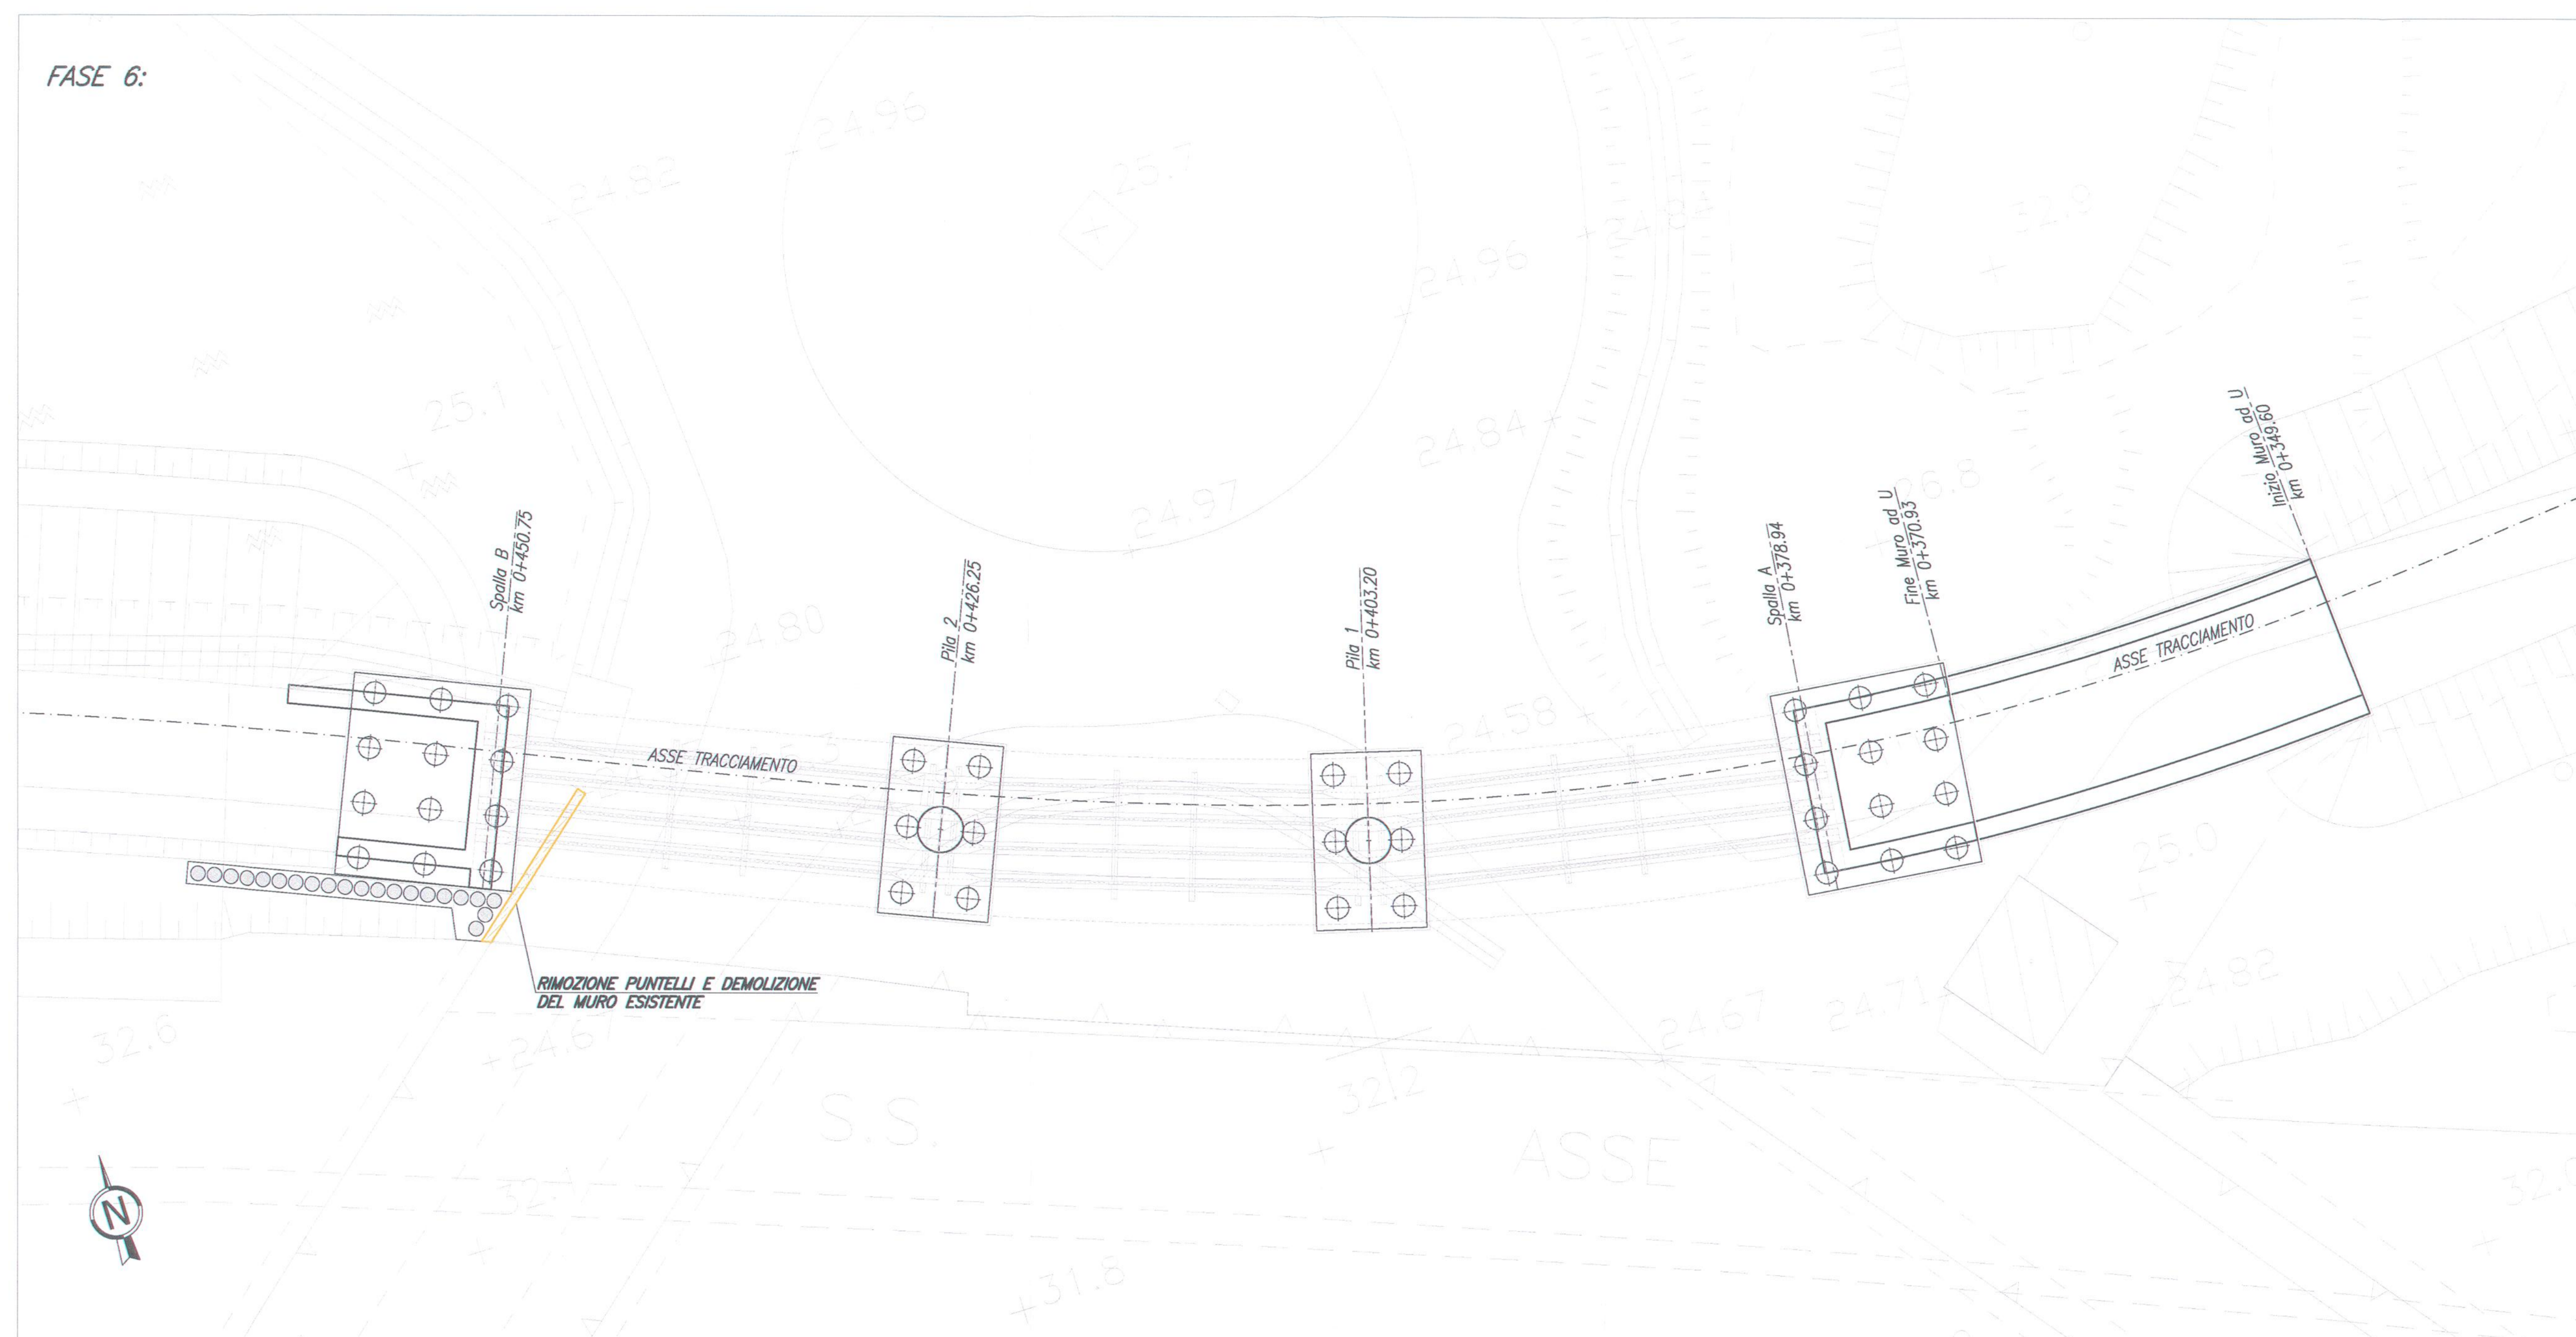

FASI REALIZZATIVE:

0. DEVIAZIONE FOSSI ESISTENTI;
1. REALIZZAZIONE PUNTELLATURA MURO ESISTENTE;
2. REALIZZAZIONE BANCA CON PISTA DI CANTIERE PER ESEGUIRE LA PARATA DI PALI, PENDENZA MASSIMA 15%;  
MESSA IN OPERA DI PALANCOLATO IN CORRISPONDENZA DELLA SPALLA B
3. REALIZZAZIONE PARATA DI PALI (PER SCAVO FINO A P.C.);  
REALIZZAZIONE PALANCOLATO SU PILA 1 E PILA 2;
4. DEMOLIZIONE RAMPA E BANCA PROVVISORIE E SCAVO FINO A P.C. PER REALIZZAZIONE SPALLA B;
5. REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE SPALLE E PILE (PER LA SPALLA A DA QUOTA +1.00 DA P.C., SCAPITIZZATURA DI 1.00M DI PALO); REALIZZAZIONE SOLETTE DI FONDAZIONE ED ELEVAZIONE SPALLE E PILE;
6. RIMOZIONE DEI PUNTELLI PROVVISORI E DEMOLIZIONE DEL MURO ESISTENTE;
7. COMPLETAMENTO RILEVATO IN AMMORSAMENTO A QUELLO DELL'ASSE MEDIANO E VARO IMPALCATO.

LEGENDA:

1. DEMOLIZIONE
2. PARTI IN COSTRUZIONE NELLA FASE CORRENTE

COMMITTENTE:  **RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**U.O. PRODUZIONE SUD E ISOLE**  
**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA AV MILANO - NAPOLI TRATTA ROMA - NAPOLI**  
**VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE AV NAPOLI - AFRAGOLA**  
**VIABILITA' DI CUI LETTERA b) DELL'ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO**  
**PROCEDIMENTALE RFI - COMUNE DI AFRAGOLA DEL 22/06/2012**

OPERE CIVILI MINORI

Opera di scavalco Ramo 12  
Piatta Scavi e Fasi Realizzative - Tav. 3 di 3

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
N7D2	01	D	78	PZ	OC0200	010	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	Emissione esecutiva	A. Inglesi	aprile 2016	G. G.	aprile 2016	[Signature]	aprile 2016	[Signature]	aprile 2016
