


REGIONE PUGLIA

PORTO DI SAN FOCA S.P.A.
Porto Turistico-Stazionamento

PROGETTO DEFINITIVO PER L'AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO
DEL PORTO DI SAN FOCA ADEGUATO ALLE RISULTANZE DELLE
PROVE SUL MODELLO FISICO REALIZZATO DAL POLITECNICO DI BARI

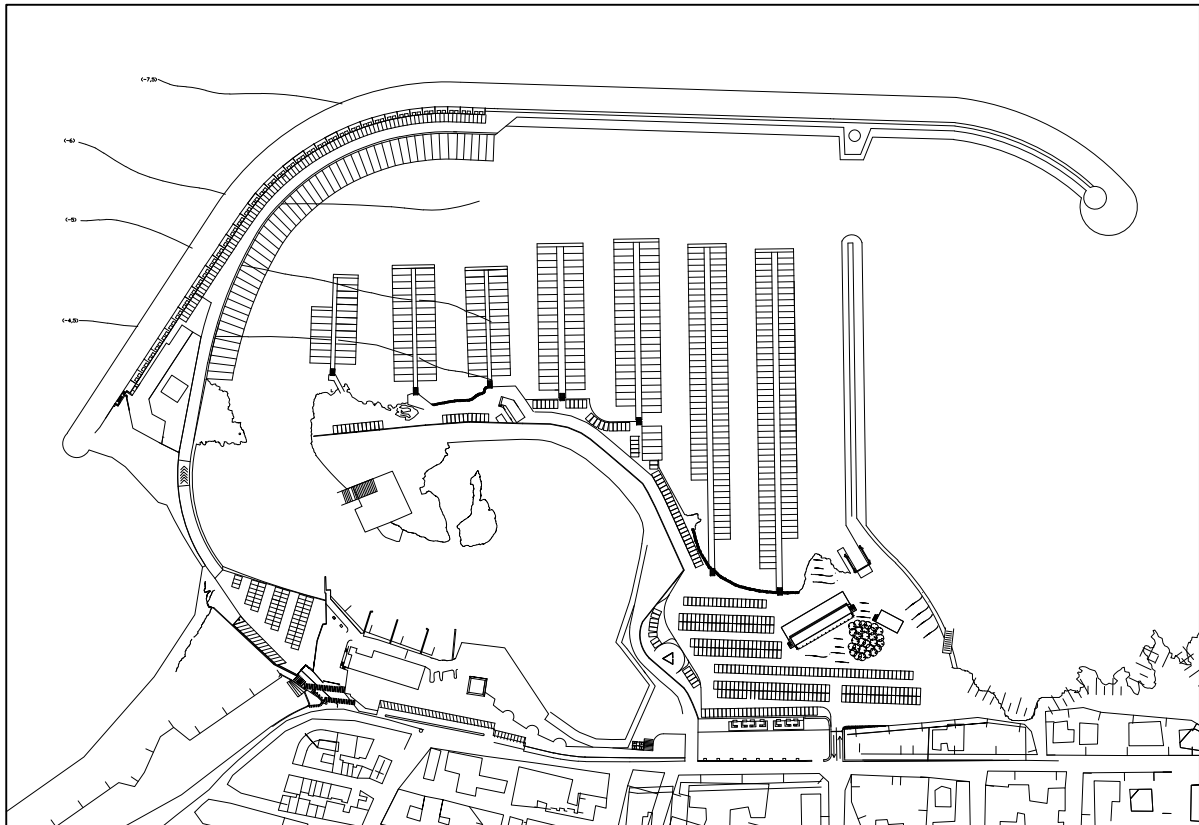

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI

Ing. Antonio Candido

Ing. Donato Candido

Ing. Luigi Del Grosso

Ing. Franco Gallo



SETTEMBRE 2018

INT.TAV. 19

Rev.

REGIONE PUGLIA - PORTO DI SAN FOCA S.P.A. - PORTO TURISTICO-STAZIONAMENTO: PROGETTO DEFINITIVO PER L'AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL PORTO DI SAN FOCA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE WBS LAVORAZIONI	Quantità desunte dal CME	Resa operativa media giornaliera	Durata totale Fasi Lavorative (gg)	ANNO 1												ANNO 2												
				MESE 1 (SETT)	MESE 2 (OTT)	MESE 3 (NOV)	MESE 4 (DIC)	MESE 5 (GEN)	MESE 6 (FEB)	MESE 7 (MAR)	MESE 8 (APR)	MESE 9 (MAG)	MESE 10 (GIU)	MESE 11 (LUG)	MESE 12 (AGO)	MESE 13 (1-15 SETT)	MESE 13 (1-15 SETT)	MESE 14 (OTT)	MESE 15 (NOV)	MESE 16 (DIC)	MESE 17 (GEN)	MESE 18 (FEB)	MESE 19 (MAR)	MESE 20 (APR)	MESE 21 (MAG)	MESE 22 (GIU)	MESE 23 (LUG)	MESE 24 (AGO)
TEMPO COMPLESSIVO			720																									
C - CANTIERIZZAZIONE			30																									
C.01 - Allestimento cantiere			7																									
C.02 - Recinzione cantiere			7																									
C.03 - Approntamento mezzi ed attrezzature di cantiere			7																									
C.04 - Eliminazione interferenze con struttura portuale esistente			7																									
OF - OPERE FORANEE			570																									
OF.01 - Bonifiche e scavi subacquei	mc 15 367	mc/gg 200	90																									
OF.02 - Salpamento opere foarnee esistenti	mc 18 682	mc/gg 200	90																									
OF.03 - Formazione nuclei di scogliera (pietrame + massi 1° ctg)	ton 183 132	ton/gg 1200	180																									
OF.04 - Formazione scogliera (massi 2° ctg + massi 3° ctg)	ton 144 774	ton/gg 1200	150																									
OF.05 - Formazione muri di sponda e guardiano in cls	mc 5 592	mc/gg 60	120																									
OF.06 - Formazione mantellata con antifir in cls	mc 35 026	mc/gg 240	210																									
OF.07 - Formazione praticabile di banchina e scalo di alaggio	mc 12 410	mc/gg 100	150																									
OF.08 - Opere di adeguamento al modello fisico			60																									
OE - OPERE EDILI			480																									
OE.01 - Movimento Materie	mc 1 589	mc/gg 100	30																									
OE.02 - Opere strutturali in c.a. e murarie	mc 882	mc/gg 20	60																									
OE.03 - Impianti idrici e antincendio, fognanti, termici e di condizionamento, elettrici, ecc.			120																									
OE.04 - Opere civili (massetti, imperm. intonaci, pavimentaz. infissi, ecc.)			180																									
V - VIABILITA' E PARCHEGGI			180																									
V.01 - Movimenti materie (sbancamenti)	mc 5 740,00	mc/gg 300	30																									
V.02 - Formazione strato di fondazione	mc 11 679,00	mc/gg 500	30																									
V.03 - Formazione prato armato con tappeto erboso	mq 5 475,50	mq/gg 300	30																									
V.04 - Formazione aree pavimentate a betonelle	mq 1 400,00	mq/gg 60	30																									
V.05 - Formazione strati collegamento bitumionoso	mq 8 000,00	mq/gg 400	30																									
V.06 - Impianto pubblica illuminazione esterna			30																									
AP - ATTREZZATURE PORTUALI			30																									
AP.01 - Pontili galleggianti completi di colonnine erogatrici, bitte, corpi morti, ecc.	ml 630	ml/gg 24	30																									
AP.02 - Travel lift			30																									
CSC - COLLAUDI E SMOBILIZZO CANTIERE			15																									
				MESI	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				PRODUZIONI MENSILI (%)		€ 140 783,10	€ 569 207,36	€ 714 578,92	€ 936 304,82	€ 989 293,61	€ 1 084 586,87	€ 834 584,80				€ 677 352,71	€ 993 768,71	€ 933 369,49	€ 900 692,18	€ 898 074,18	€ 971 732,90	€ 789 477,76	€ 266 260,47	€ 1 172 007,54				
				PRODUZIONI PROGR. (%)	€ 0,00	€ 140 783,10	€ 709 990,46	€ 1 424 569,38	€ 2 360 874,19	€ 3 350 167,80	€ 4 339 461,40	€ 5 424 048,27	€ 6 258 633,07	€ 6 258 633,07	€ 6 258 633,07	€ 6 935 985,78	€ 7 929 754,49	€ 8 863 123,99	€ 9 763 816,17	€ 10 661 890,35	€ 11 633 623,15	€ 12 423 100,90	€ 12 689 361,37	€ 13 861 368,91	€ 13 861 368,91	€ 13 861 368,91	€ 13 861 368,91	€ 13 861 368,91

DIAGRAMMA PERCENTUALE DELLE PRODUZIONI

