



FASE 7

Scala 1:1000


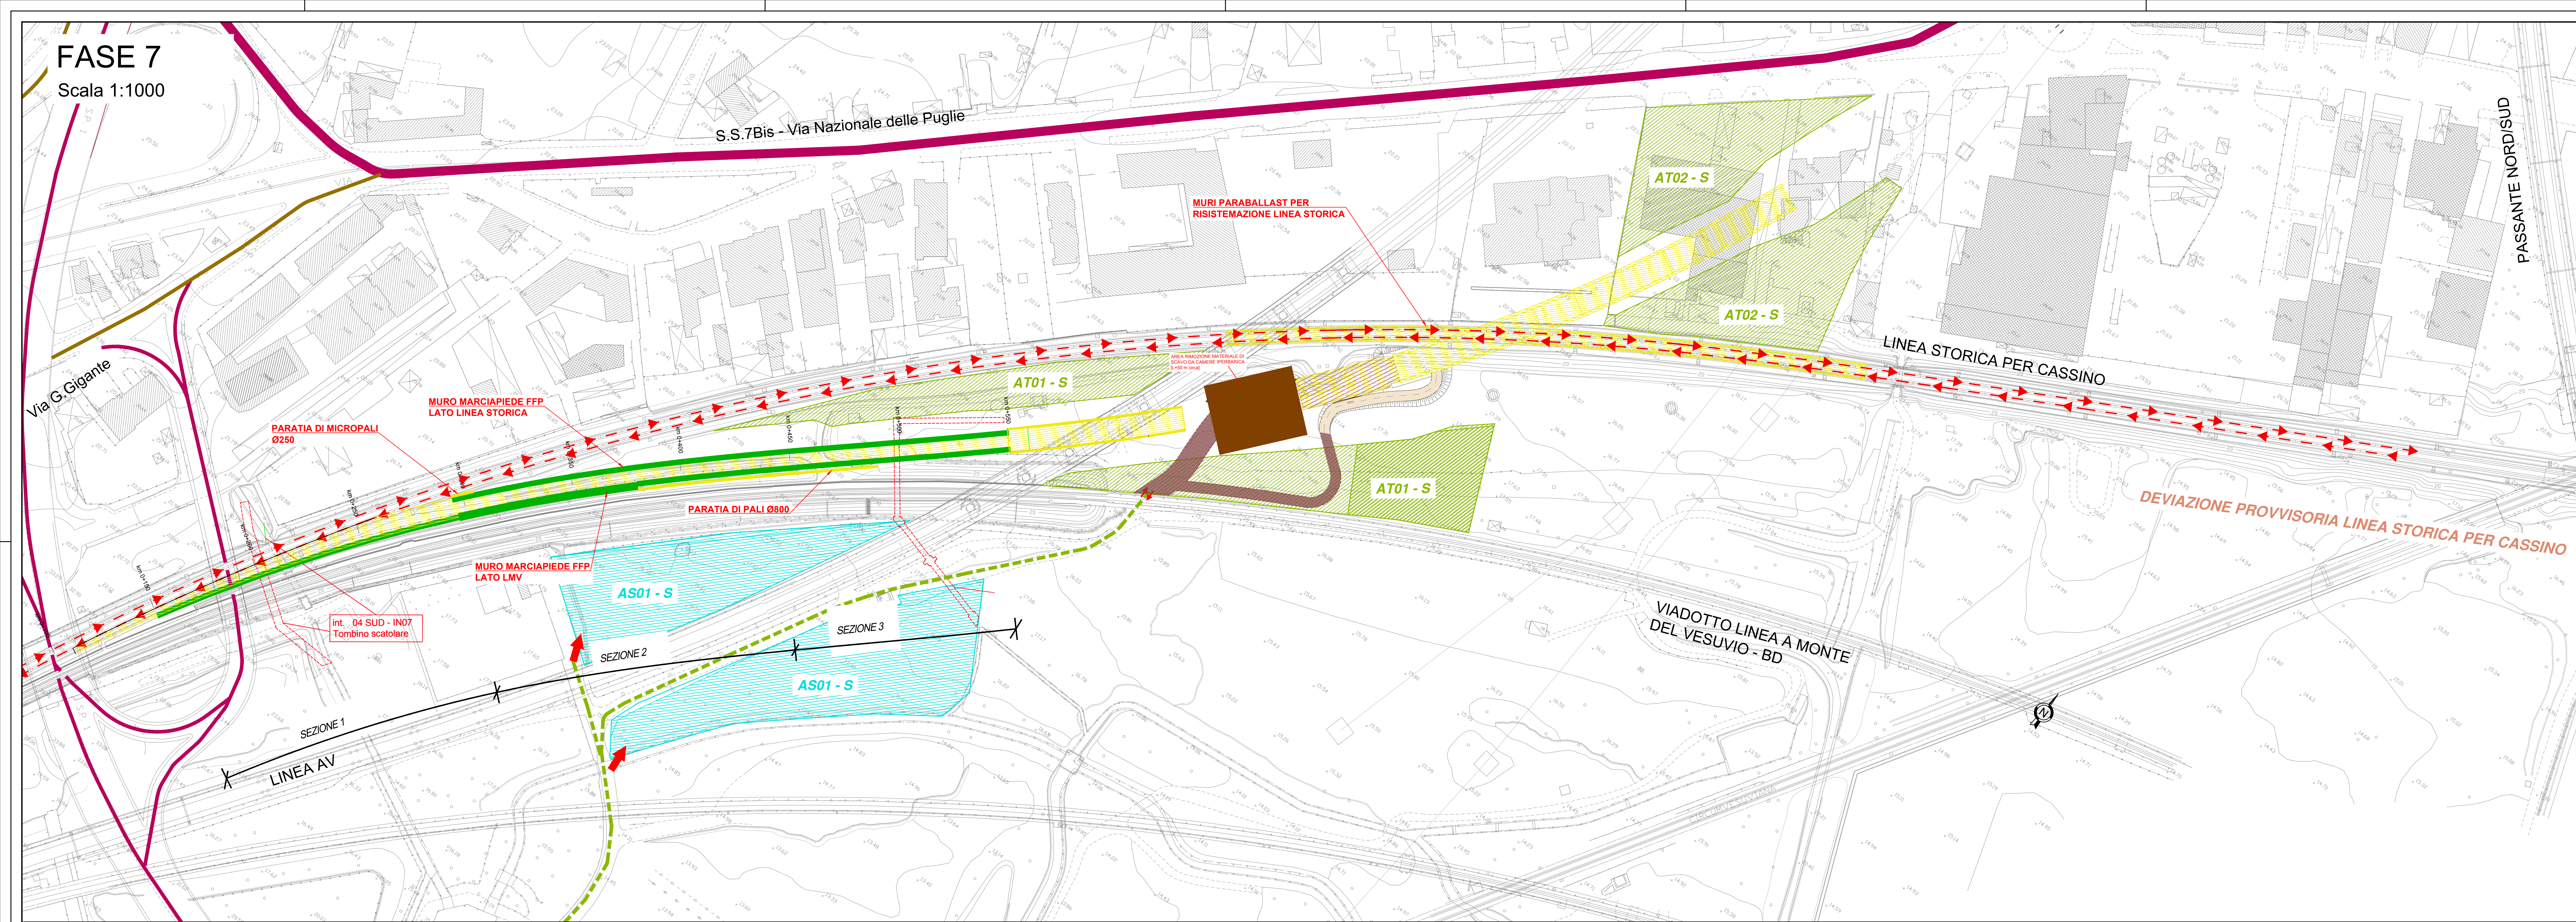


LEGENDA

- BINARIO IN ESERCIZIO NELLA FASE DI RIFERIMENTO
- BINARIO IN COSTRUZIONE NELLA FASE DI RIFERIMENTO
- SEDE IN COSTRUZIONE NELLA FASE DI RIFERIMENTO
- OPERE IN COSTRUZIONE NELLA FASE DI RIFERIMENTO
- MARCIAPIEDI FFP IN COSTRUZIONE NELLA FASE DI RIFERIMENTO
- MARCIAPIEDI FFP COSTRUITI NELLA FASE PRECEDENTE
- BINARI COSTRUITI NELLA FASE PRECEDENTE
- SEDE COSTRUITA NELLA FASE PRECEDENTE
- OPERA COSTRUITA NELLA FASE PRECEDENTE
- DEMOLIZIONE NELLA FASE DI RIFERIMENTO
- DEMOLIZIONE SEDE NELLA FASE DI RIFERIMENTO
- SCAVO MATERIALE DI RISULTA
- PARTI D'OPERA DA REALIZZARE NELLA FASE SPECIFICA
- AREA DI CANTIERE - AREA TECNICA
- AREA DI CANTIERE - AREA DI STOCCAGGIO
- PISTE DI CANTIERE
- int. INTERFERENZE NELL'AREA
- COPERTURA GALLERIA DESTINATA AGLI IMPIANTI PER LO SCAVO IN PRESSIONE
- RAMPA DI COLLEGAMENTO CON LA COPERTURA DELLA GALLERIA
- AREA RIMOZIONE MATERIALE DI SCAVO DA CAMERE IPERBARICHE
- PISTA DI CANTIERE PER IL COLLEGAMENTO ALL'AREA DI RIMOZIONE MATERIALE ED ALLA RAMPA

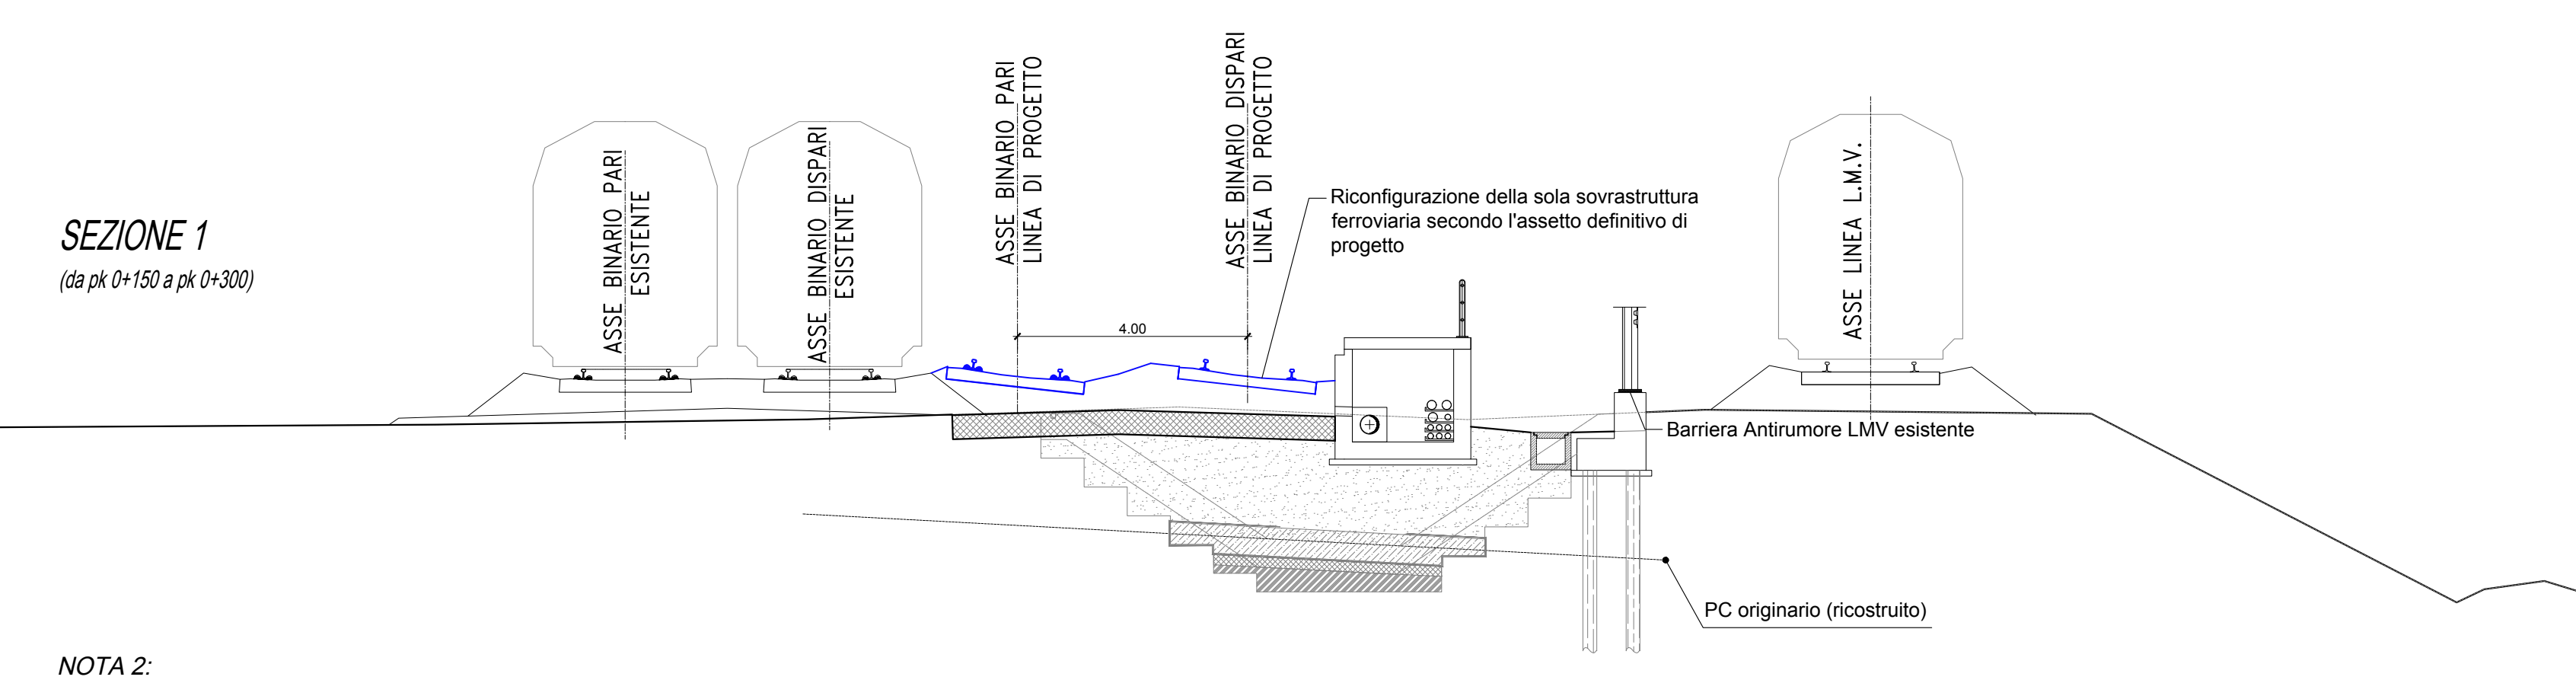

NOTA 2:
Per realizzare la sede della linea definitiva (a quote inferiori rispetto alla provvisoria), dalla pk 0+250 alla pk 0+300, dovrà essere rimossa la quotaparte di supercompattato eccedente (vedi NOTA 1 elaborato IF0E00D78AZIF0001001A)

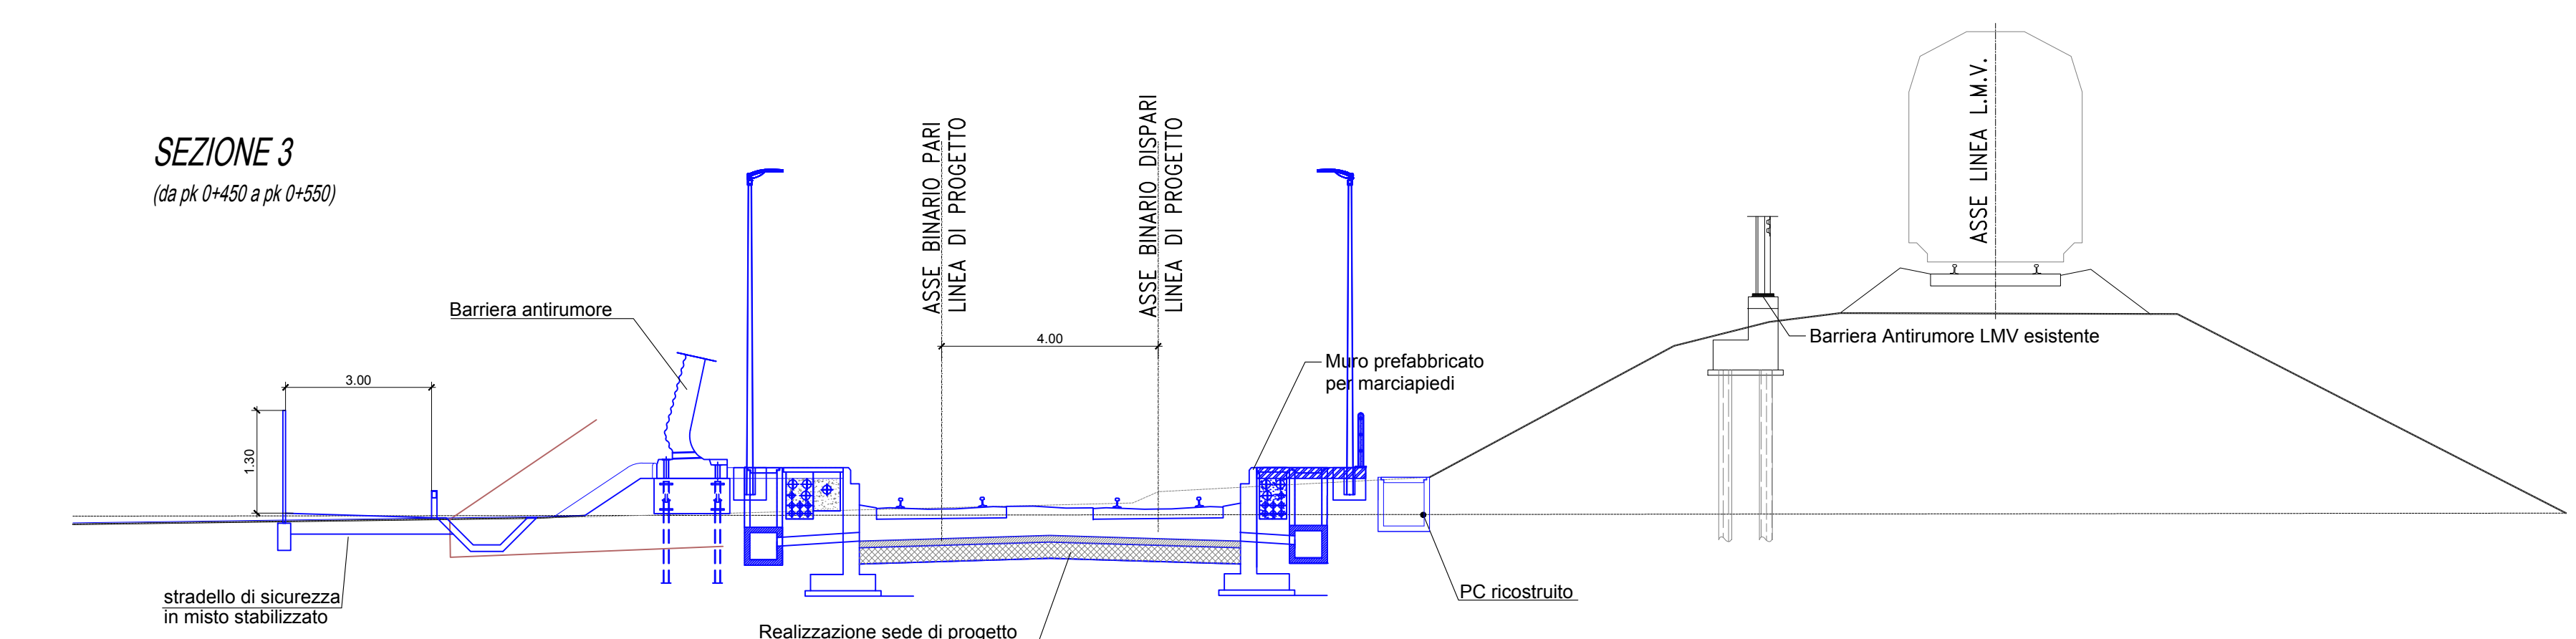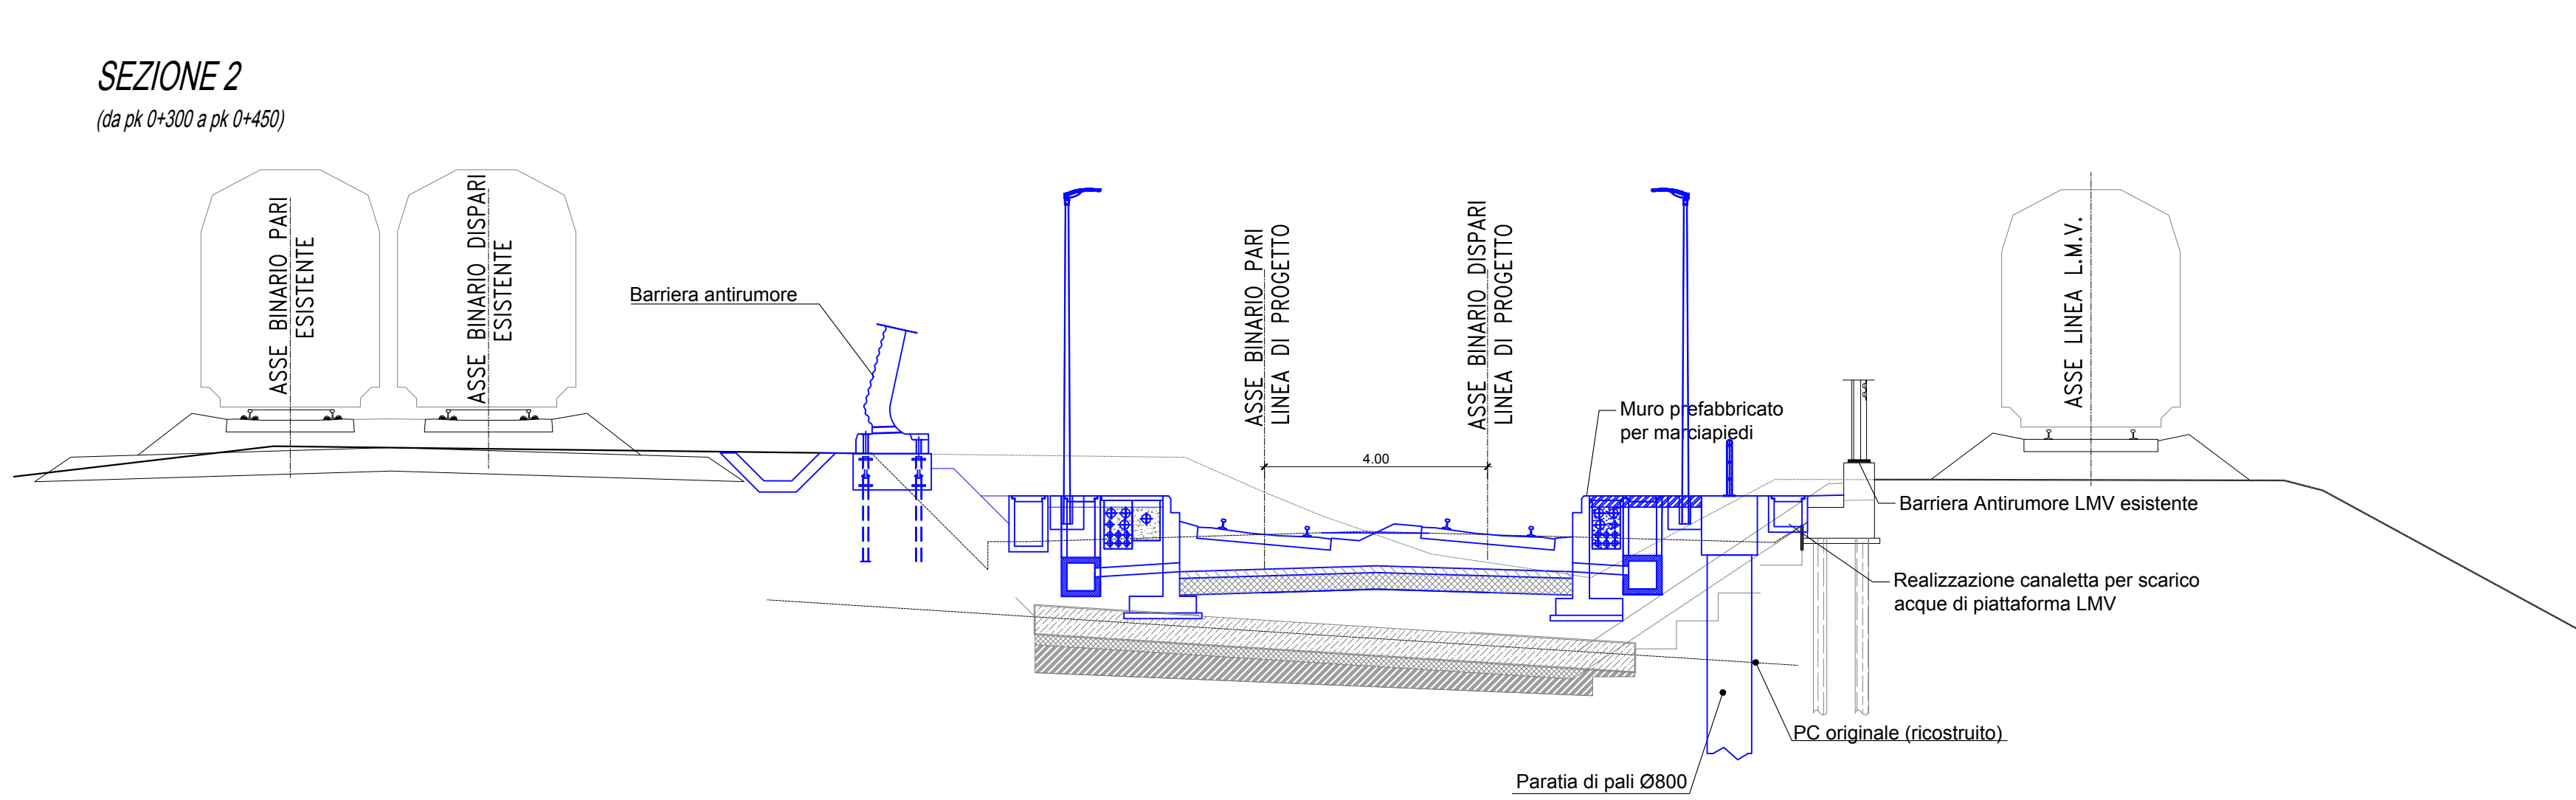

Scala 1:100

- FASE 7:**
Linea storica in esercizio:
1) Realizzazione rampa di collegamento con la copertura della galleria GA
2) Sistemazione dei piazzali per l'area di rimozione dei materiali di scavo da camera iperbarica.
3) Realizzazione dello scavo in pressione.

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **salini impregio** **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** **SOTECNI** **ROKSOIL**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

OC - OPERE CIVILI
FASI REALIZZATIVE
Planimetria Fasi Realizzative
Fase 7

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHIODI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	P7	OC0000	008	B	VARIE

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE	FRANCINI	14/09/18	CHIODI	10/09/18	PAZZI	10/09/18	LACROCI	
B	EMISSIONE PER REV.	FRANCINI	13/09/18	CHIODI	11/09/18	PAZZI	11/09/18		

F:\if1m\0.0.E.ZZ.P7.OC.00.0.008.B.DWG n. Edab.
