


**FASE 13**  
SCALA 1:1000

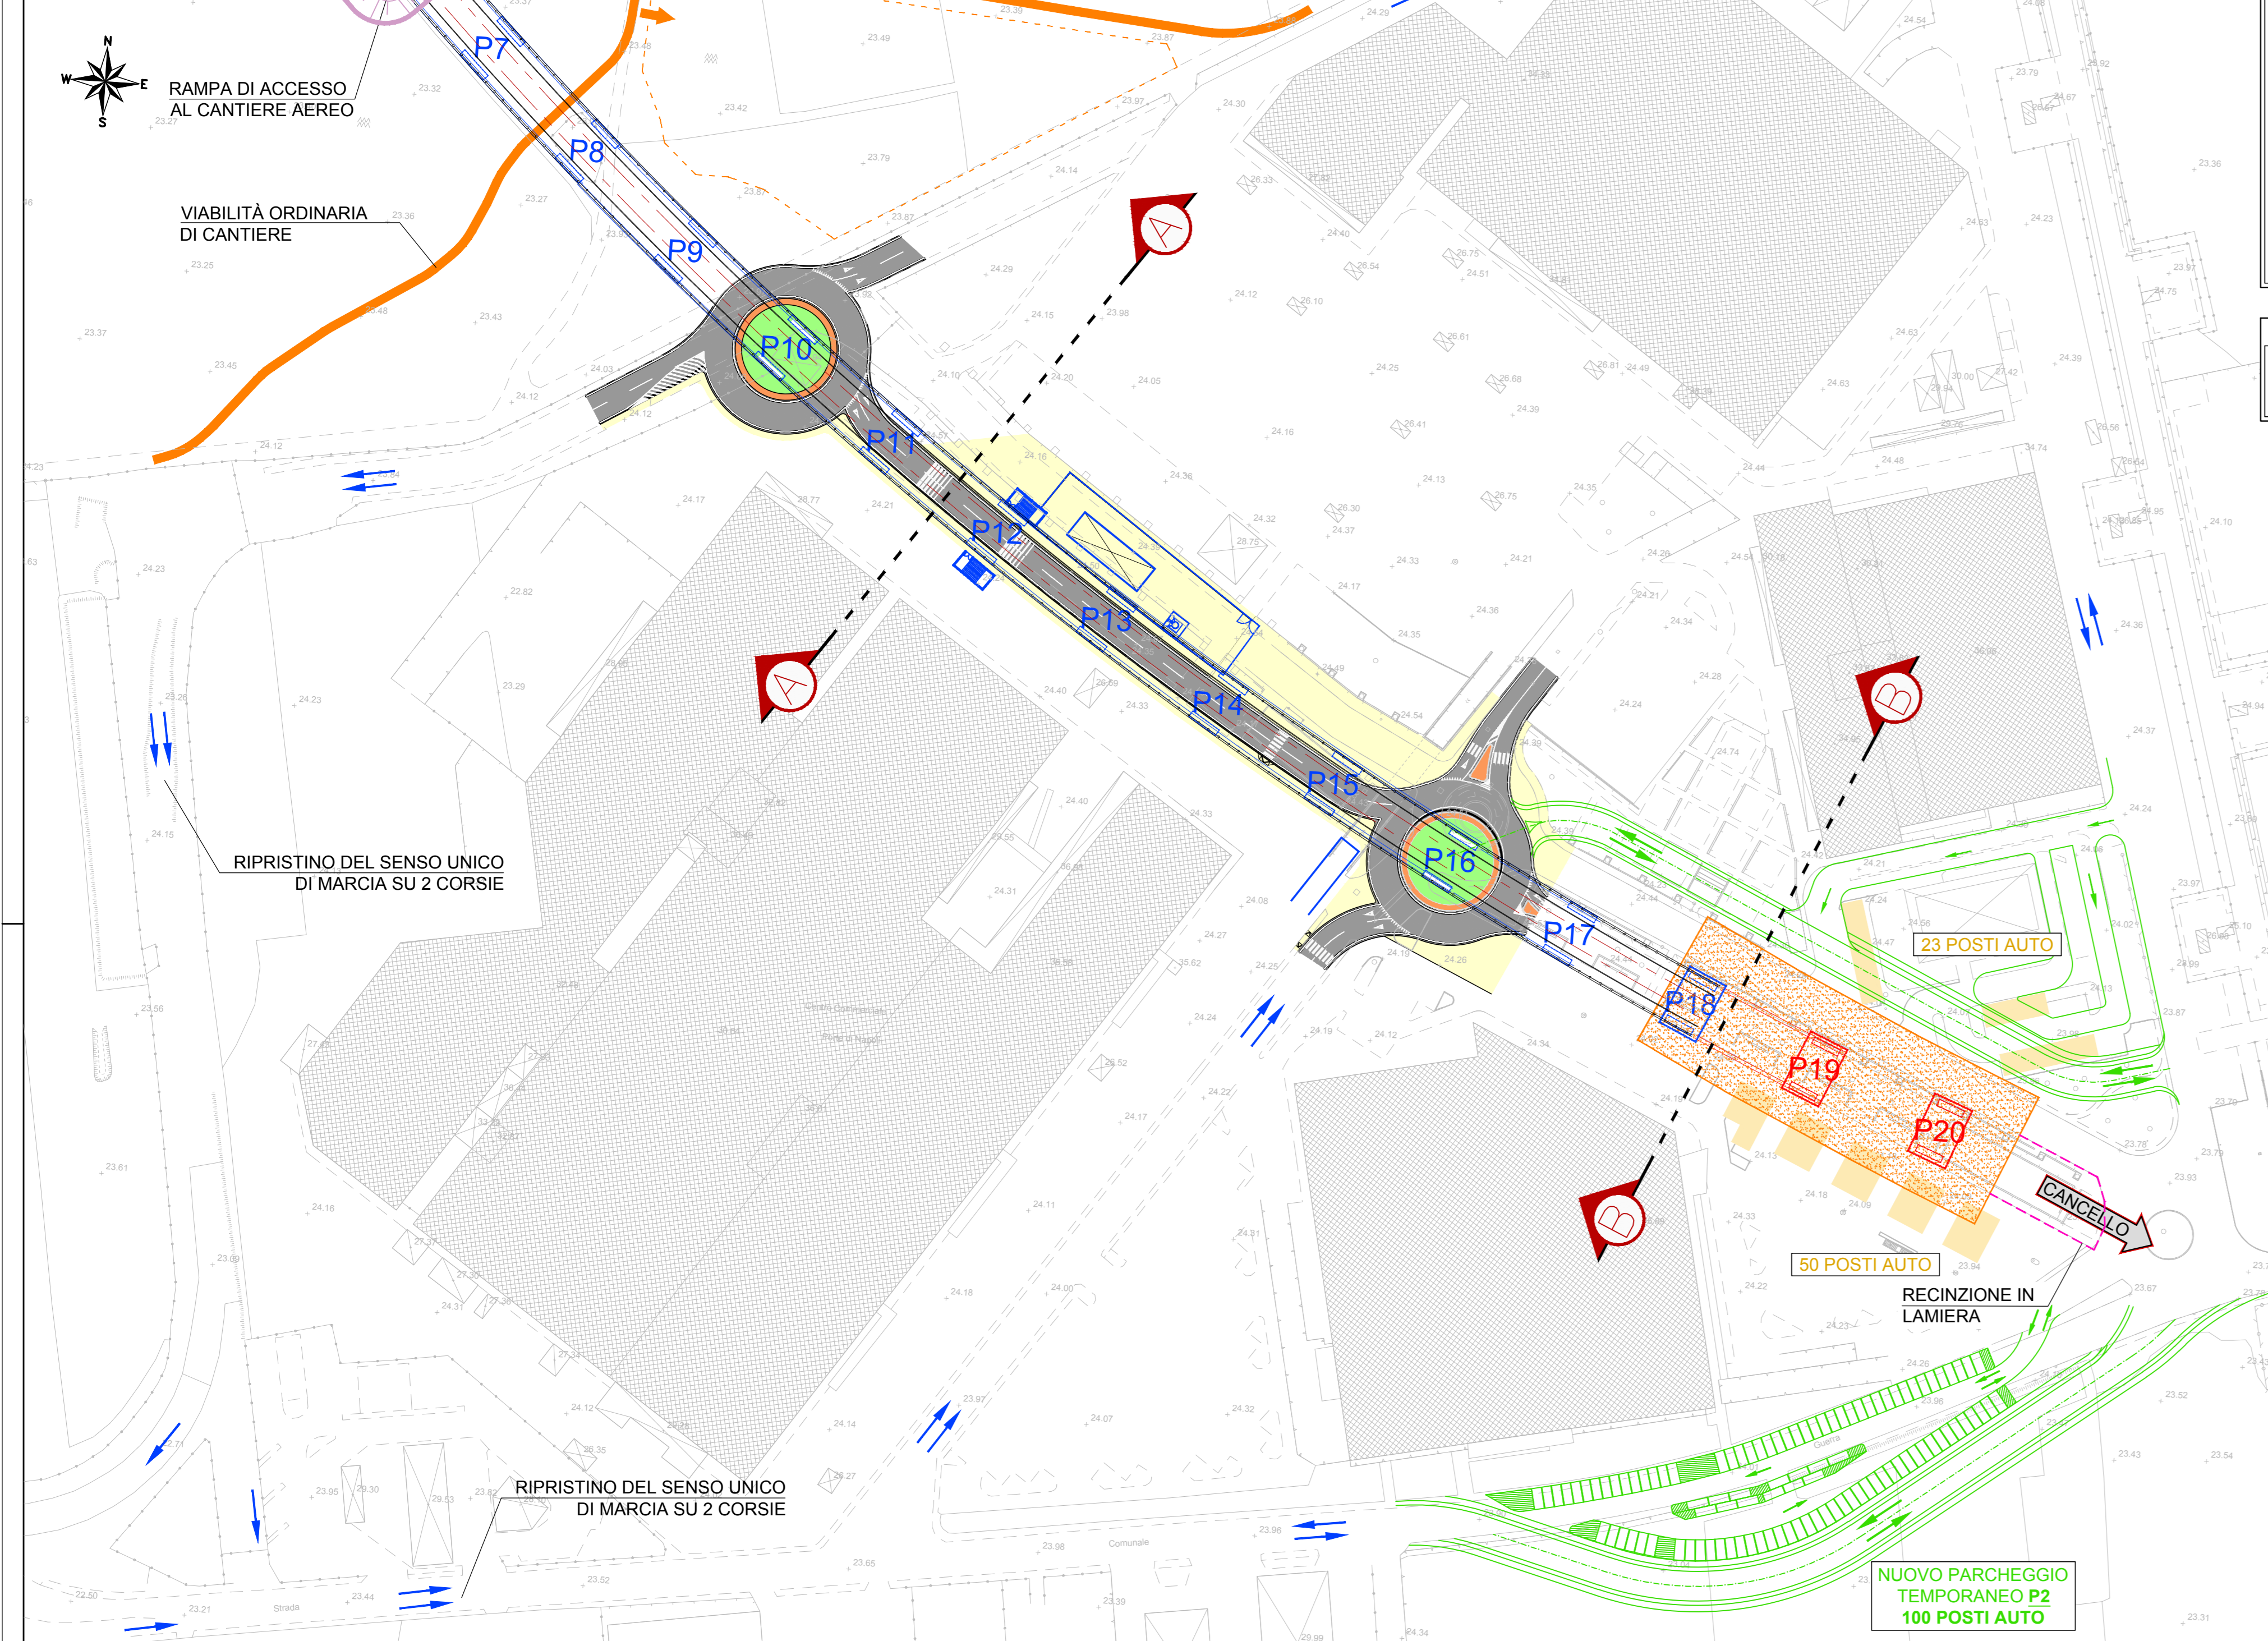


**FASE 12**

- COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ DEFINITIVA SOTTO IL NUOVO VIADOTTO ED APERTURA AL TRAFFICO DELLA NUOVA ROTATORIA E DELLA NUOVA VIABILITÀ RAMO A A SENSO UNICO IN USCITA DAL CENTRO COMMERCIALE IN CONFIGURAZIONE FINALE;
- RIPRISTINO DEL SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIABILITÀ REALIZZATA DA ALTRO APPALTO E SU VIA MARZIA SEPE;
- APERTURA AL TRAFFICO DELL'INNESTO SU ROTATORIA DEFINITIVA;
- DISMISSIONE DEL PARCHEGGIO TEMPORANEO P1 REALIZZATO IN FASE 1;
- DISMISSIONE DEL PARCHEGGIO TEMPORANEO P3 REALIZZATO IN FASE 2;
- AVANZAMENTO CANTIERE AEREO TRA LE PILE P18, P19 E P20;
- REALIZZAZIONE DEL VIADOTTO V101 TRA LE PILE 18 E 19.

**NOTA**


IL NUMERO DI STALLI DI PARCHEGGIO PROVVISORI CORRISPONDE O SUPERA QUELLO DEI PARCHEGGI PREESISTENTI, TEMPORANEAMENTE OCCUPATI.

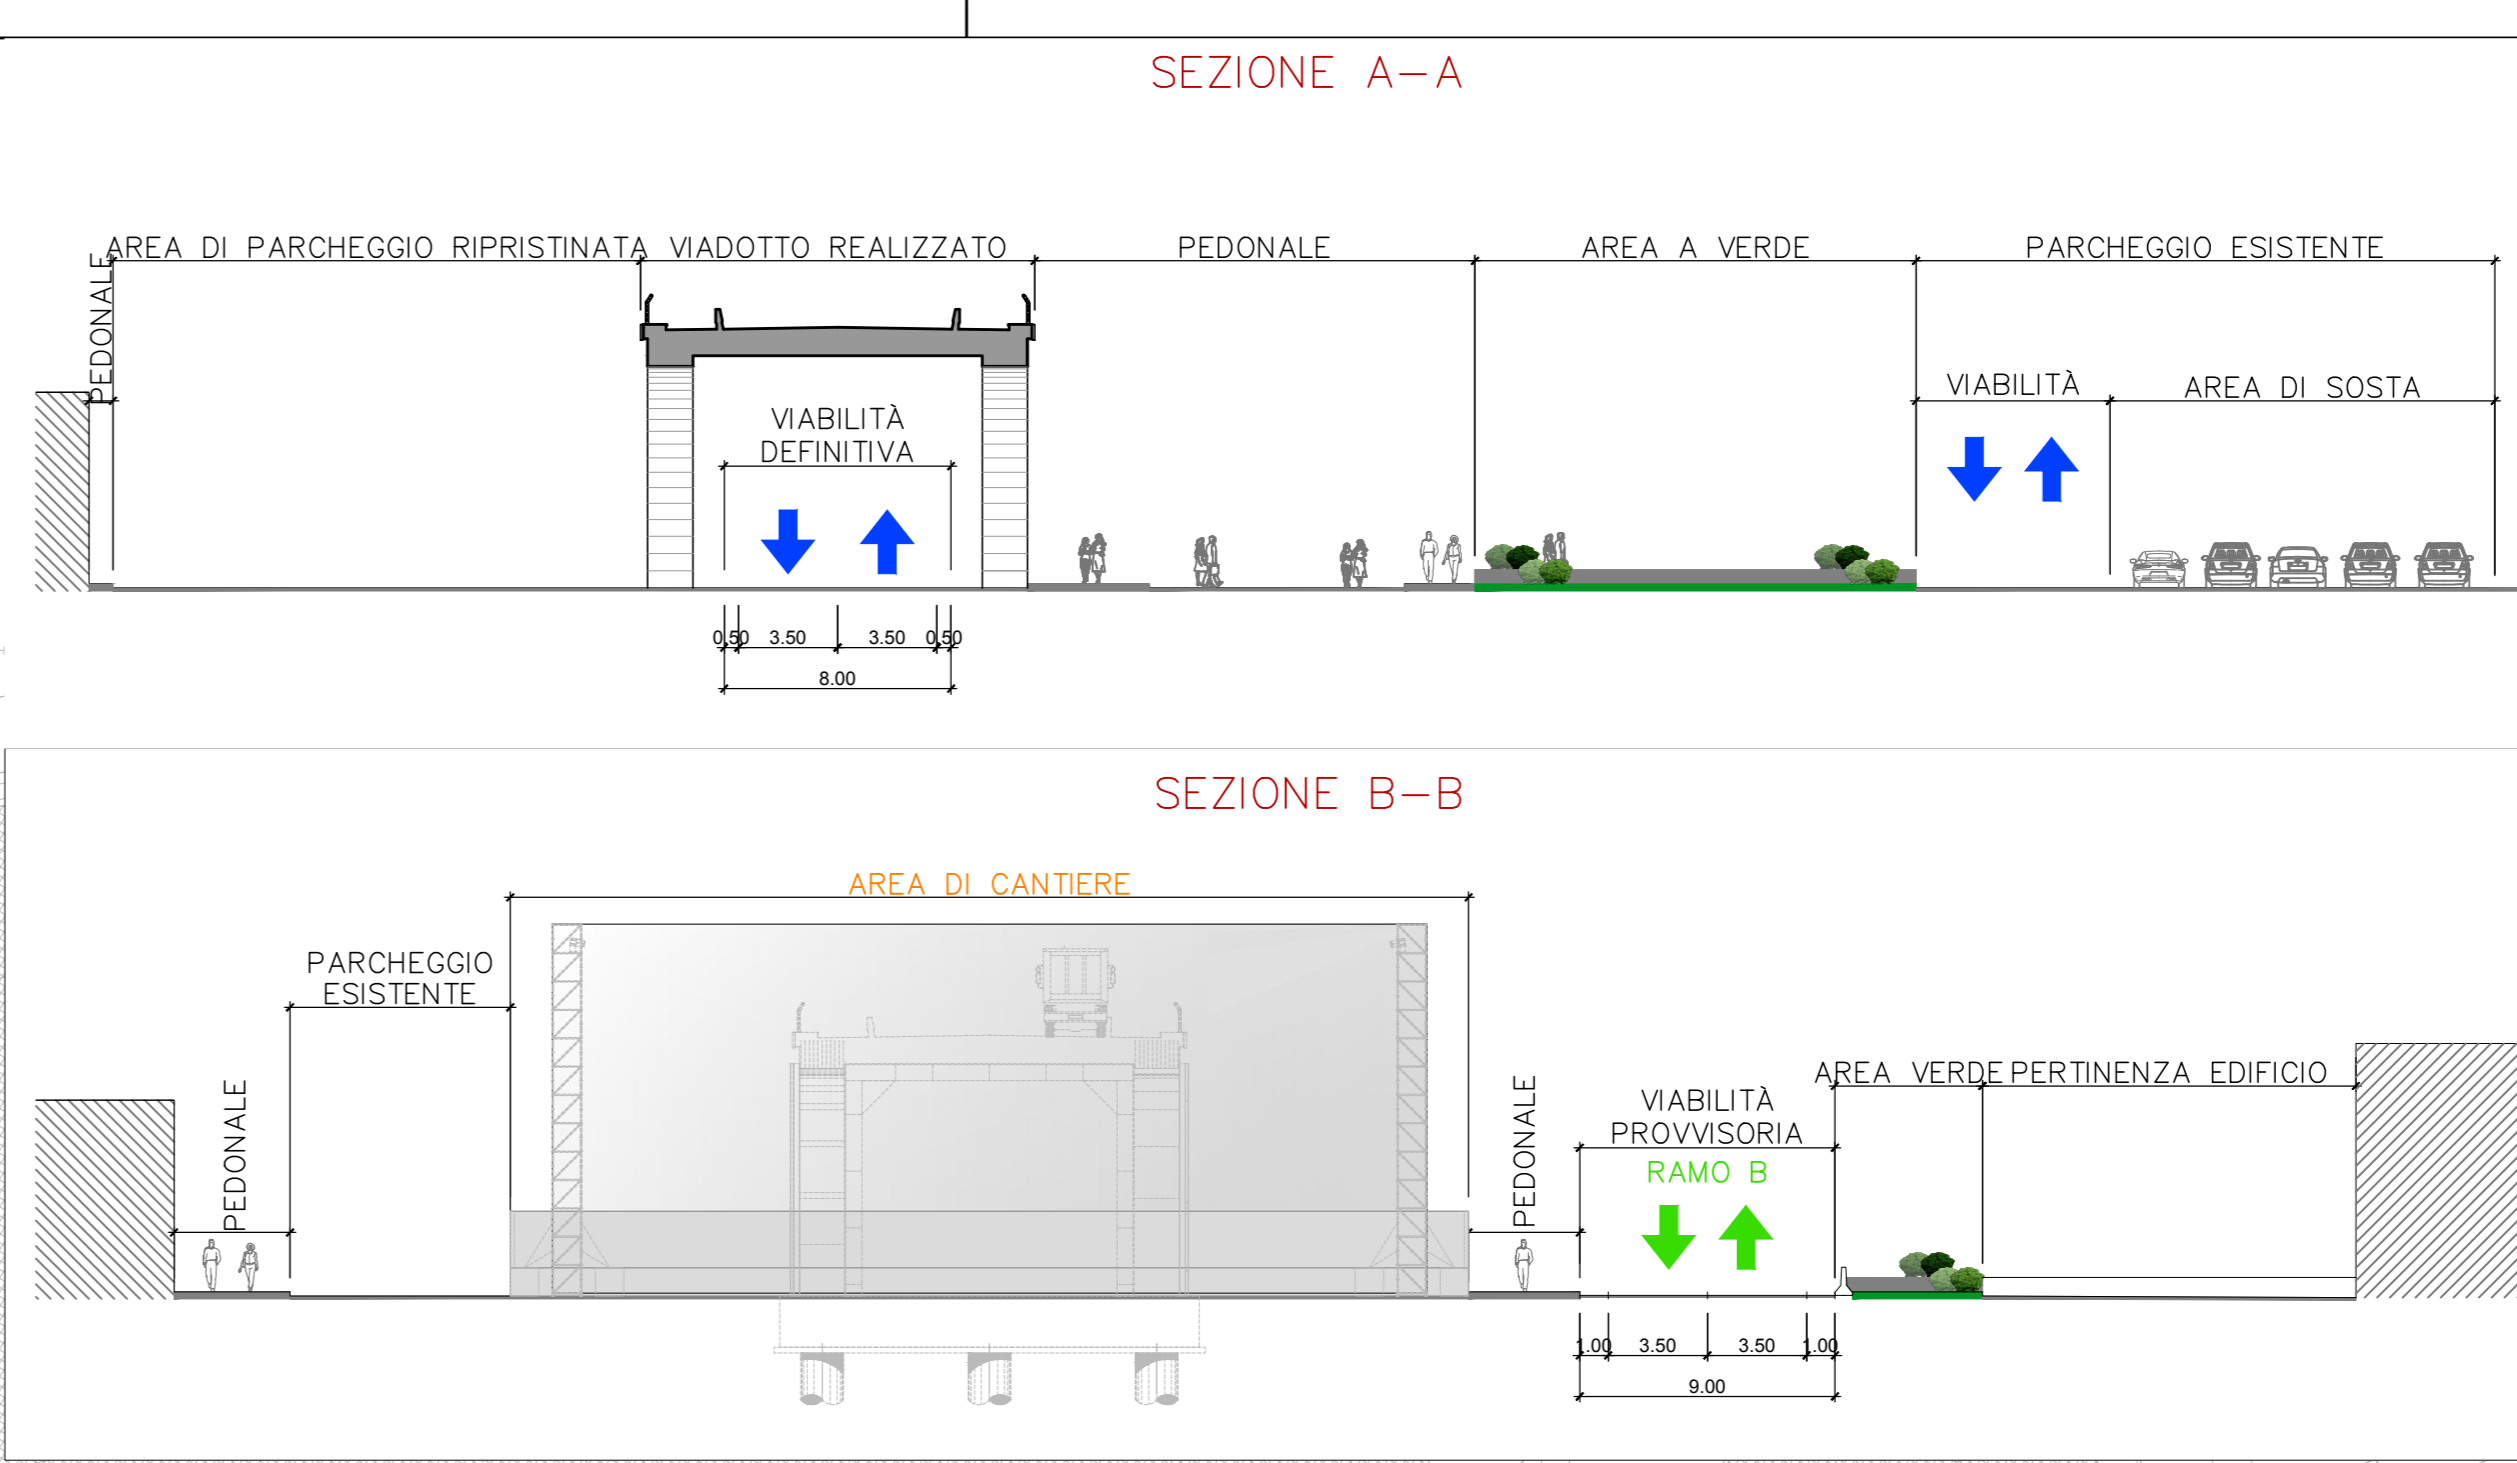

**LEGENDA**

- INFRASTRUTTURA IN LAVORAZIONE
- INFRASTRUTTURA REALIZZATA
- VIABILITÀ TEMPORANEA IN LAVORAZIONE
- VIABILITÀ TEMPORANEA REALIZZATA
- TRAFFICO VEICOLARE VIABILITÀ
- TRAFFICO VEICOLARE VIABILITÀ TEMPORANEA
- STALLI DEL PARCHEGGIO ESISTENTE DIMESSI
- PARCHEGGIO TEMPORANEO IN LAVORAZIONE
- PARCHEGGIO TEMPORANEO REALIZZATO
- PARCHEGGIO DEFINITIVO IN LAVORAZIONE
- PARCHEGGIO DEFINITIVO REALIZZATO
- AREA DI CANTIERE
- AREA DI CANTIERE DELLE FINITURE

**FASE 14**  
SCALA 1:1000


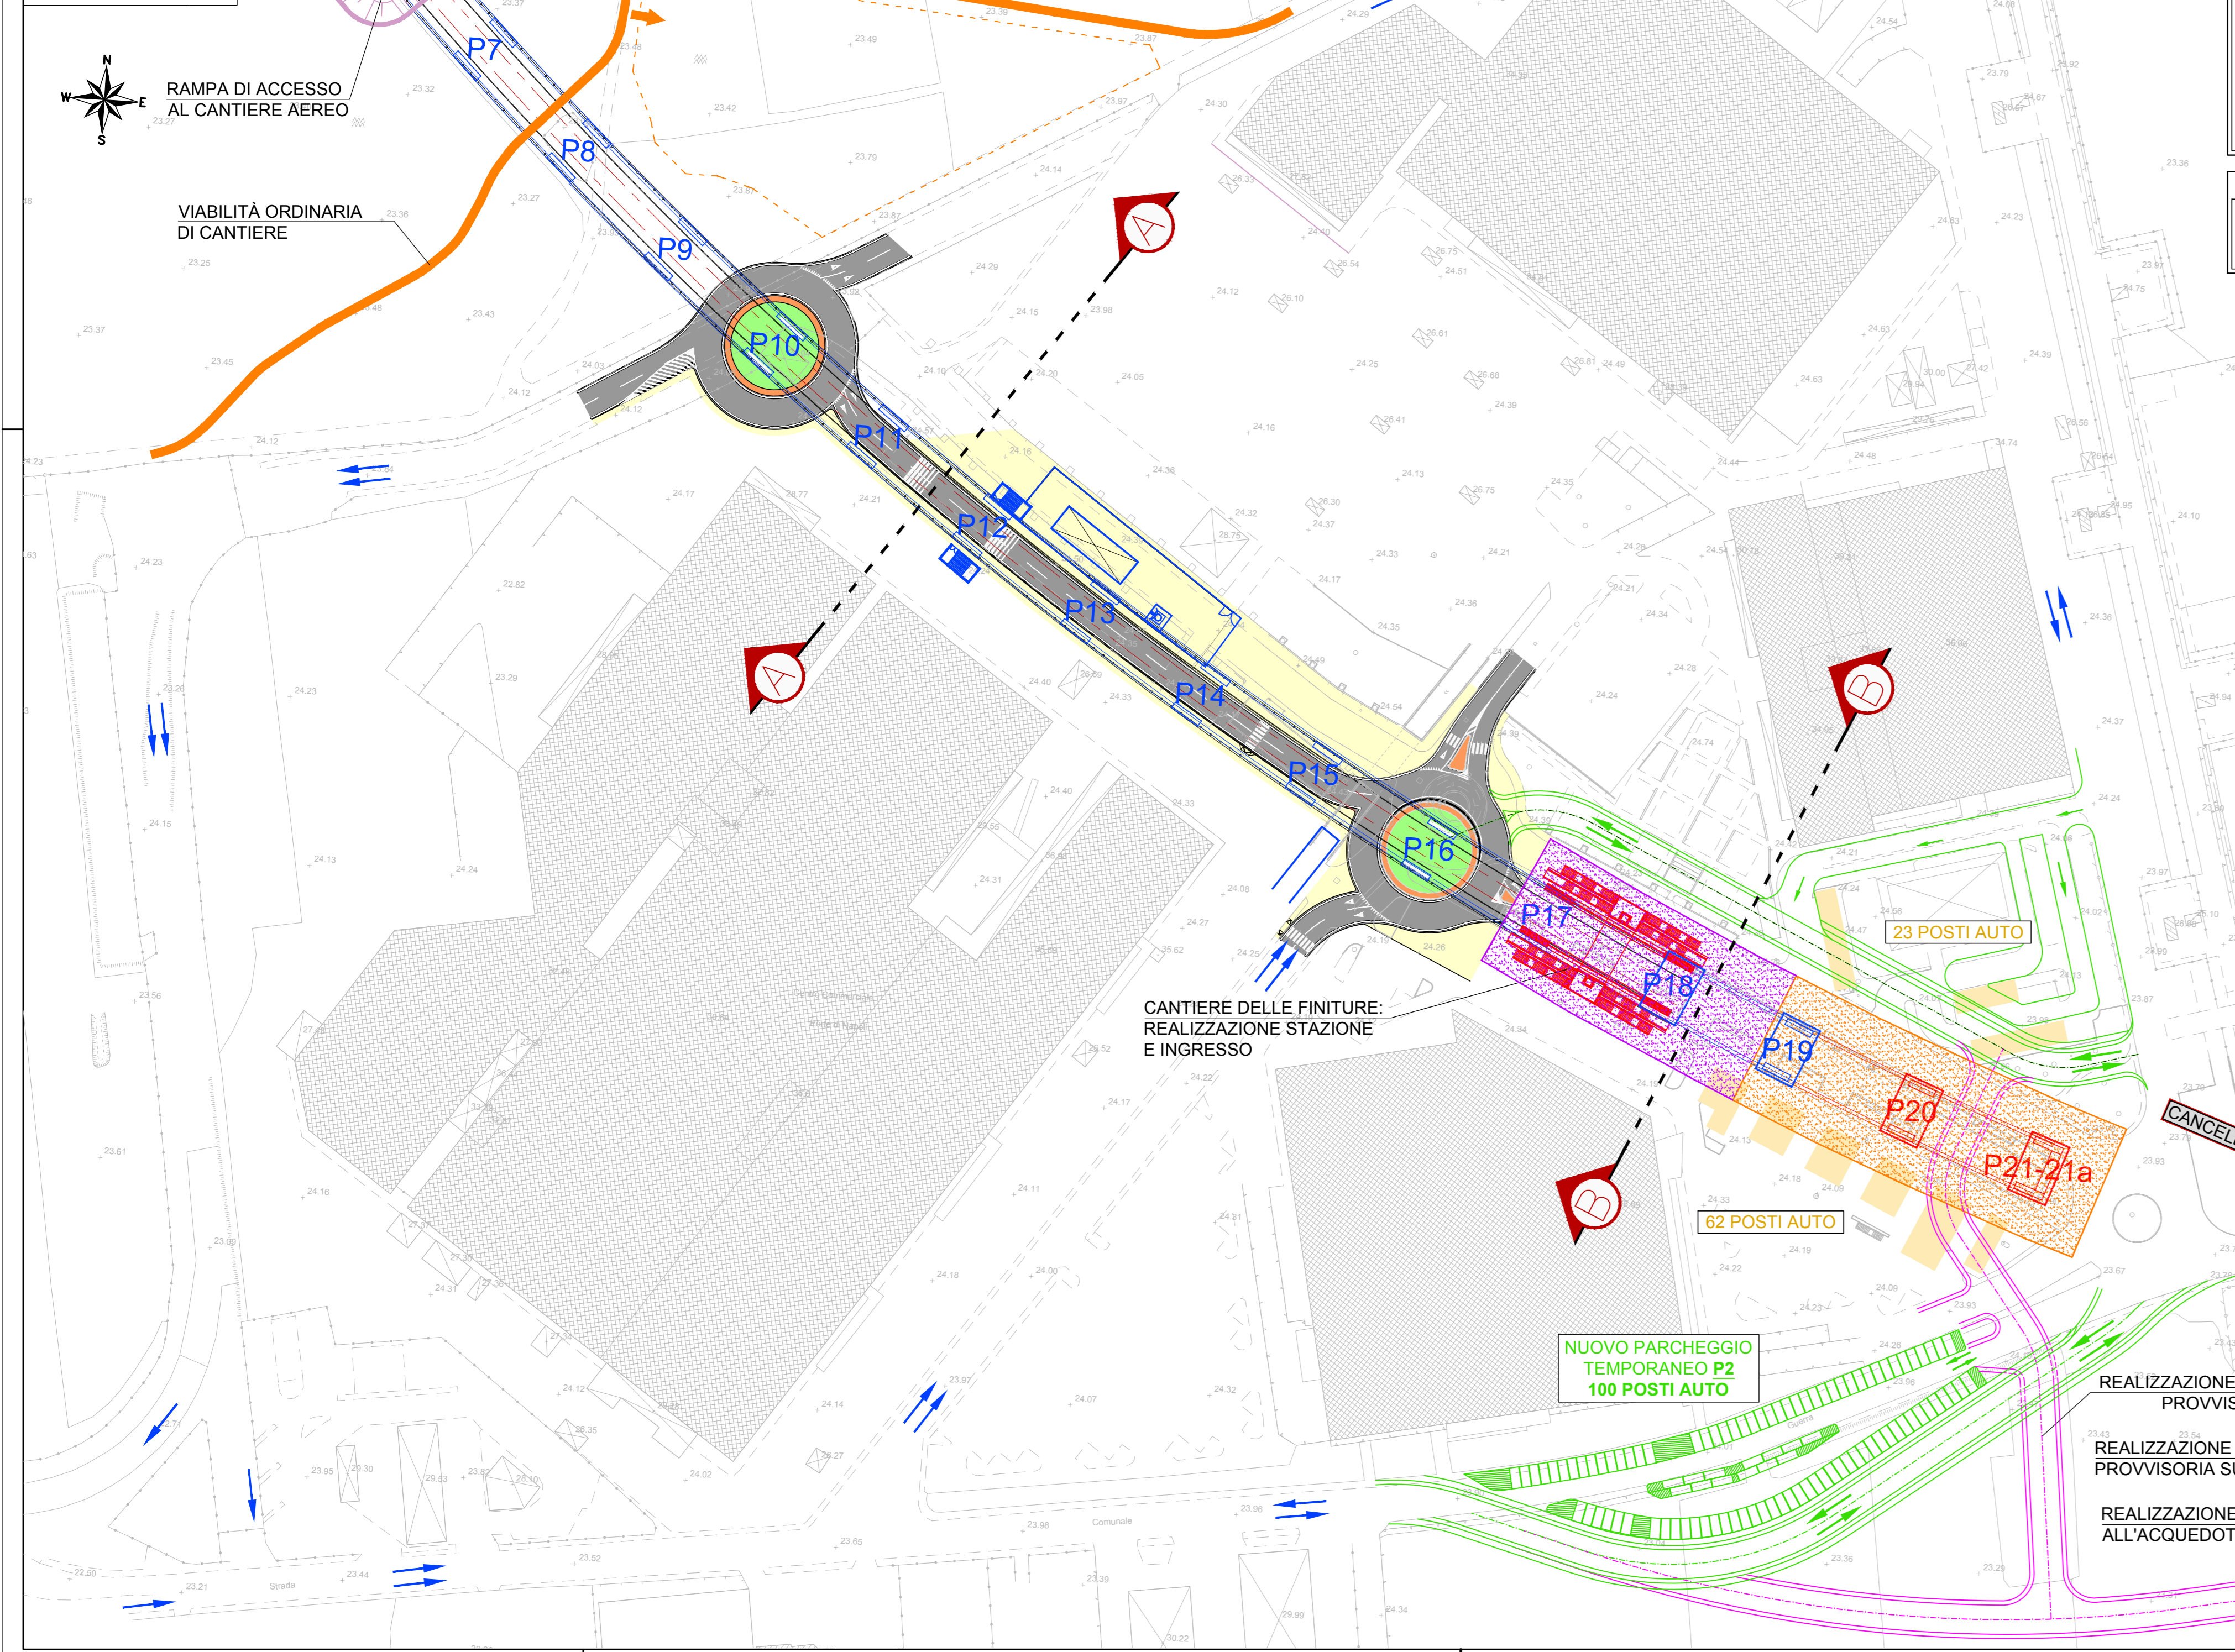


**FASE 14**

- REALIZZAZIONE CORPO FERMATA E COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ DEFINITIVA DI PROGETTO SOTTO IL NUOVO VIADOTTO FINO ALLA PILA P18;
- AVANZAMENTO CANTIERE AEREO TRA LE PILE P19, P20 E P21-P21A;
- REALIZZAZIONE DEL VIADOTTO V101 TRA LE PILE 19 E 20;
- REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ PROVVISORIA SU VIA MARZIA SEPE COMPRESI GLI ACCESSI TEMPORANEI ALL'ACQUEDOTTO ABC;
- REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PROVVISORIO SU RAMO B.

**NOTA**

IL NUMERO DI STALLI DI PARCHEGGIO PROVVISORI CORRISPONDE O SUPERA QUELLO DEI PARCHEGGI PREESISTENTI, TEMPORANEAMENTE OCCUPATI.

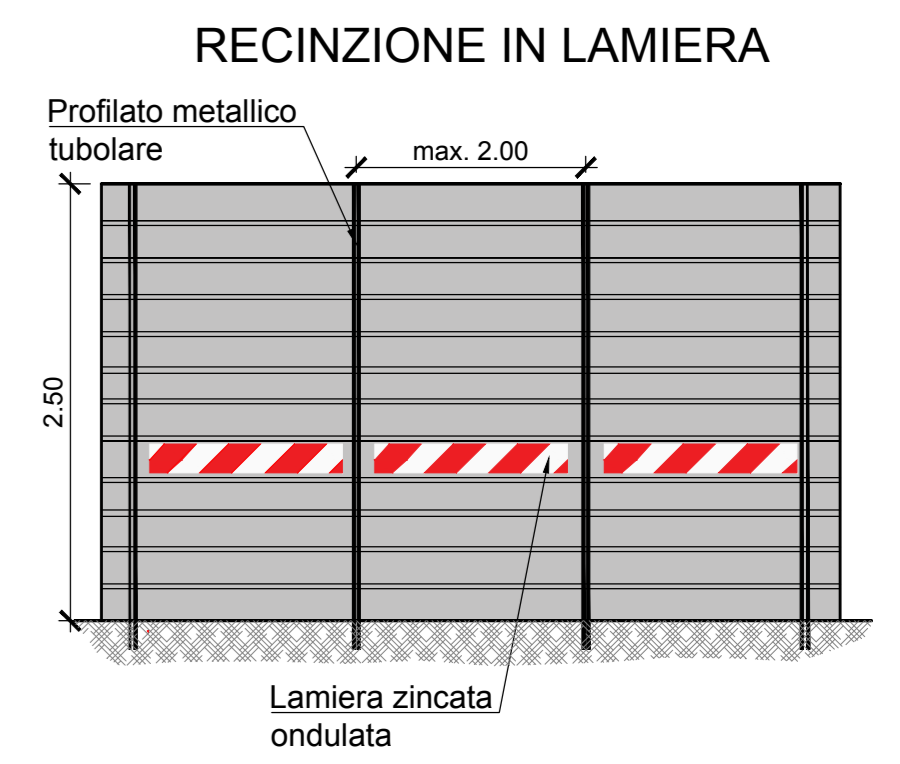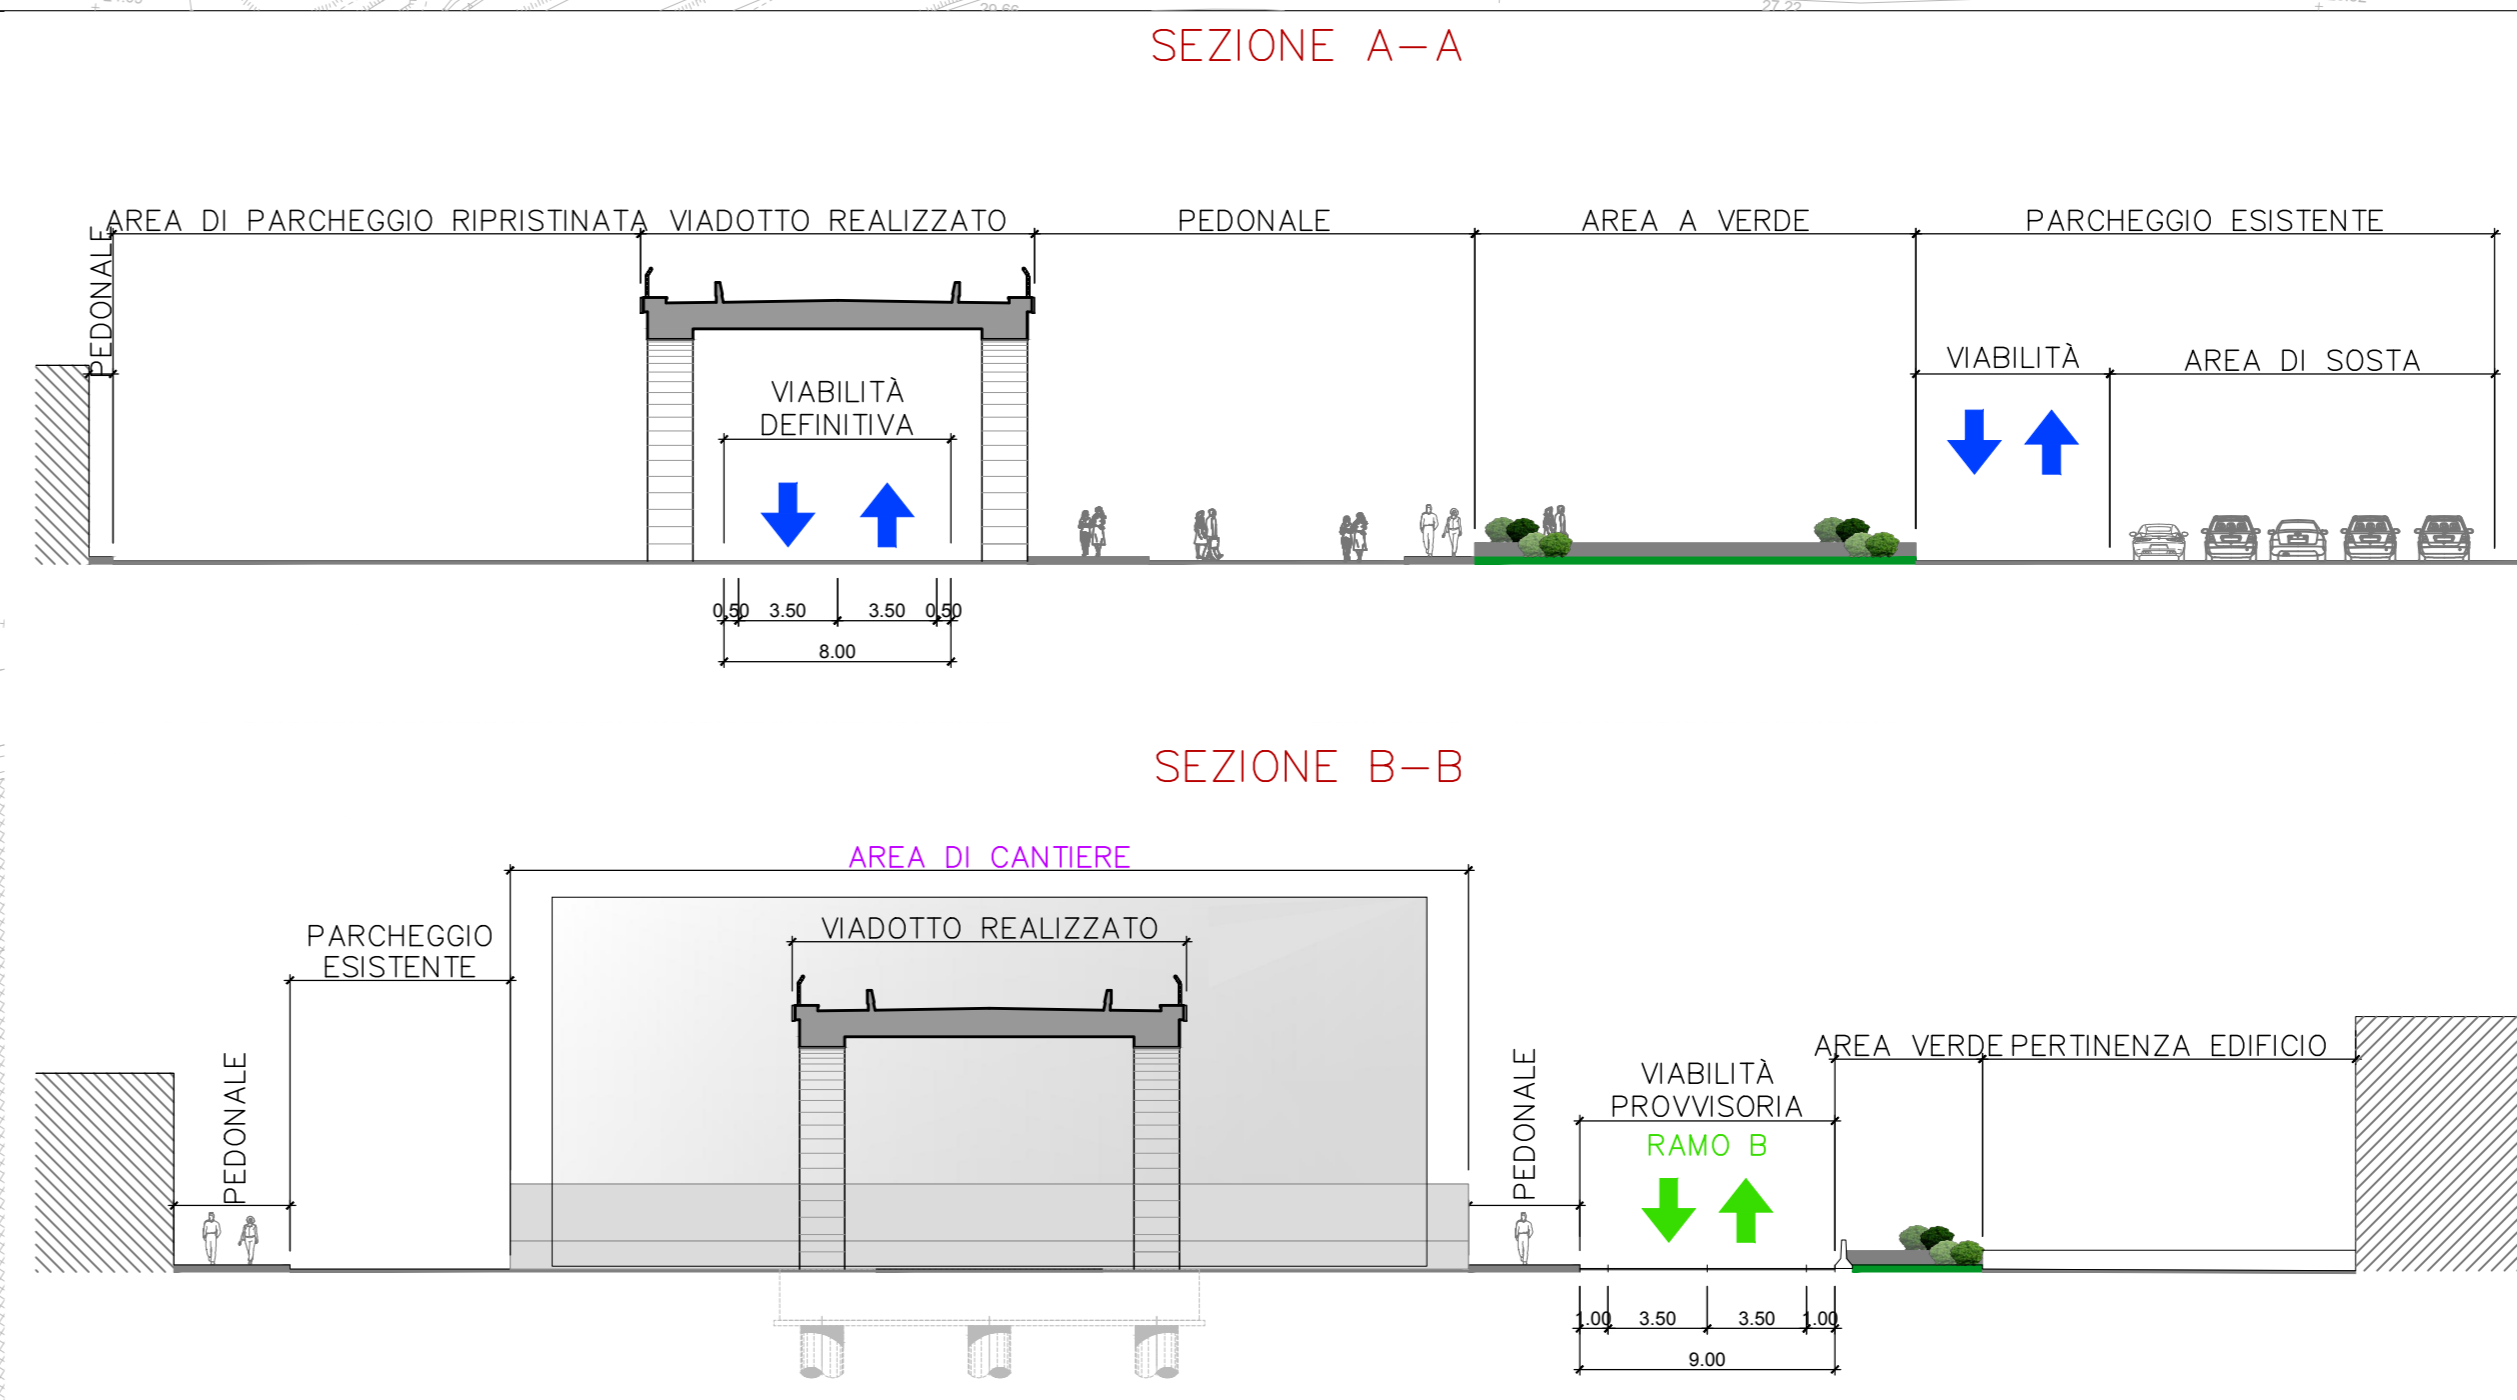

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **salini impregilo** MANDATARIA: **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** MANDATARIA: **SOTECNI** **ROCKSOIL**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014**

DISEGNO

VI - VIADOTTI

V101 - VIADOTTO DAL Km. 6+650 al Km. 8+490,66

VIADOTTO AD ARCHI

FASI REALIZZATIVE

PLANIMETRIA E SEZIONI - FASE 13 E FASE 14

APPALTATORE	PROGETTAZIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	A7	V101	010	009 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE	DI PLACCO	14/01/14	MARTURCELLI	15/01/14	DIANGELO	15/01/14	MARTURCELLI	14/01/14

File: IF1M 0.0.E.ZZ.A7.V101.0.0.009-A.DWG n. Elab.:
