



SEZIONE TRASVERSALE GALLERIA B_01 - FASE 1

- Scavo di 1° fase fino alla quota di intradosso della copertura e spostamento del sottoservizi
- Rinterramento temporaneo
- Realizzazione dei cordoli guida
- Realizzazione dei tappi di fondo in cls e dei diaframmi
- Getto magrone e posa telo in pvc

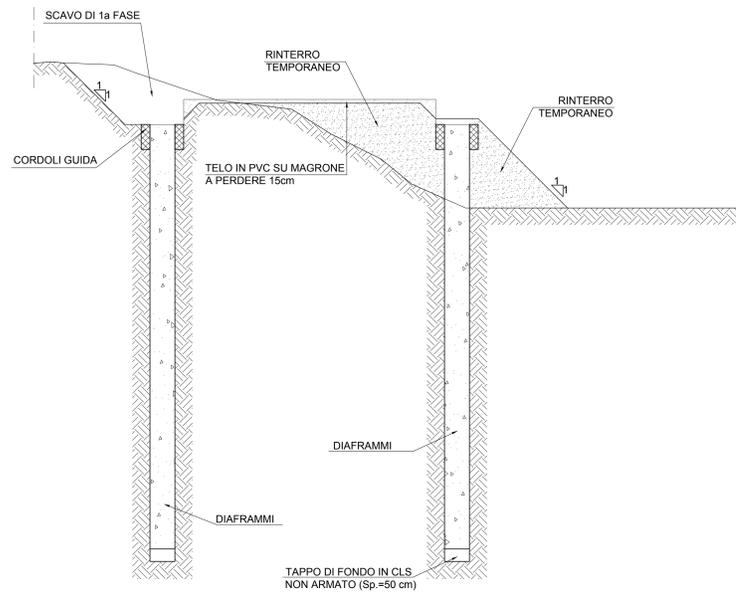


SEZIONE TRASVERSALE GALLERIA B_01 - FASE 2

- Realizzazione solettoni di copertura
- Posa strato impermeabilizzazione e massetto delle pendenze

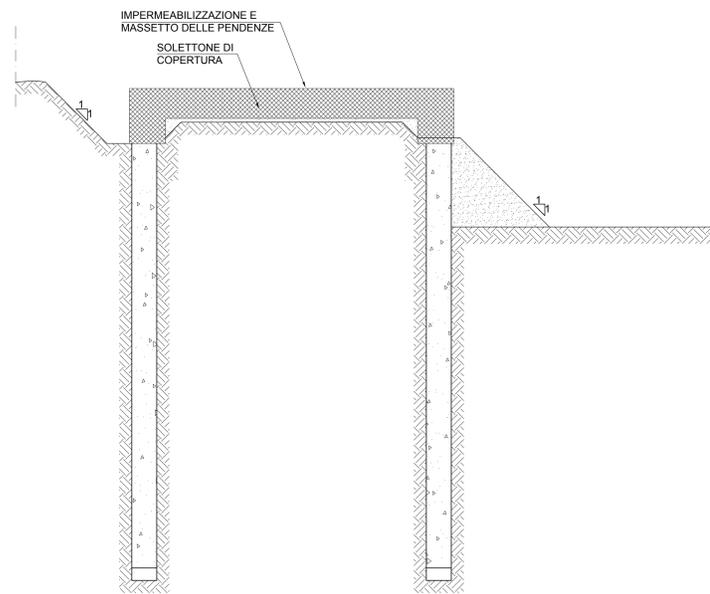


SEZIONE TRASVERSALE GALLERIA B_01 - FASE 3

- Rinterramento dello scavo sino alla quota di piano campagna

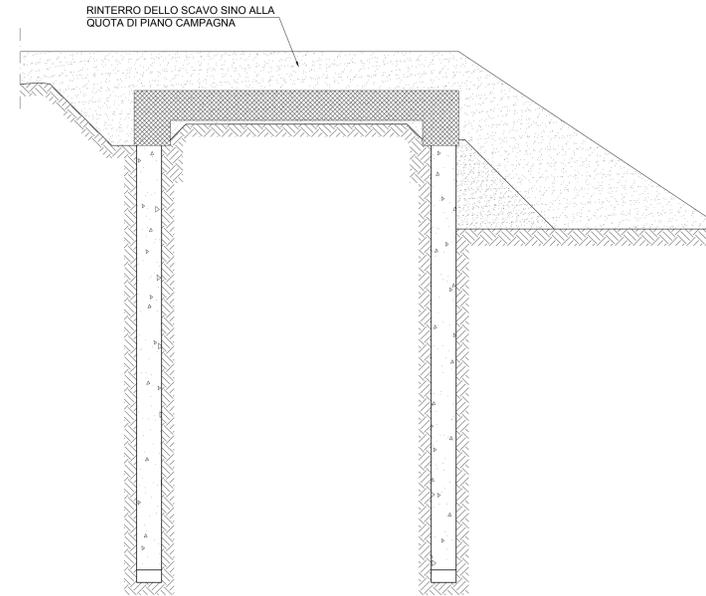


SEZIONE TRASVERSALE GALLERIA B_01 - FASE 4

- Scavo di 2° fase a foro cieco fino a quota imposta fondazione, con mantenimento di aria in pressione durante l'esecuzione delle lavorazioni per garantire l'abbassamento del livello di falda al di sotto del fondo scavo
- Posa 1° strato di magrone di fondo scavo sp. 15 cm
- Posa strato di impermeabilizzazione
- Posa 2° strato di magrone sp. 5 cm a protezione strato impermeabile

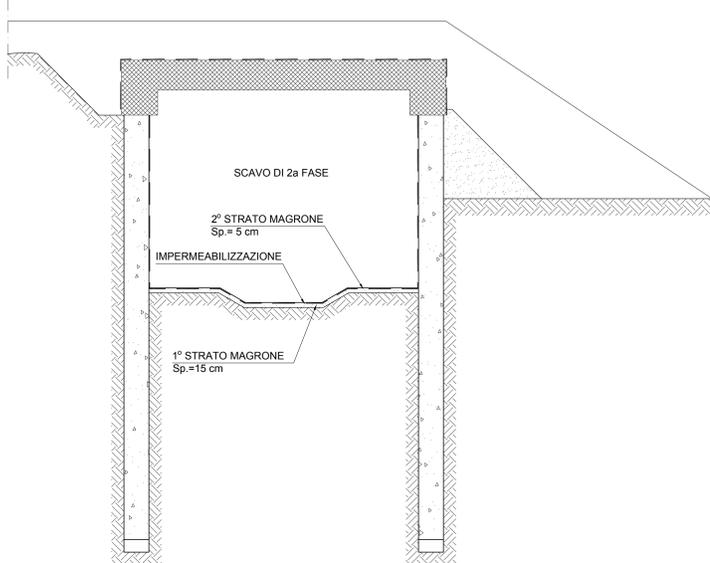



SEZIONE TRASVERSALE GALLERIA B_01 - FASE 5

- Realizzazione soletta di fondazione
- Realizzazione fodere con completamento con malta antiritiro sp. 10 cm

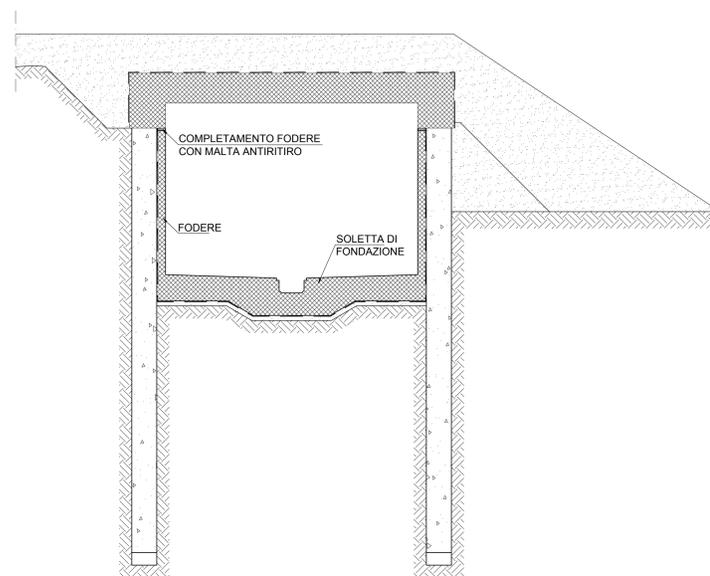

SEZIONE TRASVERSALE GALLERIA B_01 - FASE 6

- Disattivazione della pressione interna
- Completamento opere interne di finitura

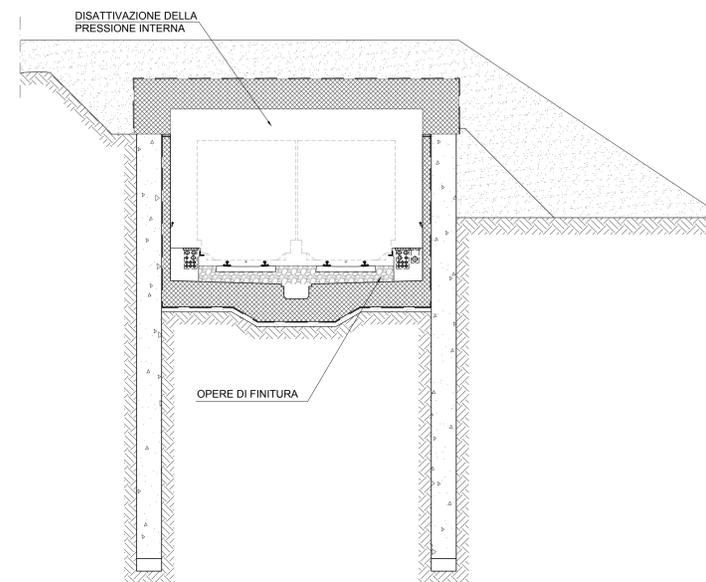

- NOTE**
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI SI FACCIÀ RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO ELABORATO (IF1M.0.0.E.ZZ.TT.GA.00.0.0.001)
 - PER LE INCIDENZE DI ARMATURA DELLE STRUTTURE SI FACCIÀ RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO ELABORATO (IF1M.0.0.E.ZZ.TT.GA.00.0.0.001)
 - LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI SALVO DOVE ESPLICITAMENTE INDICATO
 - PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO SONO STATE CONSIDERATE LE SEGUENTI TOLLERANZE DI ESECUZIONE:
 - POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO DEI CORDOLI GUIDA +/- 20mm
 - VERTICALITÀ DIAFRAMMA (GENERICI) 0.5%
 - LE PROGRESSIVE INDICATE SONO RELATIVE AL BINARIO PARI DELLA LINEA CASSINO

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **salini impregilo** **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **SYSTFA** **SOTECNI** **ROCK SOL**

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO

GA - GALLERIE

GA01 - GALLERIA CASALNUOVO DA KM 0+550,00 A KM 2+860,21

SEZIONE TIPO B DA KM 0+730,00 A KM 1+026,75

FASAGGIO SPECIFICO SEZIONE B_01

| | |
|-------------------------------------|---|
| APPALTATORE | PROGETTAZIONE |
| DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CINECCHI |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|--------|
| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. | SCALA: |
| IF1M | 00 | E | ZZA | GA01 | B0 | 006 | B | 1:100 |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|------|--------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-------------|------|
| A | EMMISSIONE PER REV | BERTINELLI | 10/09/18 | NARDONE | 11/09/18 | BELLOCCHIO | 11/09/18 | CASANOVA | |
| B | EMMISSIONE PER REV | BERTINELLI | 02/10/18 | NARDONE | 03/10/18 | BELLOCCHIO | 03/10/18 | | |

File: IF1M.0.0.E.ZZ.AA.GA.01.B.0.006-B.DWG
