



ArcelorMittal

31 10/1/19

Dir. 67/19

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
*DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it*

Spett.le  
Osservatorio permanente per il monitoraggio  
dell'attuazione del Piano ambientale ILVA  
c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
*DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it*

Spett.le  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale – IPPC  
c.a. Dott. Antonio Fardelli  
Avv. David Roettgen  
*cippc@pec.minambiente.it*

Spett.le  
Istituto Superiore per la Protezione e la  
Ricerca Ambientale  
Via V. Brancati, 48  
00144 ROMA  
*protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

**Oggetto:** Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A.) – Trasmissione documentazione

In relazione a quanto prescritto dal DPCM 29/09/2017 si trasmette la seguente documentazione.

**Allegato 1 (prescrizione UA10 del DPCM 14/03/2014- Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA) : cronoprogramma degli interventi**

ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte  
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
[arcelormittalitalia@legalmail.it](mailto:arcelormittalitalia@legalmail.it)  
[www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com)

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc. e Part. Iva 10354890963



# ArcelorMittal

**Allegato 2 (prescrizione UA11 del DPCM 14/03/2014 scarichi parziali industriale):**  
cronoprogramma relativo al trattamento dei reflui di cokeria

**Allegato 3 (prescrizione UA11 del DPCM 14/03/2014 scarichi parziali industriale):**  
cronoprogramma relativo al trattamento dei reflui di altoforno

Distinti saluti

ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Direttore Ambiente  
*Ing. Alessandro Labile*

**ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte  
della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
arcelormittalitalia@legalmail.it  
www.arcelormittal.com

Cap. soc. €401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	RDA/ORD	% completamento	2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021						
							Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4
1	<b>Raccolta e trattamento acque Meteoriche e di Processo Area IRF-PCA-SEA</b>	1950 g?	gio 09/01/14	mer 30/06/21		62%																												
2	✓ Elaborazione specifica per progettazione opere edili	37 g	gio 09/01/14	ven 28/02/14		100%																												
3	✓ Emissione rda per progettazione opere edili	5 g	lun 03/03/14	ven 07/03/14	9333 del 07/03/14	100%																												
4	✓ Emissione ordine	27 g	lun 10/03/14	mar 15/04/14	12641 del 15/04/14	100%																												
5	✓ Progettazione opere edili	150 g	mer 16/04/14	mar 11/11/14		100%																												
6	✓ Realizzazione vasca V4 per la raccolta delle acque di raffreddamento e meteoriche zona paiole e cassonetti	56 g	lun 02/02/15	lun 20/04/15		100%																												
7	✓ Elaborazione specifica per realizzazione delle strutture di contenimento e raccolta acque di bagnatura zona paiole e cassonetti scoria	42 g	mer 12/11/14	gio 08/01/15		100%																												
8	✓ Emissione rda per realizzazione opere civili di cui al punto 7	11 g	sab 10/01/15	lun 26/01/15	1400 del 26/01/15	100%																												
9	✓ Emissione ordine	3 g	mer 28/01/15	ven 30/01/15	1271 del 30/01/15	100%																												
10	✓ Emissione ordine responsabile lavori e coord. sicurezza cantiere	20 g	mer 14/01/15	mar 10/02/15	1658 del 10/02/15	100%																												
11	☒ Coordinamento sicurezza cantiere	1431 g?	mer 11/02/15	mer 30/06/21		57%																												
12	✓ Realizzazione opere edili di cui al punto 7	275 g	lun 02/02/15	sab 20/02/16		100%																												
13	✓ Regolarizzazione pavimentazione area 1B e I5	35 g	lun 16/03/15	ven 01/05/15		100%																												
14	✓ Posa manto di protezione area 1B e I5	20 g	lun 24/08/15	ven 18/09/15		100%																												
15	✓ Realizzazione opere edili e vasca V3	35 g	lun 06/07/15	ven 21/08/15		100%																												
16	✓ Regolarizzazione e pavimentazione area I6	96 g	lun 13/03/17	lun 24/07/17		100%																												
17	✓ Regolarizzazione e pavimentazione area I7	407 g	lun 07/09/15	mar 28/03/17		100%																												
18	✓ Realizzazione opere edili e vasca V2	35 g	lun 07/11/16	ven 23/12/16		100%																												
19	☒ Regolarizzazione e pavimentazione area 2B	714 g?	mer 26/11/14	mer 15/05/19		95%																												
20	✓ Ripristino e completamento area I9	28 g	lun 13/10/14	mer 19/11/14		100%																												
21	✓ Regolarizzazione e pavimentazione prima parte area I8	83 g	lun 20/03/17	mer 12/07/17		100%																												
22	☒ Emissione Ordine per attività supplementari finalizzate alla rimozione del cumulo di scoria.	71 g?	lun 07/01/19	lun 15/04/19		15%																												
23	Preparazione Cantiere e sistemazione macchine	70 g?	mar 16/04/19	lun 22/07/19		0%																												
24	☒ Rimozione Scoria e deferrizzazione	365 g?	mar 23/07/19	lun 14/12/20		0%																												
25	☒ Regolarizzazione e pavimentazione area 2A e 3B	309 g?	mar 25/07/17	lun 22/07/19		74%																												
26	☒ Regolarizzazione e pavimentazione area I4	45 g?	lun 25/05/20	ven 24/07/20		0%																												
27	☒ Completamento regolarizzazione e pavimentazione area I8	161 g?	ven 16/02/18	gio 18/07/19		50%																												
28	Regolarizzazione e pavimentazione prima parte area I3	30 g?	lun 27/07/20	ven 04/09/20		0%																												
29	Regolarizzazione e pavimentazione prima parte area I2	30 g?	lun 07/09/20	ven 16/10/20		0%																												
30	Regolarizzazione e pavimentazione prima parte area I1	30 g?	lun 19/10/20	ven 27/11/20		0%																												
31	Completamento regolarizzazione e pavimentazione area I3	30 g?	lun 30/11/20	ven 08/01/21		0%																												
32	Completamento regolarizzazione e pavimentazione area I2	30 g?	lun 11/01/21	ven 19/02/21		0%																												
33	Completamento regolarizzazione e pavimentazione area I1	30 g?	lun 22/02/21	ven 02/04/21		0%																												
34	☒ Realizzazione vasca V1	30 g?	lun 05/04/21	ven 14/05/21		0%																												


Progetto: AIA IRF-PCA-SEA del 2  
Data: gio 31/01/19

Attività Avanzamento Riepilogo Attività esterne Scadenza 
  
 Divisione Cardine Riepilogo progetto Cardine esterno


ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	RDA/ORD	% completamento	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021					
							Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4
35	Elaborazione specifica tecnica per progettazione impianto idrico ed elettrico	96 g	lun 03/02/14	lun 16/06/14		100%																				
36	Emissione rda per realizzazione impianto idrico ed elettrico	20 g	mar 01/07/14	lun 28/07/14	30123 del 28/07/14	100%																				
37	Emissione ordine per la realizzazione impianto idrico ed elettrico	234 g	mar 29/07/14	ven 19/06/15	9622 del 24/06/15	100%																				
38	Realizzazione impianto idrico (posa in opera condotte e via cavi interrati per sollevamento acque da vasche V1,V2,V3,V4), Installazione impianto idrico, parte della rete di distribuzione (serbatoi, tubazioni, pompe, valvole, ..... ) ed impianto elettrico	1172 g?	lun 20/07/15	mer 31/03/21		64%																				
39	Fornitura e montaggio sistema di pompaggio e gestione acque dalle vasche all'impianto di depurazione	1022 g?	mar 01/03/16	ven 02/04/21	rda 7678 del 23/03/16	57%																				
40	Realizzazione progetto IRF-PCA-SEA per Conferenza dei Servizi	163 g	ven 06/03/15	mar 20/10/15	ord 7489 del 11/05/15	100%																				
41	Revisione progetto definitivo	179 g	mer 19/10/16	lun 26/06/17	rda 14978 del 19/10/16	100%																				
42	Progettazione esecutiva e direzione lavori per impianto di raccolta e trattamento acque area IRF-PCA-SEA	717 g	gio 30/01/14	dom 30/10/16	ord 7347 del 27/02/14	100%																				
43	Revisione progetto esecutivo	691 g?	lun 21/11/16	lun 15/07/19	rda 24596 del	82%																				
44	Responsabile lavori e coordinatore sicurezza cantiere per la parte relativa a PCA-SEA	629 g?	ven 01/02/19	mer 30/06/21	rda 40498 del 17/12/14	0%																				
45	Emissione ordine per la fornitura di n°2 sedimentatori	1325 g?	gio 20/02/14	mer 20/03/19	rda 9680 del 19/02/14	97%																				
46	Fornitura di n°2 sedimentatori	520 g?	gio 21/03/19	mer 17/03/21		0%																				
47	Emissione ordine per realizzazione impianto di trattamento acque, impianto di bagnatura, piping di collegamento vasche acque meteoriche e di bagnatura con relativi sistemi di pompaggio ed impianto elettrico	960 g?	gio 01/10/15	mer 05/06/19	rda 9372/14 rda 1769/14 rda 2368/15	90%																				
48	Realizzazione impianto di trattamento acque, impianto di trattamento acque, impianto di bagnatura, piping di collegamento vasche acque meteoriche e di bagnatura con relativi sistemi di pompaggio ed impianto elettrico	452 g?	gio 06/06/19	ven 26/02/21		0%																				
49	Emissione RDA per le opere edili necessarie	8 g	lun 03/12/18	mer 12/12/18	rda 34725/18	100%																				
50	Emissione ordine per opere edili necessarie	122 g?	gio 13/12/18	ven 31/05/19		29%																				
51	Realizzazione Opere edili necessarie per la realizzazione dell'impianto di raccolta e trattamento acque (fogne e canalette, cordoli, dossi, pavimentazioni, vasche, invasi, bacino di laminazione e fondazioni del depuratore )	478 g?	lun 03/06/19	mer 31/03/21		0%																				
52	Emissione RDA per fornitura e posa in opera di asfalti PCA-SEA	20 g?	mar 16/07/19	lun 12/08/19		0%																				
53	Emissione Ordine per fornitura e posa in opera di asfalti PCA-SEA	30 g?	mar 13/08/19	lun 23/09/19		0%																				
54	Fornitura e posa in opera di asfalti PCA-SEA	299 g?	mar 24/09/19	ven 13/11/20		0%																				
55	Collaudo rete di raccolta acque meteoriche e impianto di depurazione	40 g?	gio 01/04/21	mer 26/05/21	ord 13529 del 29/04/14	0%																				

Progetto: AIA IRF-PCA-SEA del 2  
Data: gio 31/01/19

Attività  Avanzamento  Riepilogo  Attività esterne  Scadenza   
 Divisione  Cardine  Riepilogo progetto  Cardine esterno 

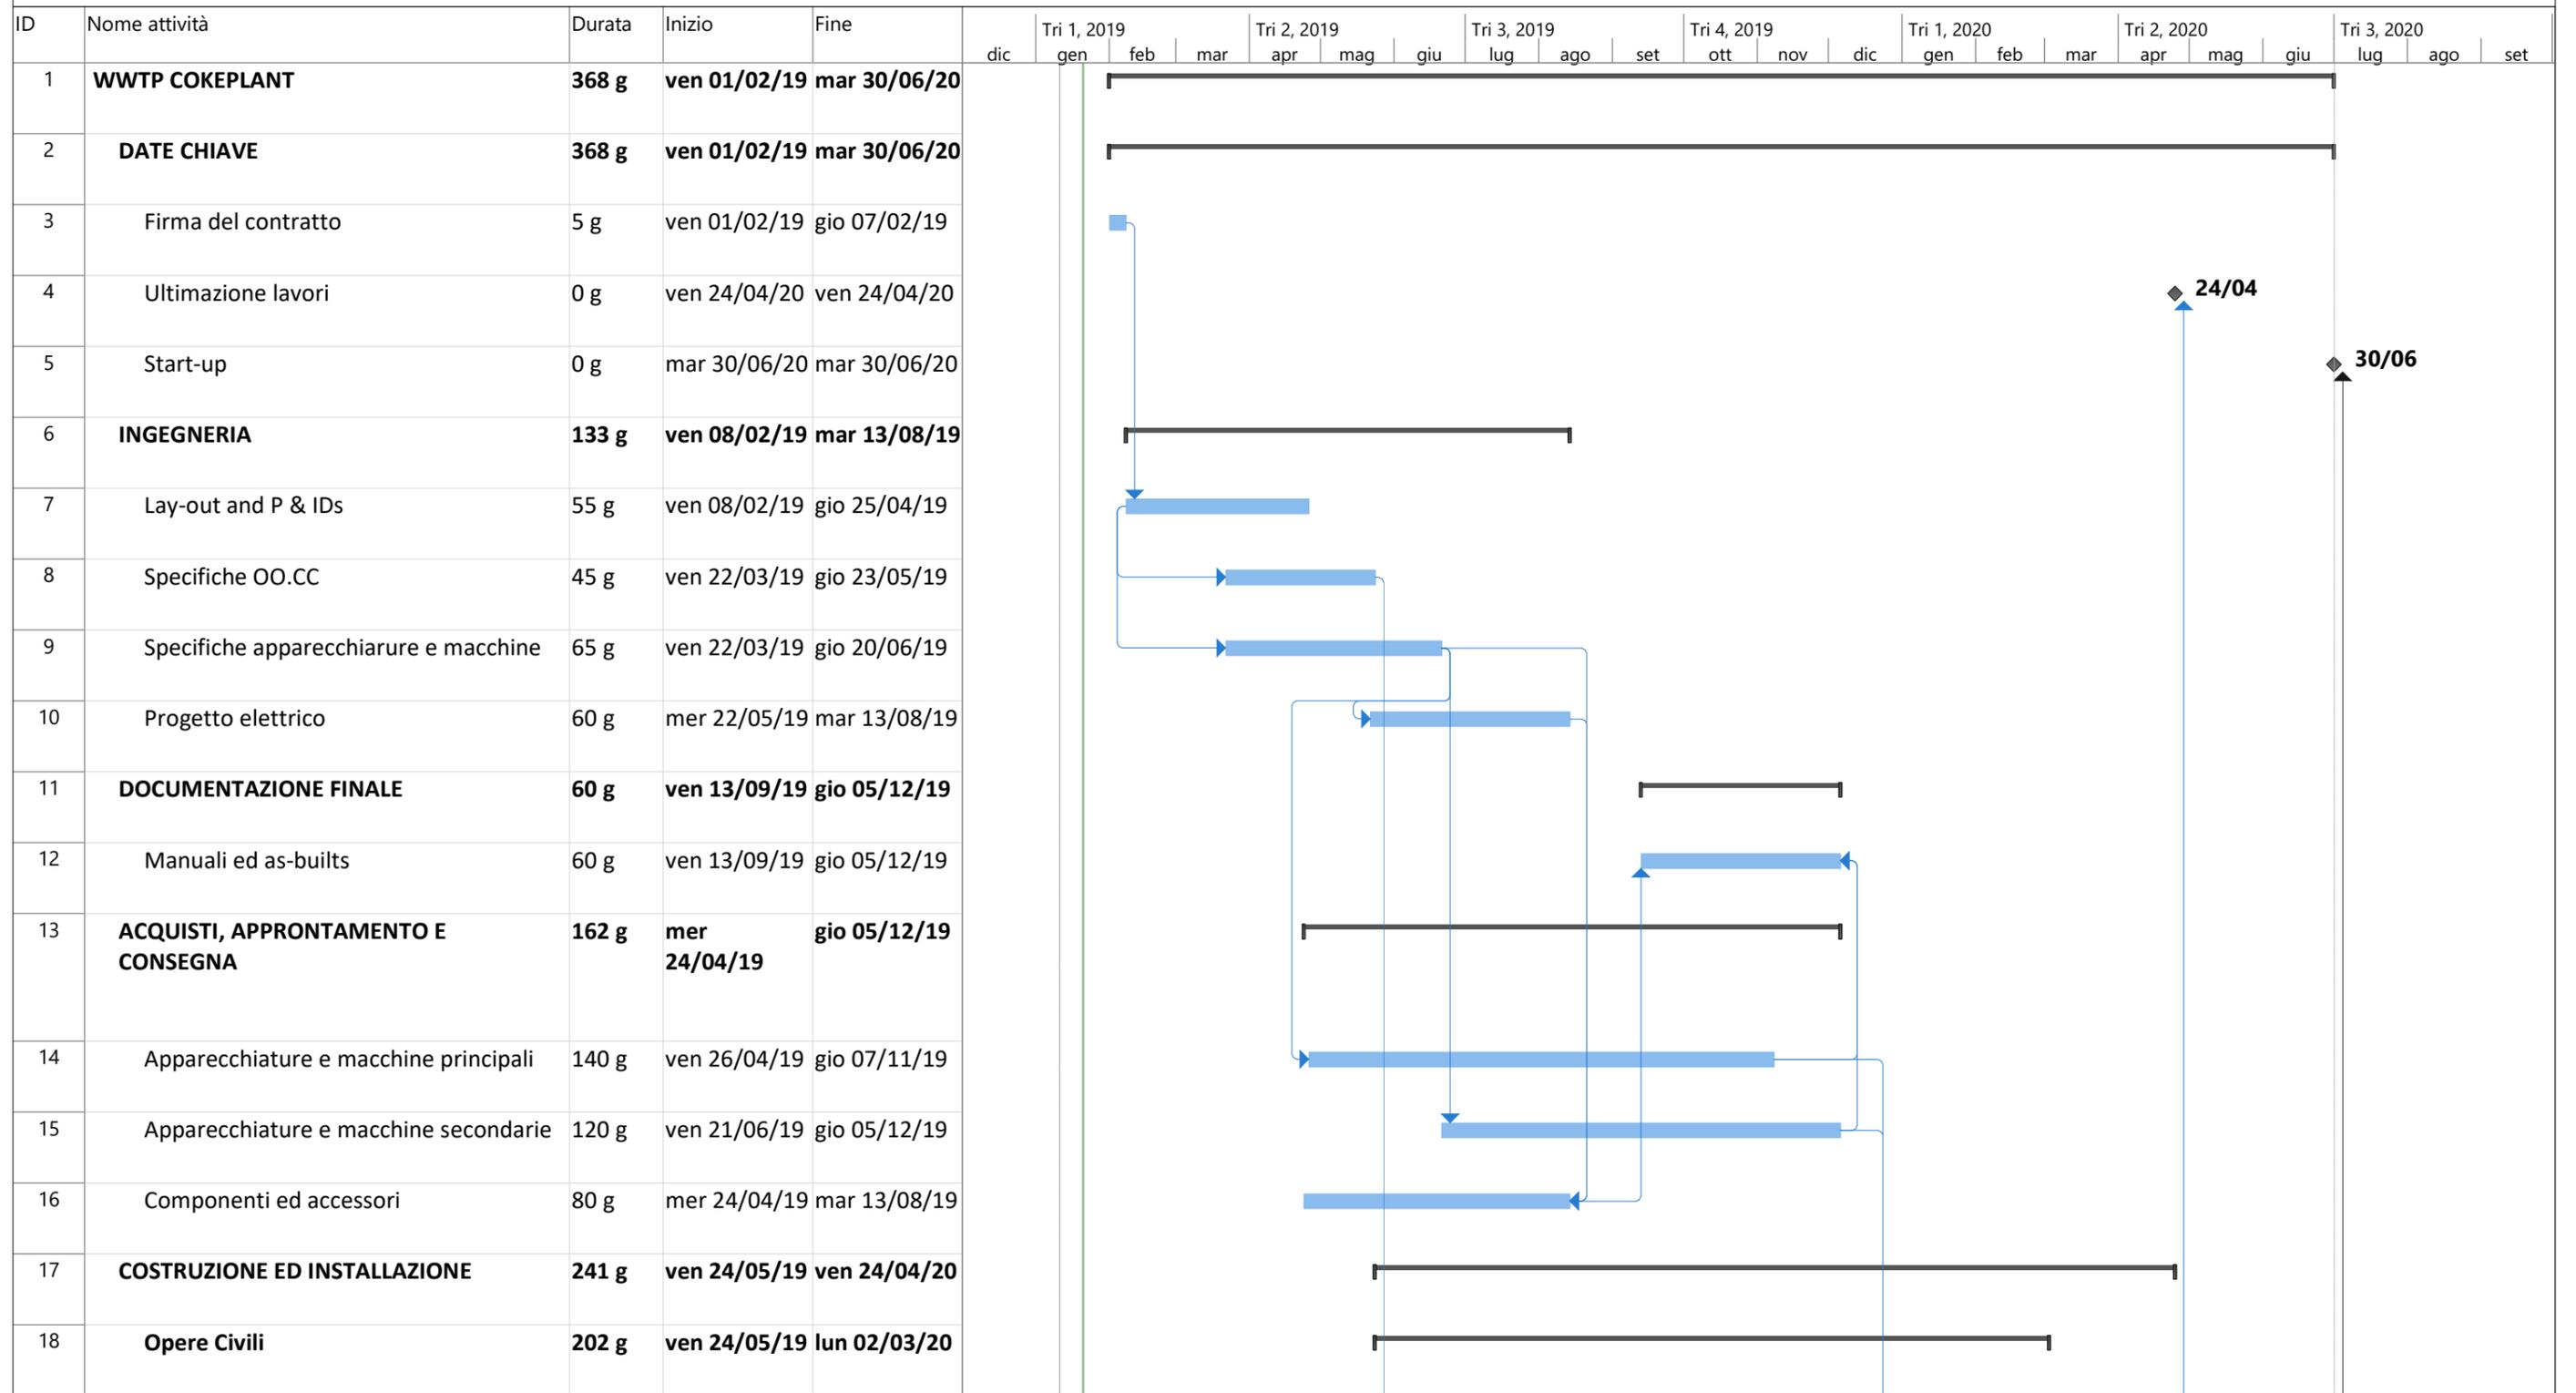

Progetto: WWTP COKEPLANT Data: lun 21/01/19	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			

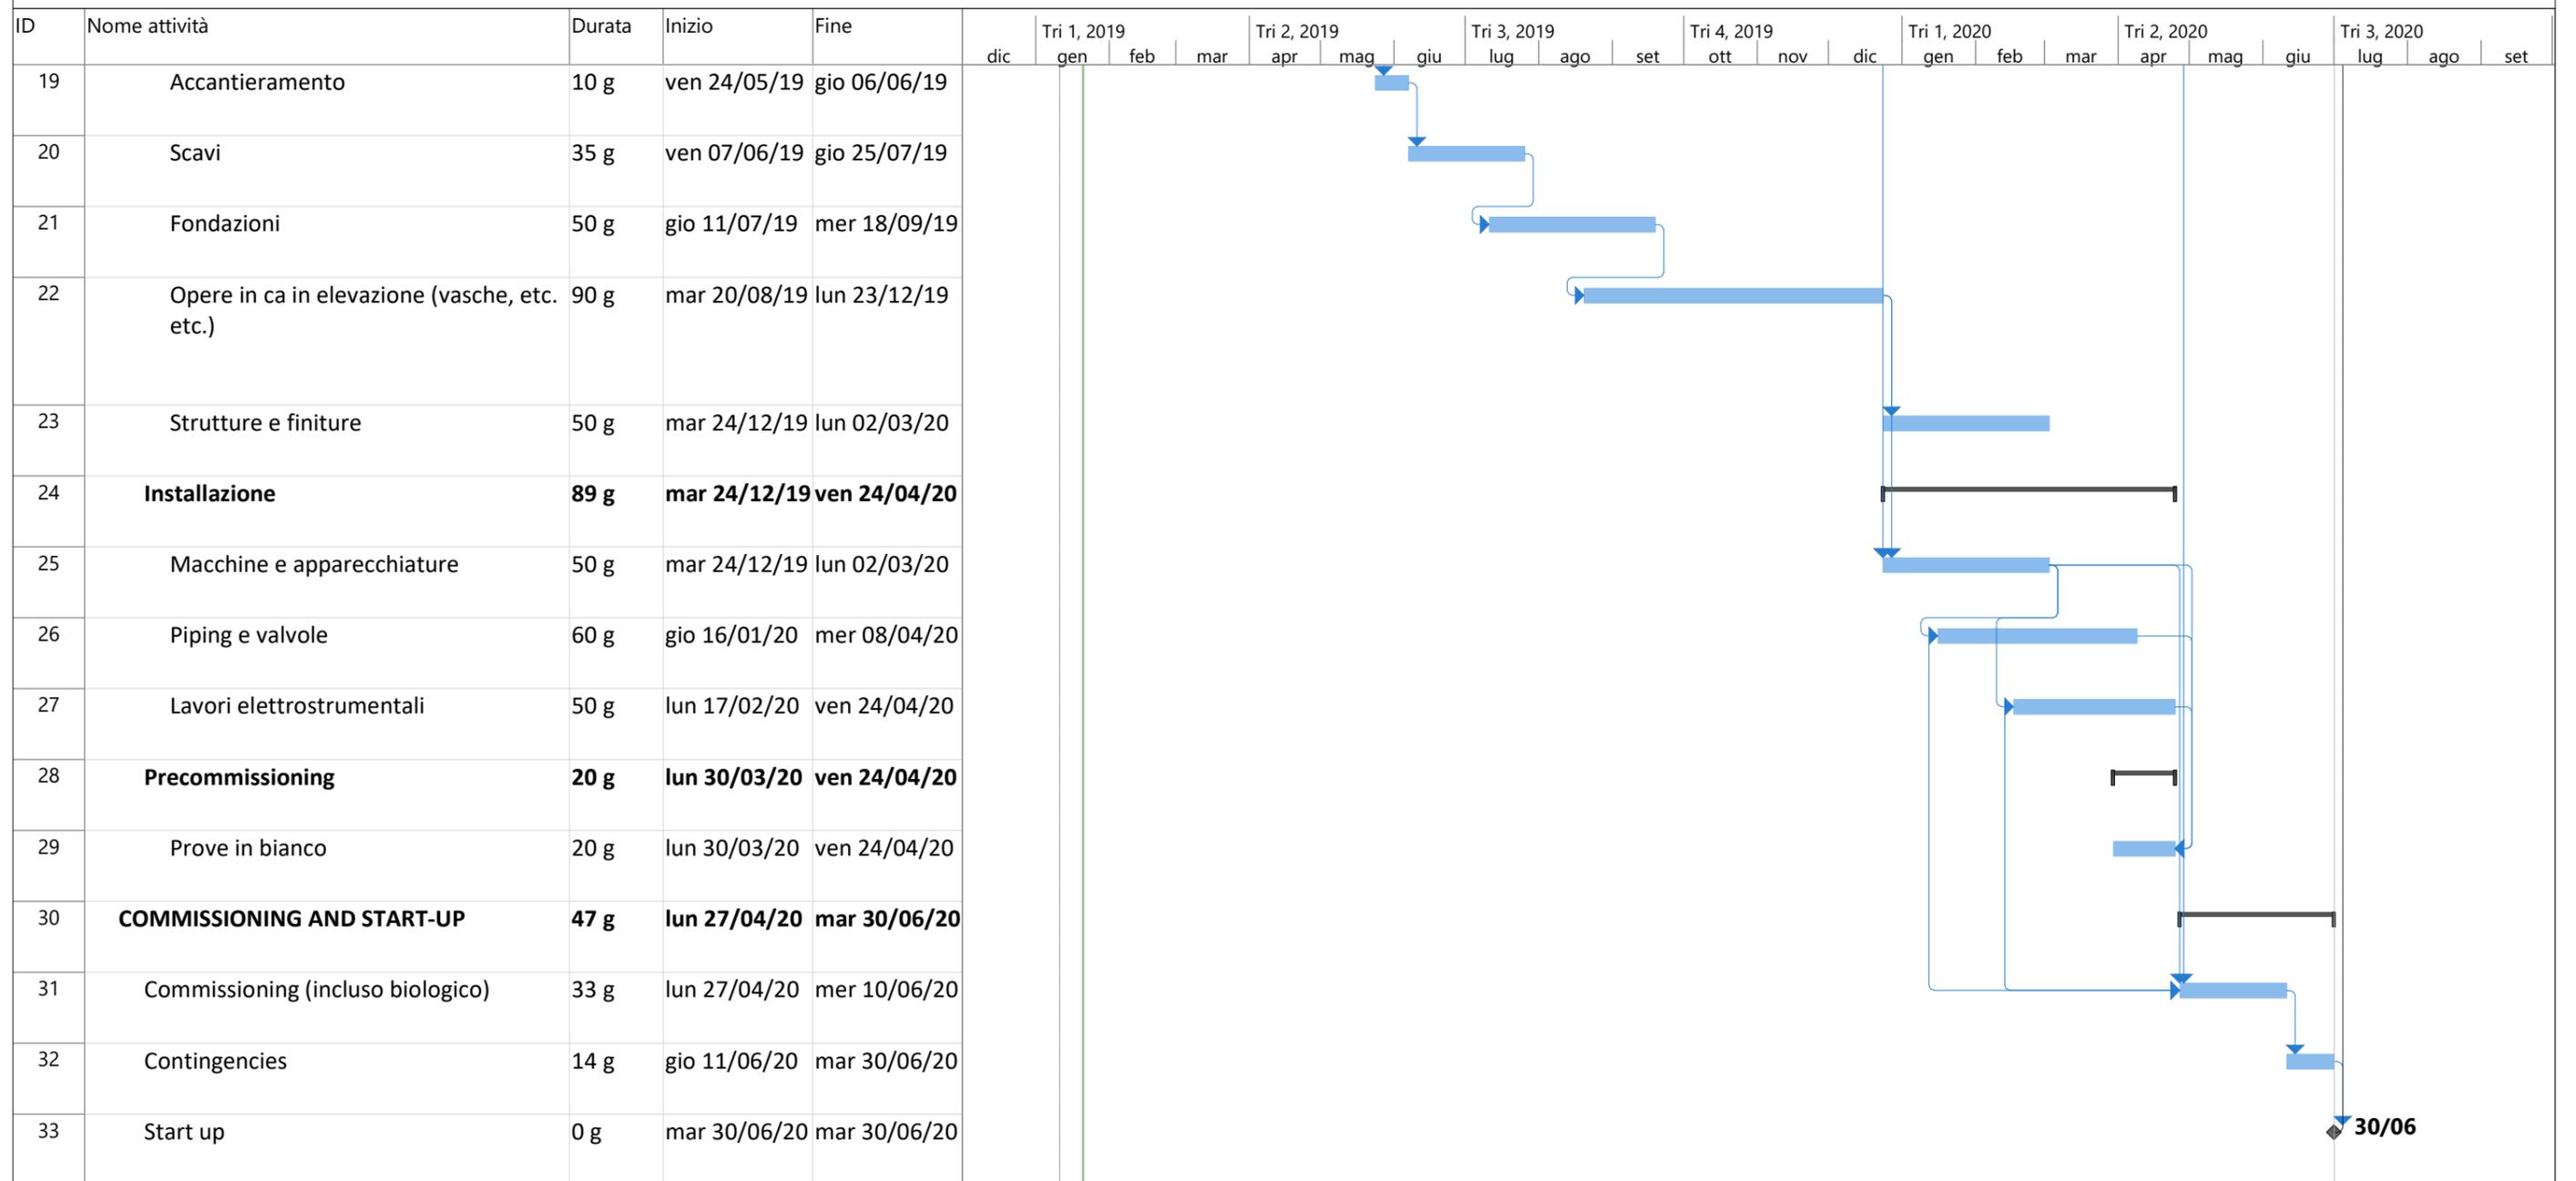

Progetto: WWTP COKEPLANT Data: lun 21/01/19	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			

# P50E4 A/701



## TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO: ALTIFORNI 1-2-4

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre			4° trimestre			1° trimestre			2° trimestre			3° trimestre		
					gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug		
1	<b>P50E4 A/701 TRATTAMENTO ACQUE INDUSTRIALI: ALTIFORNI</b>	<b>352 g</b>	<b>lun 25/02/19</b>	<b>mar 30/06/20</b>																					
2	<b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO AFO/1-2-4</b>	<b>352 g</b>	<b>lun 25/02/19</b>	<b>mar 30/06/20</b>																					
3	EMISSIONE ORDINE	21 g	lun 25/02/19	lun 25/03/19																					
4	<b>INGEGNERIA</b>	<b>90 g</b>	<b>mar 26/03/19</b>	<b>lun 29/07/19</b>																					
5	INGEGNERIA DEFINITIVA	45 g	mar 26/03/19	lun 27/05/19																					
6	INGEGNERIA ESECUTIVA (COMPRESSE OPERE EDILI)	45 g	mar 28/05/19	lun 29/07/19																					
7	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI	110 g	mar 11/06/19	lun 11/11/19																					
8	DOCUMENTAZIONE PER SCIA	7 g	mar 30/07/19	mer 07/08/19																					
9	PRESENTAZIONE TITOLO ABILITATIVO (SCIA) E AUTORIZZAZIONE	7 g	gio 08/08/19	ven 16/08/19																					
10	ESECUZIONE OPERE EDILI	110 g	lun 19/08/19	ven 17/01/20																					
11	ESECUZIONE LAVORI MECCANICI ED ELETTRICI	80 g	mer 08/01/20	mar 28/04/20																					
12	INTERCONNESSIONE TUBAZIONI AFO/1-2-4	165 g	lun 19/08/19	ven 03/04/20																					
13	INSTALLAZIONE POMPE AFO/1-2-4	22 g	lun 06/04/20	mar 05/05/20																					
14	TEST FUNZIONALI E MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO	20 g	mer 06/05/20	mar 02/06/20																					
15	COLLAUDO	17 g	lun 08/06/20	mar 30/06/20																					
