

- ### FASI ESECUTIVE
- FASE 1: INSTALLAZIONE CAPISALI AL P.C. PER RILIEVO TOPOGRAFICO DEI CEDIMENTI.
 - FASE 2: ESECUZIONE PISTA DI CANTIERE ED AREE PER REALIZZAZIONE MICROPALE.
 - FASE 3: ESECUZIONE PARATA DI MICROPALE.
 - FASE 4: REALIZZAZIONE TRAVE DI TESTATA IN C.A. ED INSTALLAZIONE MIRE OTTICHE.
 - FASE 5: REALIZZAZIONE OPERE DI REGIMAZIONE IDRICA A PROTEZIONE DELLA PARATA (CANALETTA RACCOLTA ACQUE).
 - FASE 6: SBANCAMENTO TERRENO FINO A 0.50m AL DI SOTTO DELLA QUOTA DI REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FILA DI TIRANTI.
 - FASE 7: MESSA IN OPERA DI SPRITZ BETON FIBRORINFORZATO $S_p=15\text{cm}$ ED INSTALLAZIONE MIRE OTTICHE.
 - FASE 8: ESECUZIONE CONSOLIDAMENTO A PRESSIONE E VOLUME CONTROLLATO.
 - FASE 9: ESECUZIONE DEI TIRANTI E POSA IN OPERA DELLA TRAVE DI RIPARTIZIONE.
 - FASE 10: RIPETIZIONE DELLE FASI DAL PUNTO 6 AL PUNTO 9.

NOTE

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO IF1V000075FGN0000002A
- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD

LEGENDA

P.F.= PIANO FERRO
P.S.= PIANO DI SCAVO
Q.C.= QUOTA CORDOLO
Q.P.= QUOTA PROGETTO

COMMITTENTE:
RFI
RAIL INFRASTRUTTURE ITALIANE
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE TECNICA
U.O. GALLERIE**

PROGETTO DEFINITIVO

**ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA BOVINO - ORSARA**

GALLERIA ORSARA - IMBOCCO LATO NAPOLI
Fase provvisoria - Planimetria e profili longitudinali




Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	Emissione Esecutiva	F.Pavli	Set-2018	F.Pavli	Set-2018	D. Arino	Set-2018		
B	Emissione Esecutiva	F.Pavli	Ott-2018	F.Pavli	Ott-2018	D. Arino	Ott-2018		

SCALA: Varie

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IF1V 00 07 LZ 010200 001 B

File: IF1V000075FGN0000018.dwg n. Ediz.: 246

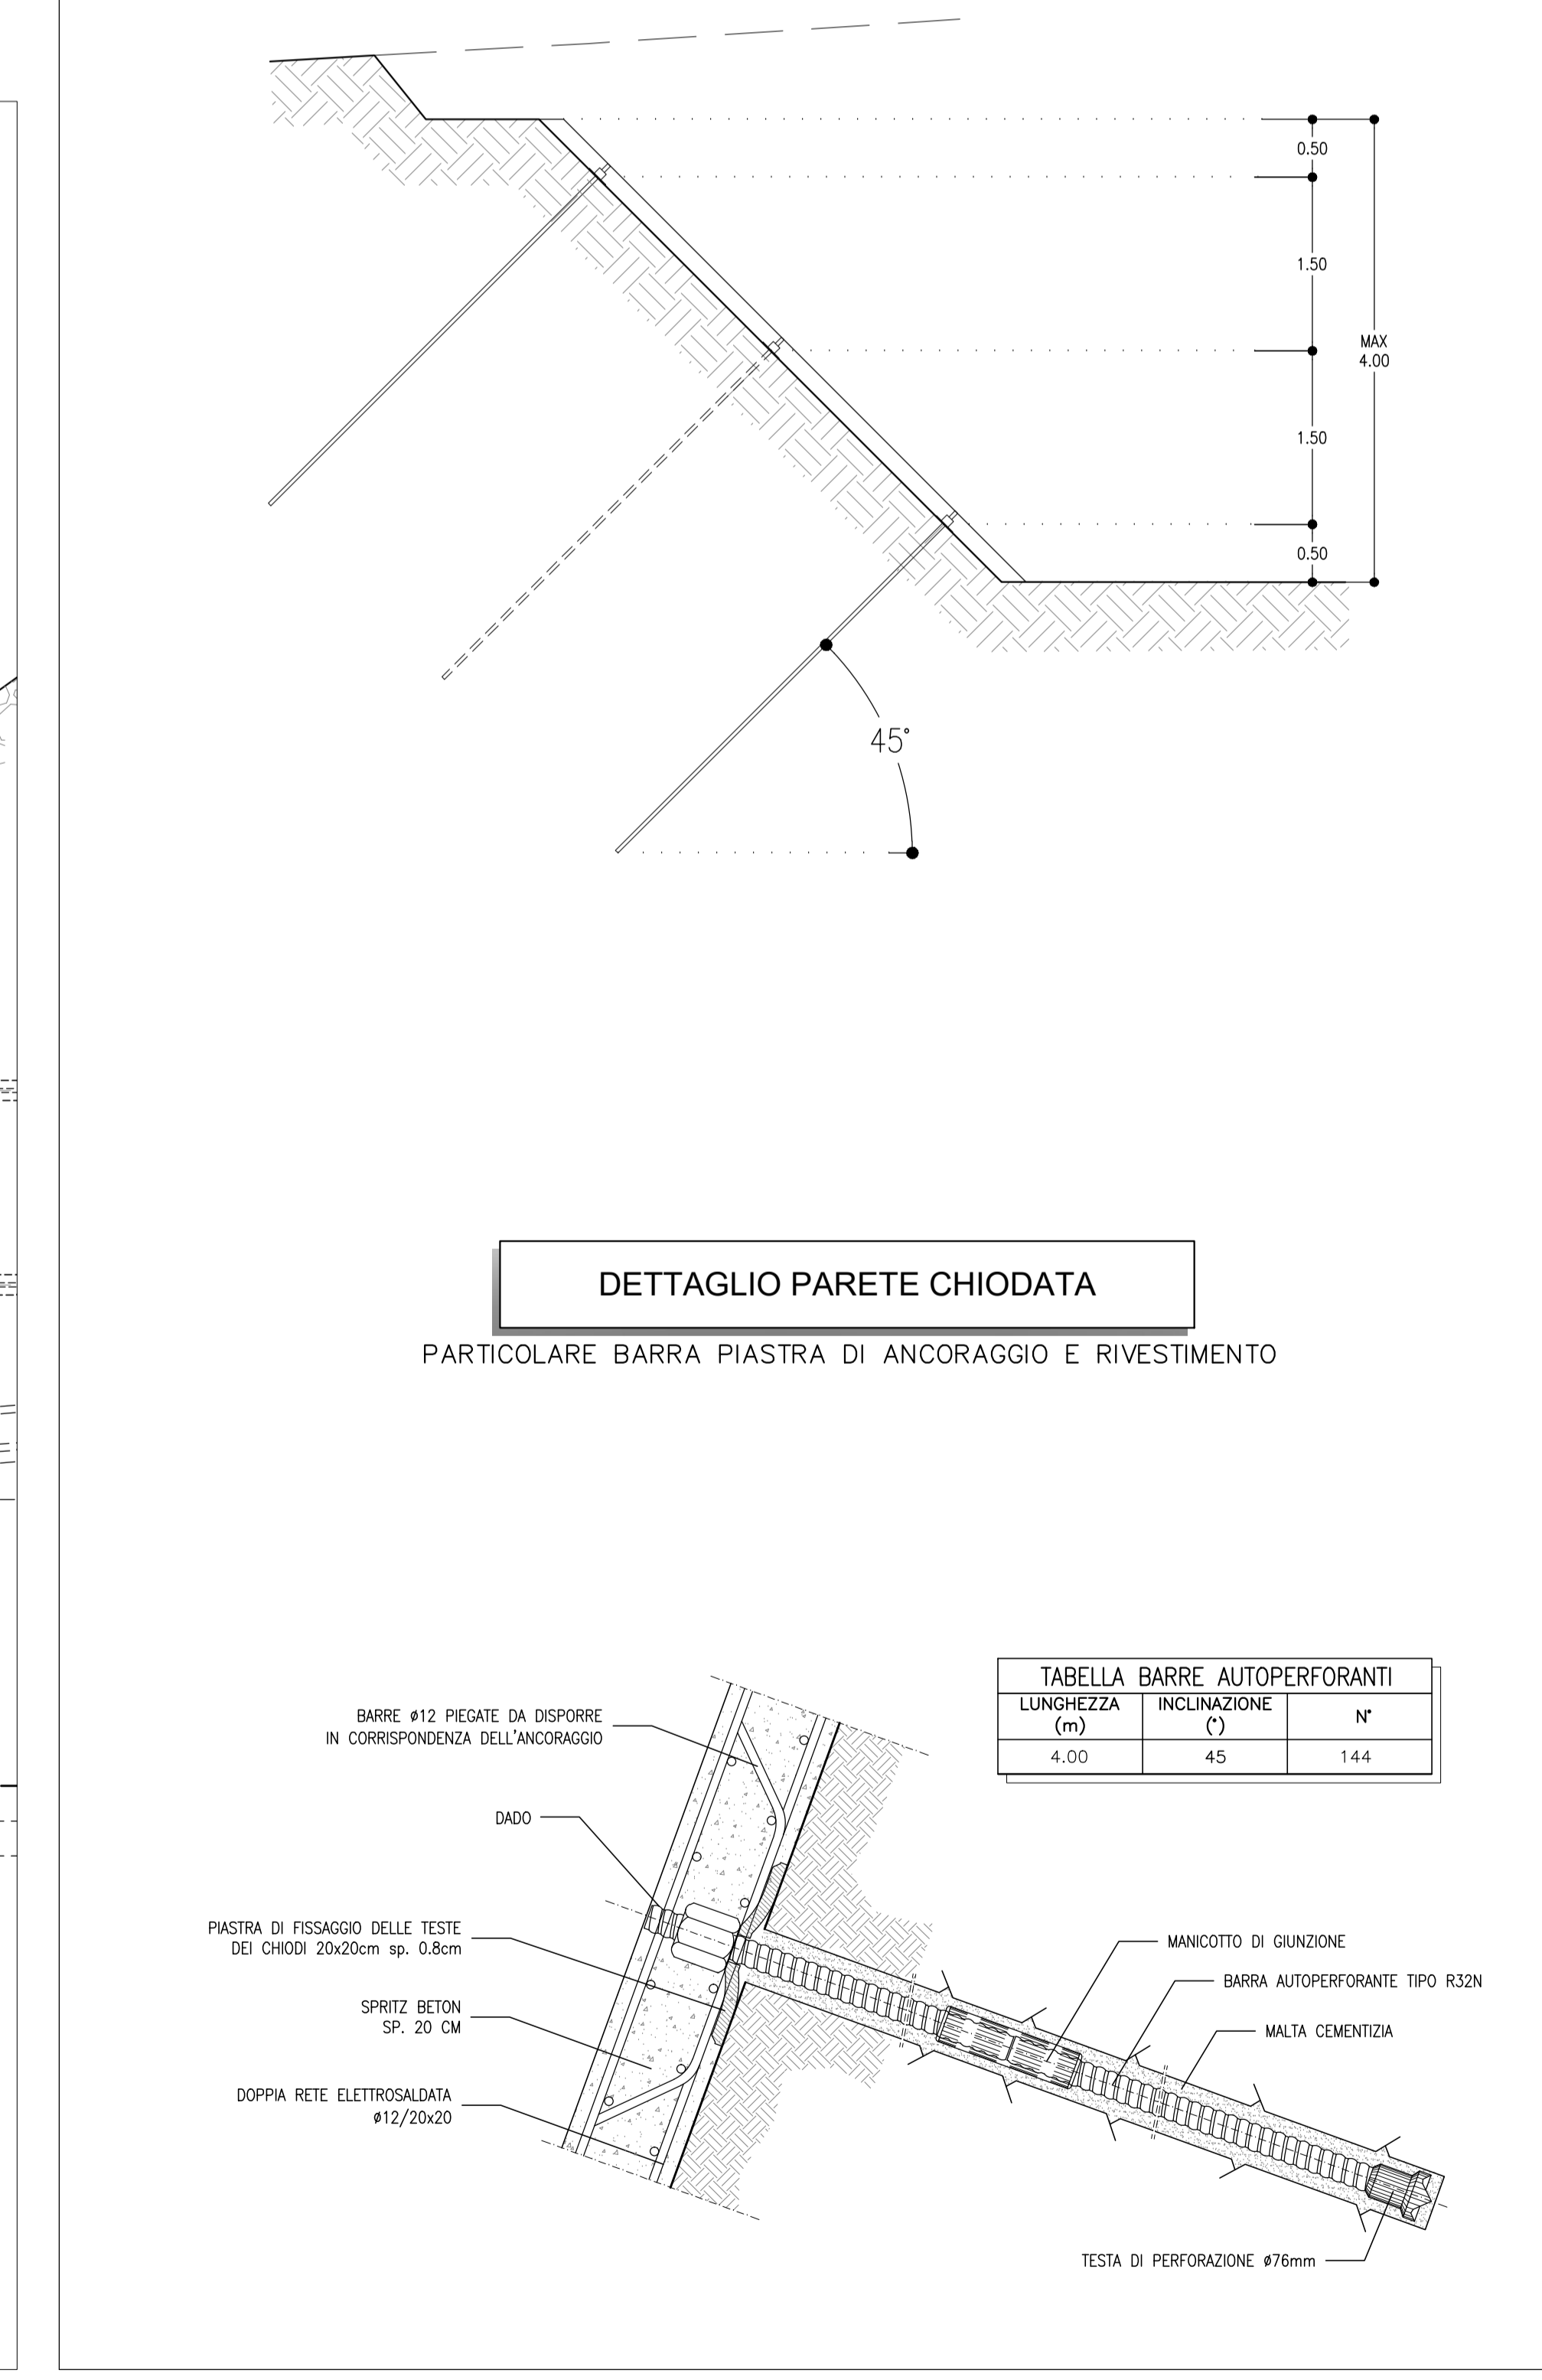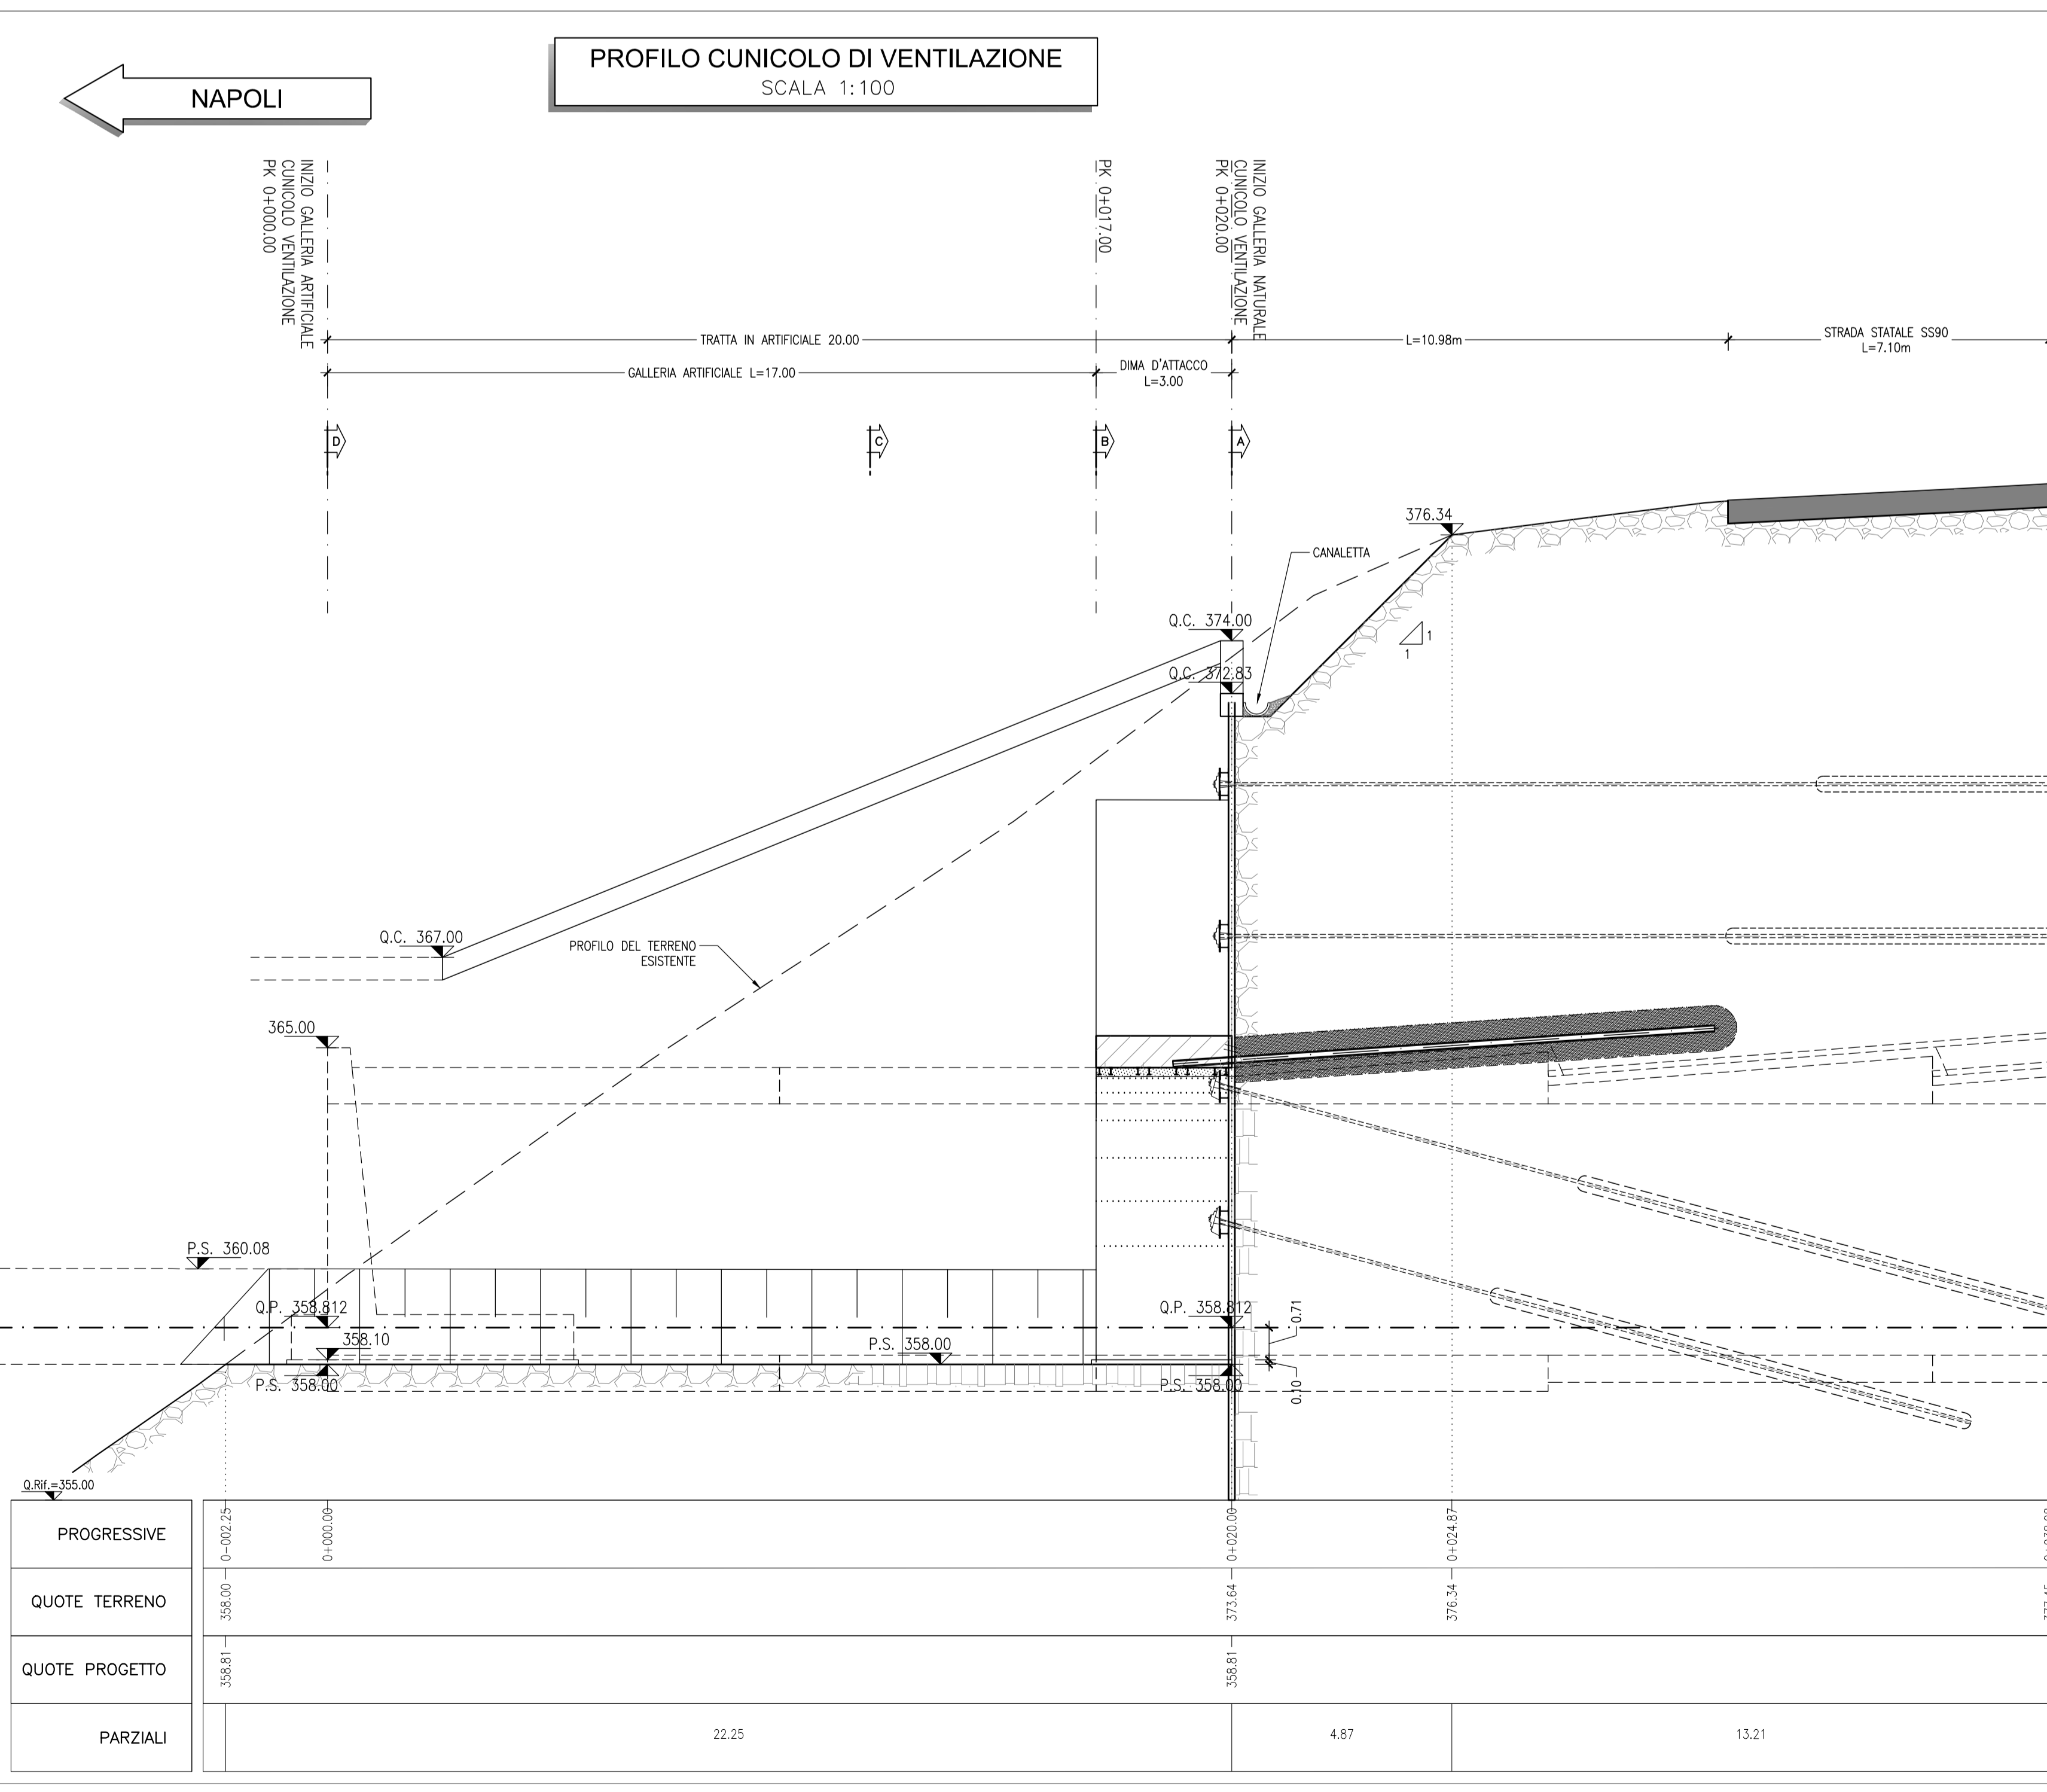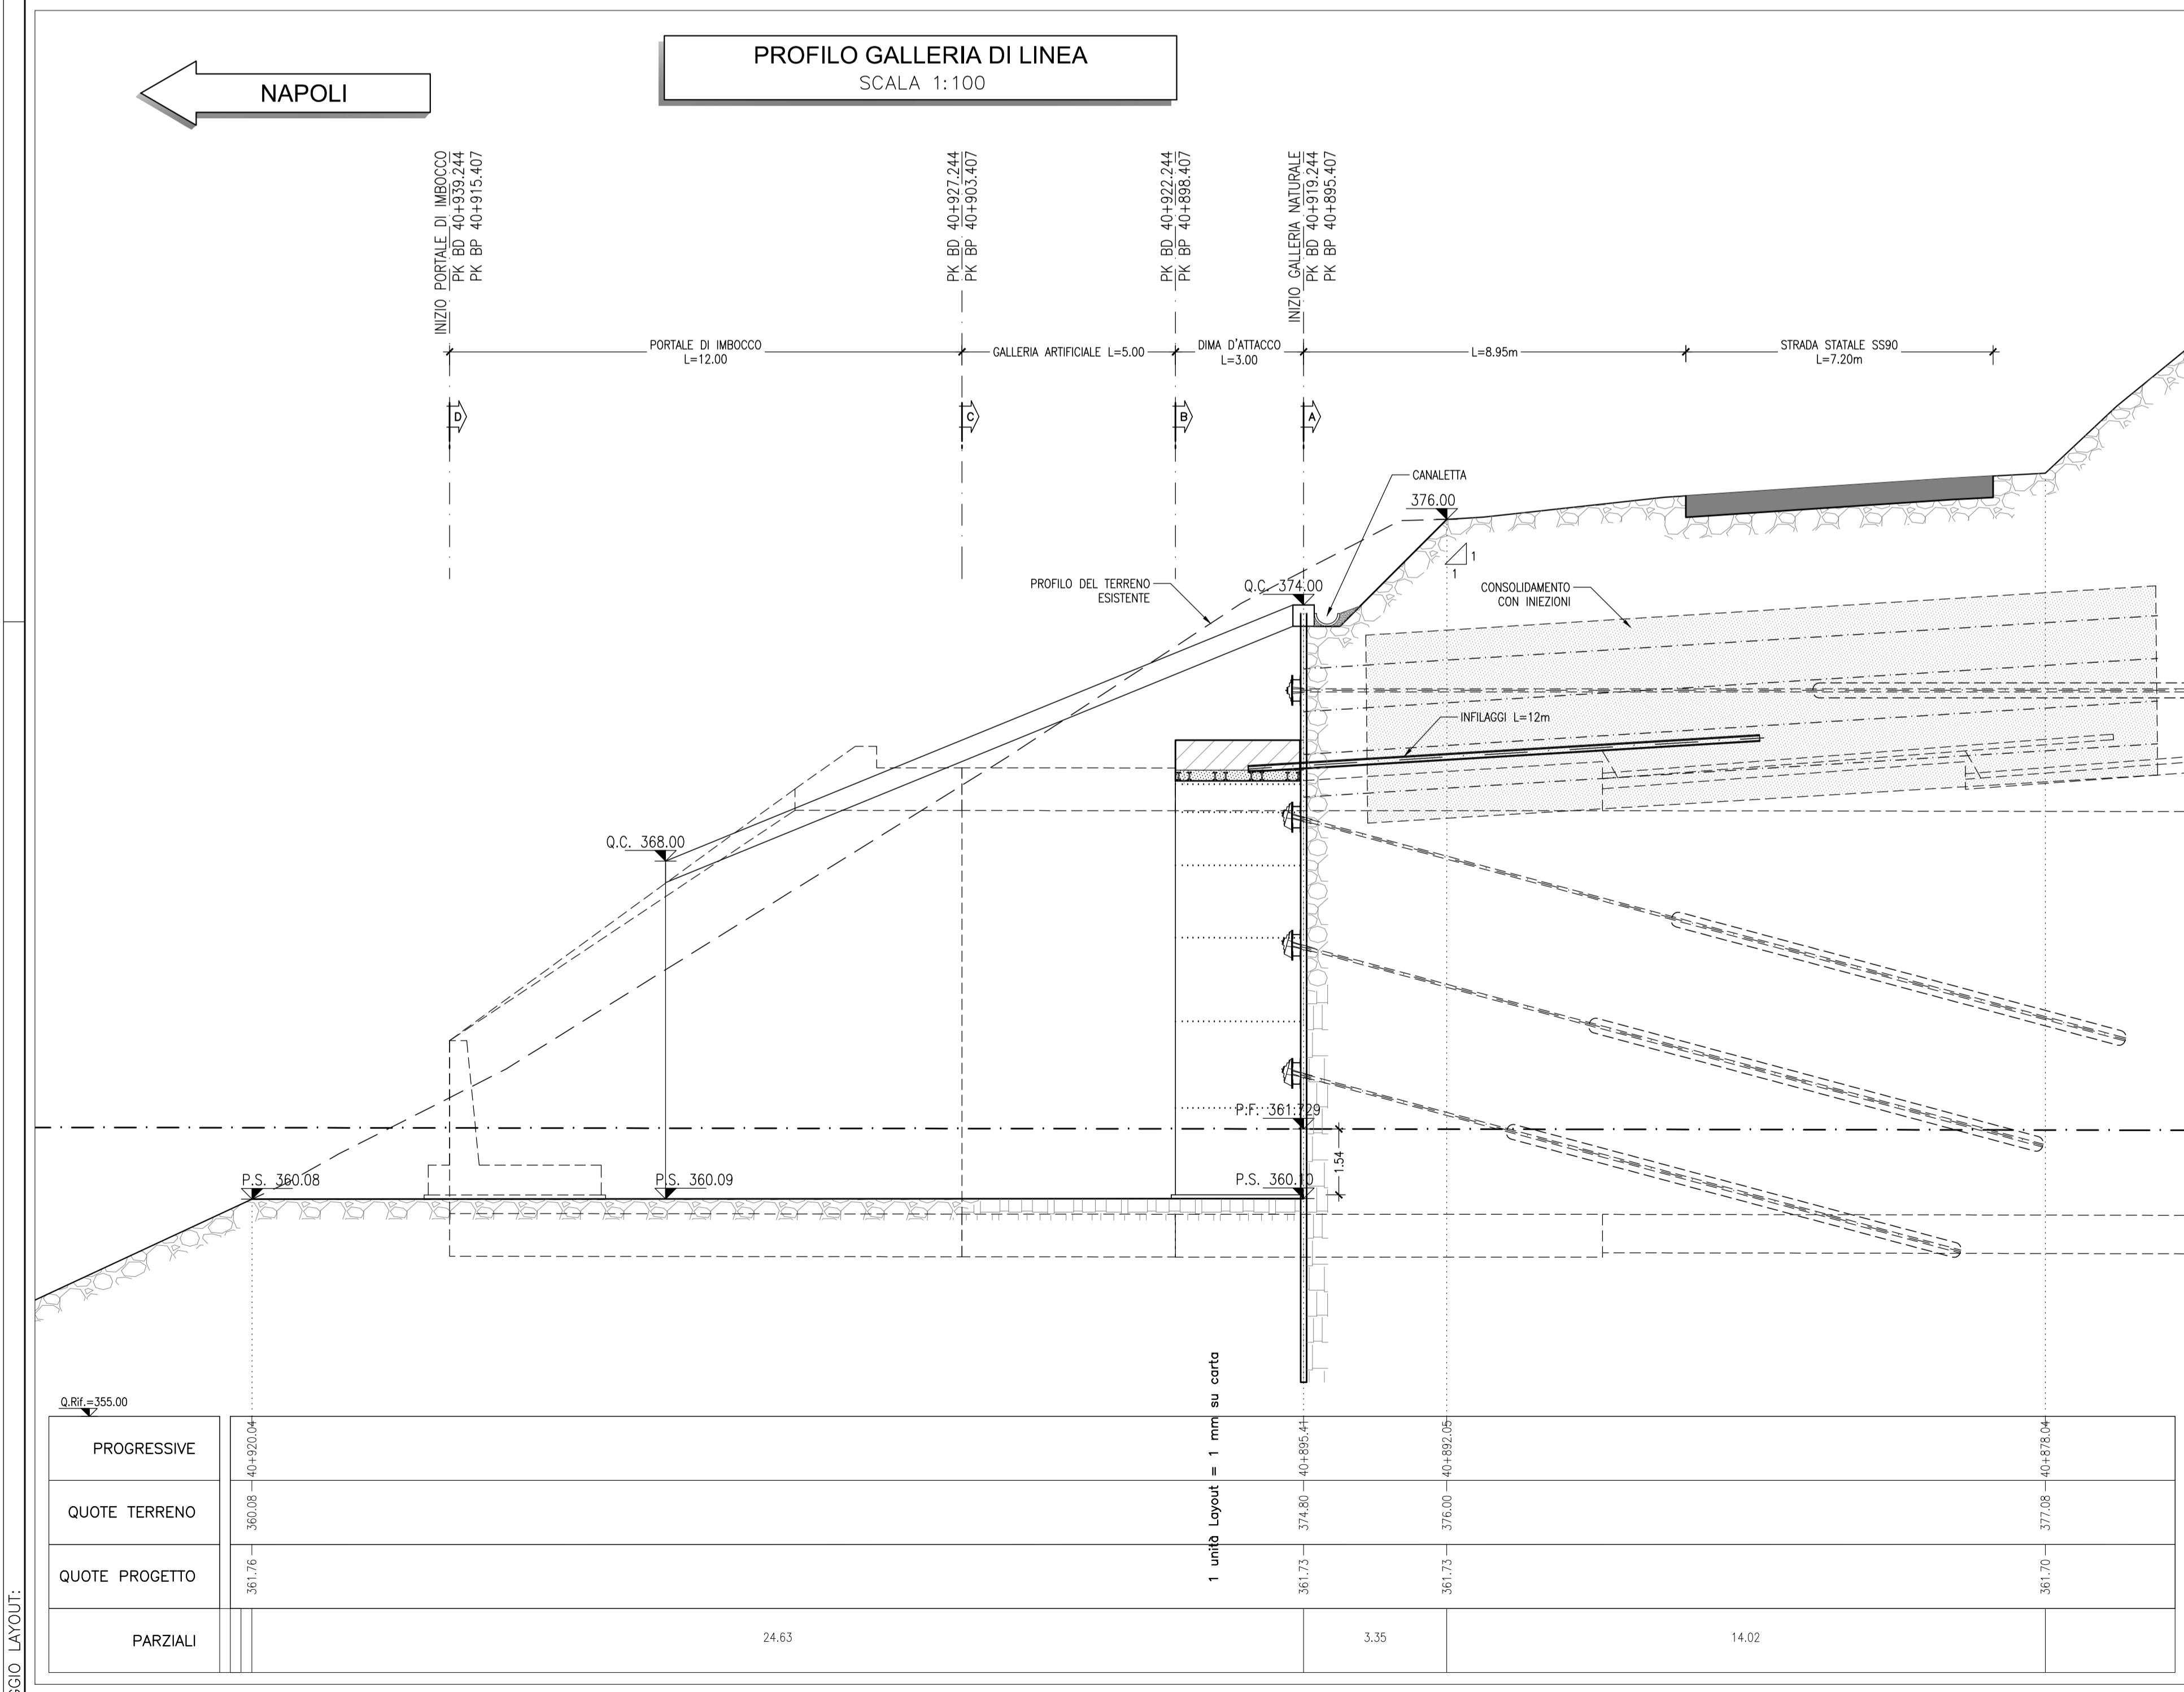

AUTORE: B. P. GOTTARASSO LANDINI
