

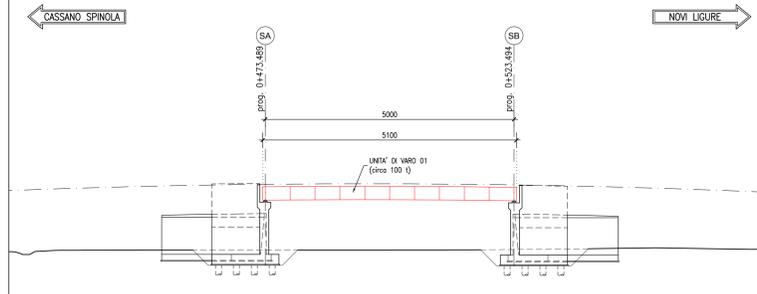
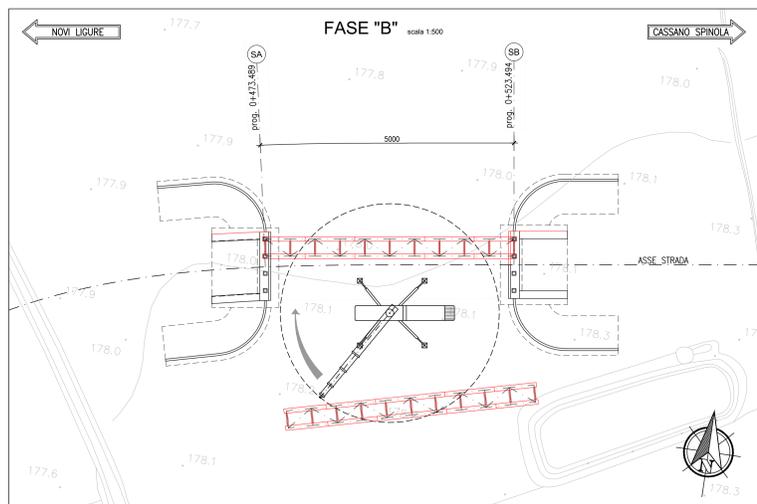




- ESECUZIONE DEGLI SBANCAMENTI E DEGLI SCANI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE SPALLE, FINO ALLA QUOTA PREVISTA A PROGETTO;
- ESECUZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE Ø1200 E DELLE RELATIVE PROVE DI CARICO;
- REALIZZAZIONE MEDIANTE GETTO IN OPERA DELLE STRUTTURE IN C.A. DELLE SPALLE, NONCHÉ DEI MURI DI RACCORDO;
- POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI D'APPOGGIO PER L'IMPALCATO METALLICO.

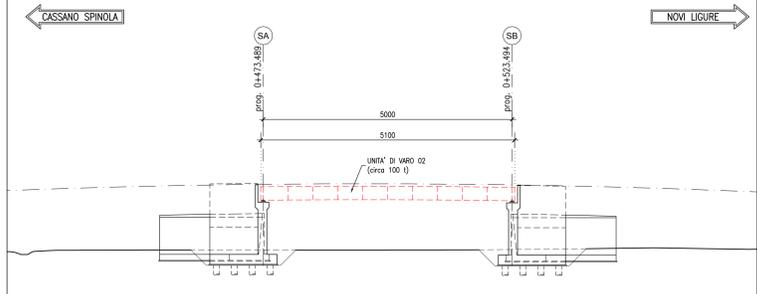



- ACCESSO AL SITO DA PARTE DELL'AUTOGRU DI MONTAGGIO;
- ASSEMBLAGGIO DEL CASSONE RETICOLARE MEDIANTE BULLONATURA DEI CONCI ED ASSEMBLAGGIO DELLE TRAVI METALLICHE A 2 A 2 MEDIANTE CONTROVENTI E DIAFRAMMI;
- SOLLEVAMENTO ED INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DESCRITTI AL PUNTO PRECEDENTE.

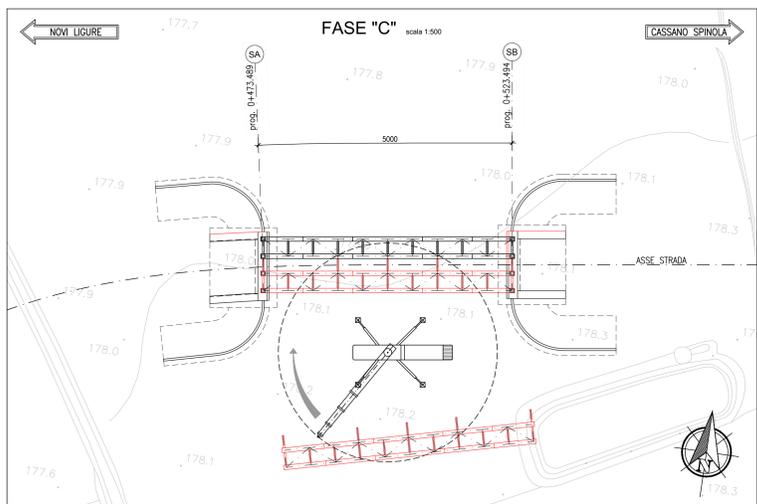



- ASSEMBLAGGIO DEL CASSONE RETICOLARE MEDIANTE BULLONATURA DEI CONCI ED ASSEMBLAGGIO DELLE TRAVI METALLICHE A 2 A 2 MEDIANTE CONTROVENTI E DIAFRAMMI;
- SOLLEVAMENTO ED INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DESCRITTI AL PUNTO PRECEDENTE;
- POSIZIONAMENTO DEI DIAFRAMMI PASSANTI.

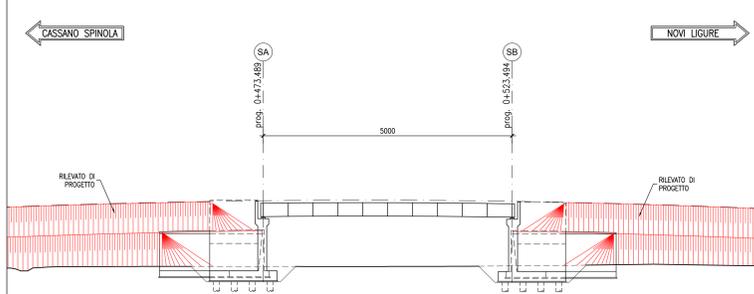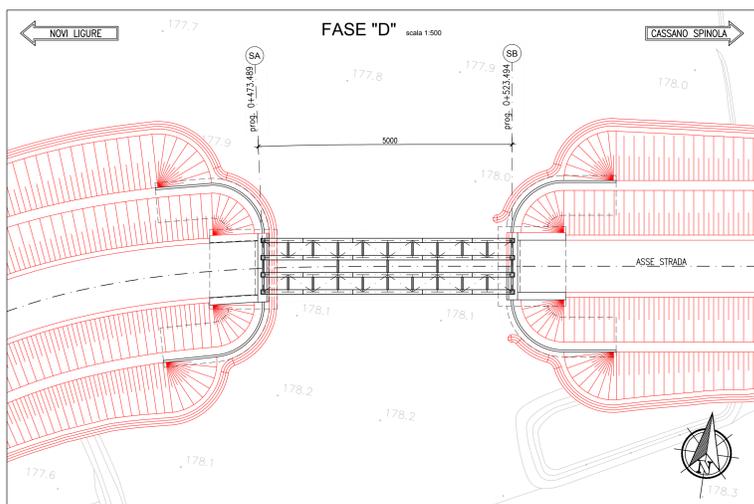

- REALIZZAZIONE DEI RILEVATI E ADEGUATO COMPATTAMENTO A TERGO DELLE SPALLE.

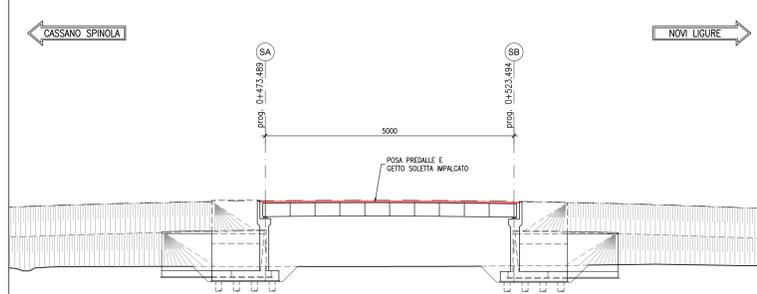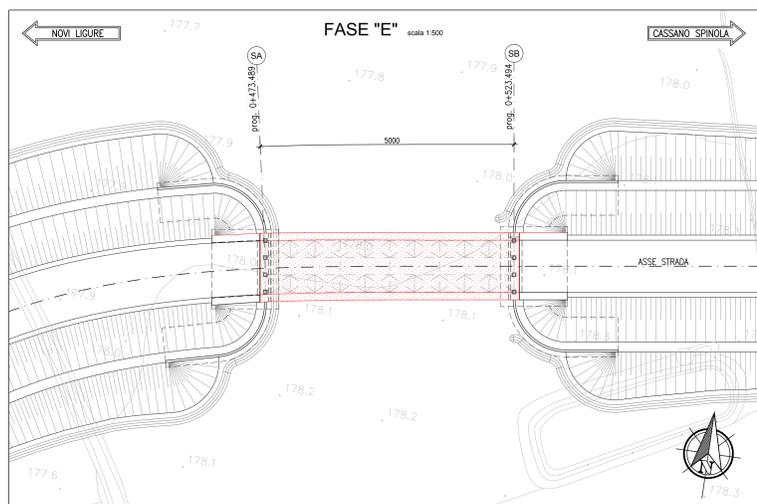

- POSA DELLE PREDALLE IN AUTOPORTANZA E DELLE BARRE COSTITUENTI L'ARMATURA DI COMPLETAMENTO;
- ESECUZIONE DEL GETTO DI COMPLETAMENTO DELLA SOLETTA.

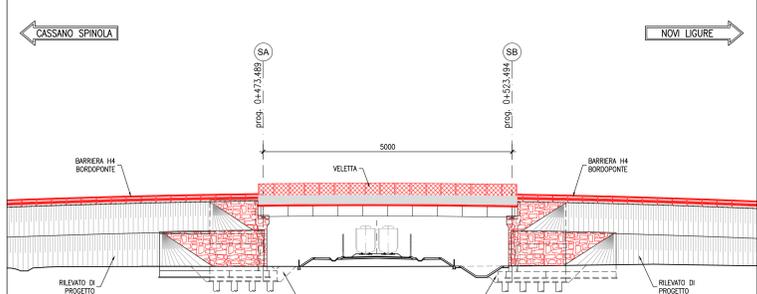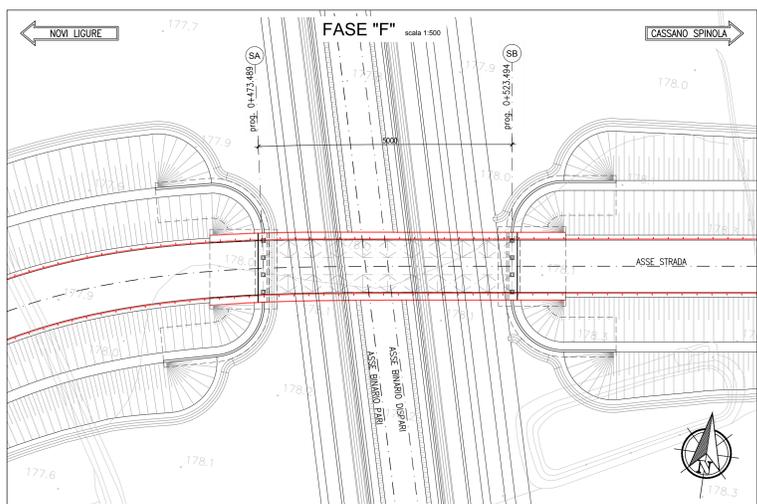

- INSTALLAZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO STRADALE E STESURA DELLA PAVIMENTAZIONE;
- APPLICAZIONE DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI SULLE SPALLE E SISTEMAZIONI FINALI.

COMMITTENTE:  **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

ALTA Sorveglianza:  **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

GENERAL CONTRACTOR:  **COCLV**
Costruzioni e Impianti s.p.a.

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01
TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

Cavalcaferrovia Sp 152 Linea III Valico
alla Pk 38+765 - Tratto 0

Fasi di varo

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Costruzioni Coclv Ing. M. Mezzalana		1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERASUBDISCIPLINA	PROGR.	REV.
I G 5 1	0 4	E	C V	B Z	I V 1 4 0 X	1 0 6	A

PROGETTAZIONE							
Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data
AD0	Prima emissione	COCLV	25/07/2019	COCLV	25/07/2019	A. Marcella	25/07/2019

 **COCLV**
Costruzioni e Impianti s.p.a.
Via S. Maria Maddalena, 10
I-42121 R.

Nome File: I0319A-CV140X-100-AD0
CLIP: F3116220000000
