


MACROFASE 1 - FASE 1d - 35 gg

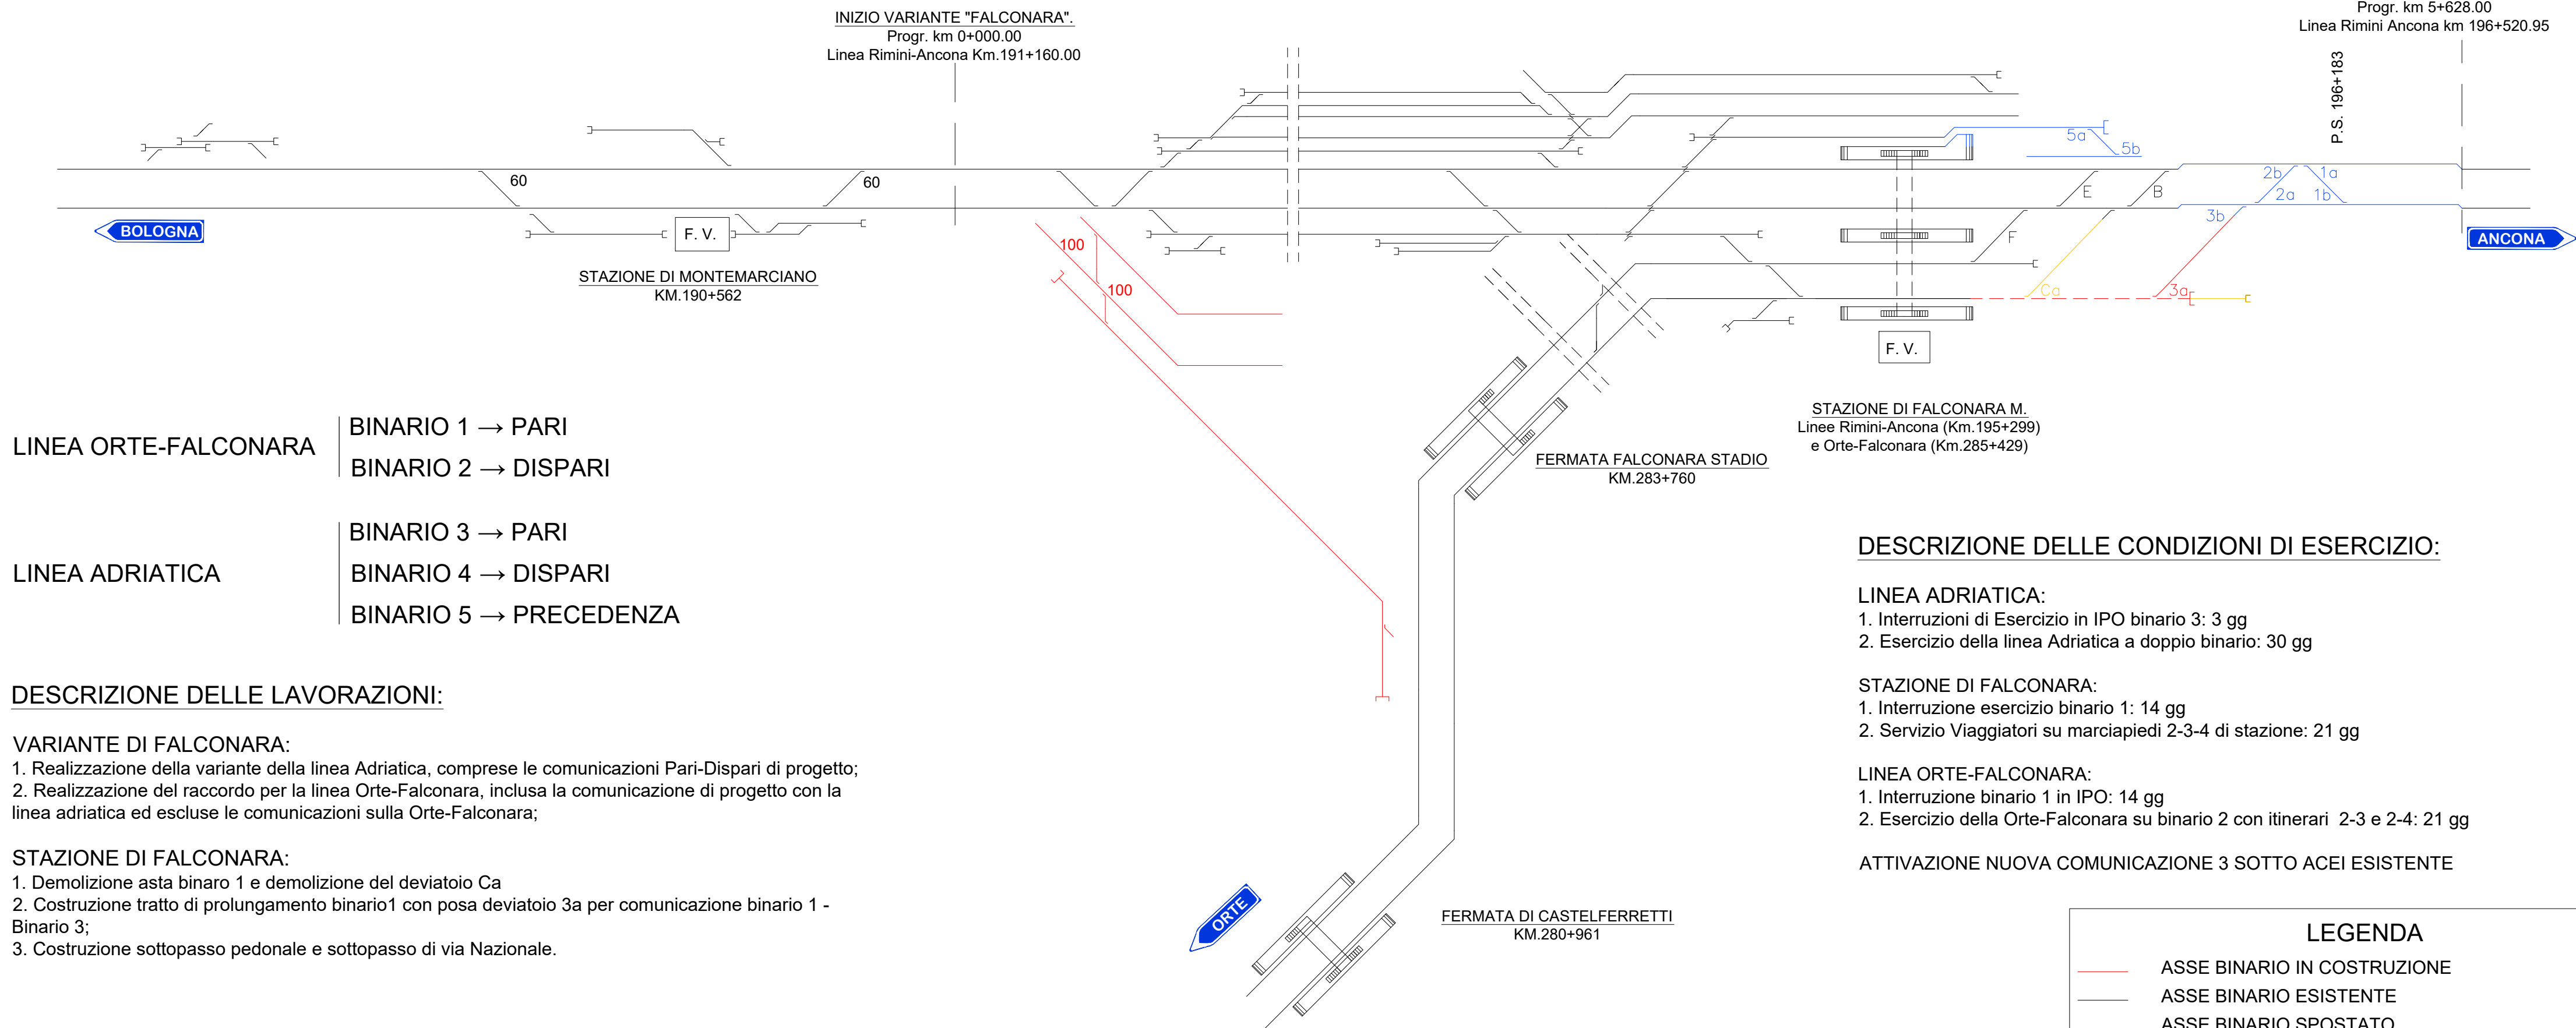

- LINEA ORTE-FALCONARA
- BINARIO 1 → PARI
 - BINARIO 2 → DISPARI
- LINEA ADRIATICA
- BINARIO 3 → PARI
 - BINARIO 4 → DISPARI
 - BINARIO 5 → PRECEDENZA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI:

- VARIANTE DI FALCONARA:
- Realizzazione della variante della linea Adriatica, comprese le comunicazioni Pari-Disparsi di progetto;
 - Realizzazione del raccordo per la linea Orte-Falconara, inclusa la comunicazione di progetto con la linea adriatica ed escluse le comunicazioni sulla Orte-Falconara;

- STAZIONE DI FALCONARA:
- Demolizione asta binario 1 e demolizione del deviatoio Ca
 - Costruzione tratto di prolungamento binario1 con posa deviatoio 3a per comunicazione binario 1 - Binario 3;
 - Costruzione sottopasso pedonale e sottopasso di via Nazionale.

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

- LINEA ADRIATICA:
- Interruzioni di Esercizio in IPO binario 3: 3 gg
 - Esercizio della linea Adriatica a doppio binario: 30 gg
- STAZIONE DI FALCONARA:
- Interruzione esercizio binario 1: 14 gg
 - Servizio Viaggiatori su marciapiedi 2-3-4 di stazione: 21 gg
- LINEA ORTE-FALCONARA:
- Interruzione binario 1 in IPO: 14 gg
 - Esercizio della Orte-Falconara su binario 2 con itinerari 2-3 e 2-4: 21 gg
- ATTIVAZIONE NUOVA COMUNICAZIONE 3 SOTTO ACEI ESISTENTE

| LEGENDA | |
|---------|---|
| | ASSE BINARIO IN COSTRUZIONE |
| | ASSE BINARIO ESISTENTE |
| | ASSE BINARIO SPOSTATO |
| | ASSE BINARIO DA SPOSTARE |
| | ASSE BINARIO/OPERE IN DEMOLIZIONE |
| | ASSE BINARIO COSTRUITO IN FASE PRECEDENTE |
| | ASSE BINARIO PROVVISORIO |

COMMITTENTE:

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE INVESTIMENTI - S.O. PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

U.O. : AREA OPERATIVA CENTRO SUD
PM Nodi di Roma e Falconara, Orte - Falconara e Bologna - Falconara

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA FERROVIARIA: ADRIATICA
INTERVENTO: VARIANTE DI FALCONARA

CA - CANTIERIZZAZIONE

Esercizio
Schematico - Macrofase 1 d

| APPALTATORE | IL PROGETTISTA | SCALA |
|--|----------------|-------|
| | | |
| IL DIRETTORE TECNICO Ing. Fabio Sgarrella | | |

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| IA1Y | 00 | E | ZZ | DX | CA2100 | 012 | B |

| PROGETTAZIONE | | | | | | | | IL PROGETTISTA |
|---------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Ing. Giancarlo Tanzi |
| A | Rec. istruttoria del 13.03.2017 | A. Casini | 06/04/2017 | A. Nastasi | 07/04/2017 | G. Tanzi | 10/04/2017 | |
| B | Rec. Rdv | F. Sgarrella | 20/06/2017 | A. Nastasi | 20/06/2017 | G. Tanzi | 20/06/2017 | |
| | | | | | | | | |

Data: 20/06/2017
