



FASE 5

- SCAVO IN DISCESA DELL'ULTIMO CAMPO DELLA GALLERIA LATERALE, POSA IN OPERA DEI PROFILATI METALLICI E DELLO SPIRITZ-BECON
- COLLEGAMENTO CON LA FINESTRA

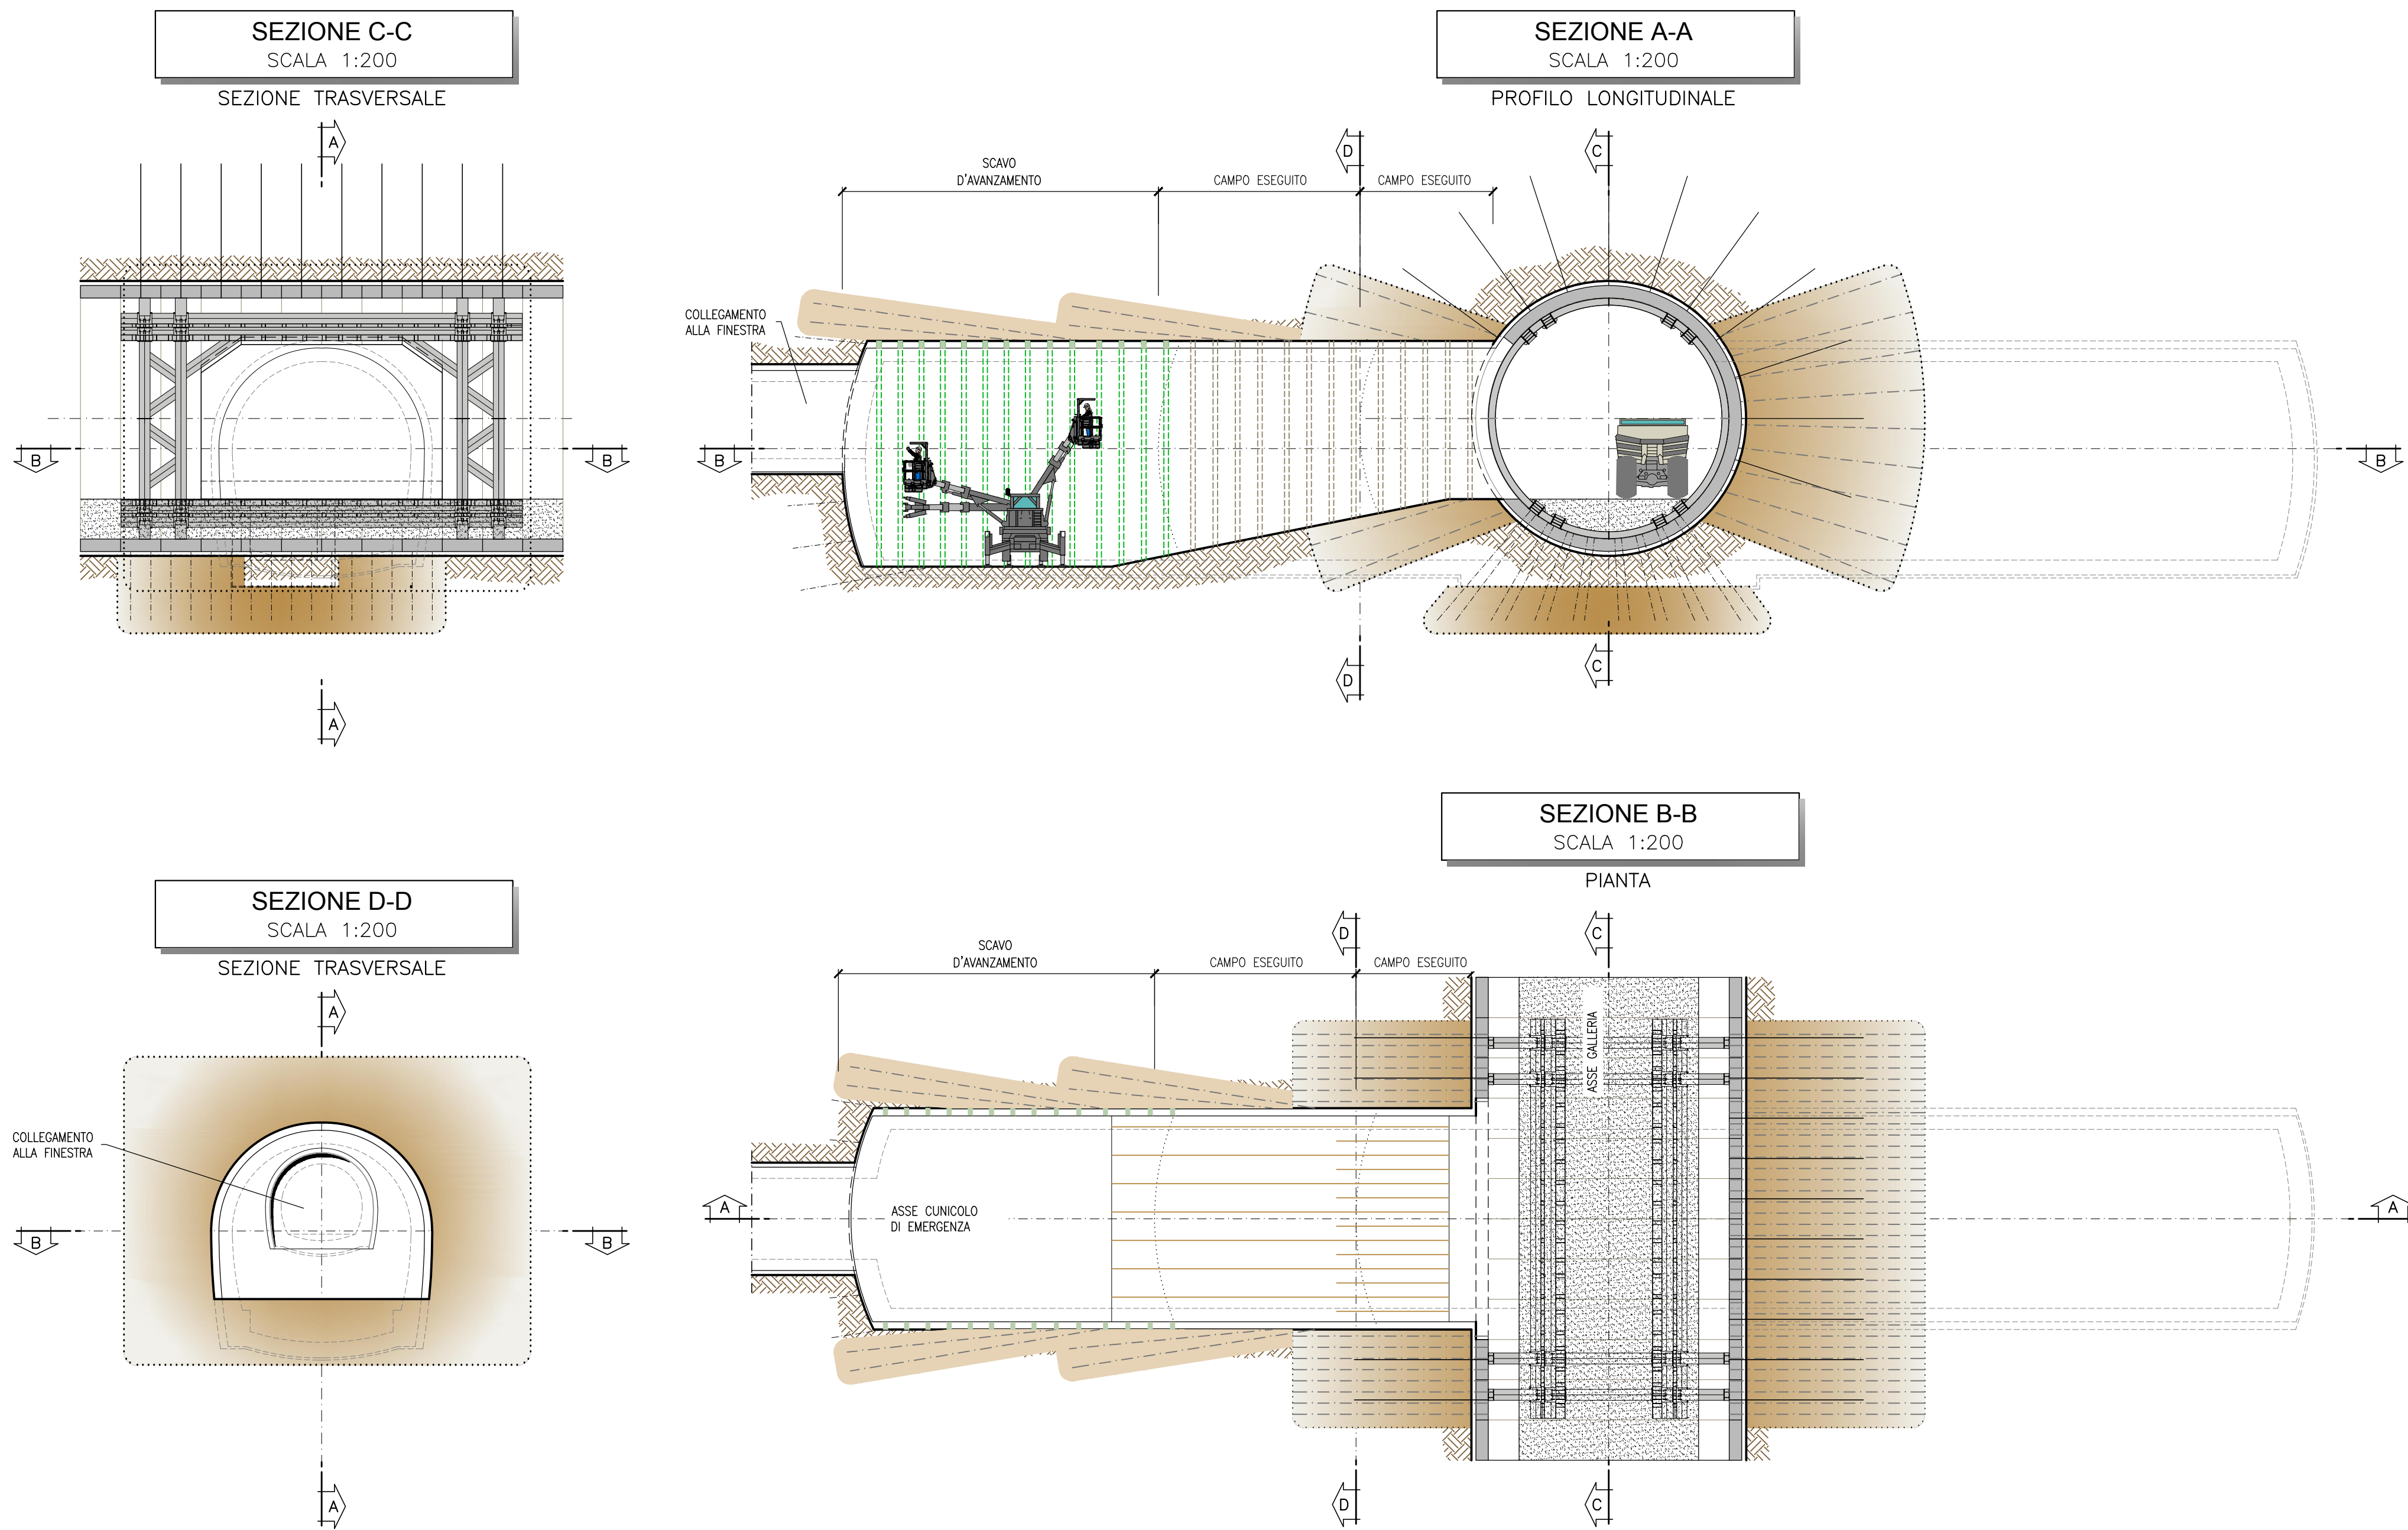


FASE 7

- POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELL'ARMATURA
- GETTO ARCO ROVESCIO, MURETTE, PIEDRITI E CALOTTA DALL'ULTIMO CAMPO VERSO LA GALLERIA DI LINEA
- SCAVO DI RIBASSO/RIBATTITURA FINO AL PIANO DI SCAVO DELLA SEZIONE DI PORTALE, POSA DEL NUOVO PIEDE CENTINA (MANTENENDO SEMPRE UNA RAMPA DI ACCESSO/USCITA VERSO LA GALLERIA DI LINEA)

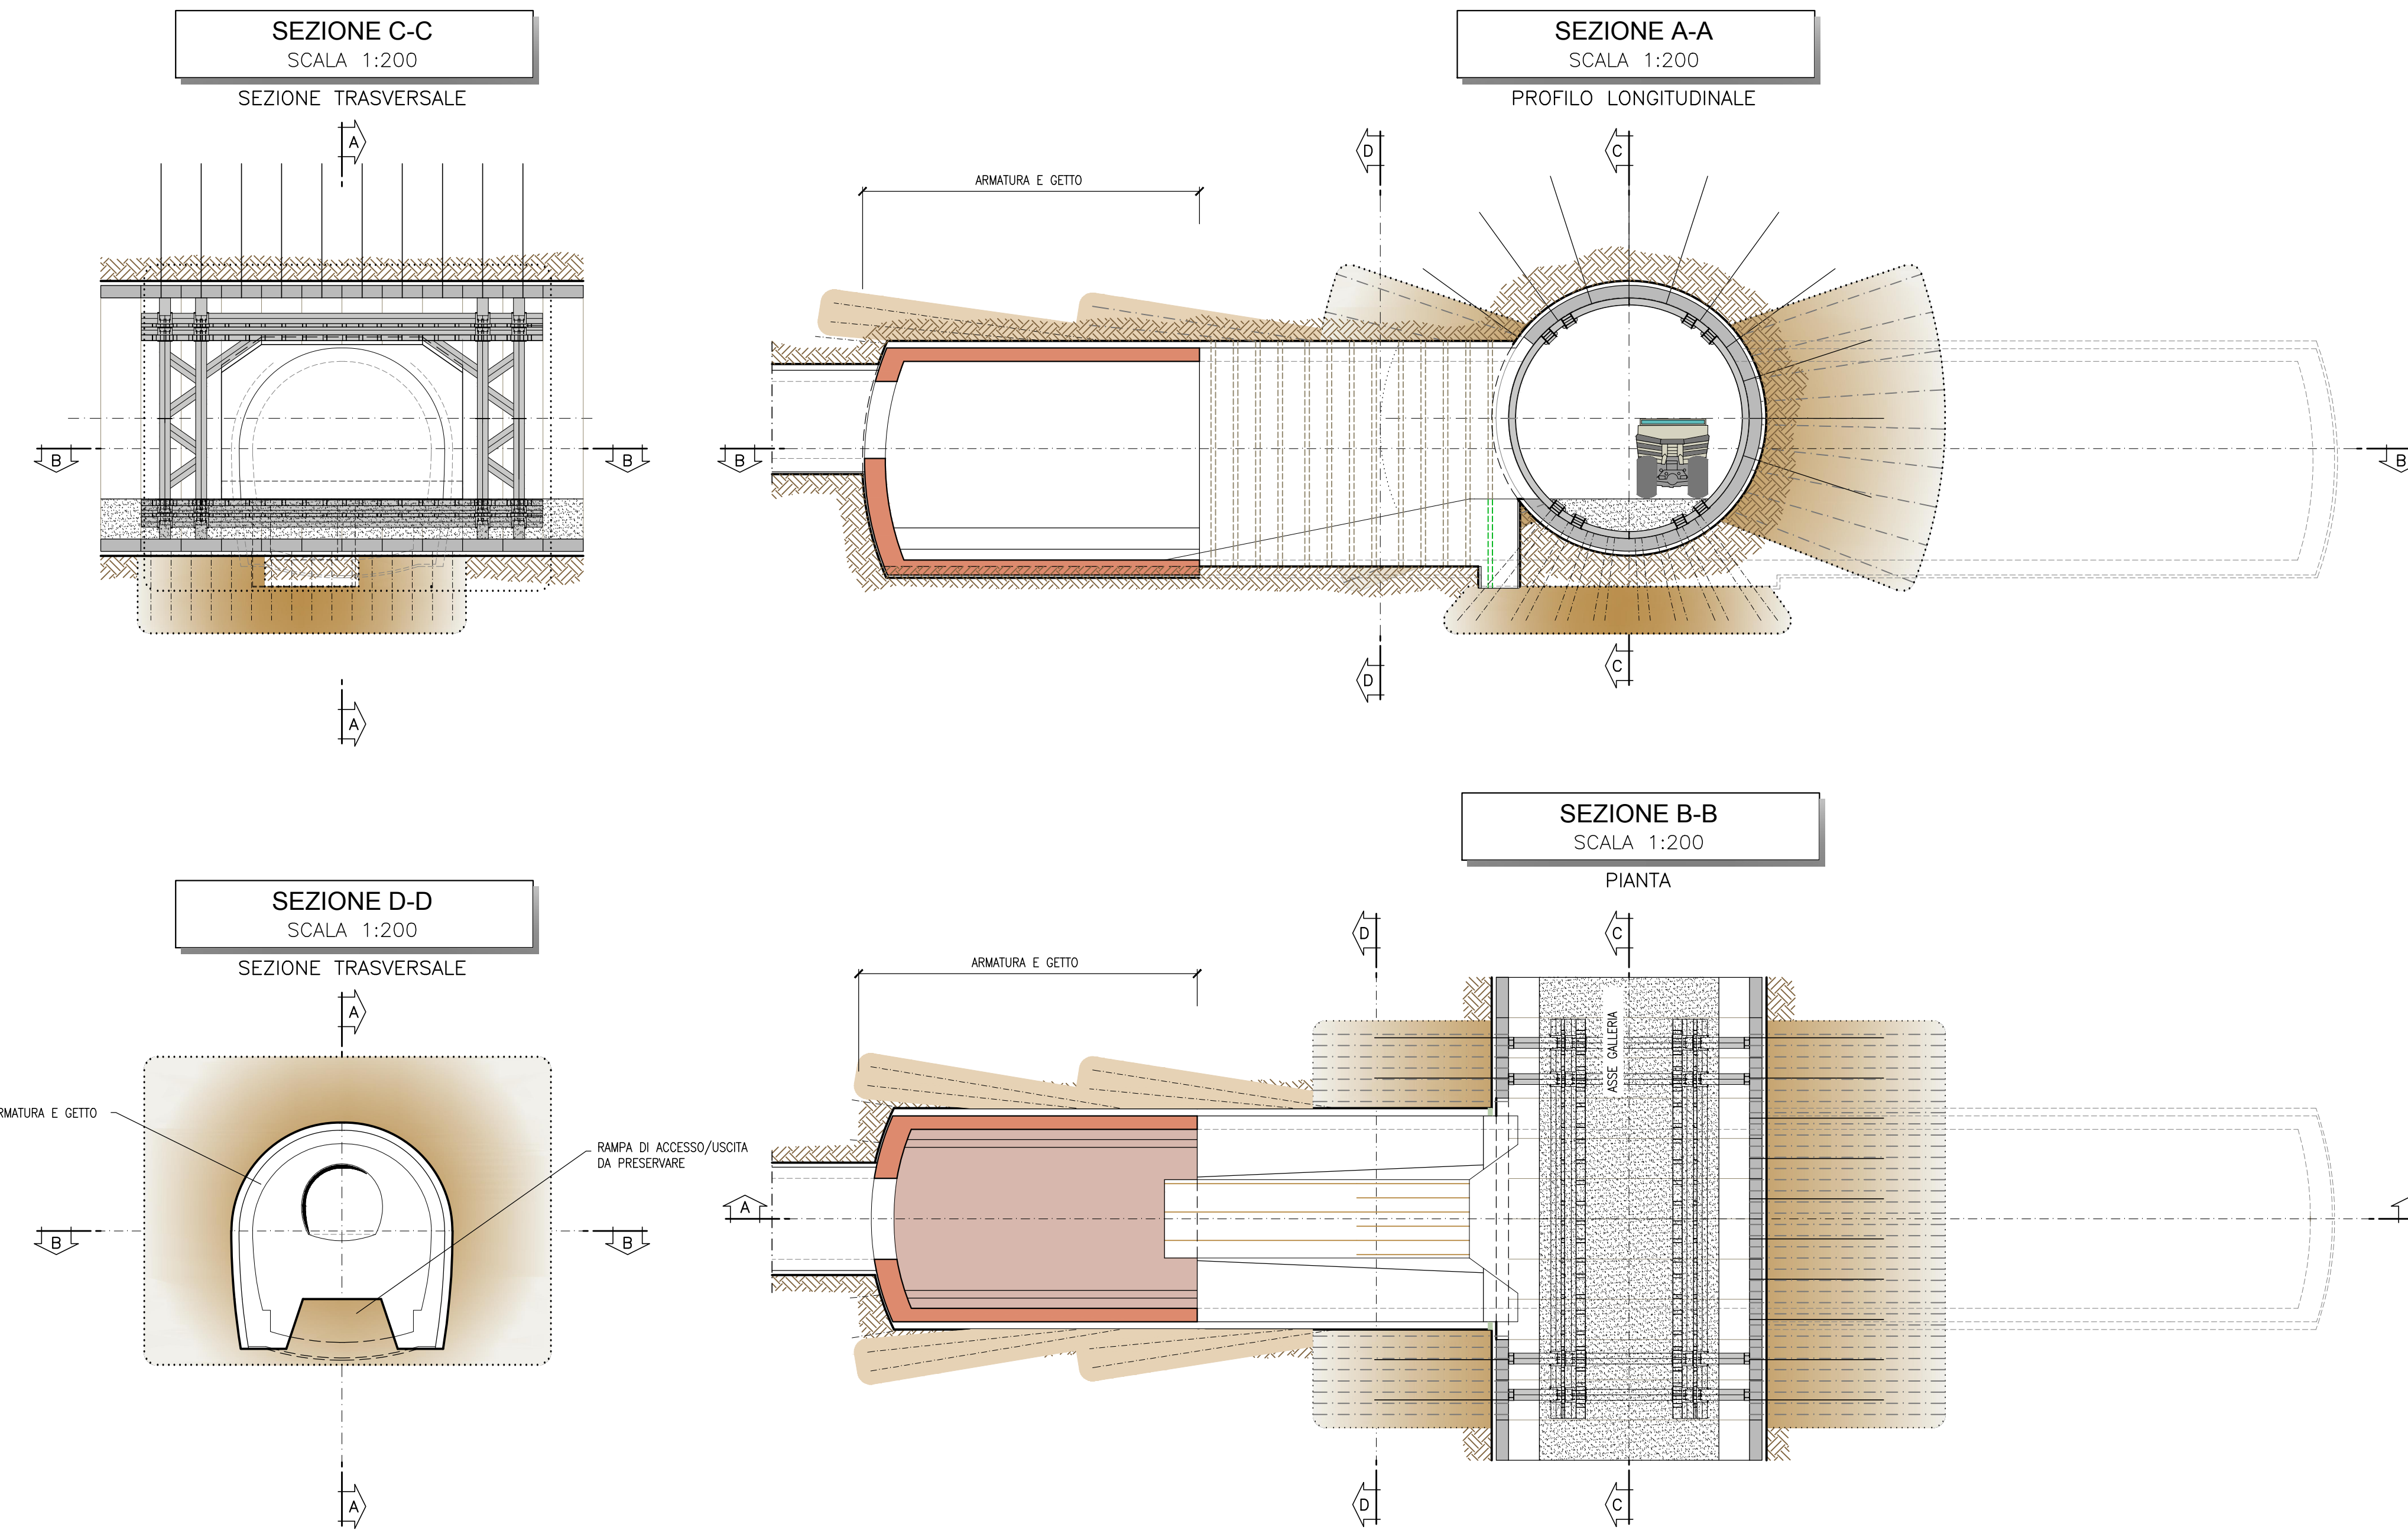


FASE 6

- SCAVO DI RIBASSO/RIBATTITURA FINO AL PIANO DI SCAVO DELLA GALLERIA LATERALE, POSA DEL NUOVO PIEDE CENTINA (MANTENENDO SEMPRE UNA RAMPA DI ACCESSO/USCITA VERSO LA GALLERIA DI LINEA)

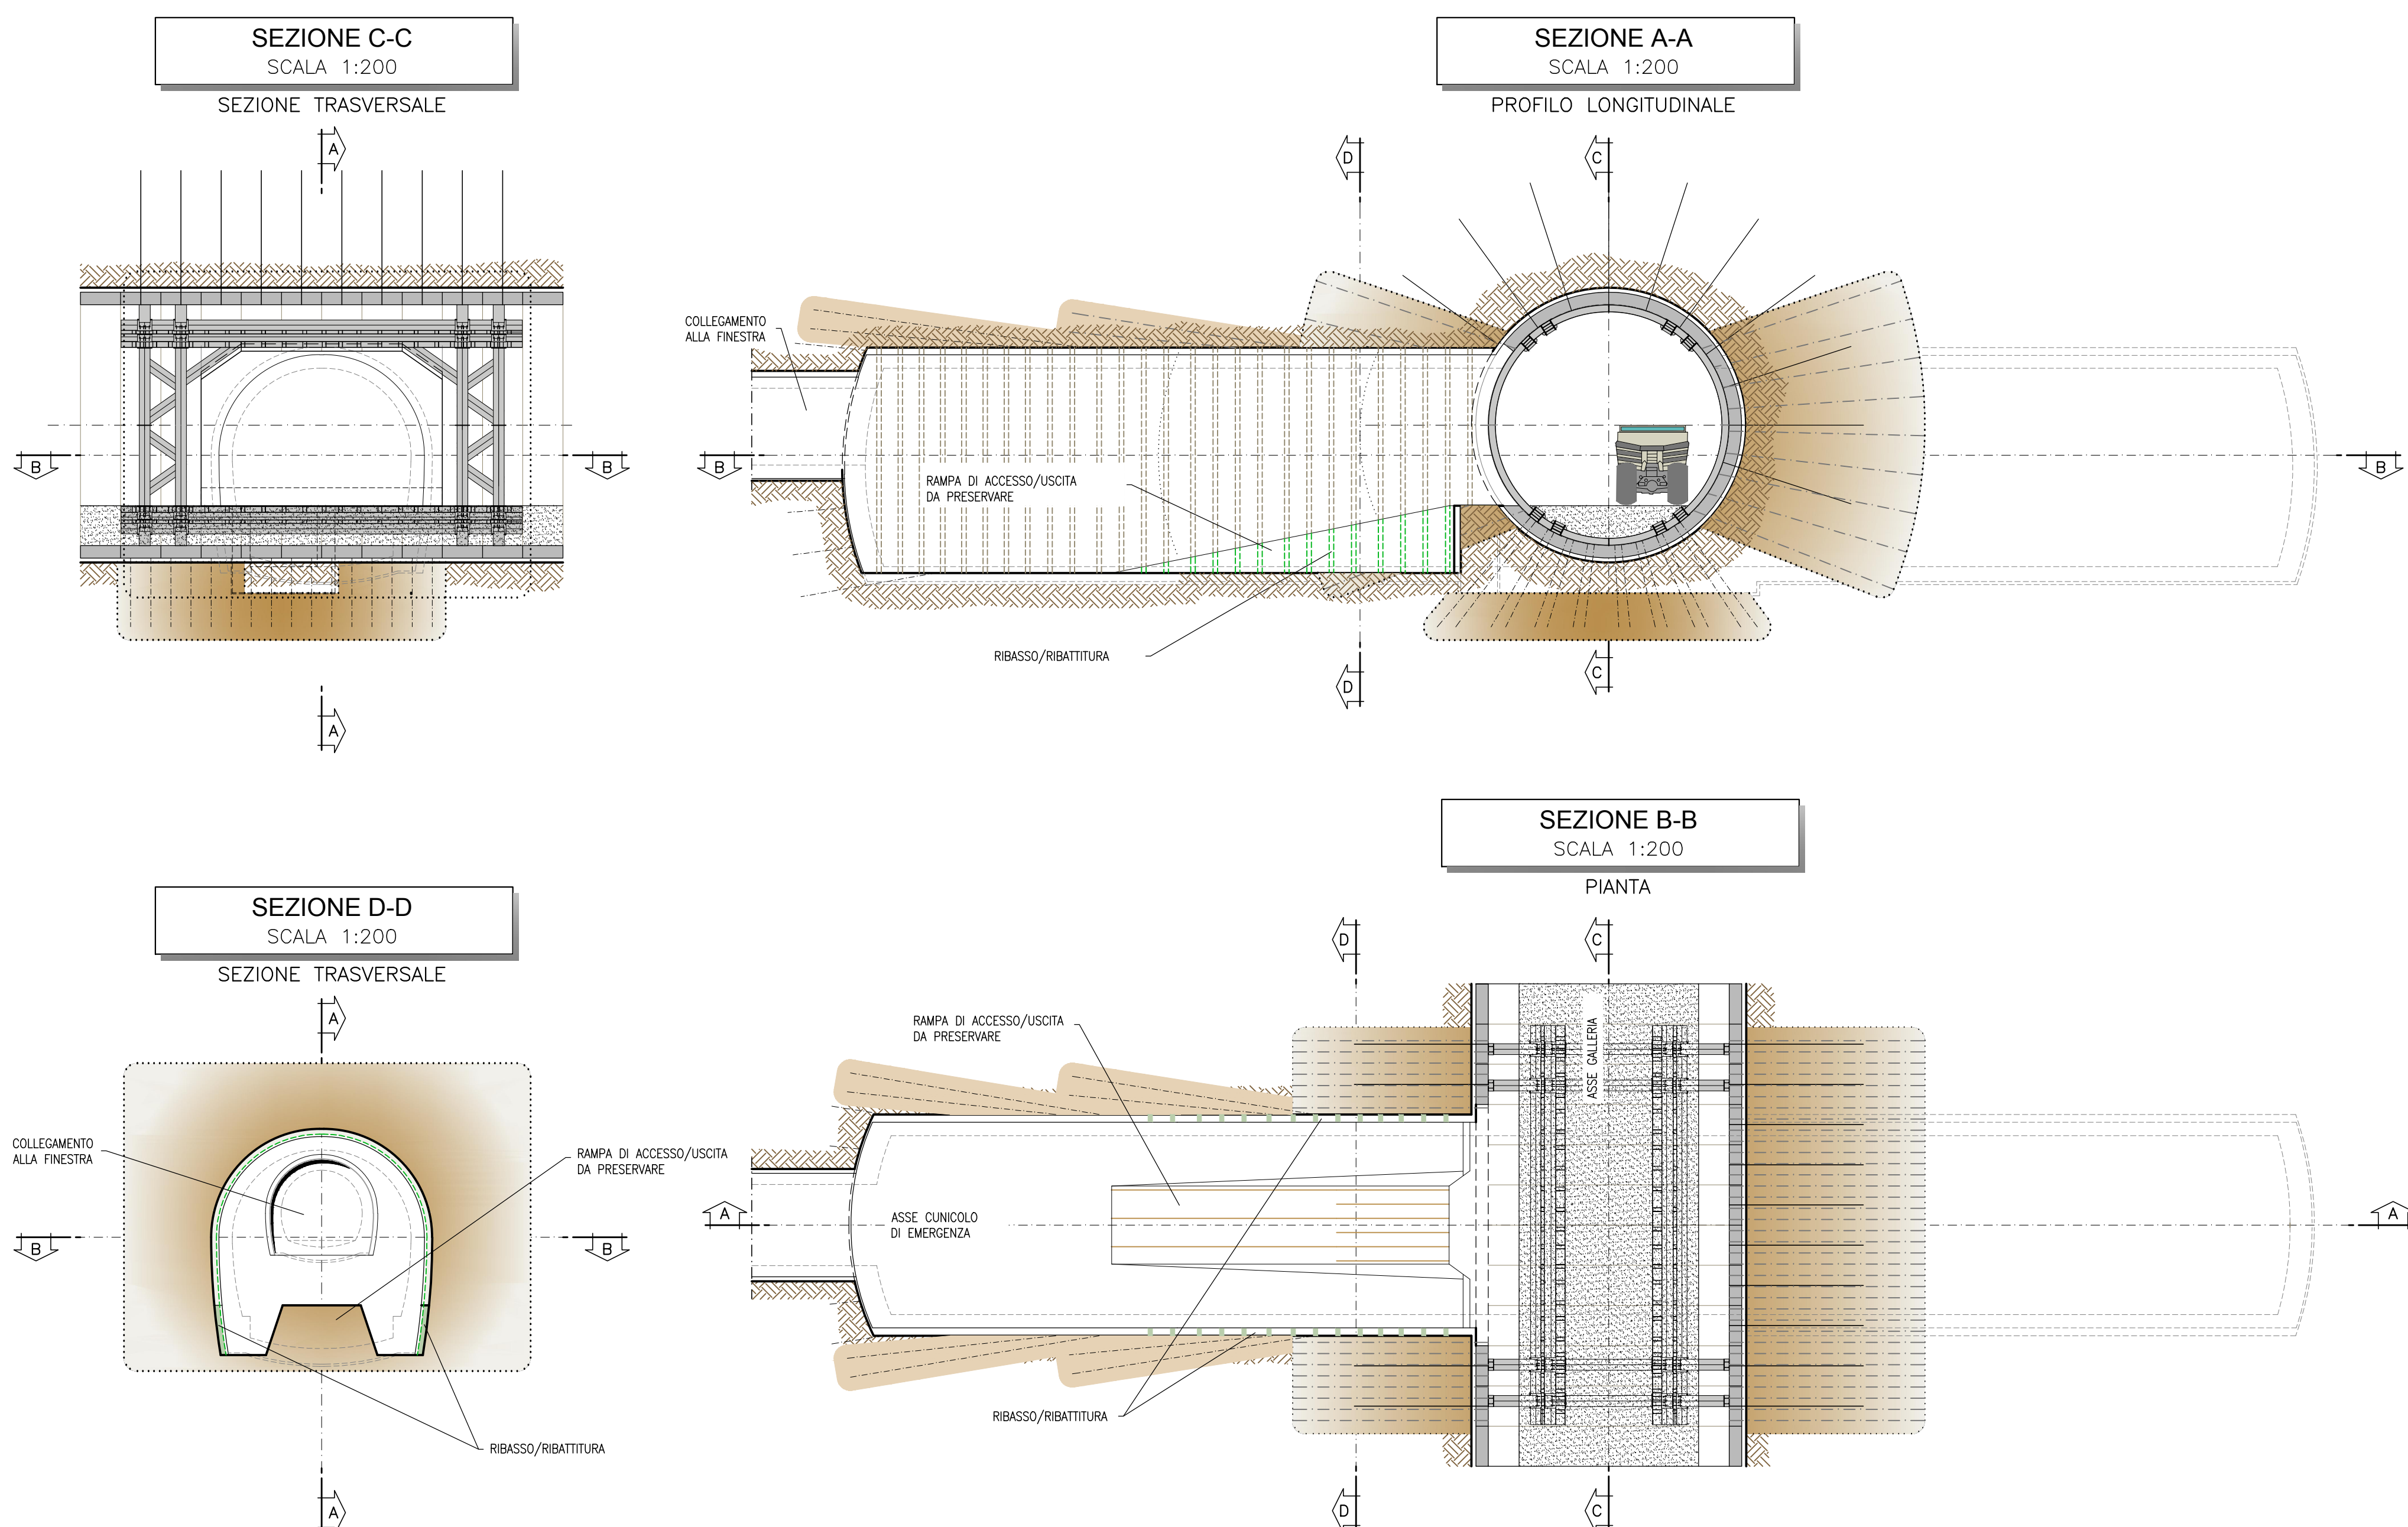

FASE 8

- SPOSTAMENTO DELLA RAMPA DI ACCESSO/USCITA VERSO LA GALLERIA DI LINEA SU UN LATO DELLA GALLERIA LATERALE
- POSA (SUL LATO OPPOSTO ALLA RAMPA) DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE ED DELL'ARMATURA, LASCIANDO PREDISPOSIZIONI PER COLLEGARE ARMATURE FUTURE
- GETTO DELL'ARCO ROVESCIO E MURETTE DELLA GALLERIA LATERALE
- GETTO DEL SOLETTONE E MURETTE DEL PORTALE LASCIANDO UN RISPARMIO IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO AL FUTURO PASSAGGIO PEDONALE

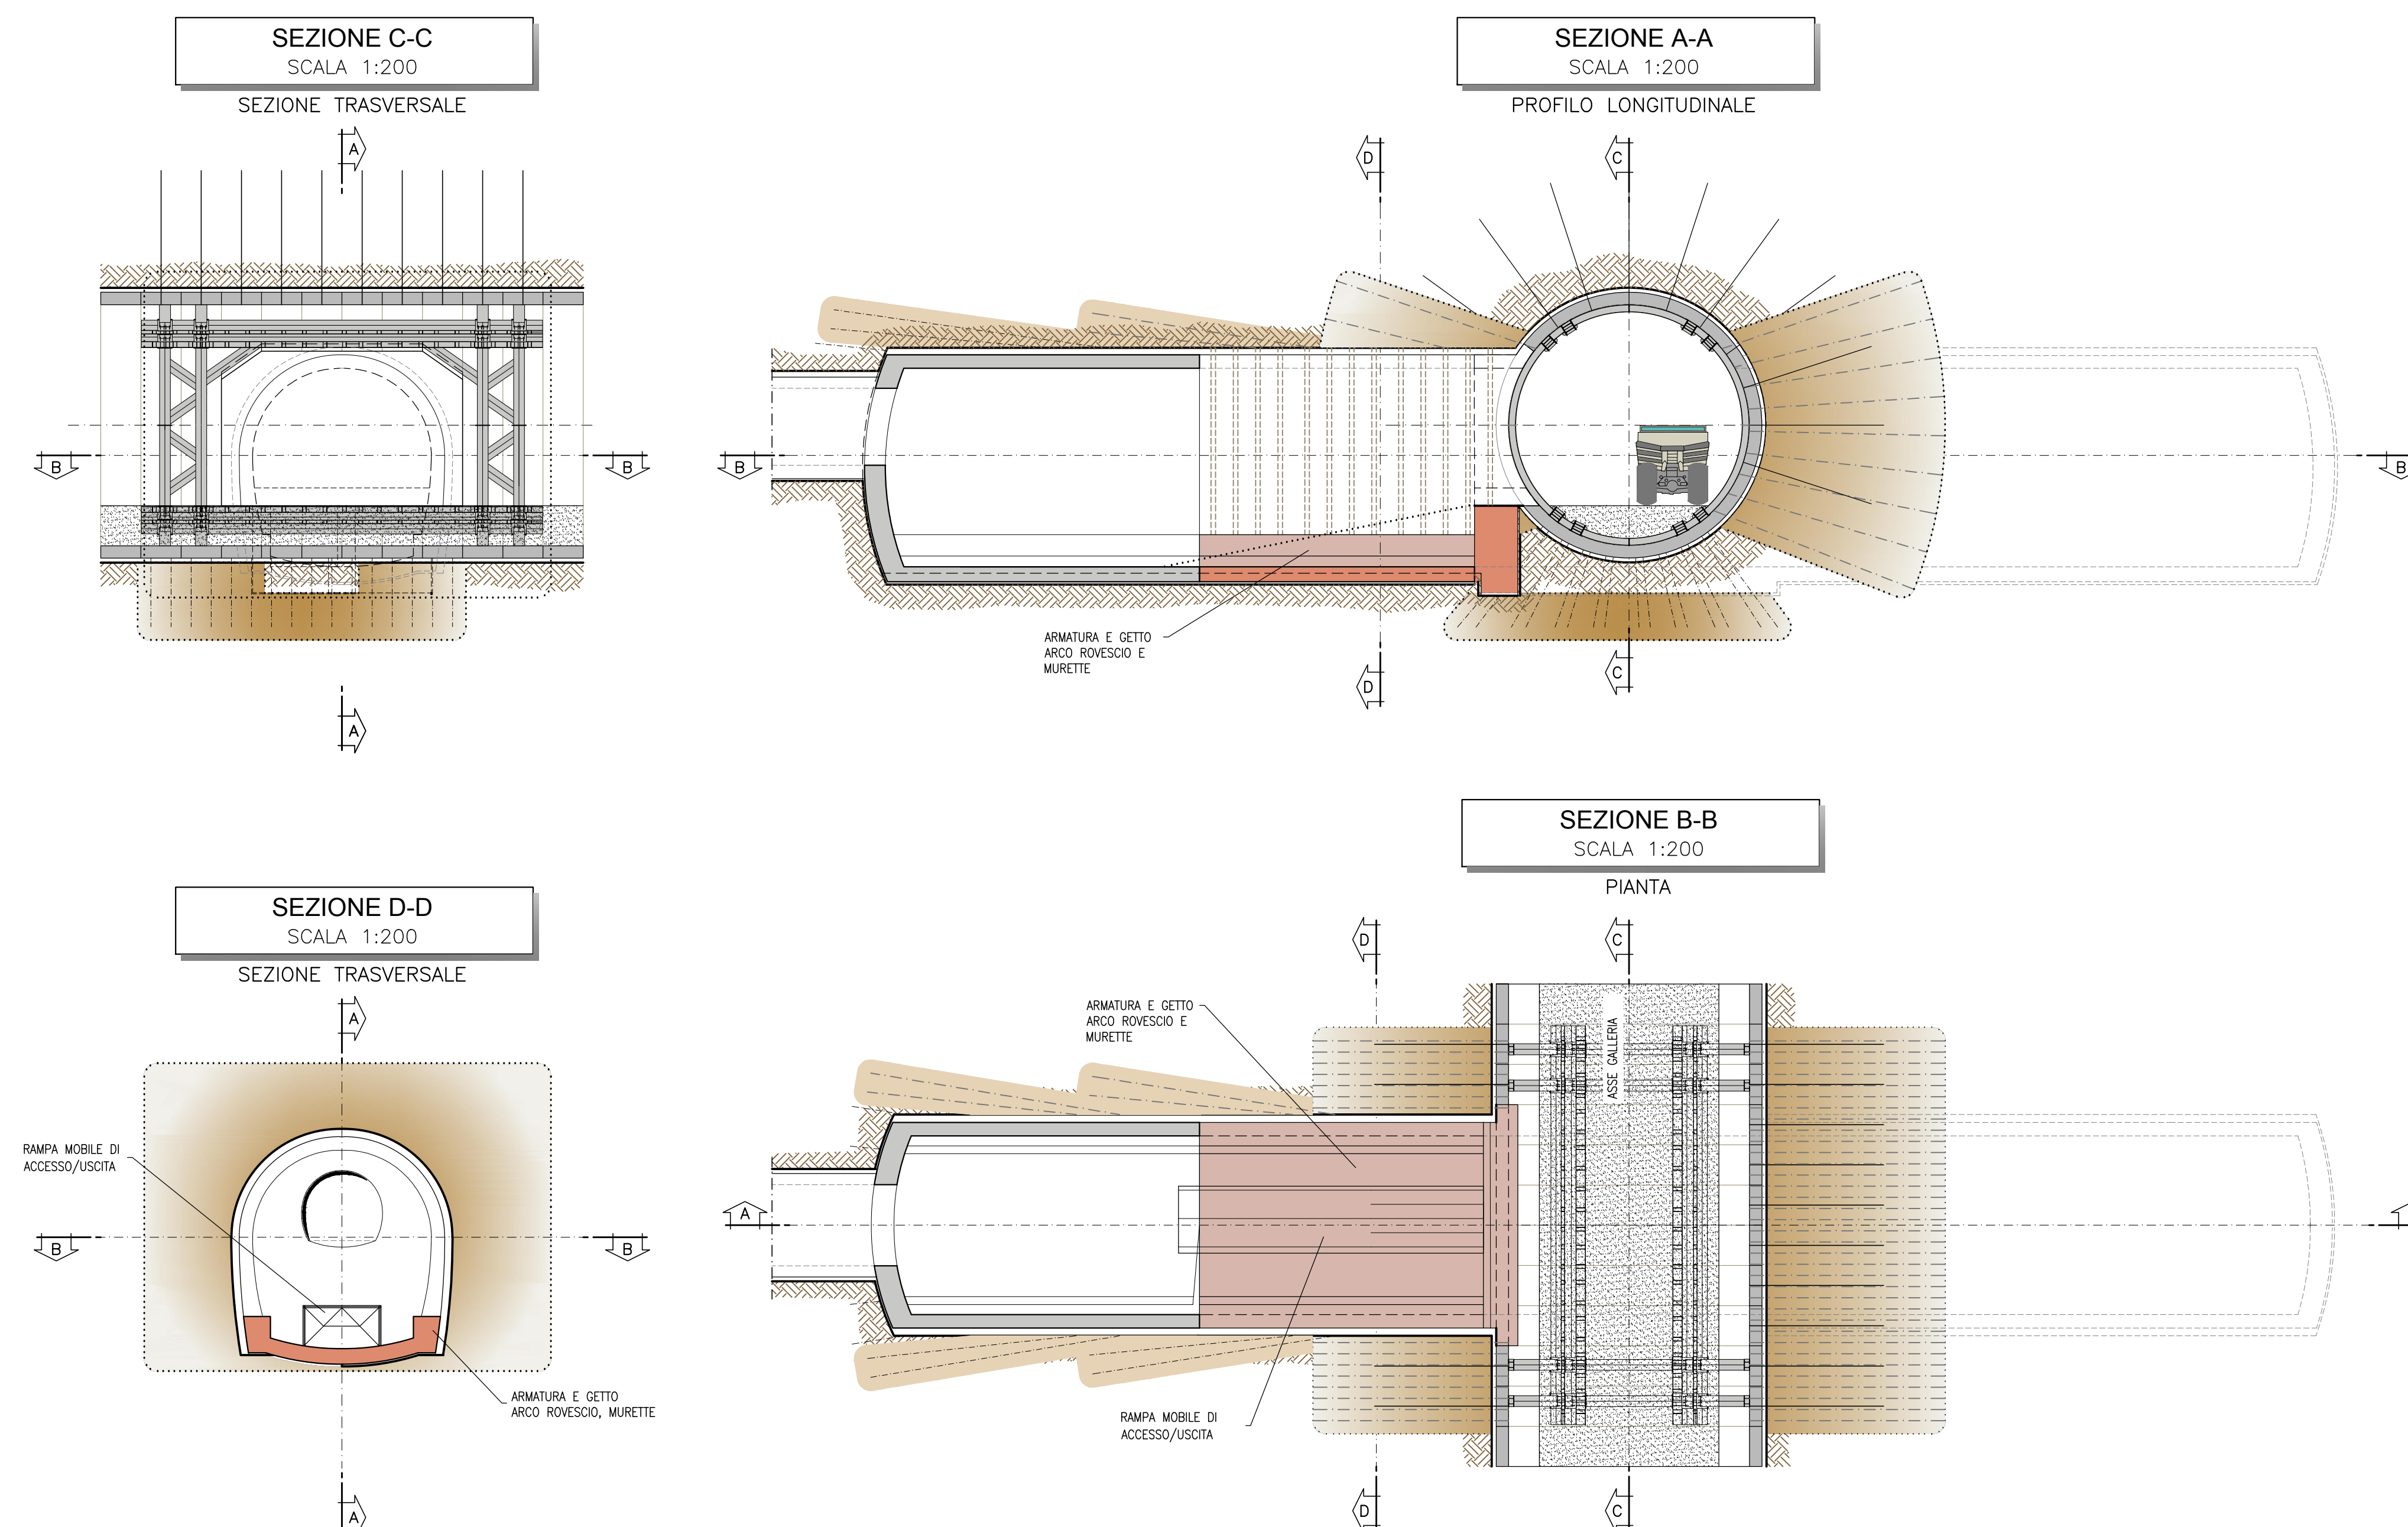

NOTA TABELLA MATERIALI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "IF2801EZZSPGN000002"



COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV** (Consorzio HirpiniaAV e Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Mordillo 150902020)

SOGE: **salini impregio** and **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROKSOUL S.p.A.**

MANDANTE: **NETENGINEERING** and **Alpina S.p.A.**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
GN05 - GALLERIA MELITO - USCITA DI EMERGENZA PEDONALE F2 px 6+077.50
 ZONA DI INNESTO CON GALLERIA DI LINEA AL KM 6+077.50
 FASI ESECUTIVE
 Planimetria, sezioni - Tav. 2/4

Rev.	Descrizione	Elaborato	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	Emissione per consegna	M. Agrippone	21/03/2020	B. Spagnoli	21/03/2020	M. Casti	21/03/2020	Ing. G. Cassari	
B	Revisione per struttura	M. Agrippone	04/04/2020	B. Spagnoli	04/04/2020	M. Casti	04/04/2020		19/03/2020

COMMESSA: **IF2801EZZSPGN000002**

LOTTO: **01**

FASE: **E**

TIPO DOC.: **DA**

OPERADISCIPLINA: **GN0500**

PROGR.: **002**

REV.: **B**

SCALA: **1:200**

FILE: IF2801EZZSPGN000002.dwg

n. Elab.: -
