



FASE 9

- POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELL'ARMATURA COLLEGATA ALLE ARMATURE PREDISPOSTE NELLA FASE PRECEDENTE
- GETTO DEI PIEDRITI E CALOTA DELLA GALLERIA LATERALE
- GETTO DELLA CERCHIATURA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO DELLA GALLERIA LATERALE SULLA GALLERIA DI LINEA

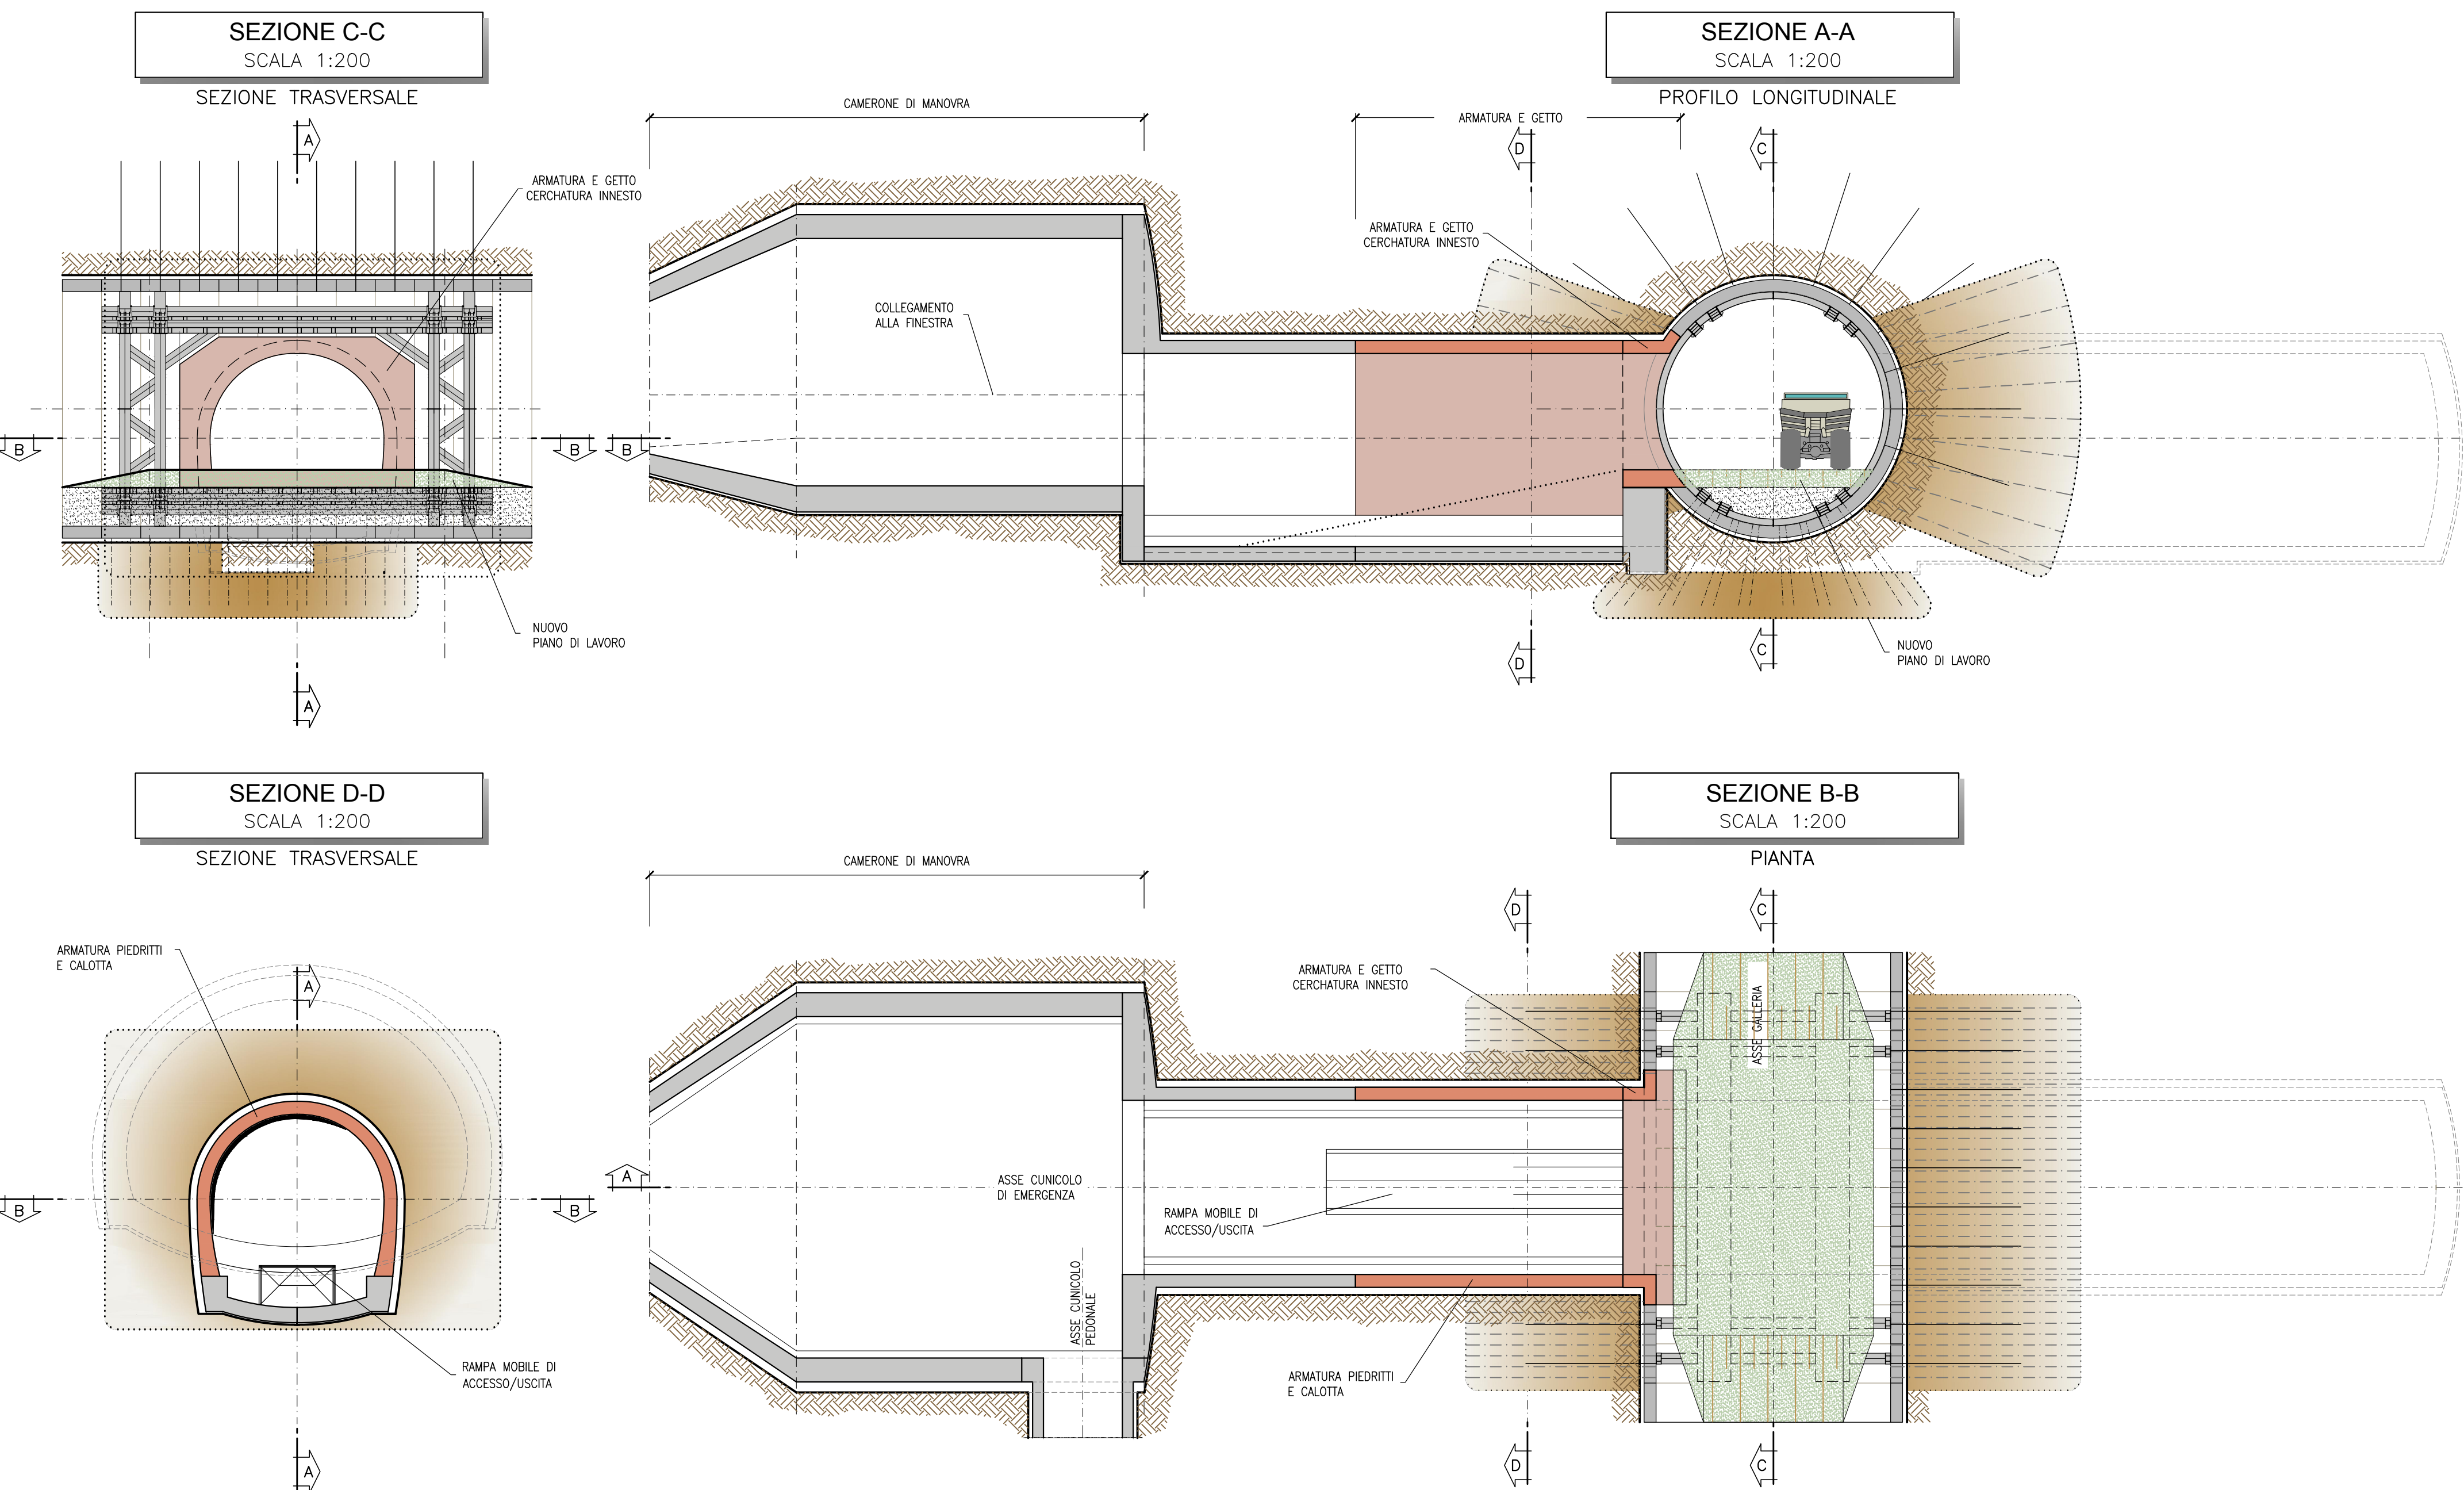


FASE 11

- INSTALLAZIONE TELAIO DI CERCHIAGGIO ATTORNO ALL'APERTURA DA REALIZZARE PER ESECUZIONE SCATOLARE (TELAIO PIANO, IMPOSTATO SU PIANO DI LAVORO GIÀ UTILIZZATO PER LE LAVORAZIONI GALLERIE LATERALI) - MANTENIMENTO TRANSITO LONGITUDINALE LUNGO GALERIA LINEA (ESEMPLO CON SISTEMA DI LASTRE METALLICHE SOPRA IL TELAIO)
- DEMOLIZIONE CONCI IN ARCO ROVESCIO
- SCAVO SEZIONE OBLIQUATA

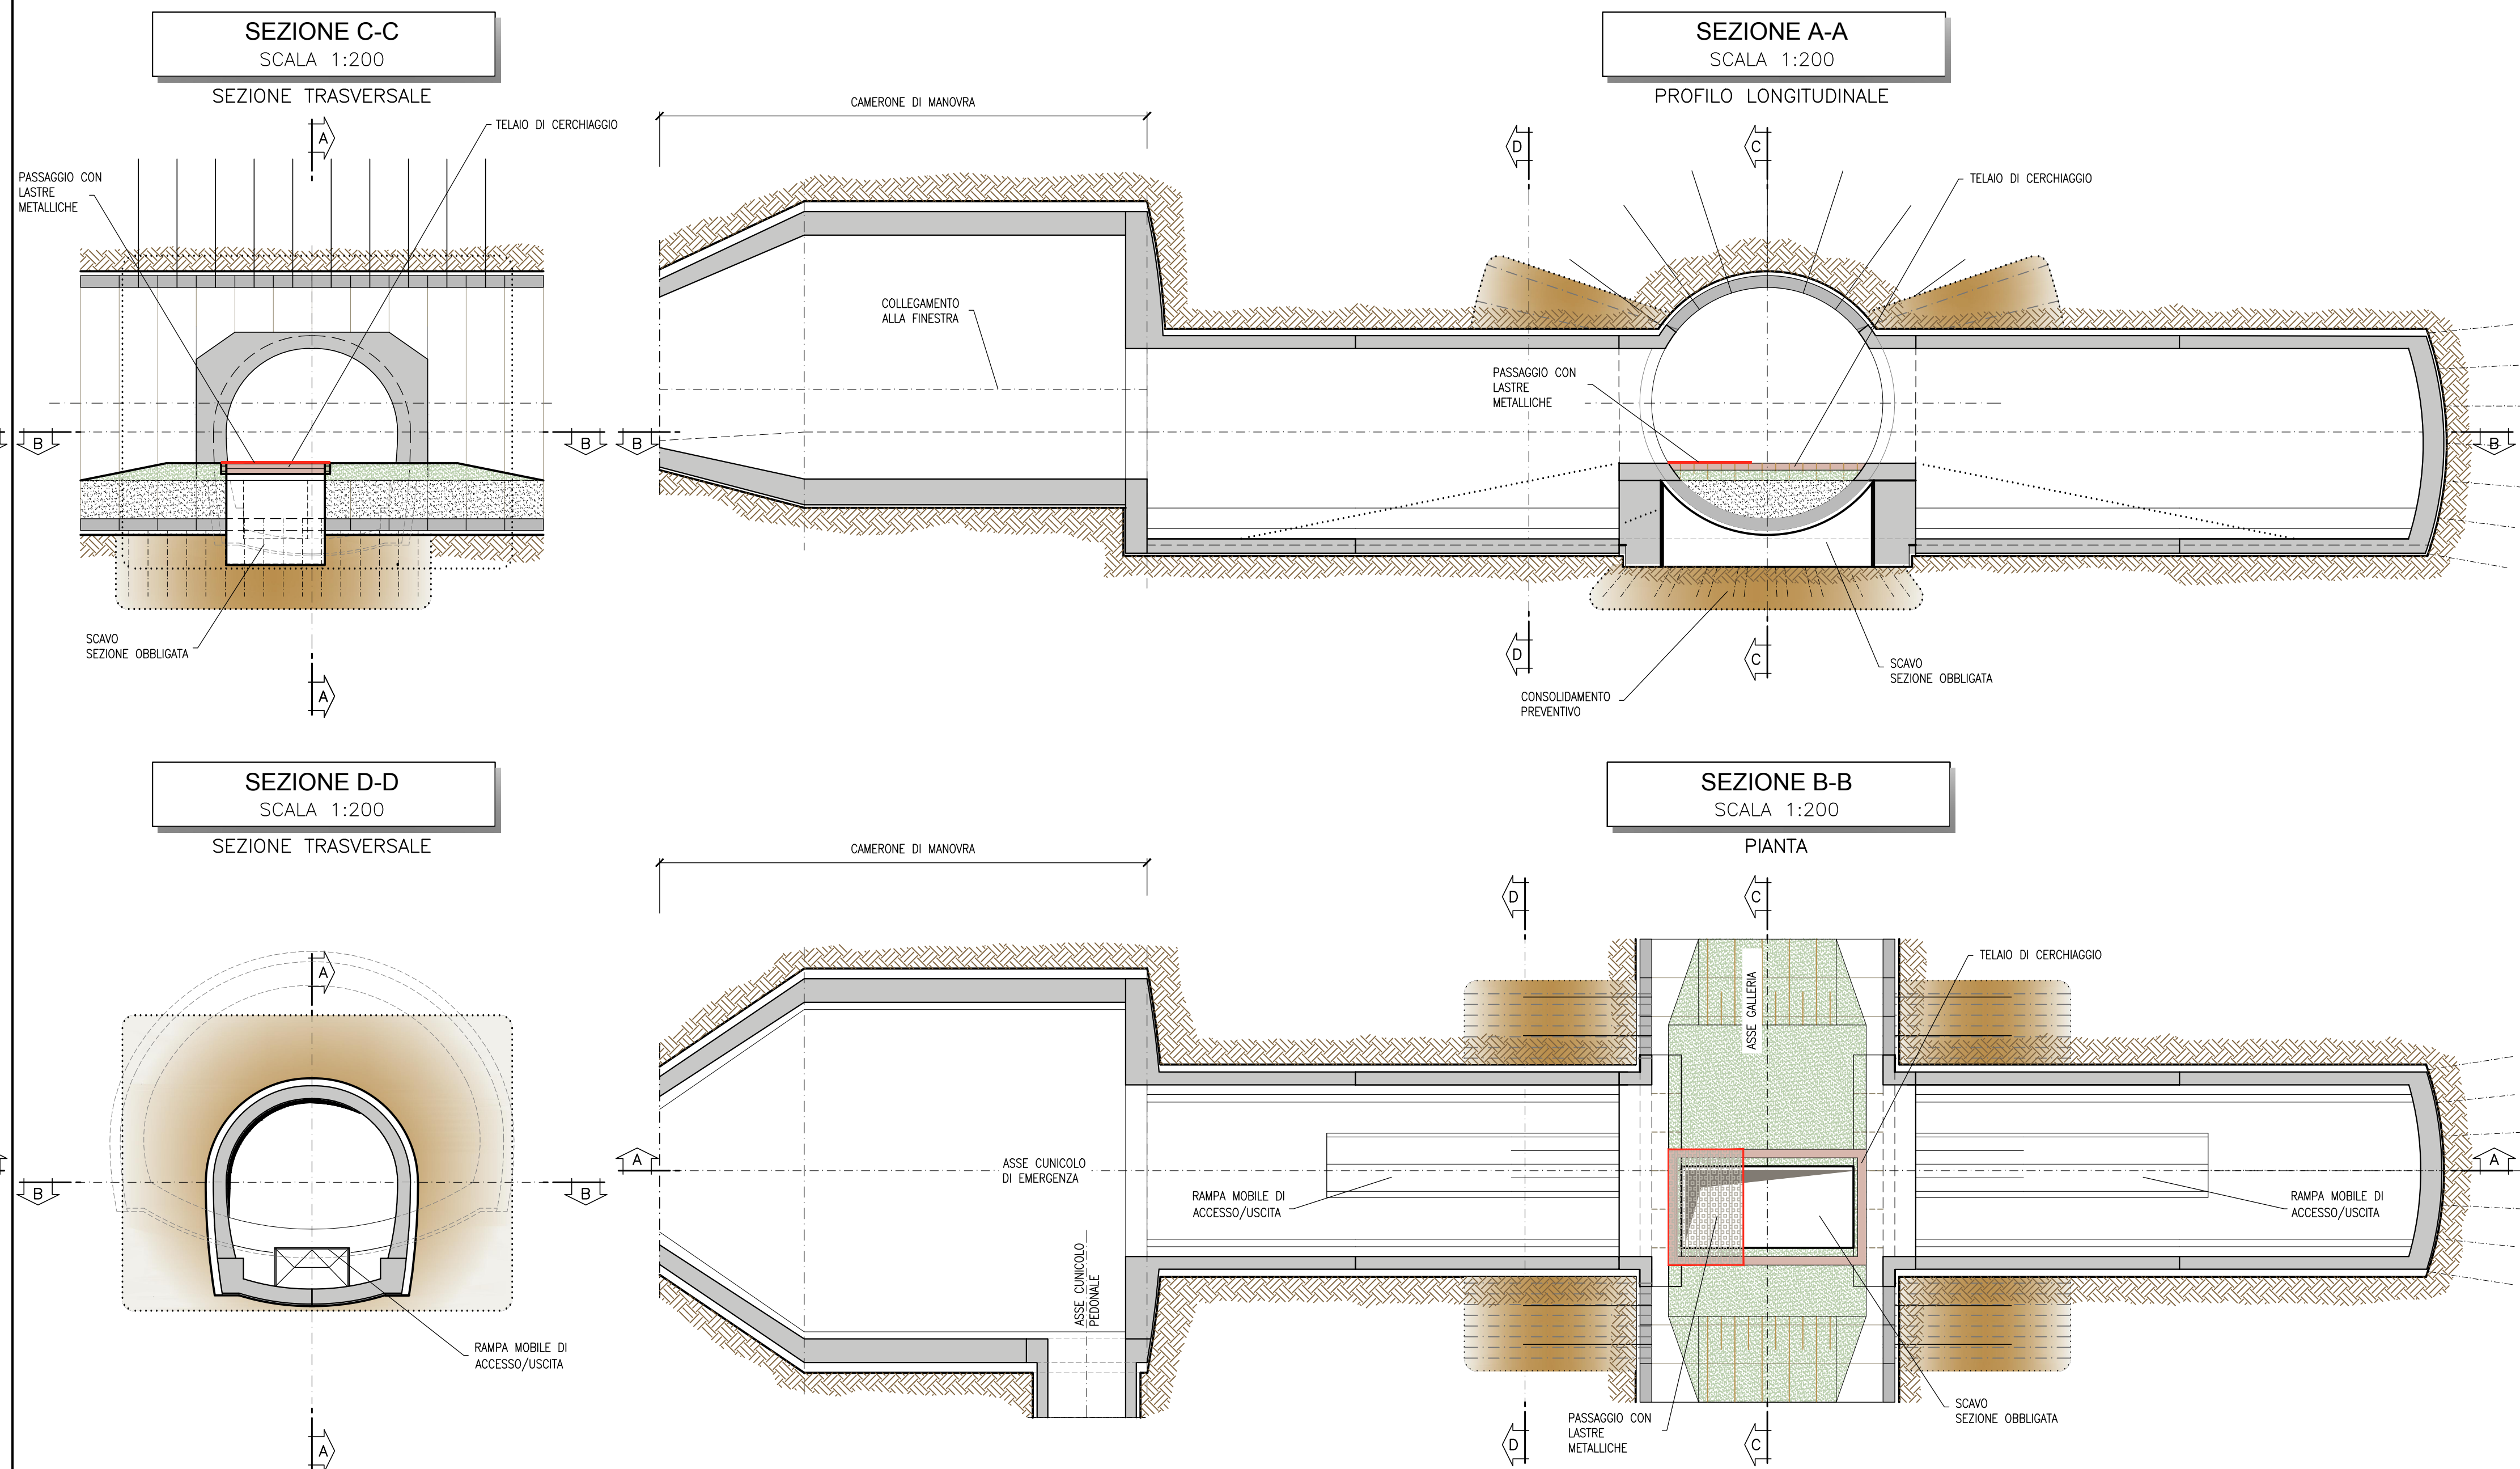


FASE 10

- ASPORTAZIONE PIANO DI LAVORO
- RIMOZIONE TELAIO REGGICONCI (GALL. LATERALE SCANATA) E INSTALLAZIONE TELAIO REGGICONCI PER GALLERIA FRONTALE
- NOTA BENE: POSSIBILITÀ OTTIMIZZAZIONE PREVEDENDO TELAIO REGGICONCI GIÀ PREDISPOSTO PER ATTACCO DA DUE LATI DELLE GALLERIE LATERALI.
- RIPRISTINO PIANO DI LAVORO
- RIPETIZIONI DELLE FASI DA 1 A 10 PER LA GALLERIA LATERALE OPPOSTA

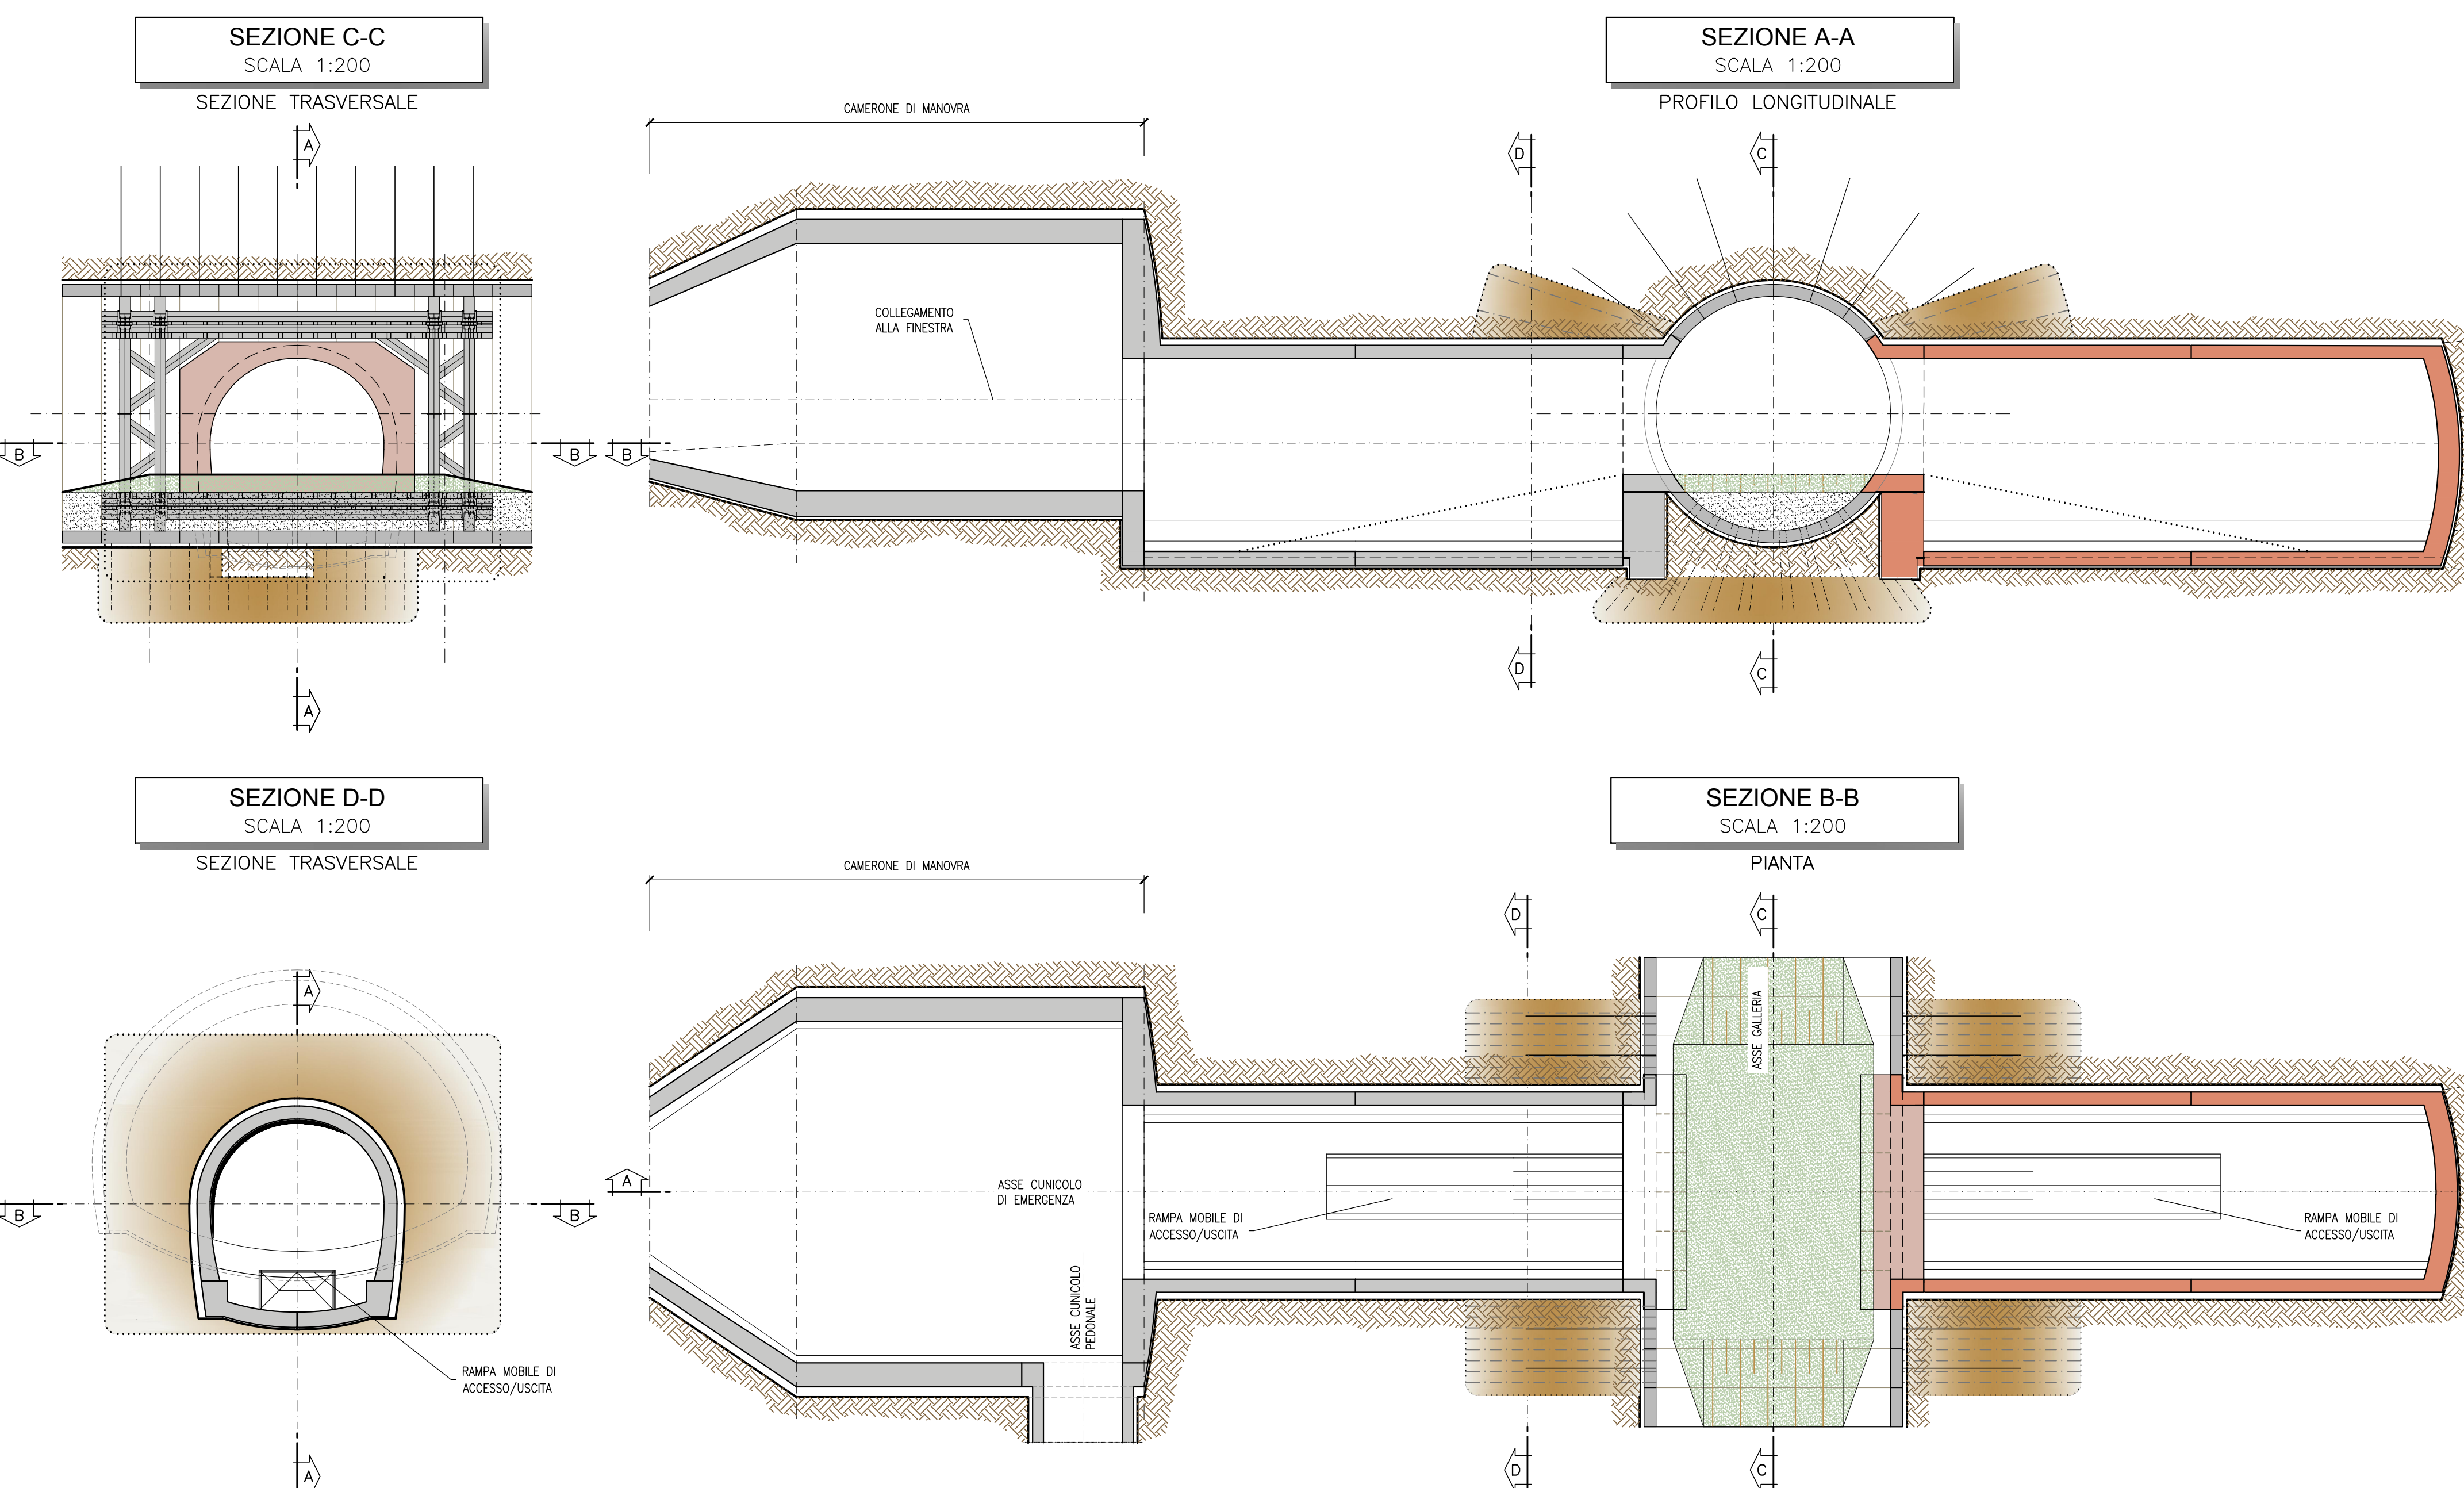

FASE 12

- ARMATURA E GETTO DEL SOLETTONE DELLO SCATOLARE (PREVISTA CONNESSIONE LATERALE ALLE STRUTTURE DELLA GALLERIA ED ALLE CERCHIATURE IN C.A. ALL'INNESTO DELLE GALERIE LATERALI)

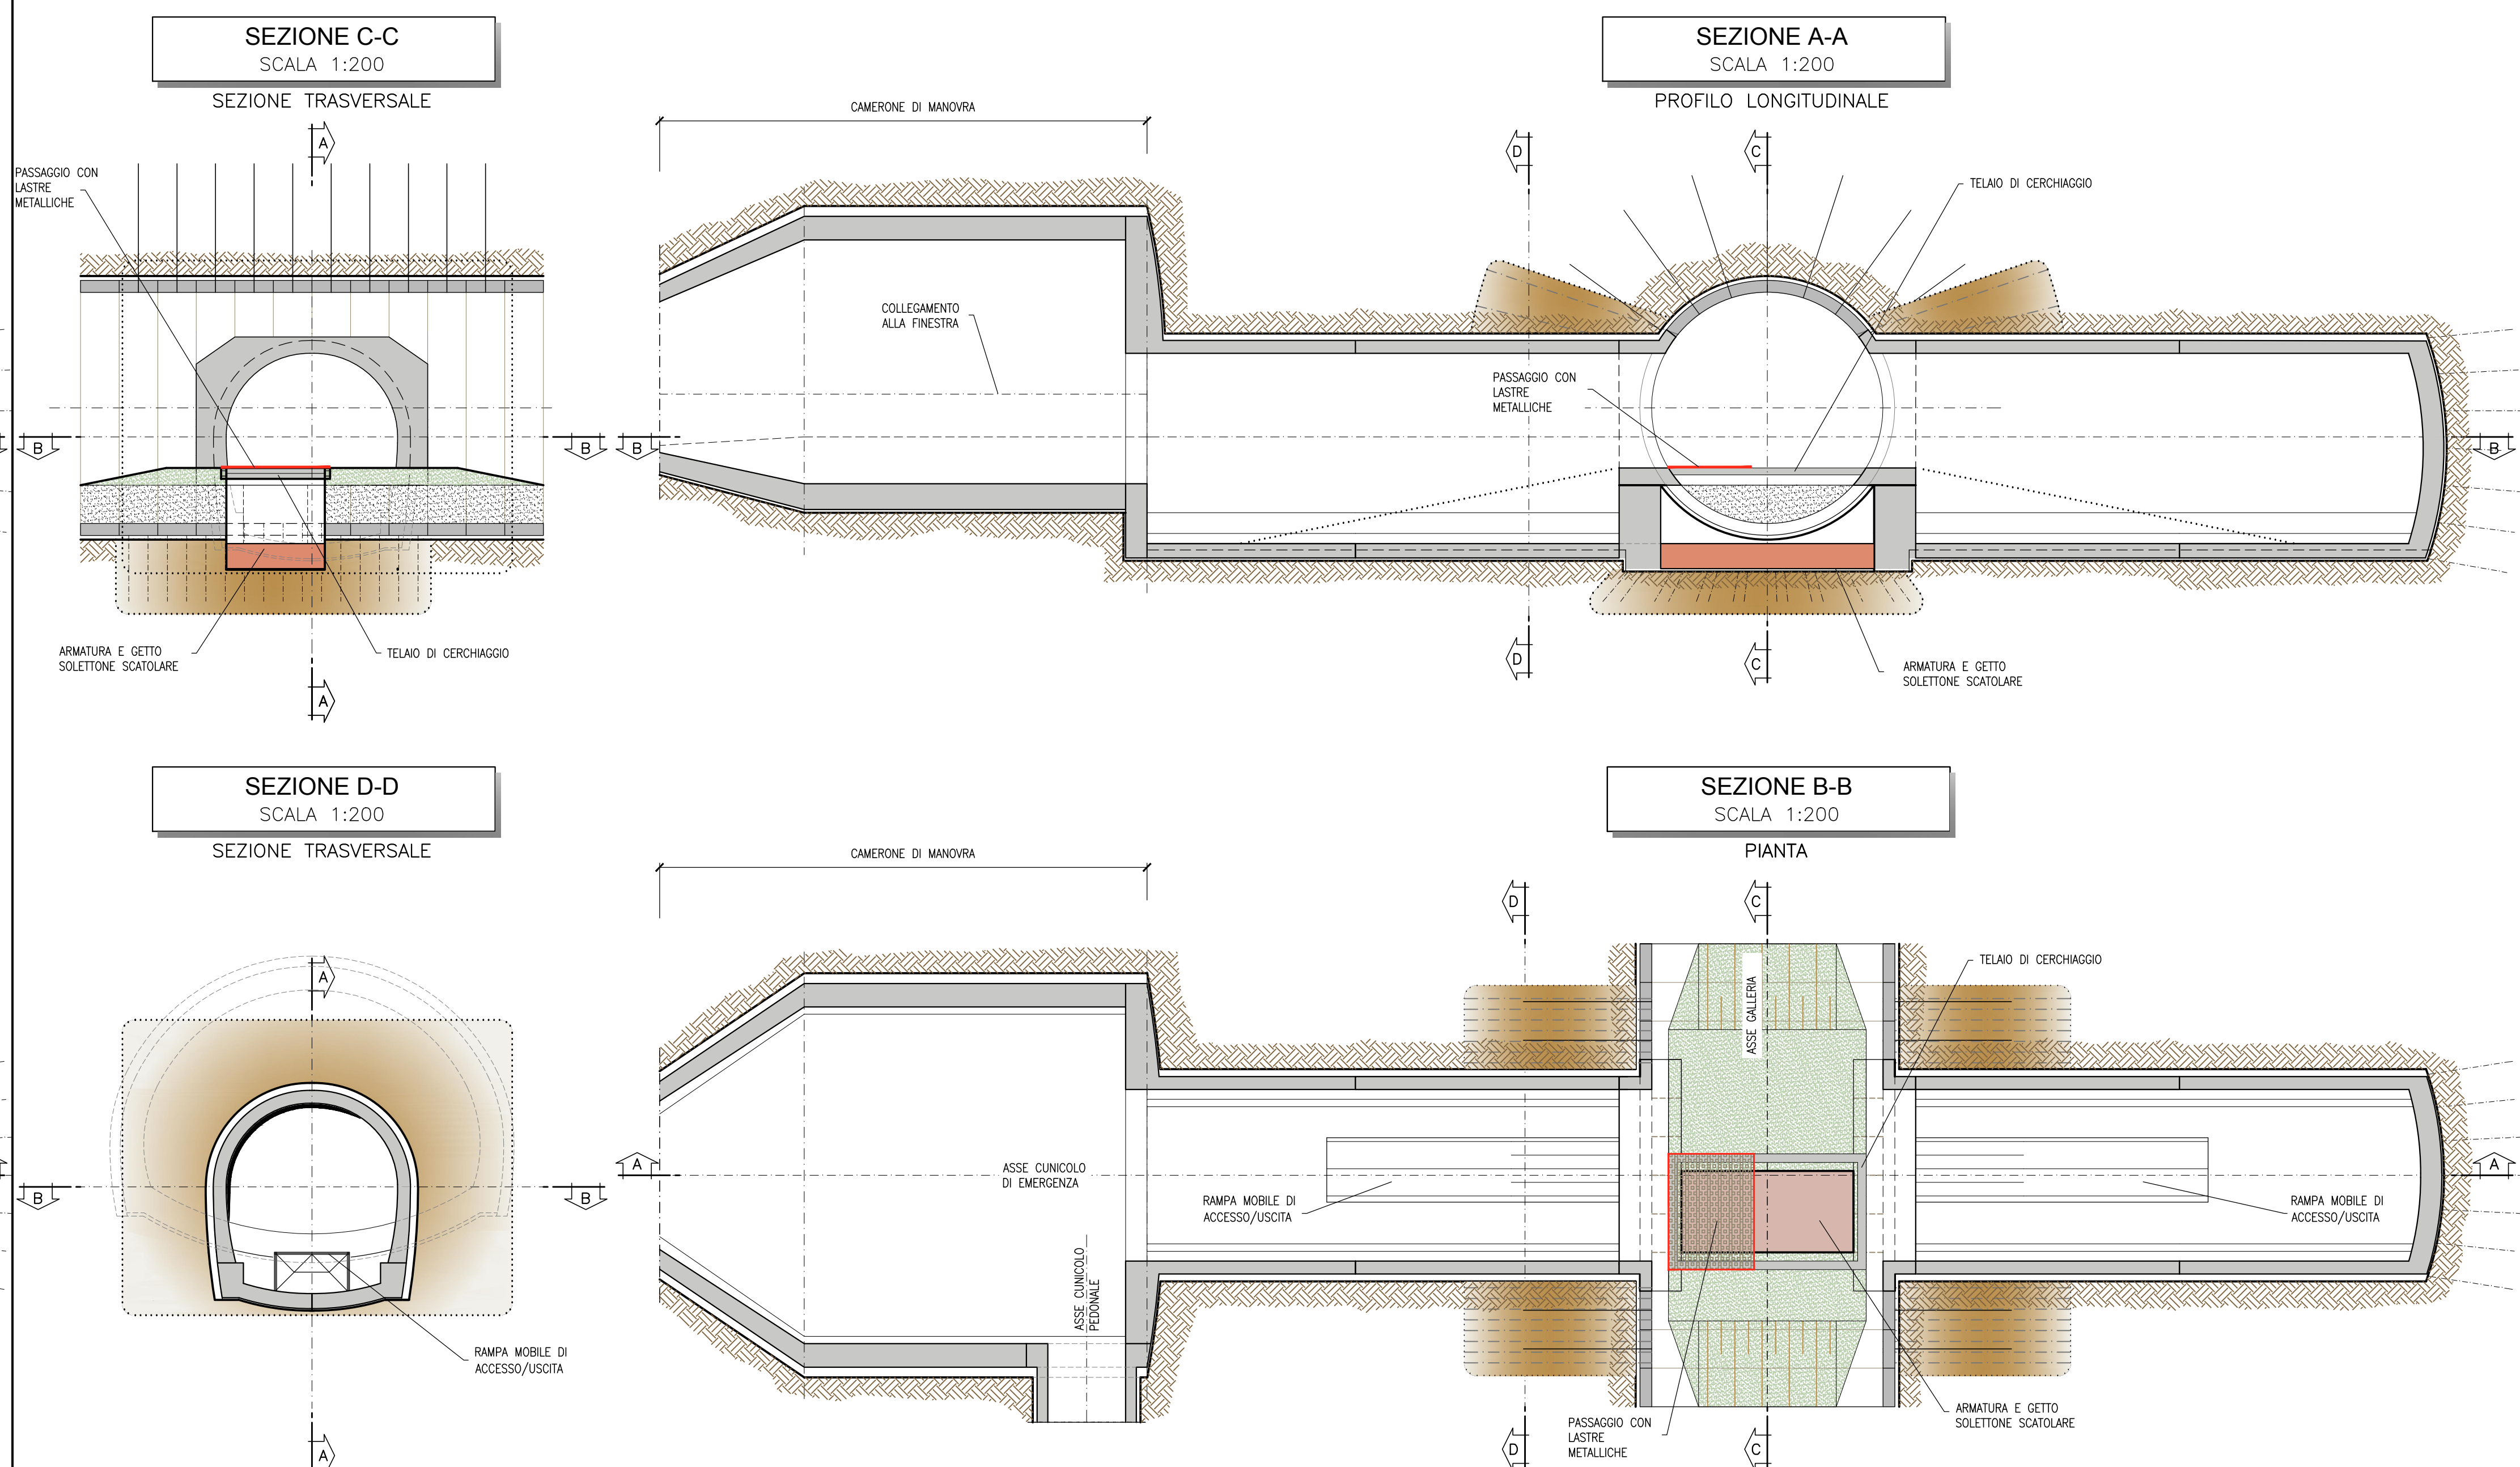

NOTA TABELLA MATERIALI

PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "F2801EZZSPGN000002"



COMMITTENTE: **RFI** R.F.E. FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV** SOCI: **salini impreglio** **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROK SOL** MANDATARI: **NETENGINEERING** **Alpina**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

GN01 - GALLERIA ROCCETTA - FINESTRA COSTRUTTIVA/USCITA DI EMERGENZA FS s/n 15+480 E CUNCIOLI PEDONALI s/n 15+475 (LATO BA) E 14+720 (LATO NA)

ZONA DI INNESTO CON GALLERIA DI LINEA AL KM 13+850

FASI ESECUTIVE

Planimetria, sezioni - Tav. 3/4

APPALTATORE Consorzio HIRPINIA AV 8 Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morone 15/06/2020	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile Integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casiani	PROGETTISTA ROK SOL Ing. G. Casiani
---	---	--

Rev.	Descrizione	Prodotto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Disegnato
A	Esecuzione per cantiere	M. Agrippone	21/03/2020	E. Spagnoli	21/03/2020	M. Gatti	21/03/2020	Ing. G. Casiani
B	Revisione per struttura	M. Agrippone	10/04/2020	E. Spagnoli	10/04/2020	M. Gatti	10/04/2020	

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

1 | F | 2 | 8 | 0 | 1 | E | Z | Z | D | A | G | N | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | B | 1:50

File: F2801EZZDAGN0000003B.dwg n.Elab.:
