



FASE 1

- PREDISPOSIZIONE PIANO DI LAVORO
- ESECUZIONE DELLA CHIODATURA RADIALE A SOSTEGNO DEI CONCI PREFABBRICATI DELLA GALLERIA
- ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO PREVENTIVO, LATERALE, PER IL FUTURO SCAVO DEGLI INNESTI
- ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO DALL'ALTO PER LO SCAVO DEL FUTURO PASSAGGIO PEDONALE

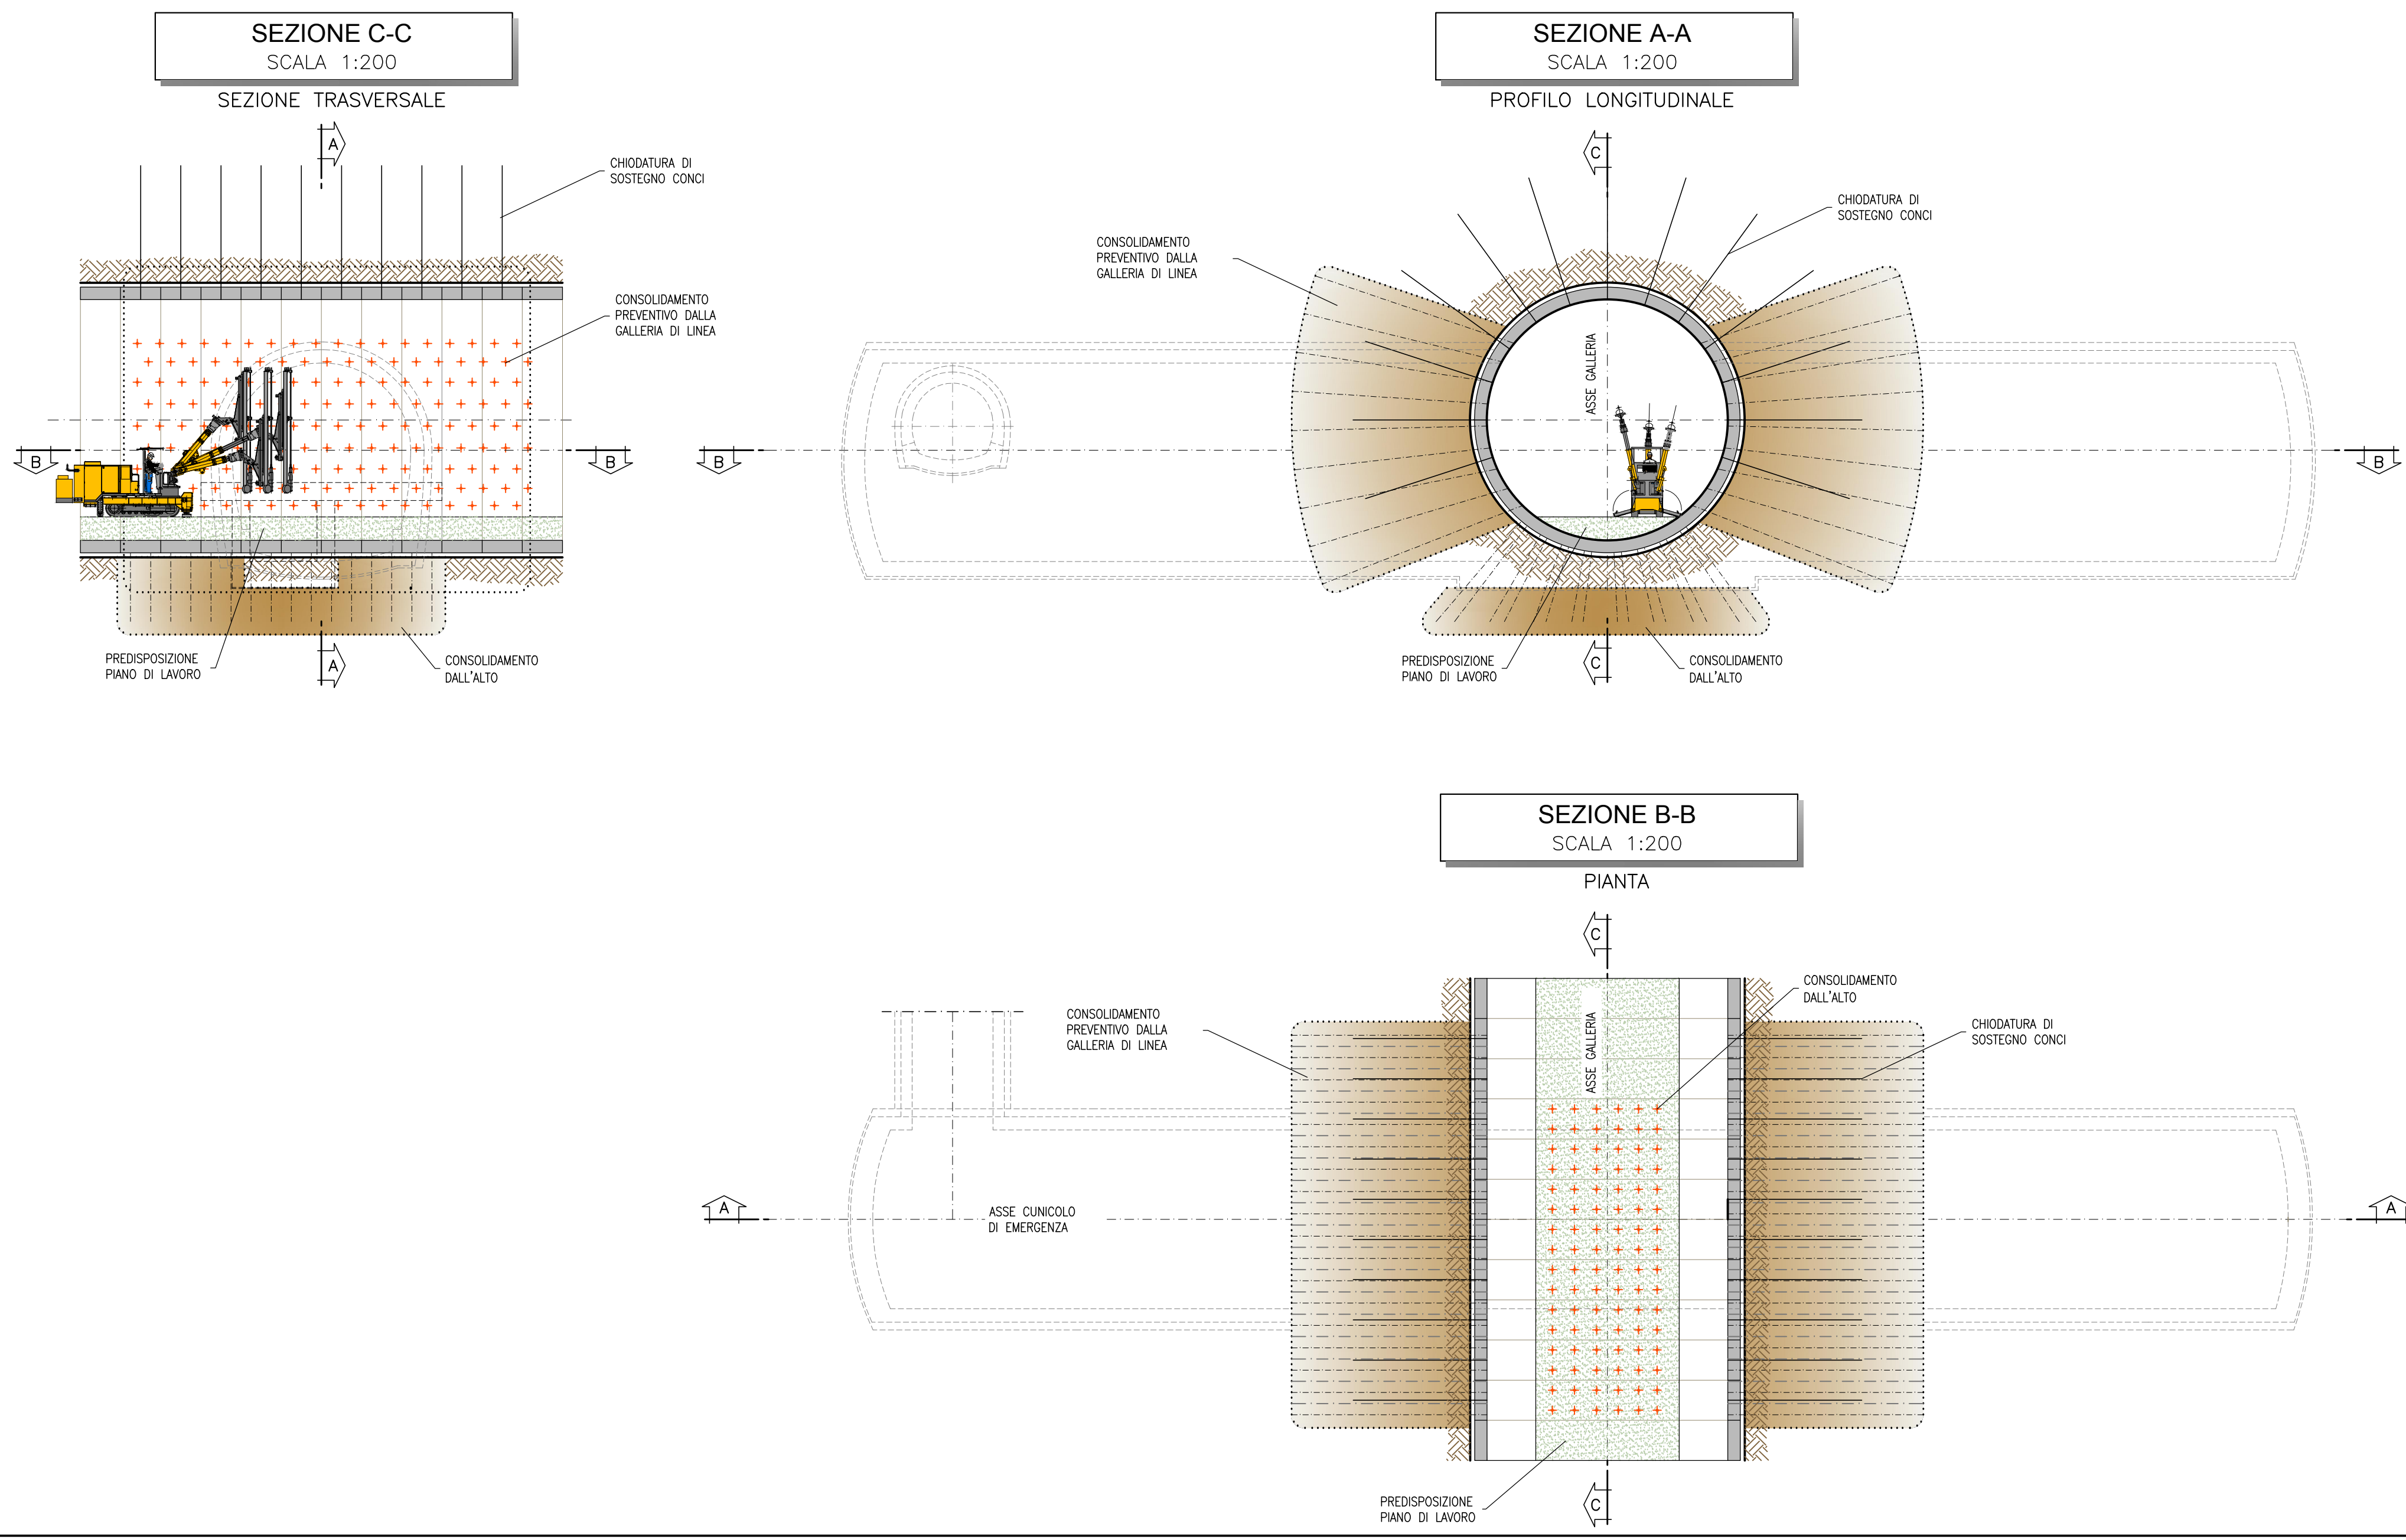


FASE 3

- DEMOLIZIONE DEI CONCI PREFABBRICATI E SCAVO PRIMO CAMPO DELLA GALLERIA LATERALE (PREFERIBILMENTE LATO FINISTRA, PER RENDERE FRUIBILE, QUANTO PRIMA, VIA DI ACCESSO ULTERIORE DALL'ESTERNO), POSA IN OPERA DEI PROFILATI METALLICI E DELLO SPRITZ-BETON
- ESECUZIONE CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (SOLO T3) E AL FRONTE PER IL FUTURO SCAVO DEL CAMPO D'AVVANZAMENTO DELLA GALLERIA LATERALE

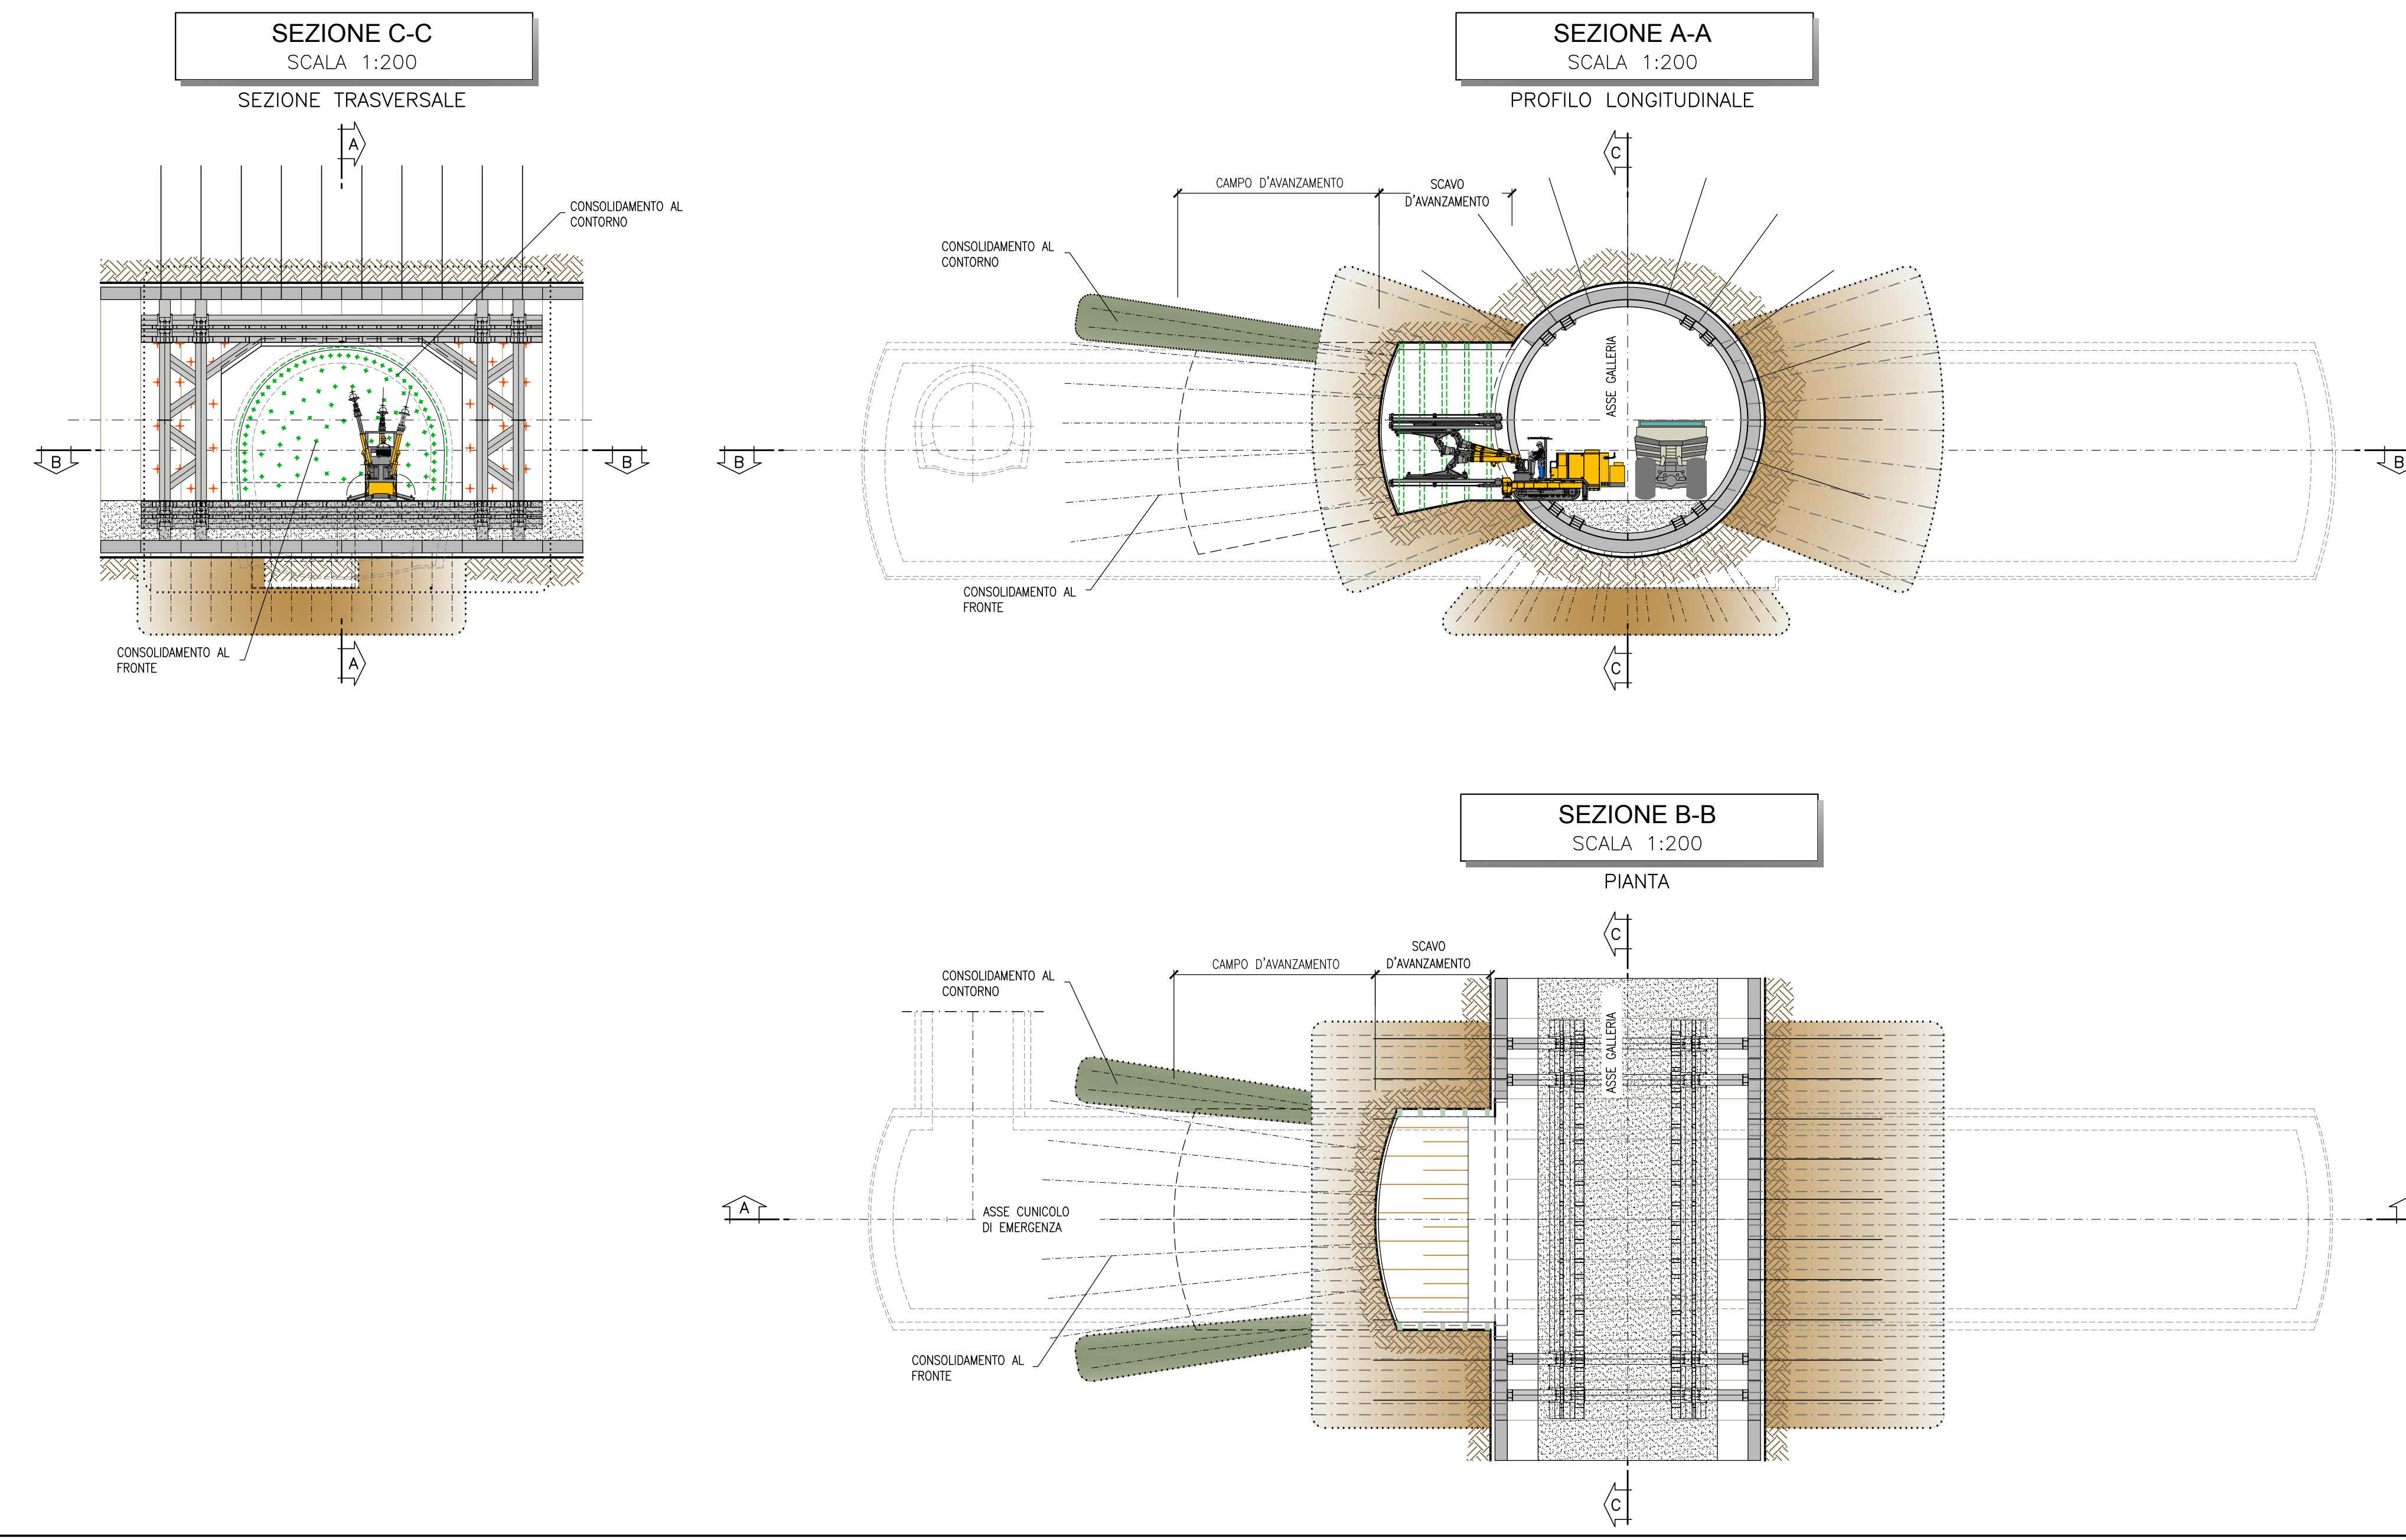


FASE 2

- INSTALLAZIONE DEL TELAIÒ REGGICONCI (CON PREDISPOSIZIONE PER DOPPIO ATTACCO INNESTI)
- PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO DI LAVORO A QUOTA ATTACCO INNESTO

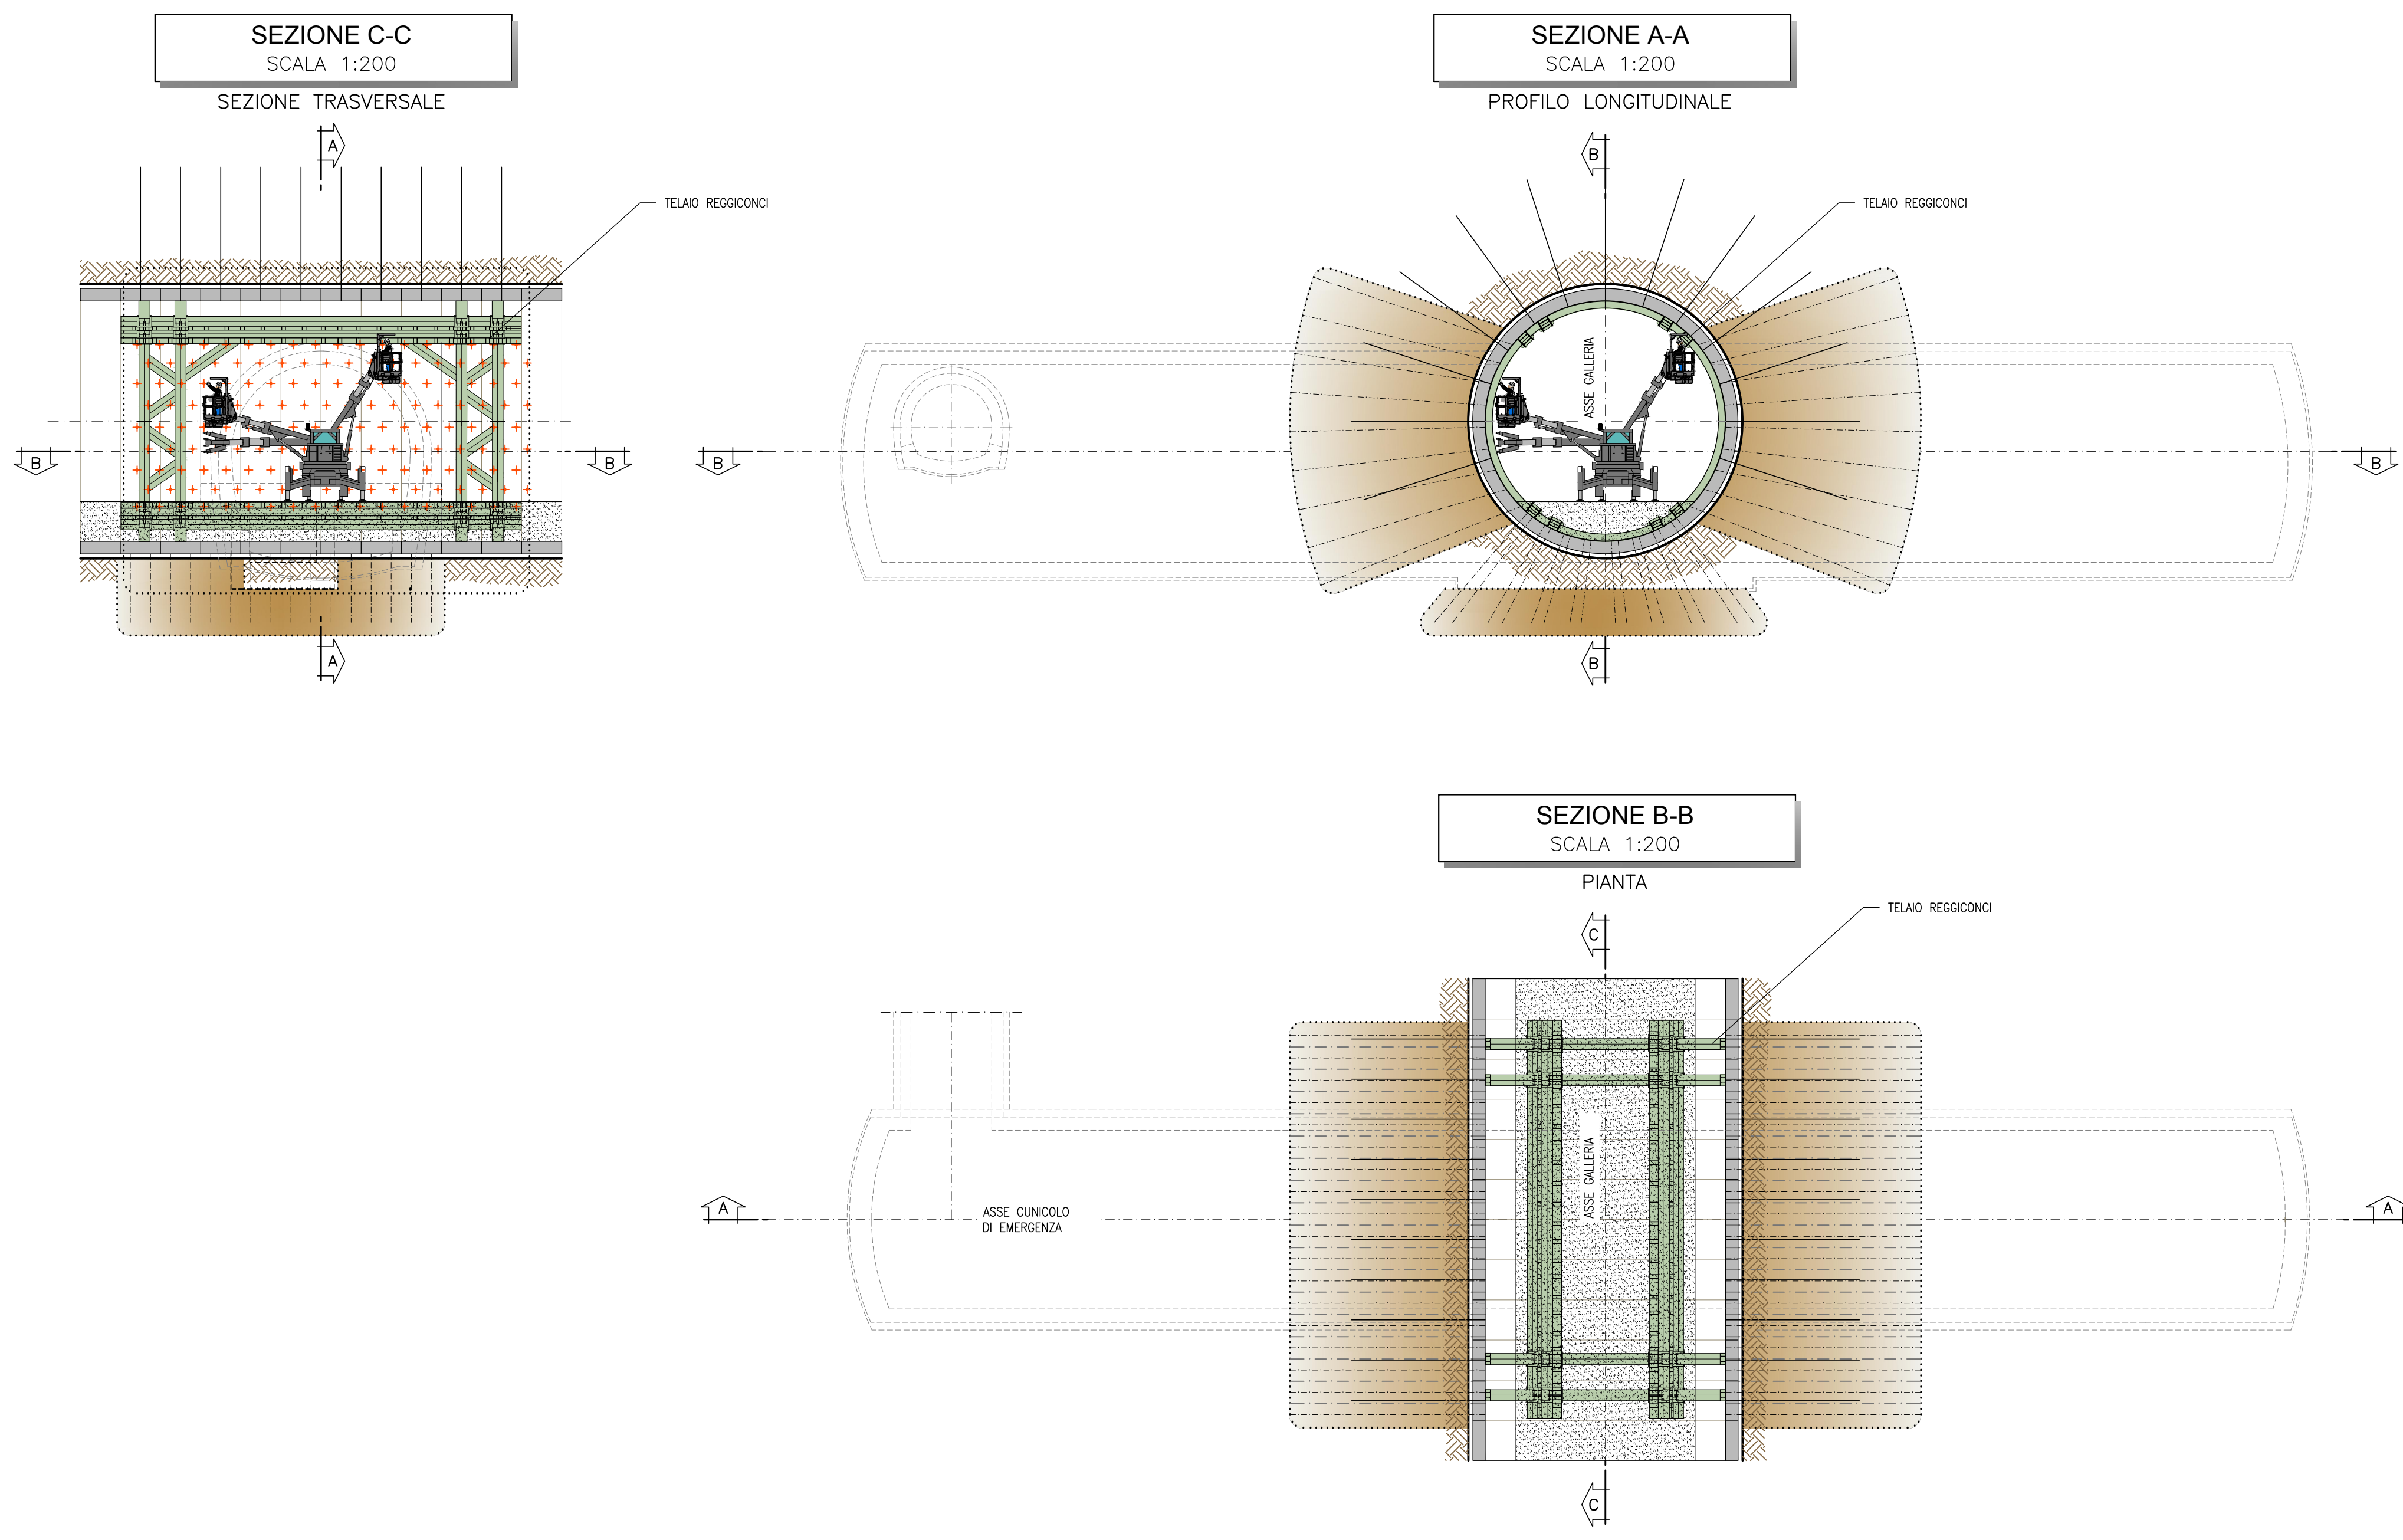

FASE 4

- SCAVO IN DISCESA DEL CAMPO DELLA GALLERIA LATERALE, POSA IN OPERA DEI PROFILATI METALLICI E DELLO SPRITZ-BETON
- CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (SOLO T3) E AL FRONTE PER IL FUTURO SCAVO DEL SUCCESSIVO CAMPO DELLA GALLERIA LATERALE

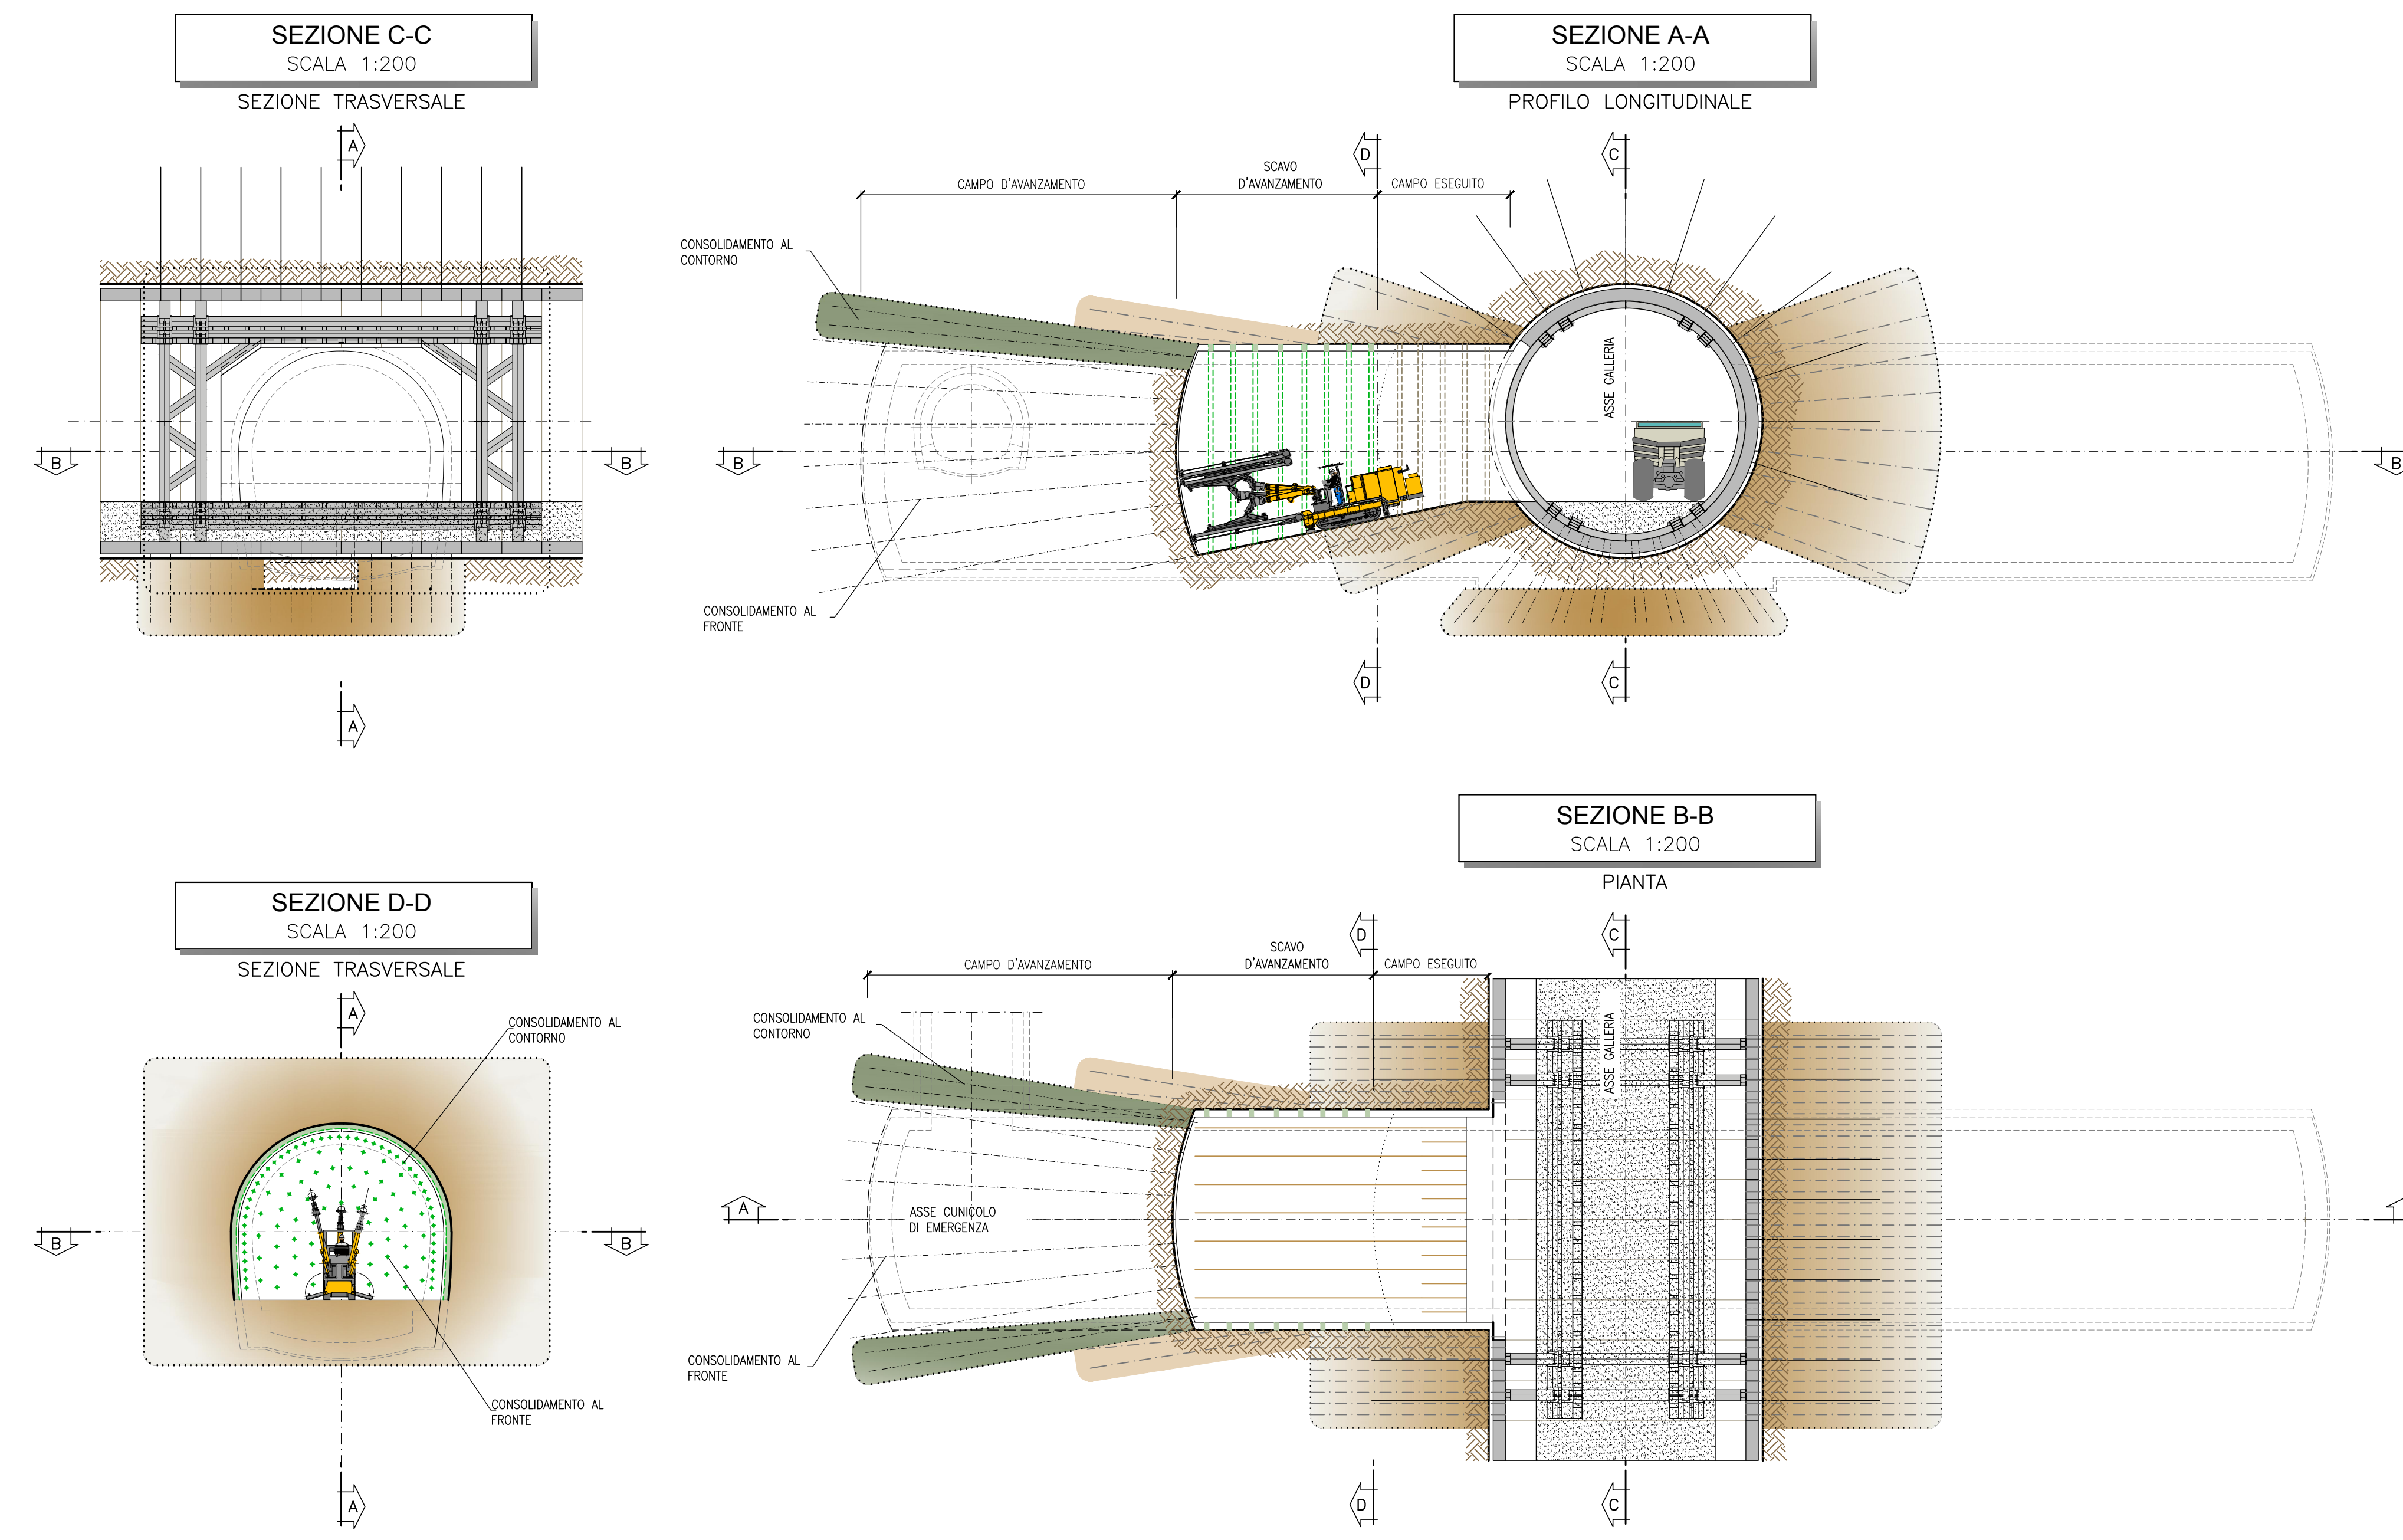

NOTA TABELLA MATERIALI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "IF2801EZZSPGN000002"



COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE ITALIANE
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV** SOCI: **salini impregio**, **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROCK SOIL** s.p.a. MANDANTI: **NET ENGINEERING**, **Alpina**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

ING. - GALLERIA RICCIOLETTA - FINESTRA COSTRUTTIVA USATA DI EMERGENZA FER (A 13+85) E CUNCILOLO PEDONALI (A 12+85) (LATO BA) E (A 14+725) (LATO NA)

ZONA DI INNESTO CON GALLERIA DI LINEA AL KM 14+725 (LATO NA)

FASI ESECUTIVE
Planimetria, sezioni - Tav. 1/4

APPALTATORE Conorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morone 10080000	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie proiezioni specialistiche Ing. G. Casari	PROGETTISTA ROCK SOIL s.p.a. Ing. G. Casari
---	---	--

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	DA	GN0900	021	B	1:50

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	M. Augamento	10/06/2020	B. Stignetti	10/06/2020	M. Gatti	10/06/2020	Ing. G. Casari
B	Revisione per sottile	M. Augamento	10/06/2020	B. Stignetti	10/06/2020	M. Gatti	10/06/2020	

File: IF2801EZZDAGN09000218.dwg n. Elab. -
