



FASE 1

- PREDISPOSIZIONE PIANO DI LAVORO
- ESECUZIONE DELLA CHIODATURA RADIALE A SOSTEGNO DEI CONCI PREFABBRICATI DELLA GALLERIA
- ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO PREVENTIVO, LATERALE, PER IL FUTURO SCAVO DEGLI INNESTI
- ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTO DALL'ALTO PER LO SCAVO DEL FUTURO PASSAGGIO PEDONALE

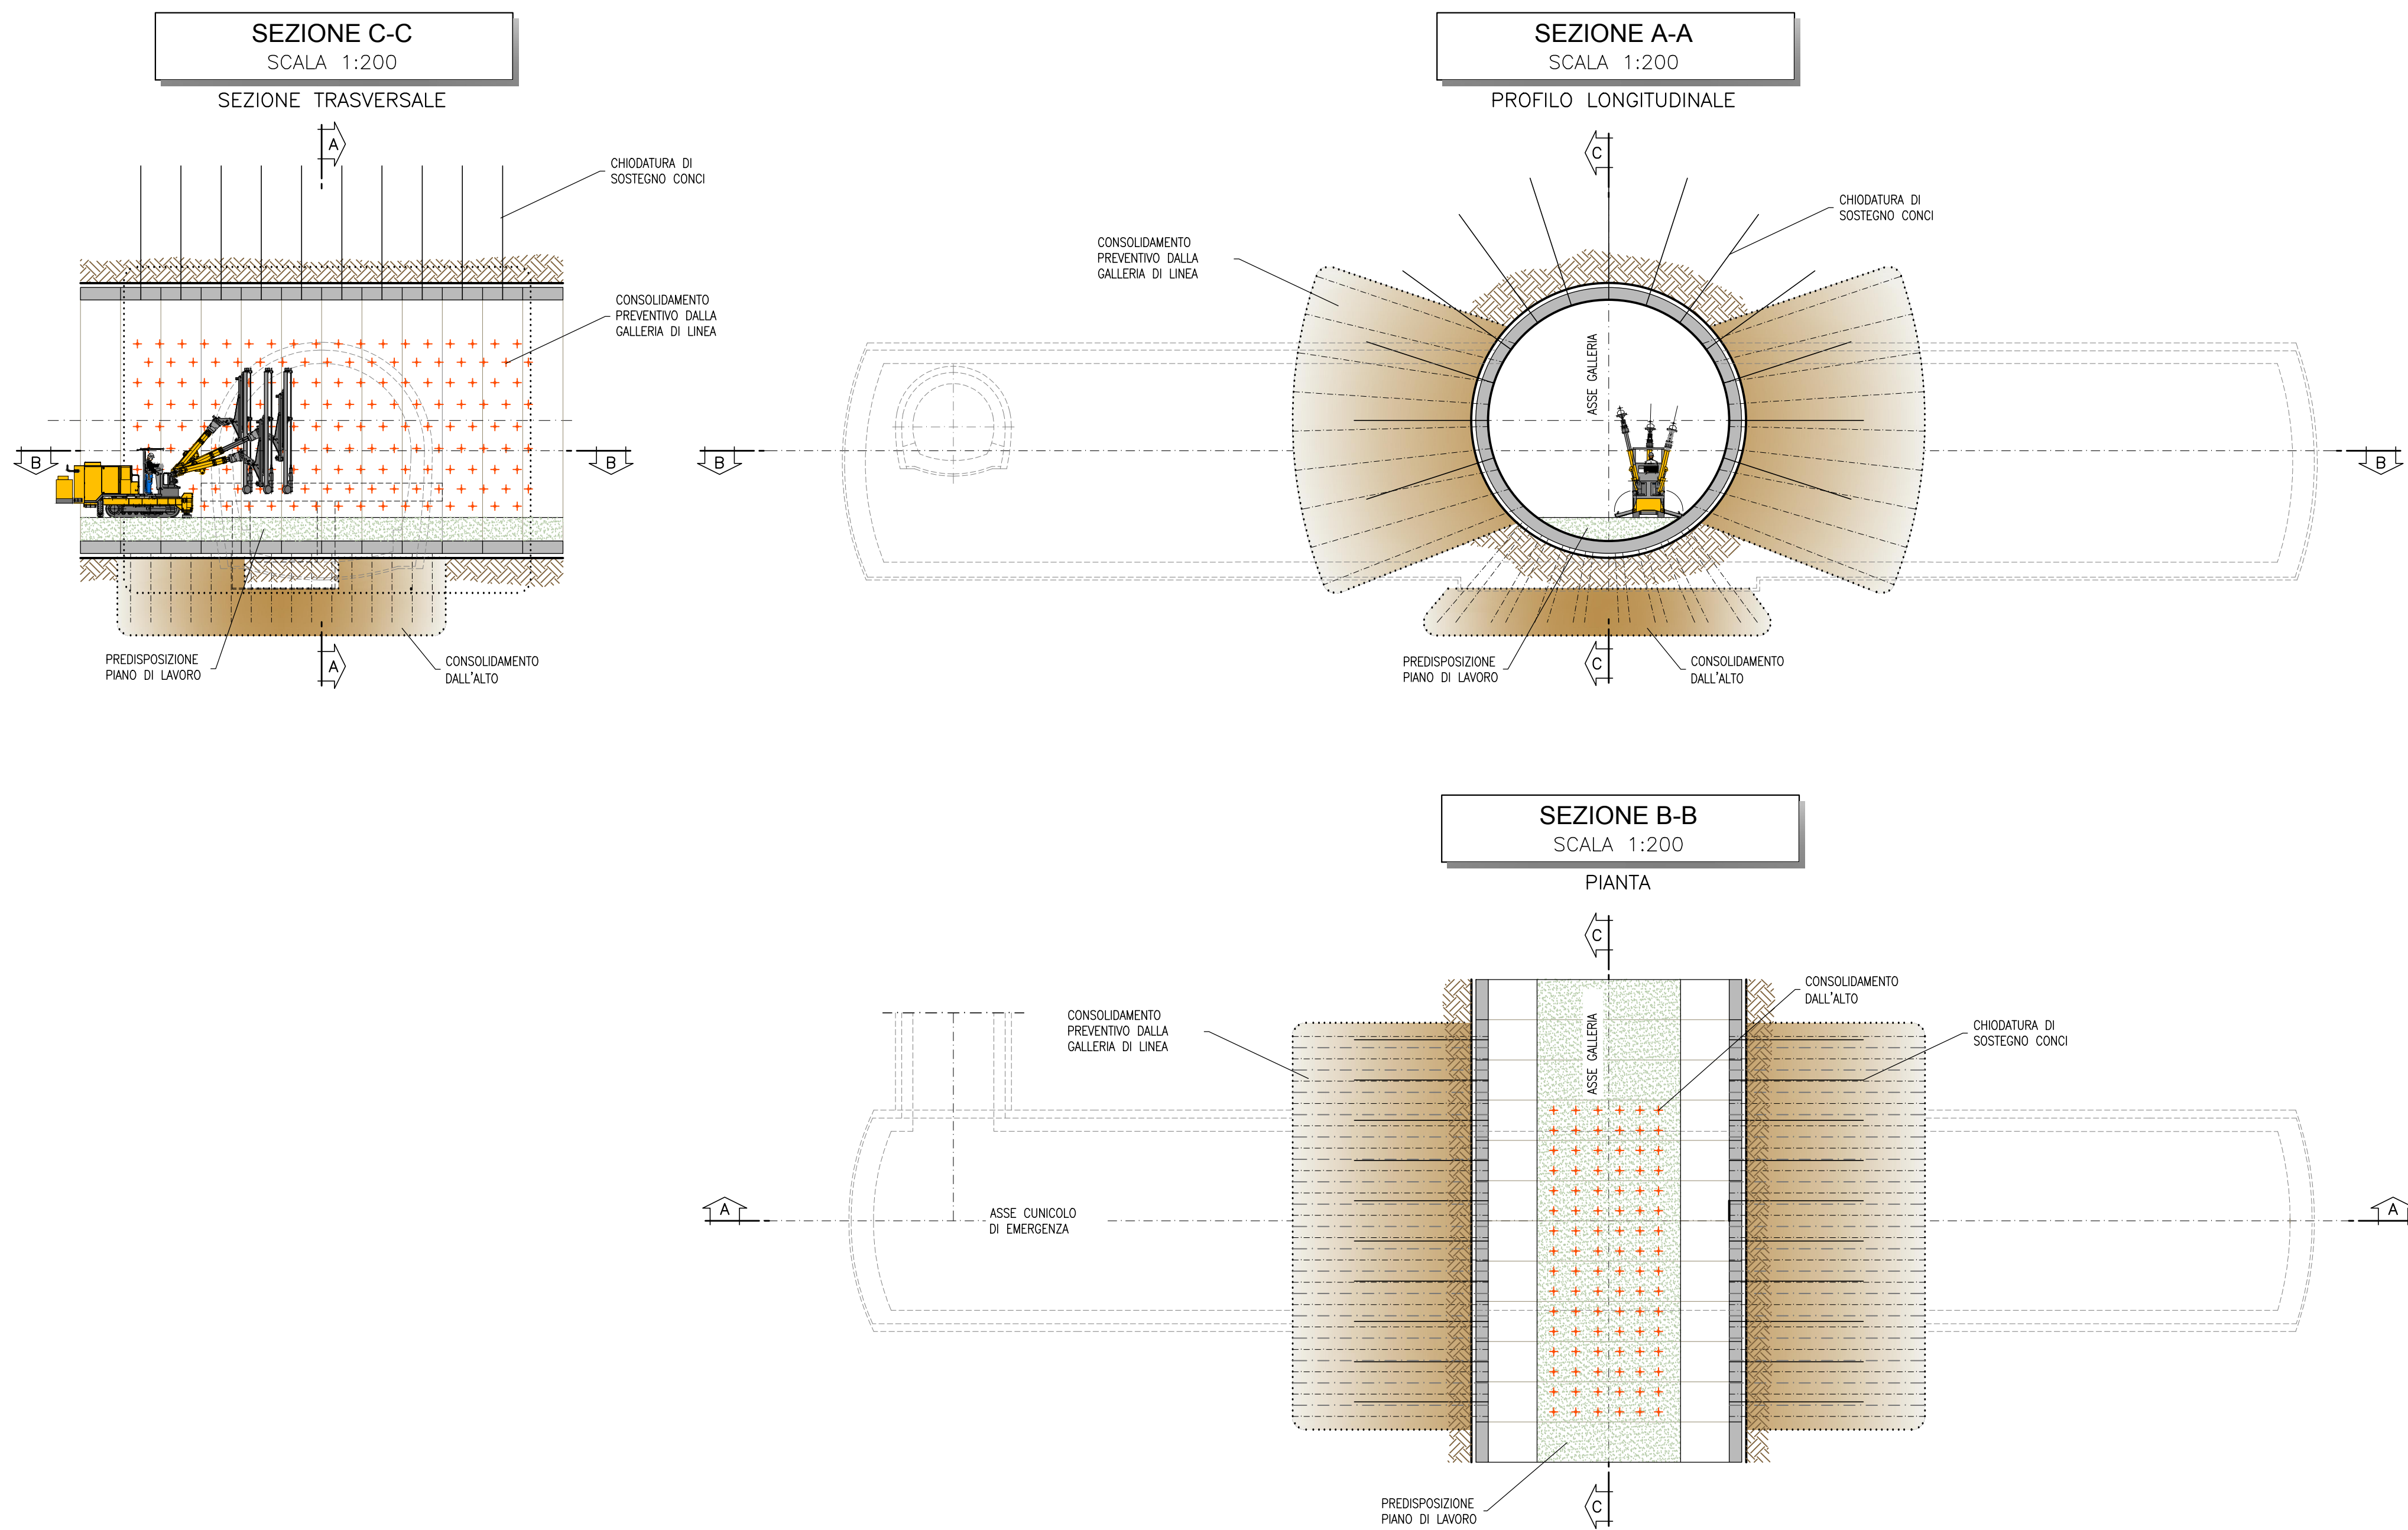


FASE 3

- DEMOLIZIONE DEI CONCI PREFABBRICATI E SCAVO PRIMO CAMPO DELLA GALLERIA LATERALE (PREFERIBILMENTE LATO FINISTRA, PER RENDERE FRUIBILE, QUANTO PRIMA, VIA DI ACCESSO ULTERIORE DALL'ESTERNO), POSA IN OPERA DEI PROFILATI METALLICI E DELLO SPRITZ-BETON
- ESECUZIONE CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (SOLO T3) E AL FRONTE PER IL FUTURO SCAVO DEL CAMPO D'AVANZAMENTO DELLA GALLERIA LATERALE

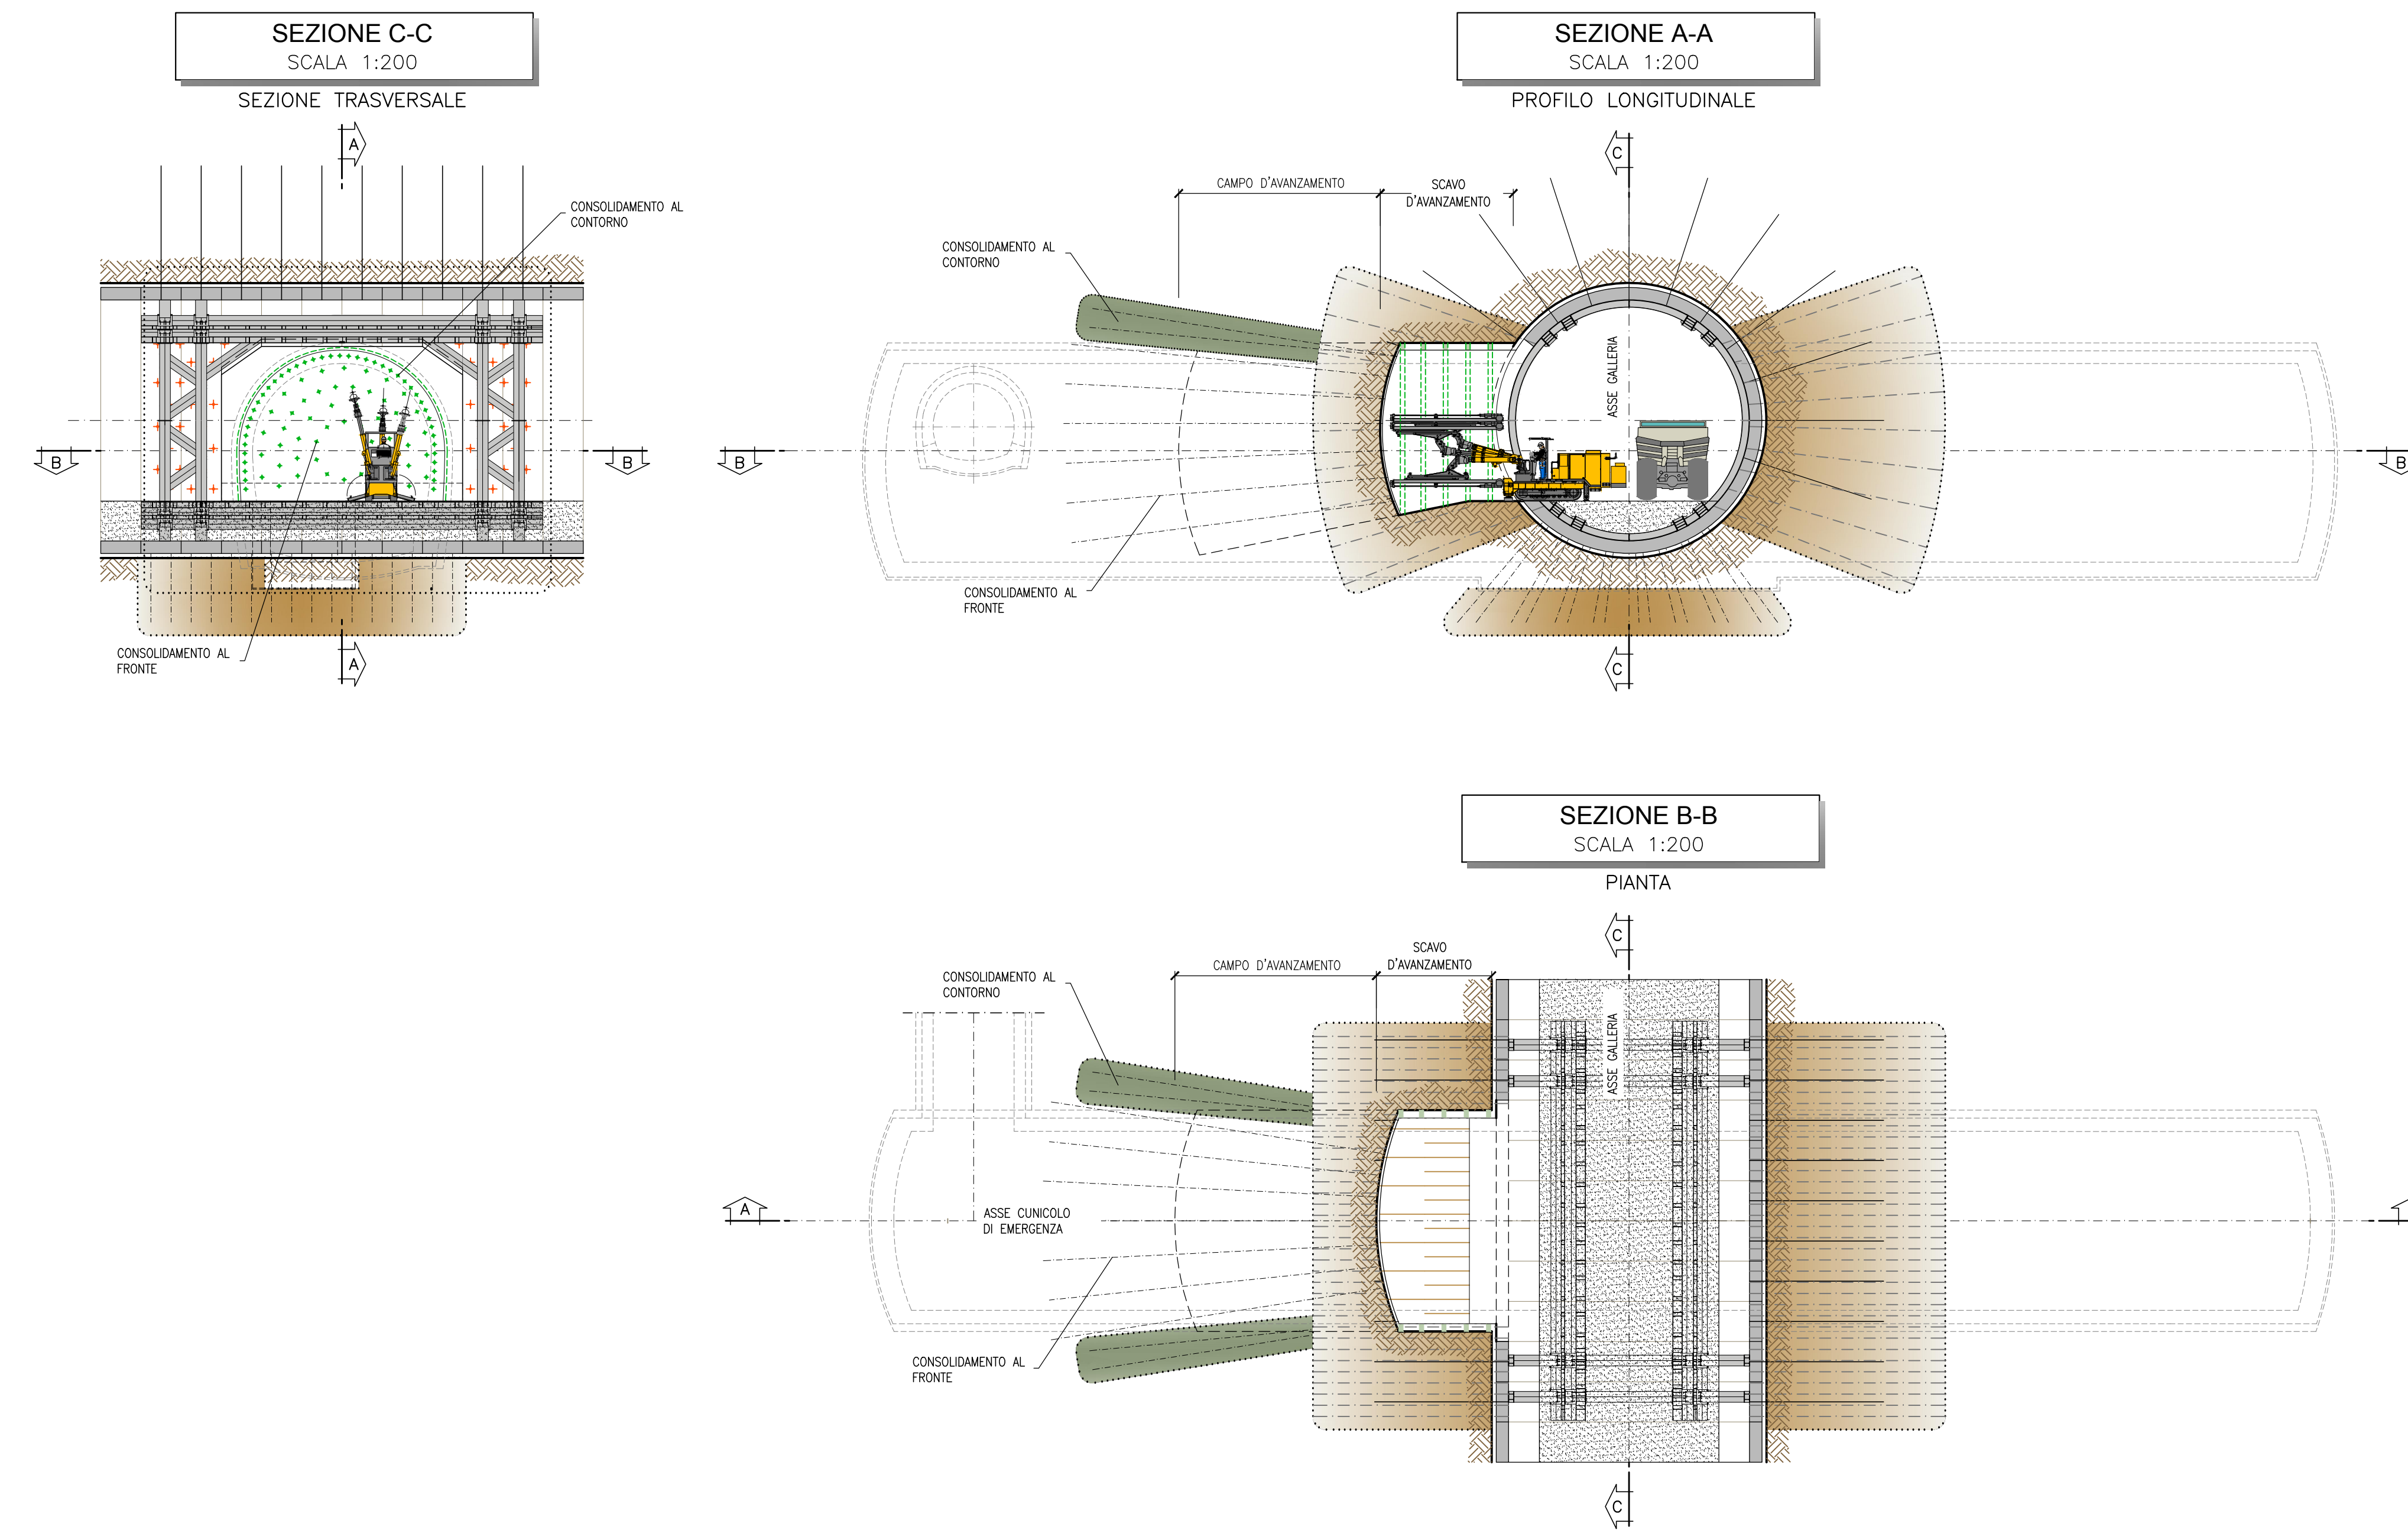


FASE 2

- INSTALLAZIONE DEL TELAIO REGGICONCI (CON PREDISPOSIZIONE PER DOPPIO ATTACCO INNESTI)
- PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO DI LAVORO A QUOTA ATTACCO INNESTO

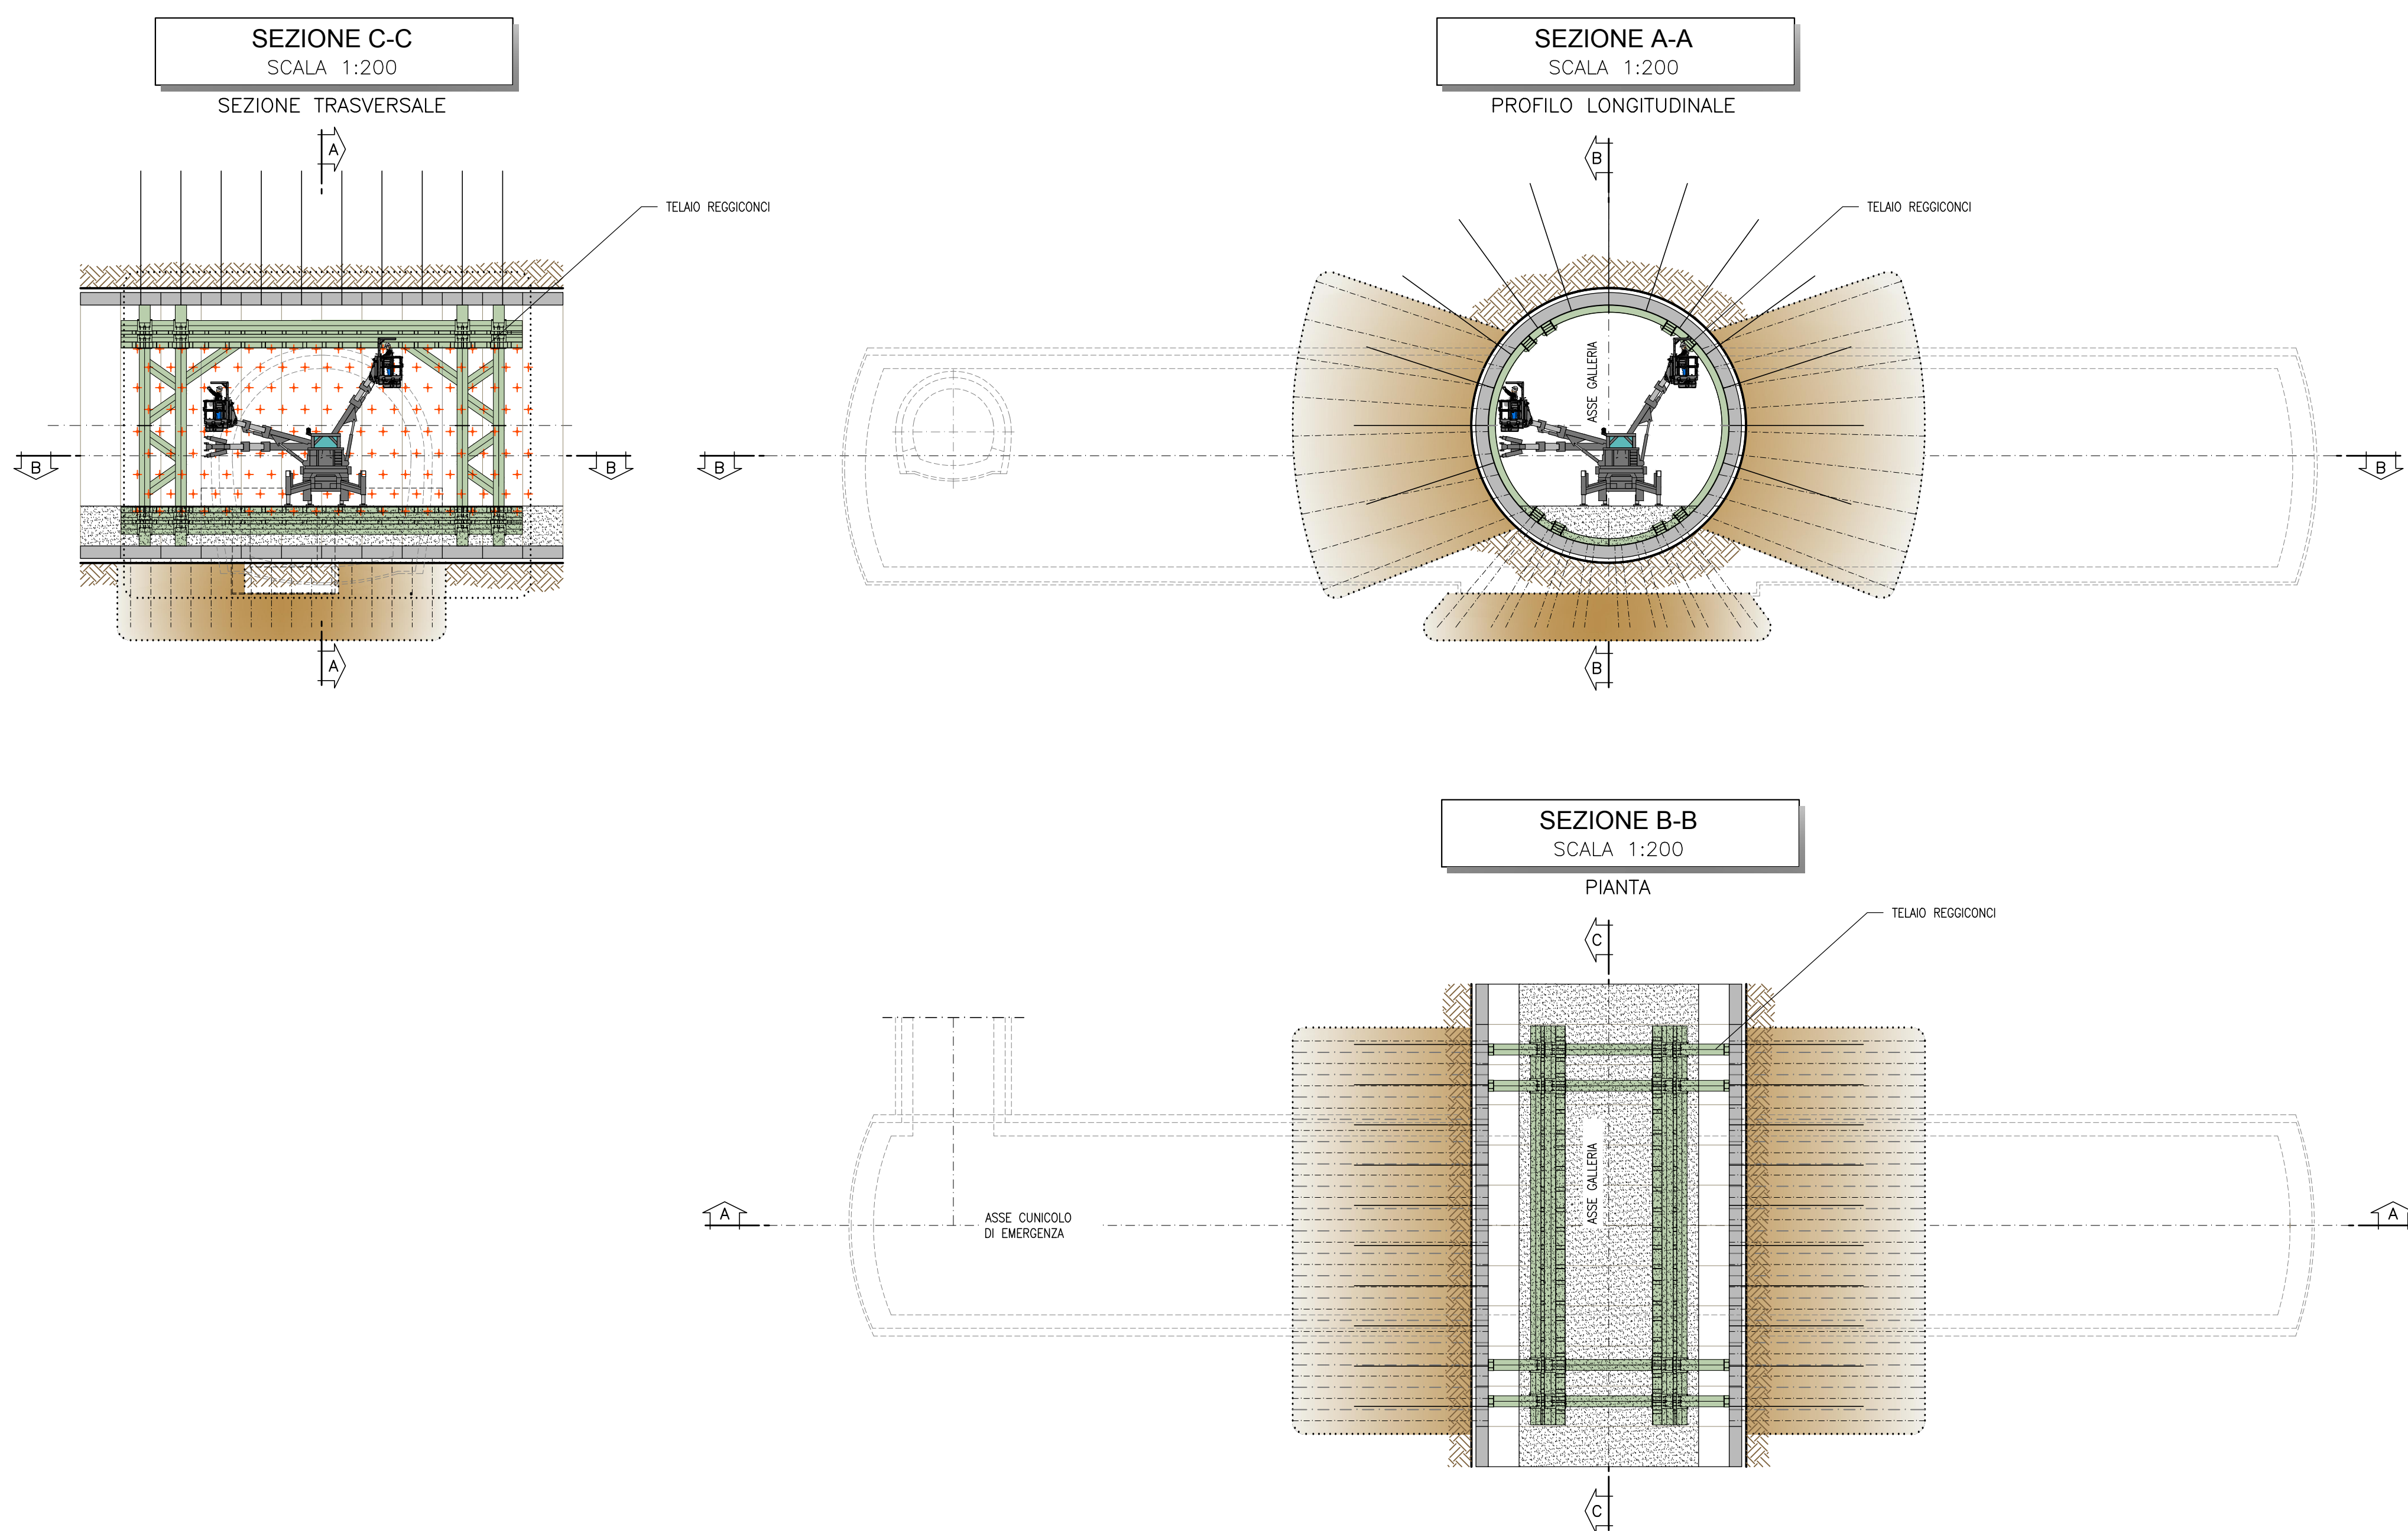


FASE 4

- SCAVO IN DISCESA DEL CAMPO DELLA GALLERIA LATERALE, POSA IN OPERA DEI PROFILATI METALLICI E DELLO SPRITZ-BETON
- CONSOLIDAMENTO AL CONTORNO (SOLO T3) E AL FRONTE PER IL FUTURO SCAVO DEL SUCCESSIVO CAMPO DELLA GALLERIA LATERALE

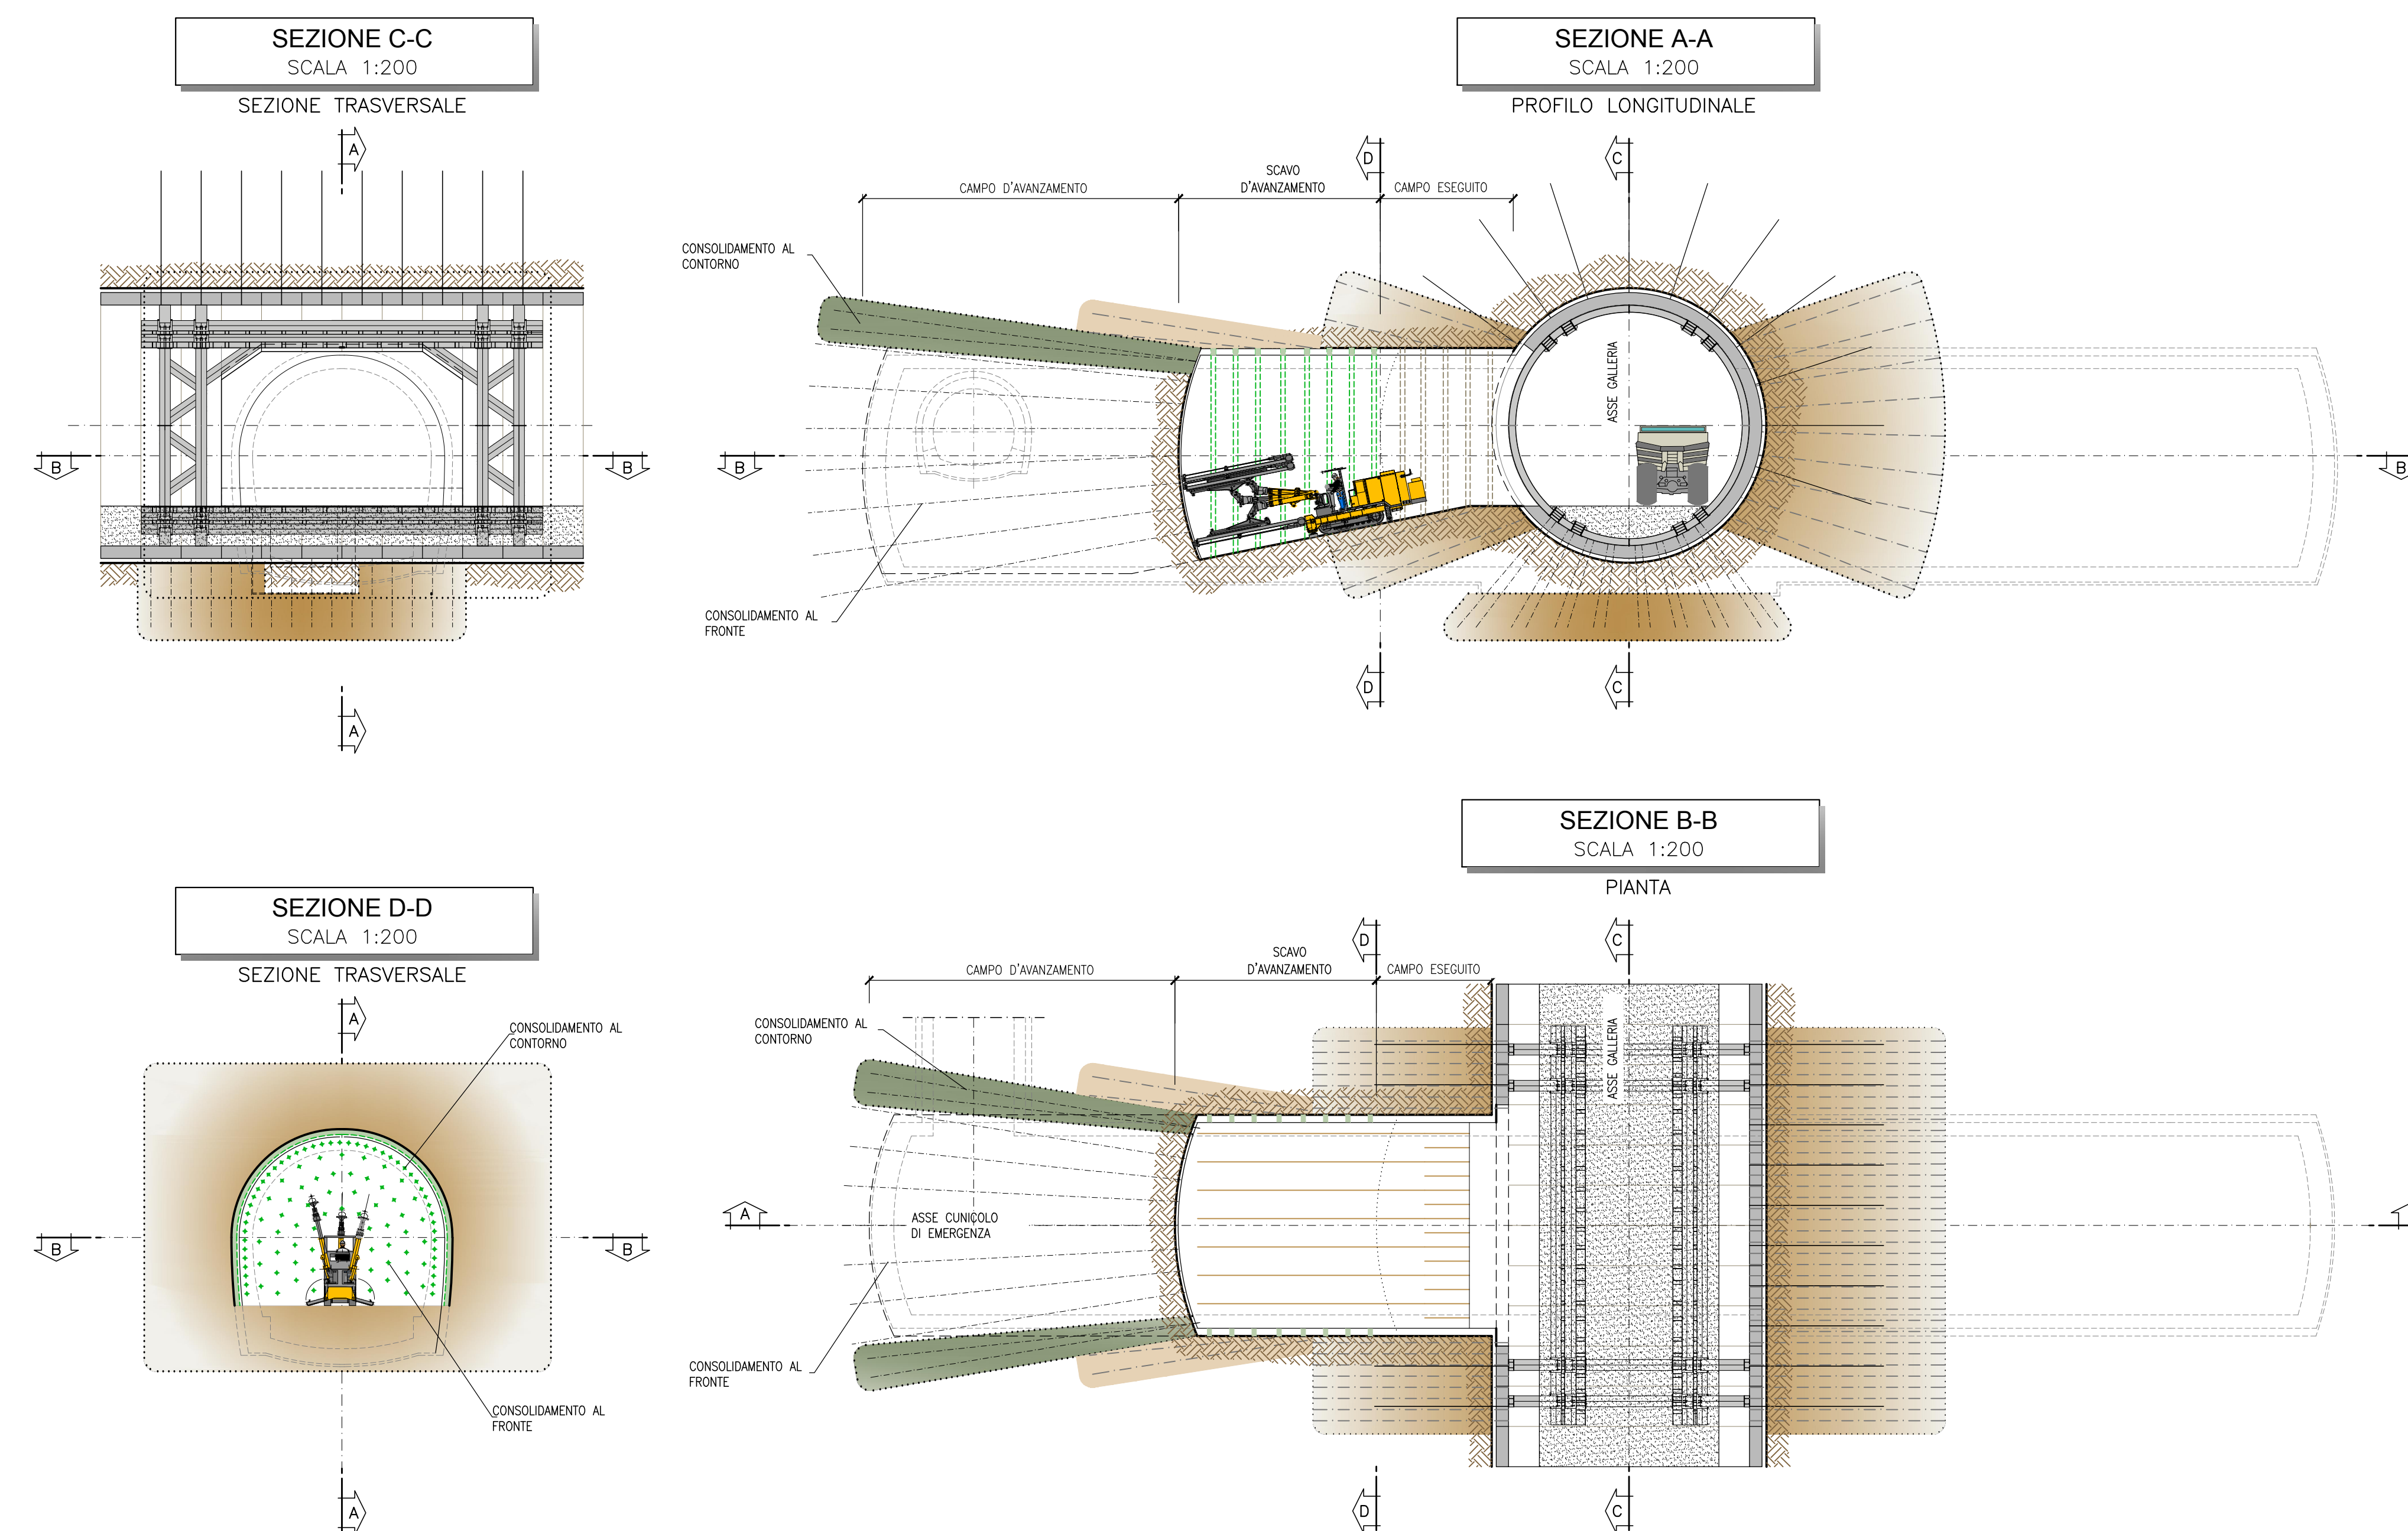

NOTA TABELLA MATERIALI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "IF2801EZZSPGN000002"



COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV** CONSORZIO HIRPINIA-AV
 SOCI: **salini impregio** **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL S.p.A.** MANDANTE: **NETENGINEERING** **Alpina S.p.A.**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
 GN10 - GALLERIA ROCCHETTA - USCITA DI EMERGENZA PEDONALE F7 pk 15+700
 ZONA DI INNESTO CON GALLERIA DI LINEA AL KM 15+700
 FASI ESECUTIVE
 Planimetria, sezioni - Tav. 1/4

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione per consegna	M. Casali	21/03/2020	B. Spignelli	21/03/2020	M. Casali	21/03/2020	Ing. G. Cassani	
B	Revisione per struttura	M. Casali	04/04/2020	B. Spignelli	04/04/2020	M. Casali	04/04/2020		19/03/2020

File: IF2801EZZDAGN1000001B.dwg n. Elab.: -
