



FASE 5

- SCAVO IN DISCESA DELL'ULTIMO CAMPO DELLA GALLERIA LATERALE, POSA IN OPERA DEI PROFILATI METALLICI E DELLO SPRITZ-BETON

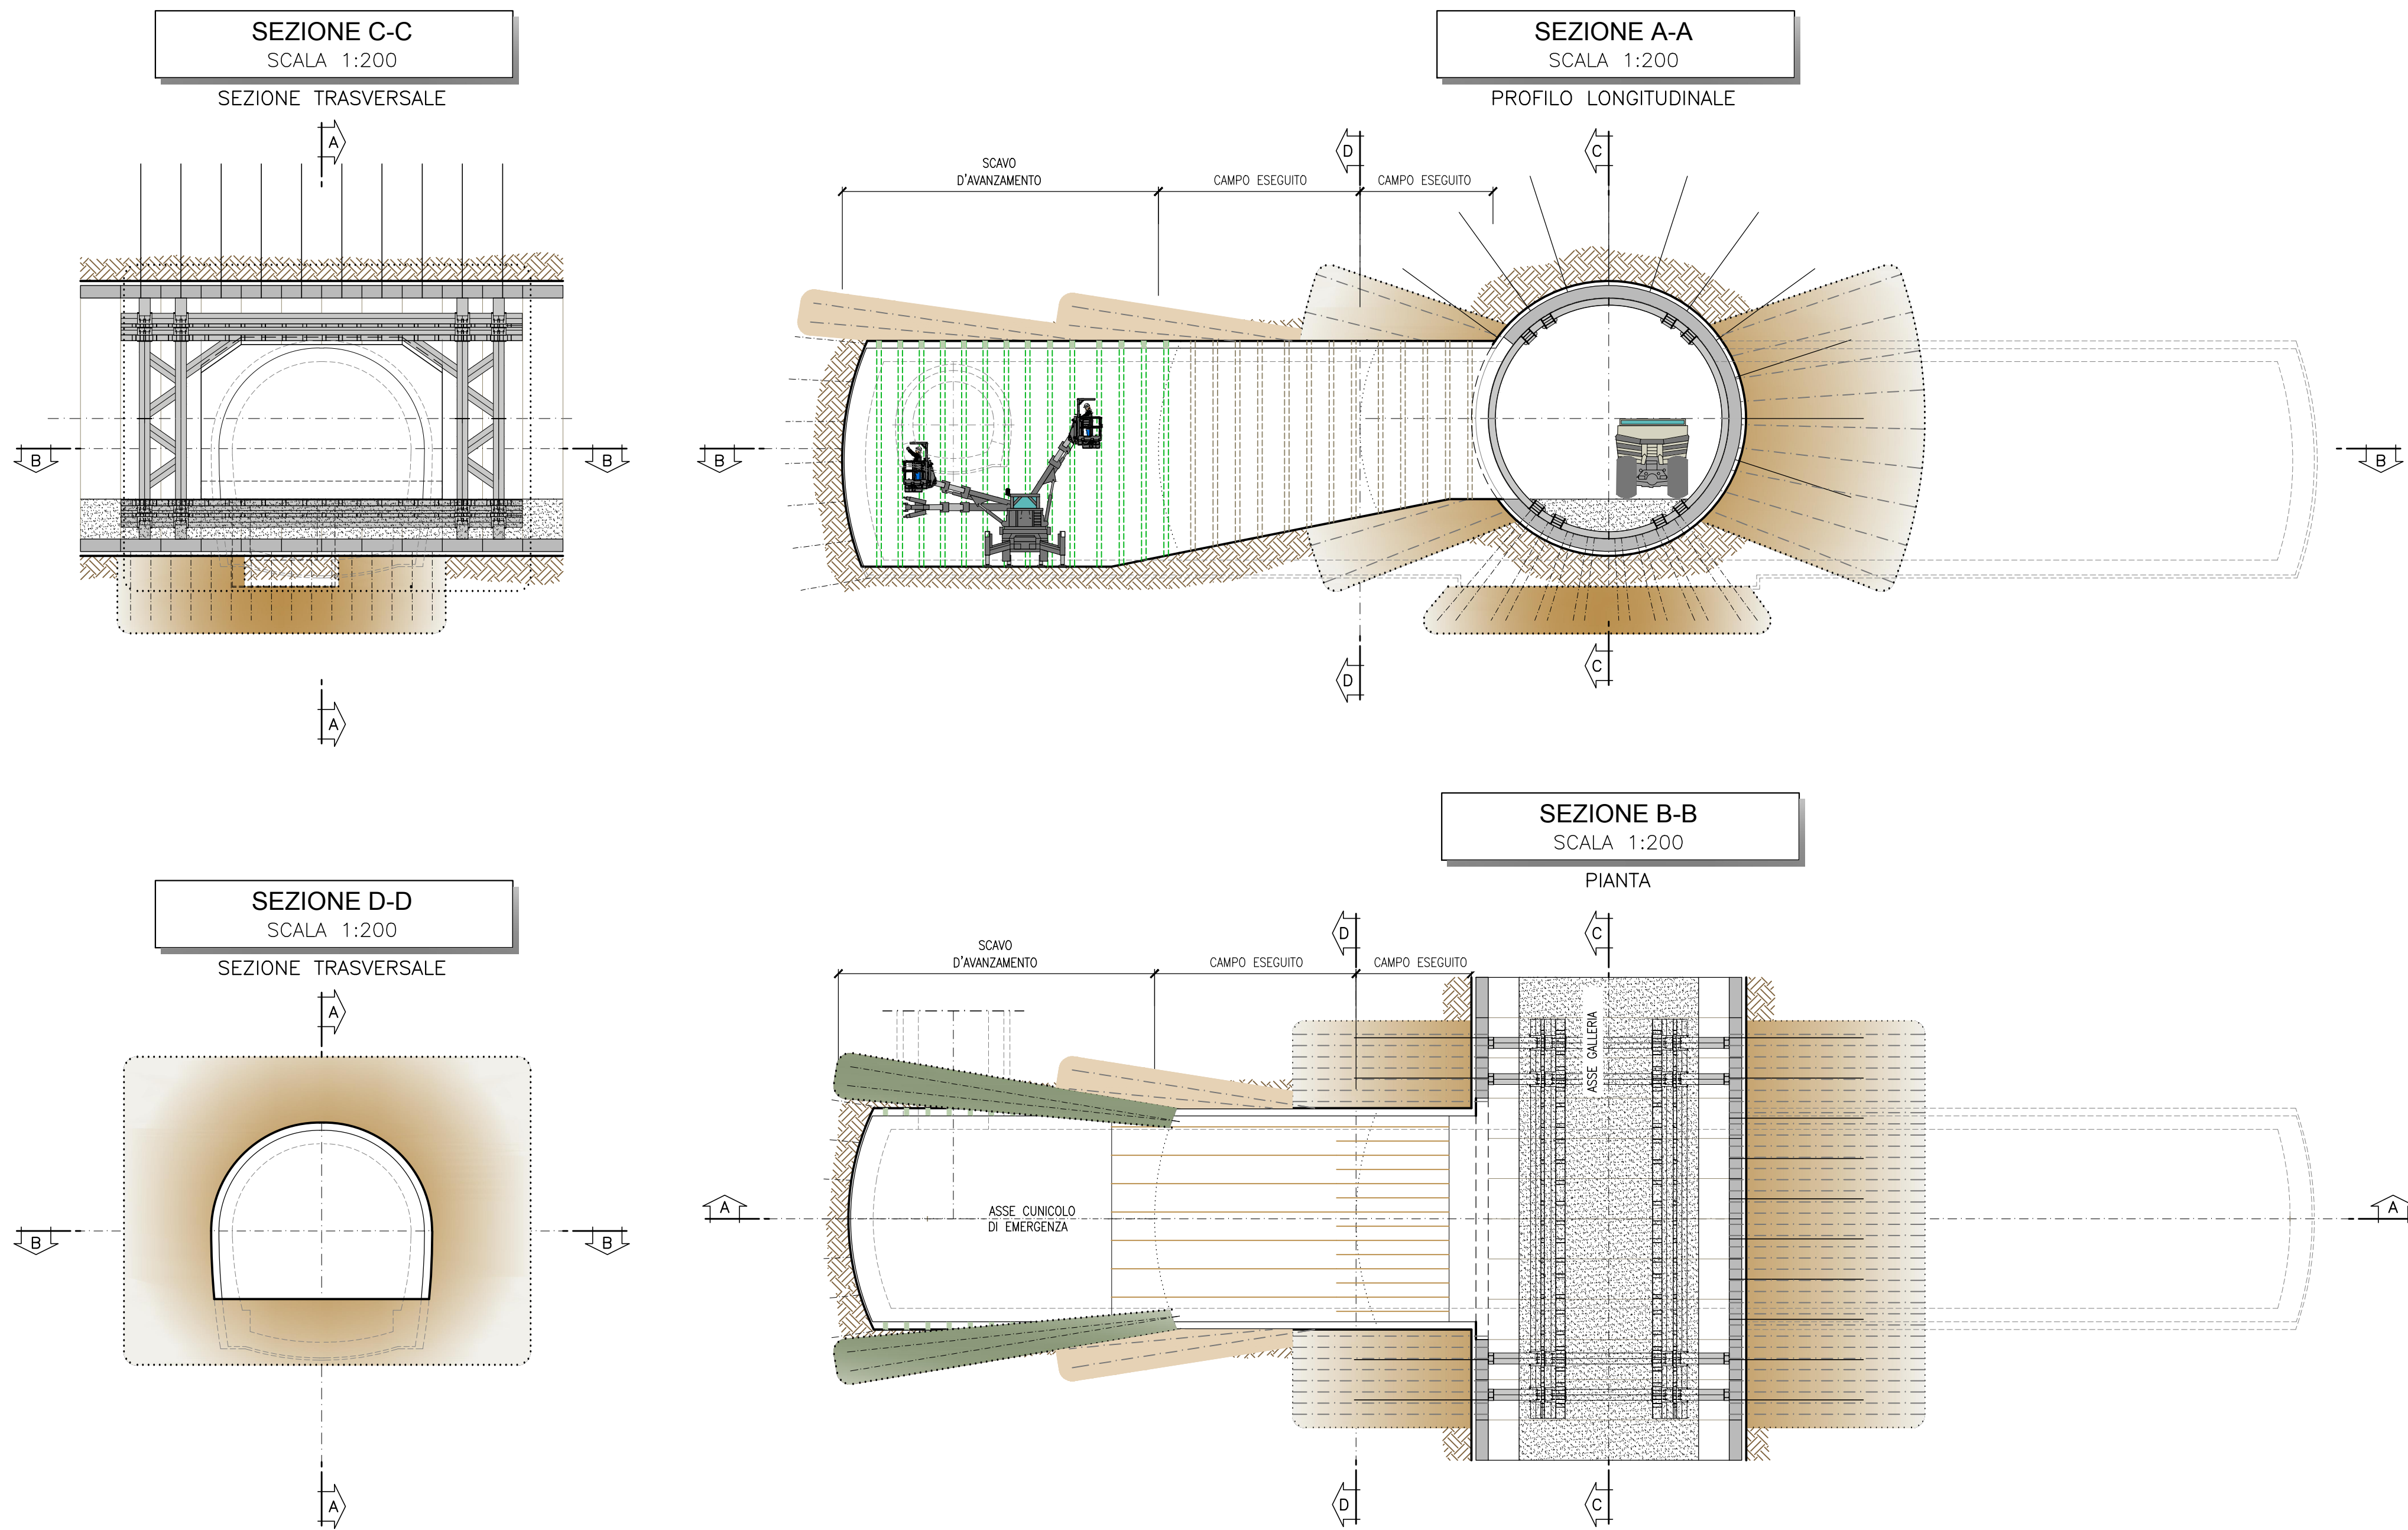


FASE 7

- POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE E DELL'ARMATURA
- GETTO ARCO ROVESCIO, MURETTE, PIEDRITI E CALOTTA DALL'ULTIMO CAMPO VERSO LA GALLERIA DI LINEA LASCIANDO UN RISPARMIO NEL GETTO IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO DELLA FINESTRA
- SCAVO DI RIBASSO/RIBATTITURA FINO AL PIANO DI SCAVO DELLA SEZIONE DI PORTALE, POSA DEL NUOVO PIEDE CENTINA (MANTENENDO SEMPRE UNA RAMPA DI ACCESSO/USCITA VERSO LA GALLERIA DI LINEA)

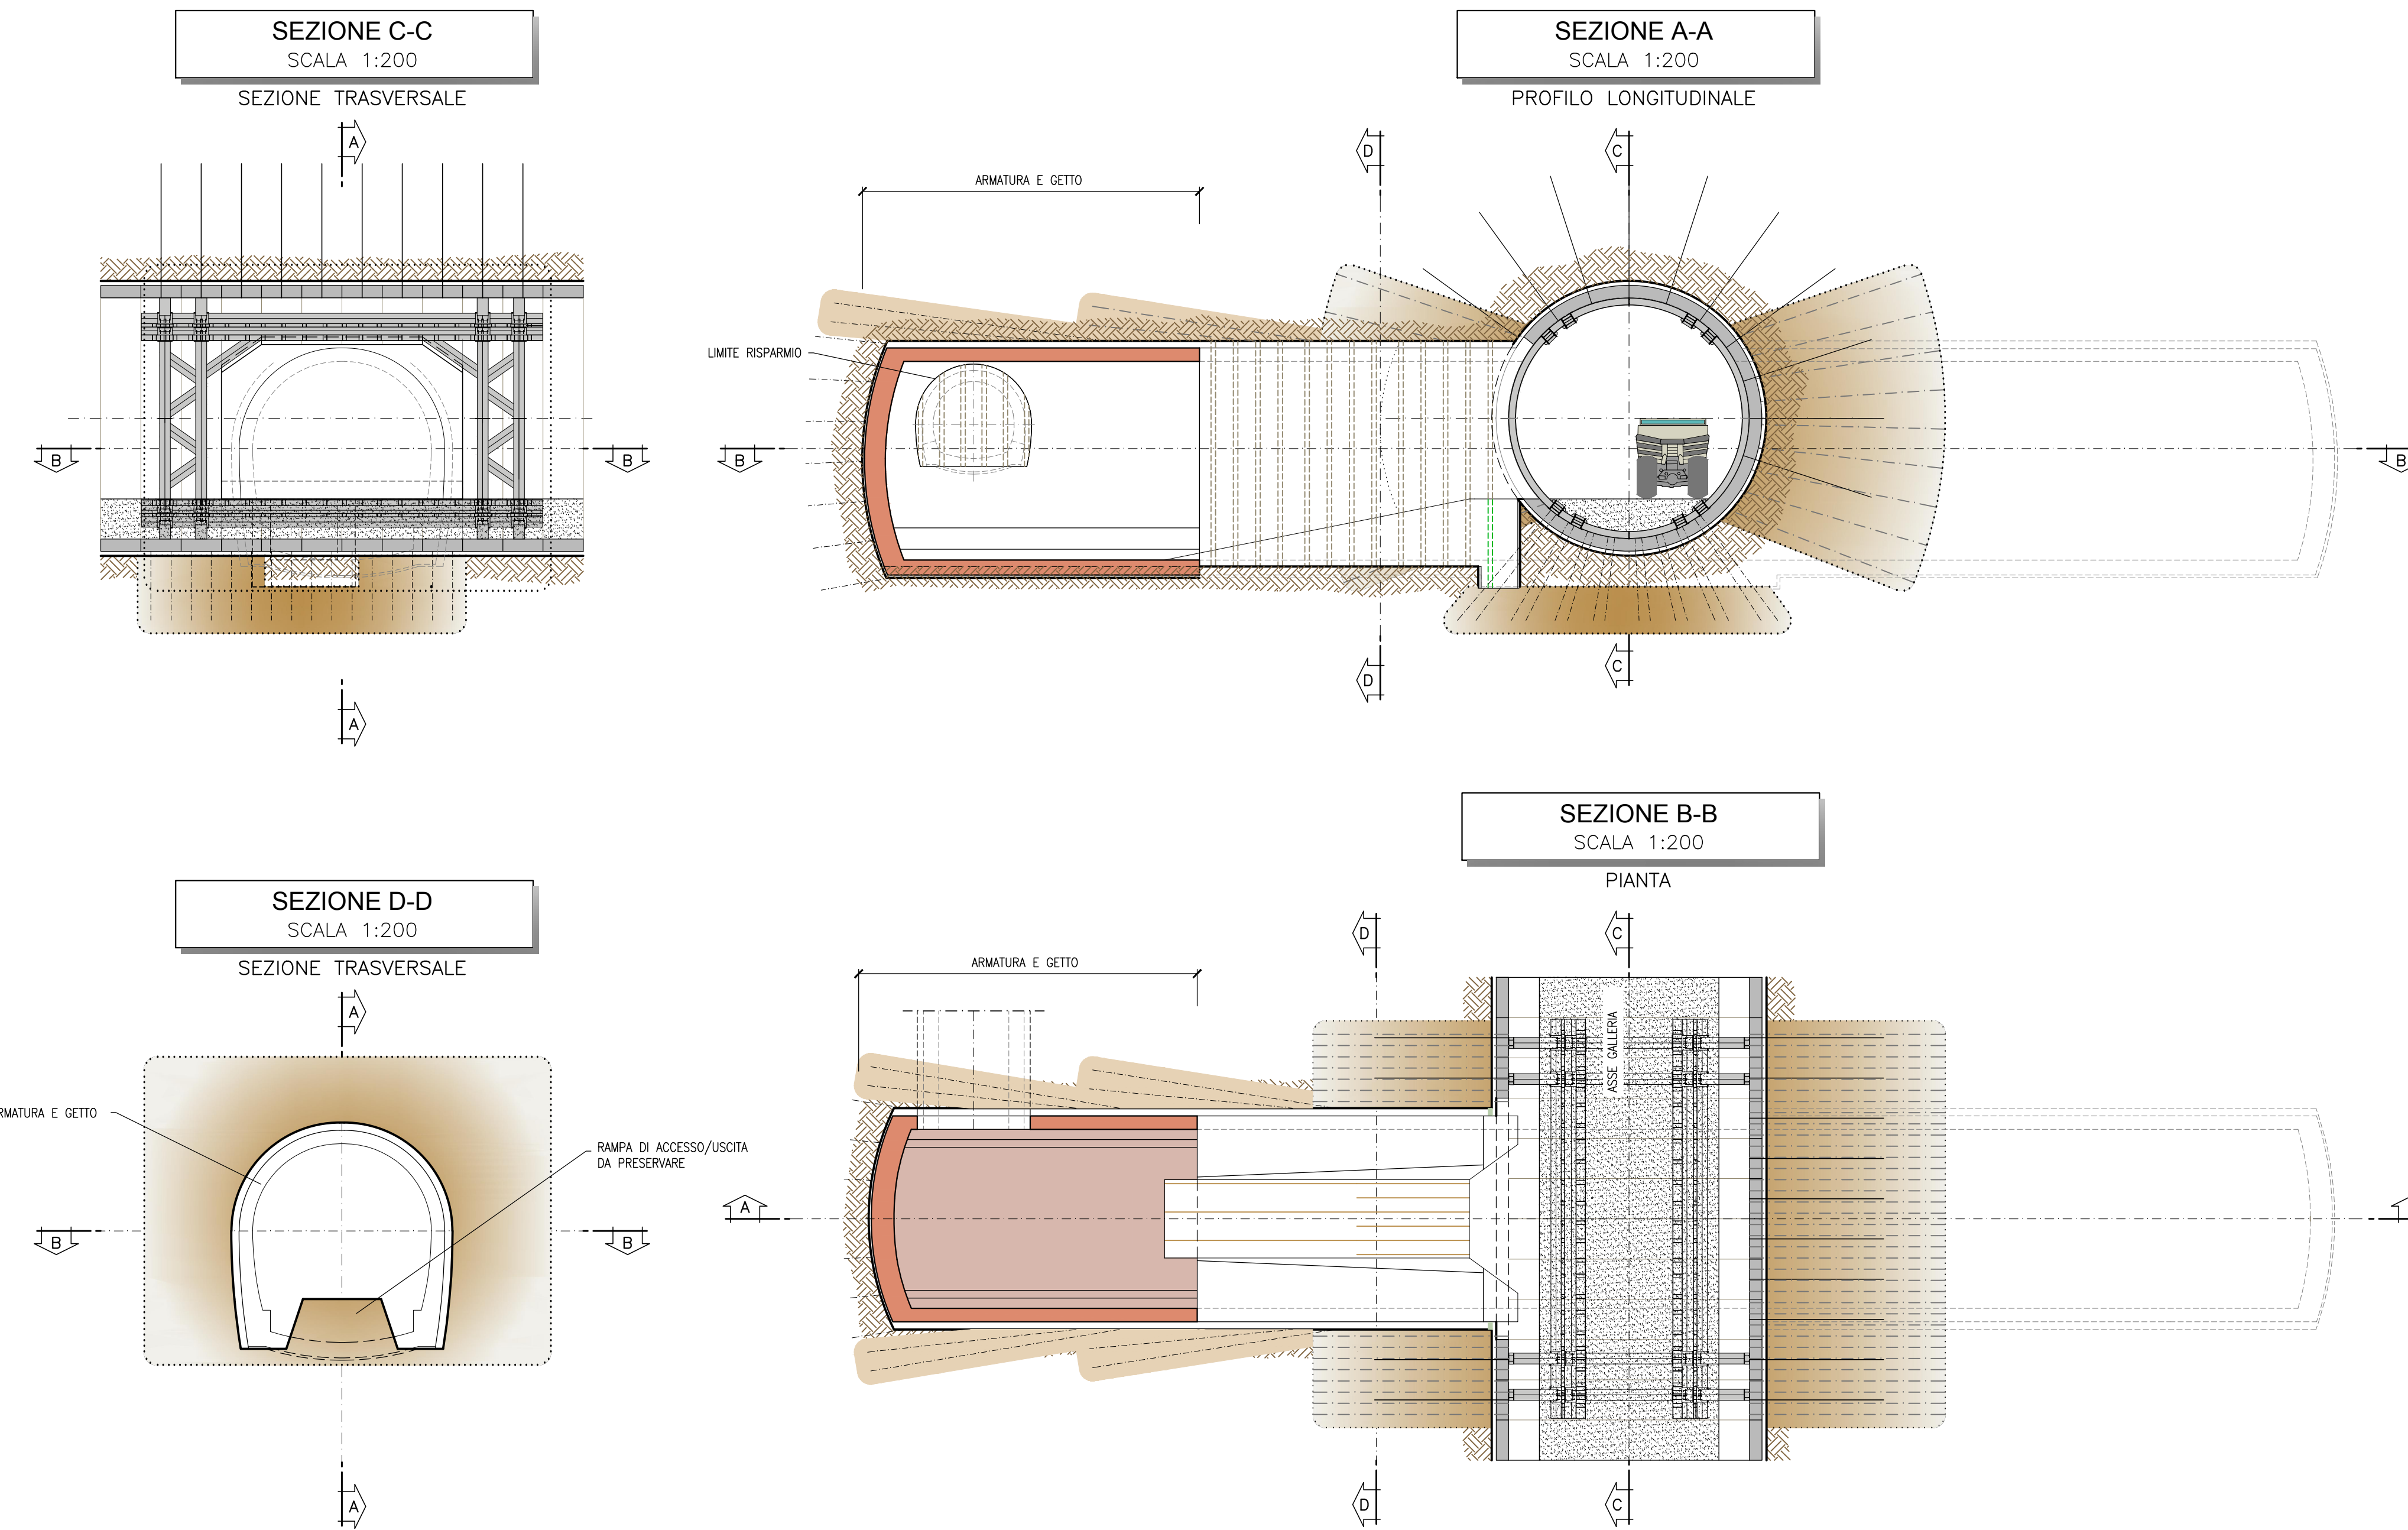


FASE 6

- SCAVO DI RIBASSO/RIBATTITURA FINO AL PIANO DI SCAVO DELLA GALLERIA LATERALE, POSA DEL NUOVO PIEDE CENTINA (MANTENENDO SEMPRE UNA RAMPA DI ACCESSO/USCITA VERSO LA GALLERIA DI LINEA)

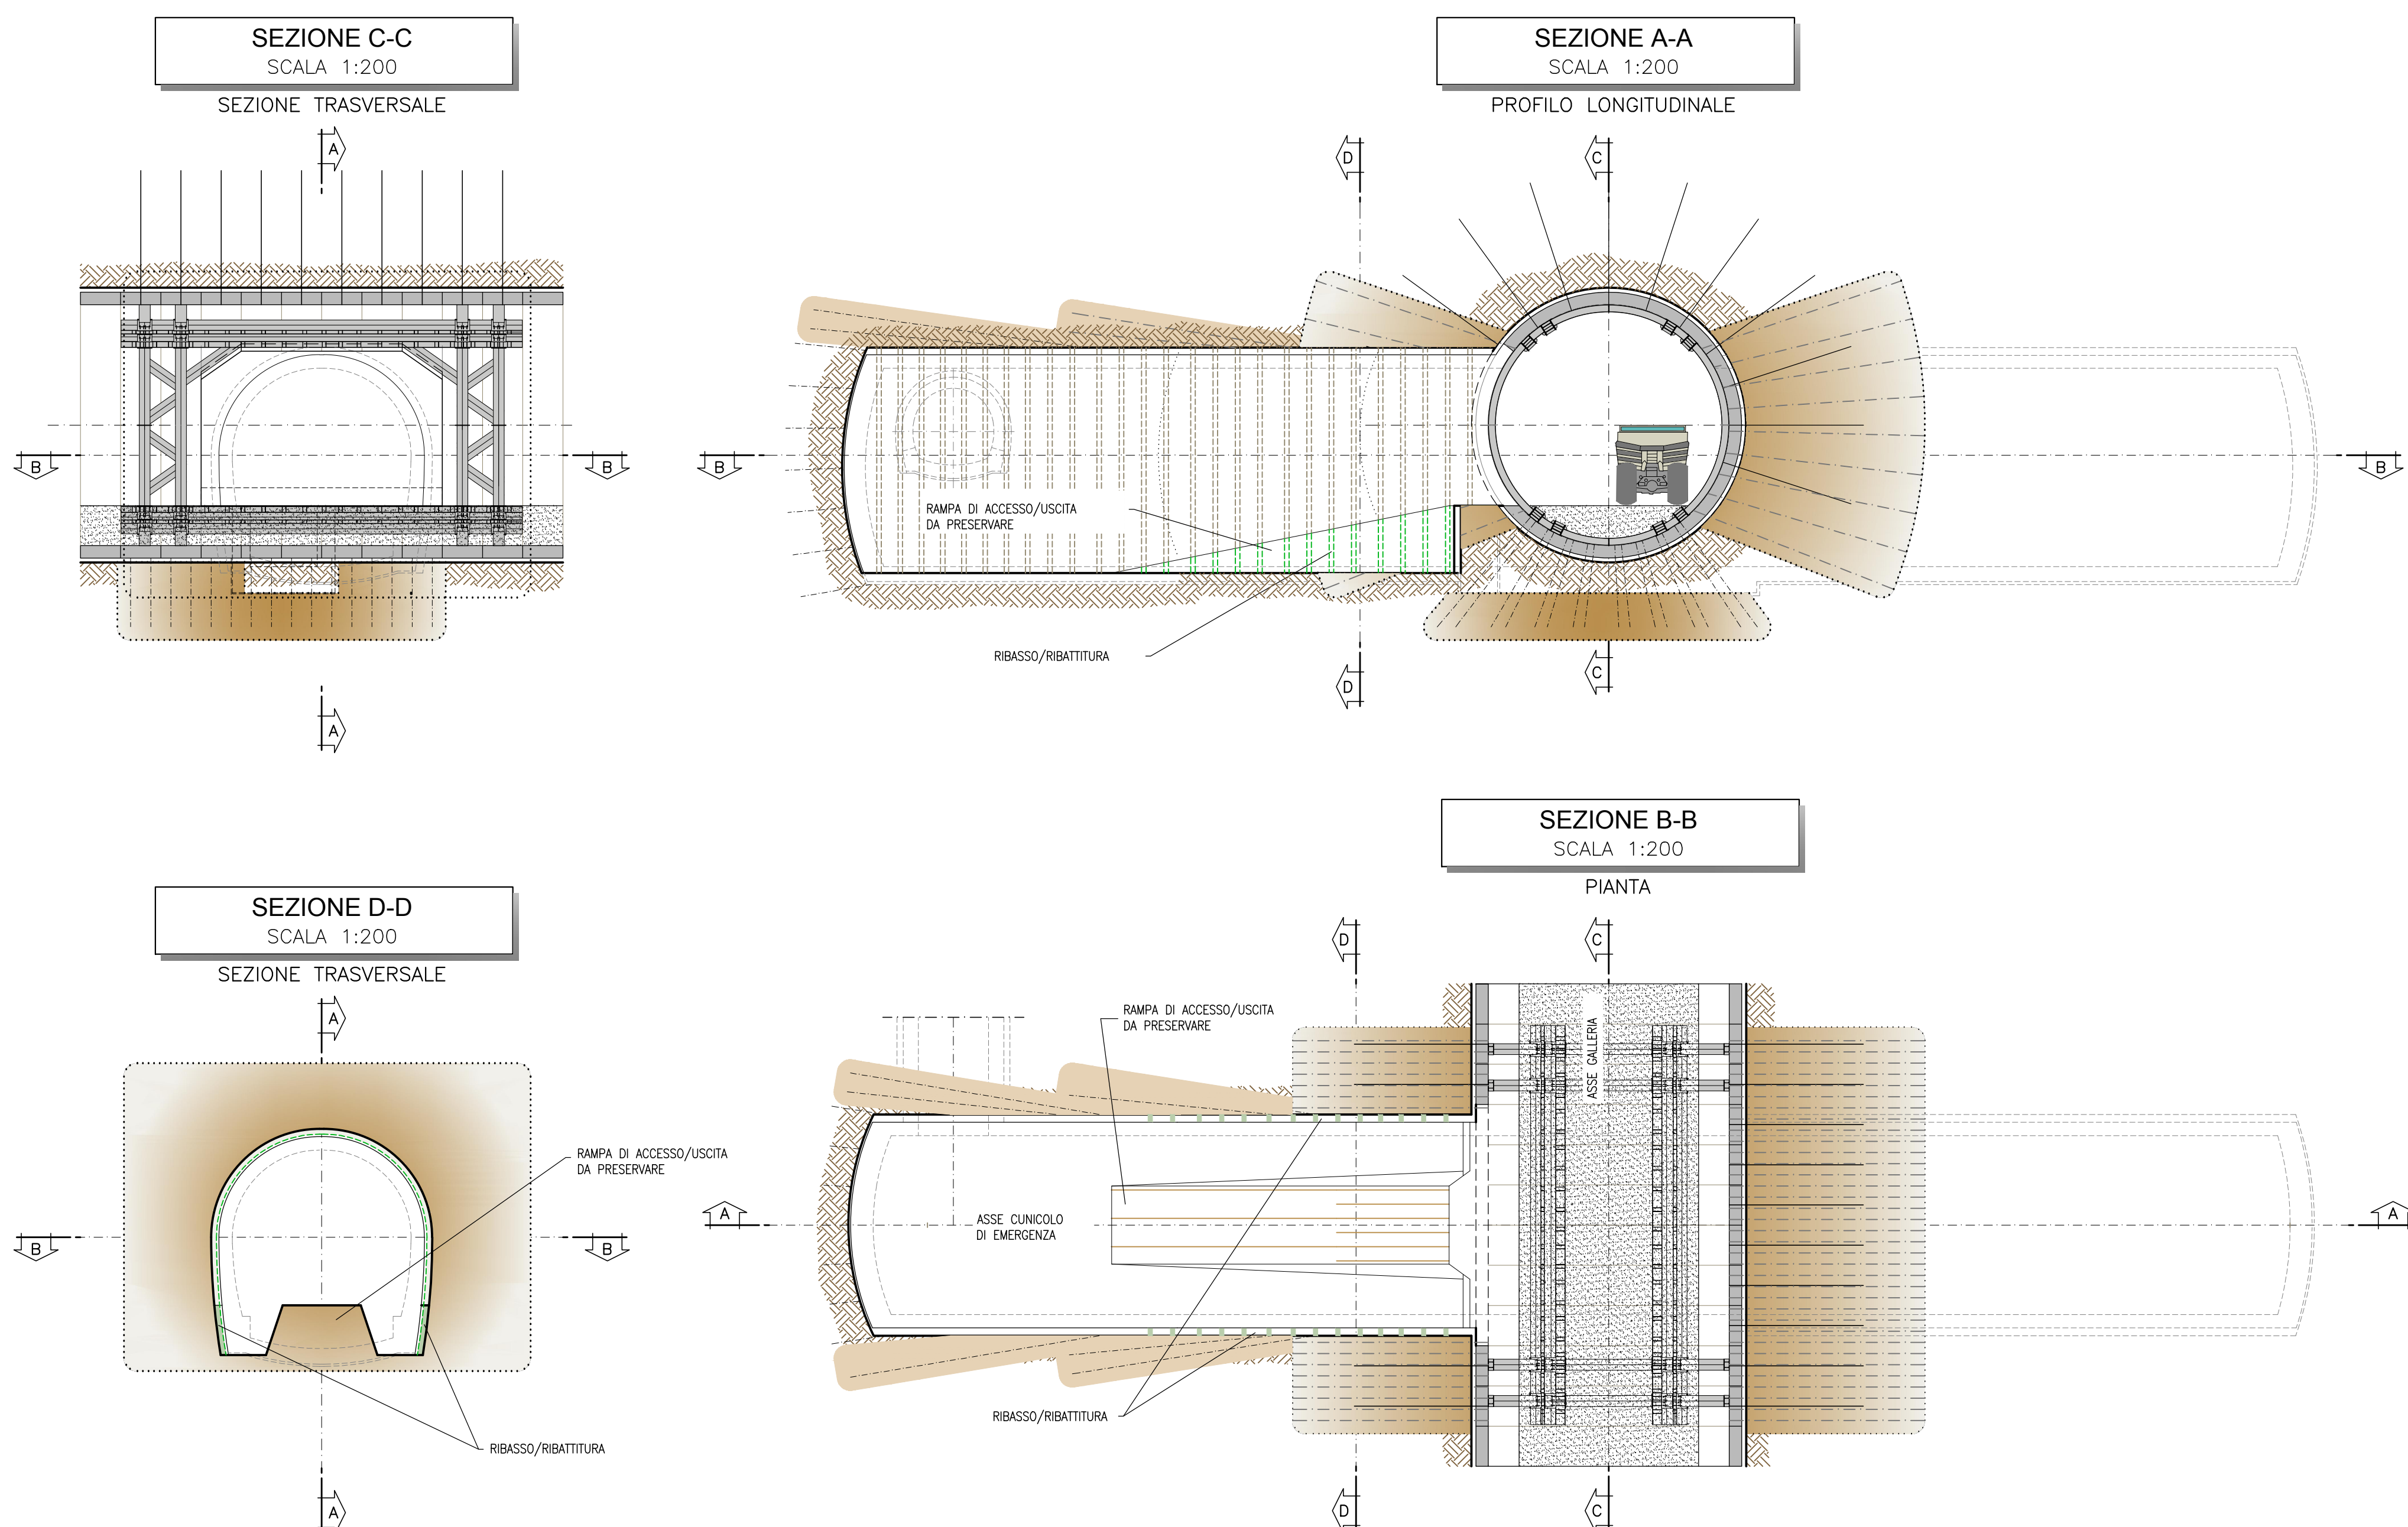


FASE 8

- SPOSTAMENTO DELLA RAMPA DI ACCESSO/USCITA VERSO LA GALLERIA DI LINEA SU UN LATO DELLA GALLERIA LATERALE
- POSA (SUL LATO OPPOSTO ALLA RAMPA) DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE ED DELL'ARMATURA, LASCIANDO PREDISPOSIZIONI PER COLLEGARE ARMATURE FUTURE
- GETTO DELL'ARCO ROVESCIO E MURETTE DELLA GALLERIA LATERALE
- GETTO DEL SOLETTONE E MURETTE DEL PORTALE LASCIANDO UN RISPARMIO IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO AL FUTURO PASSAGGIO PEDONALE

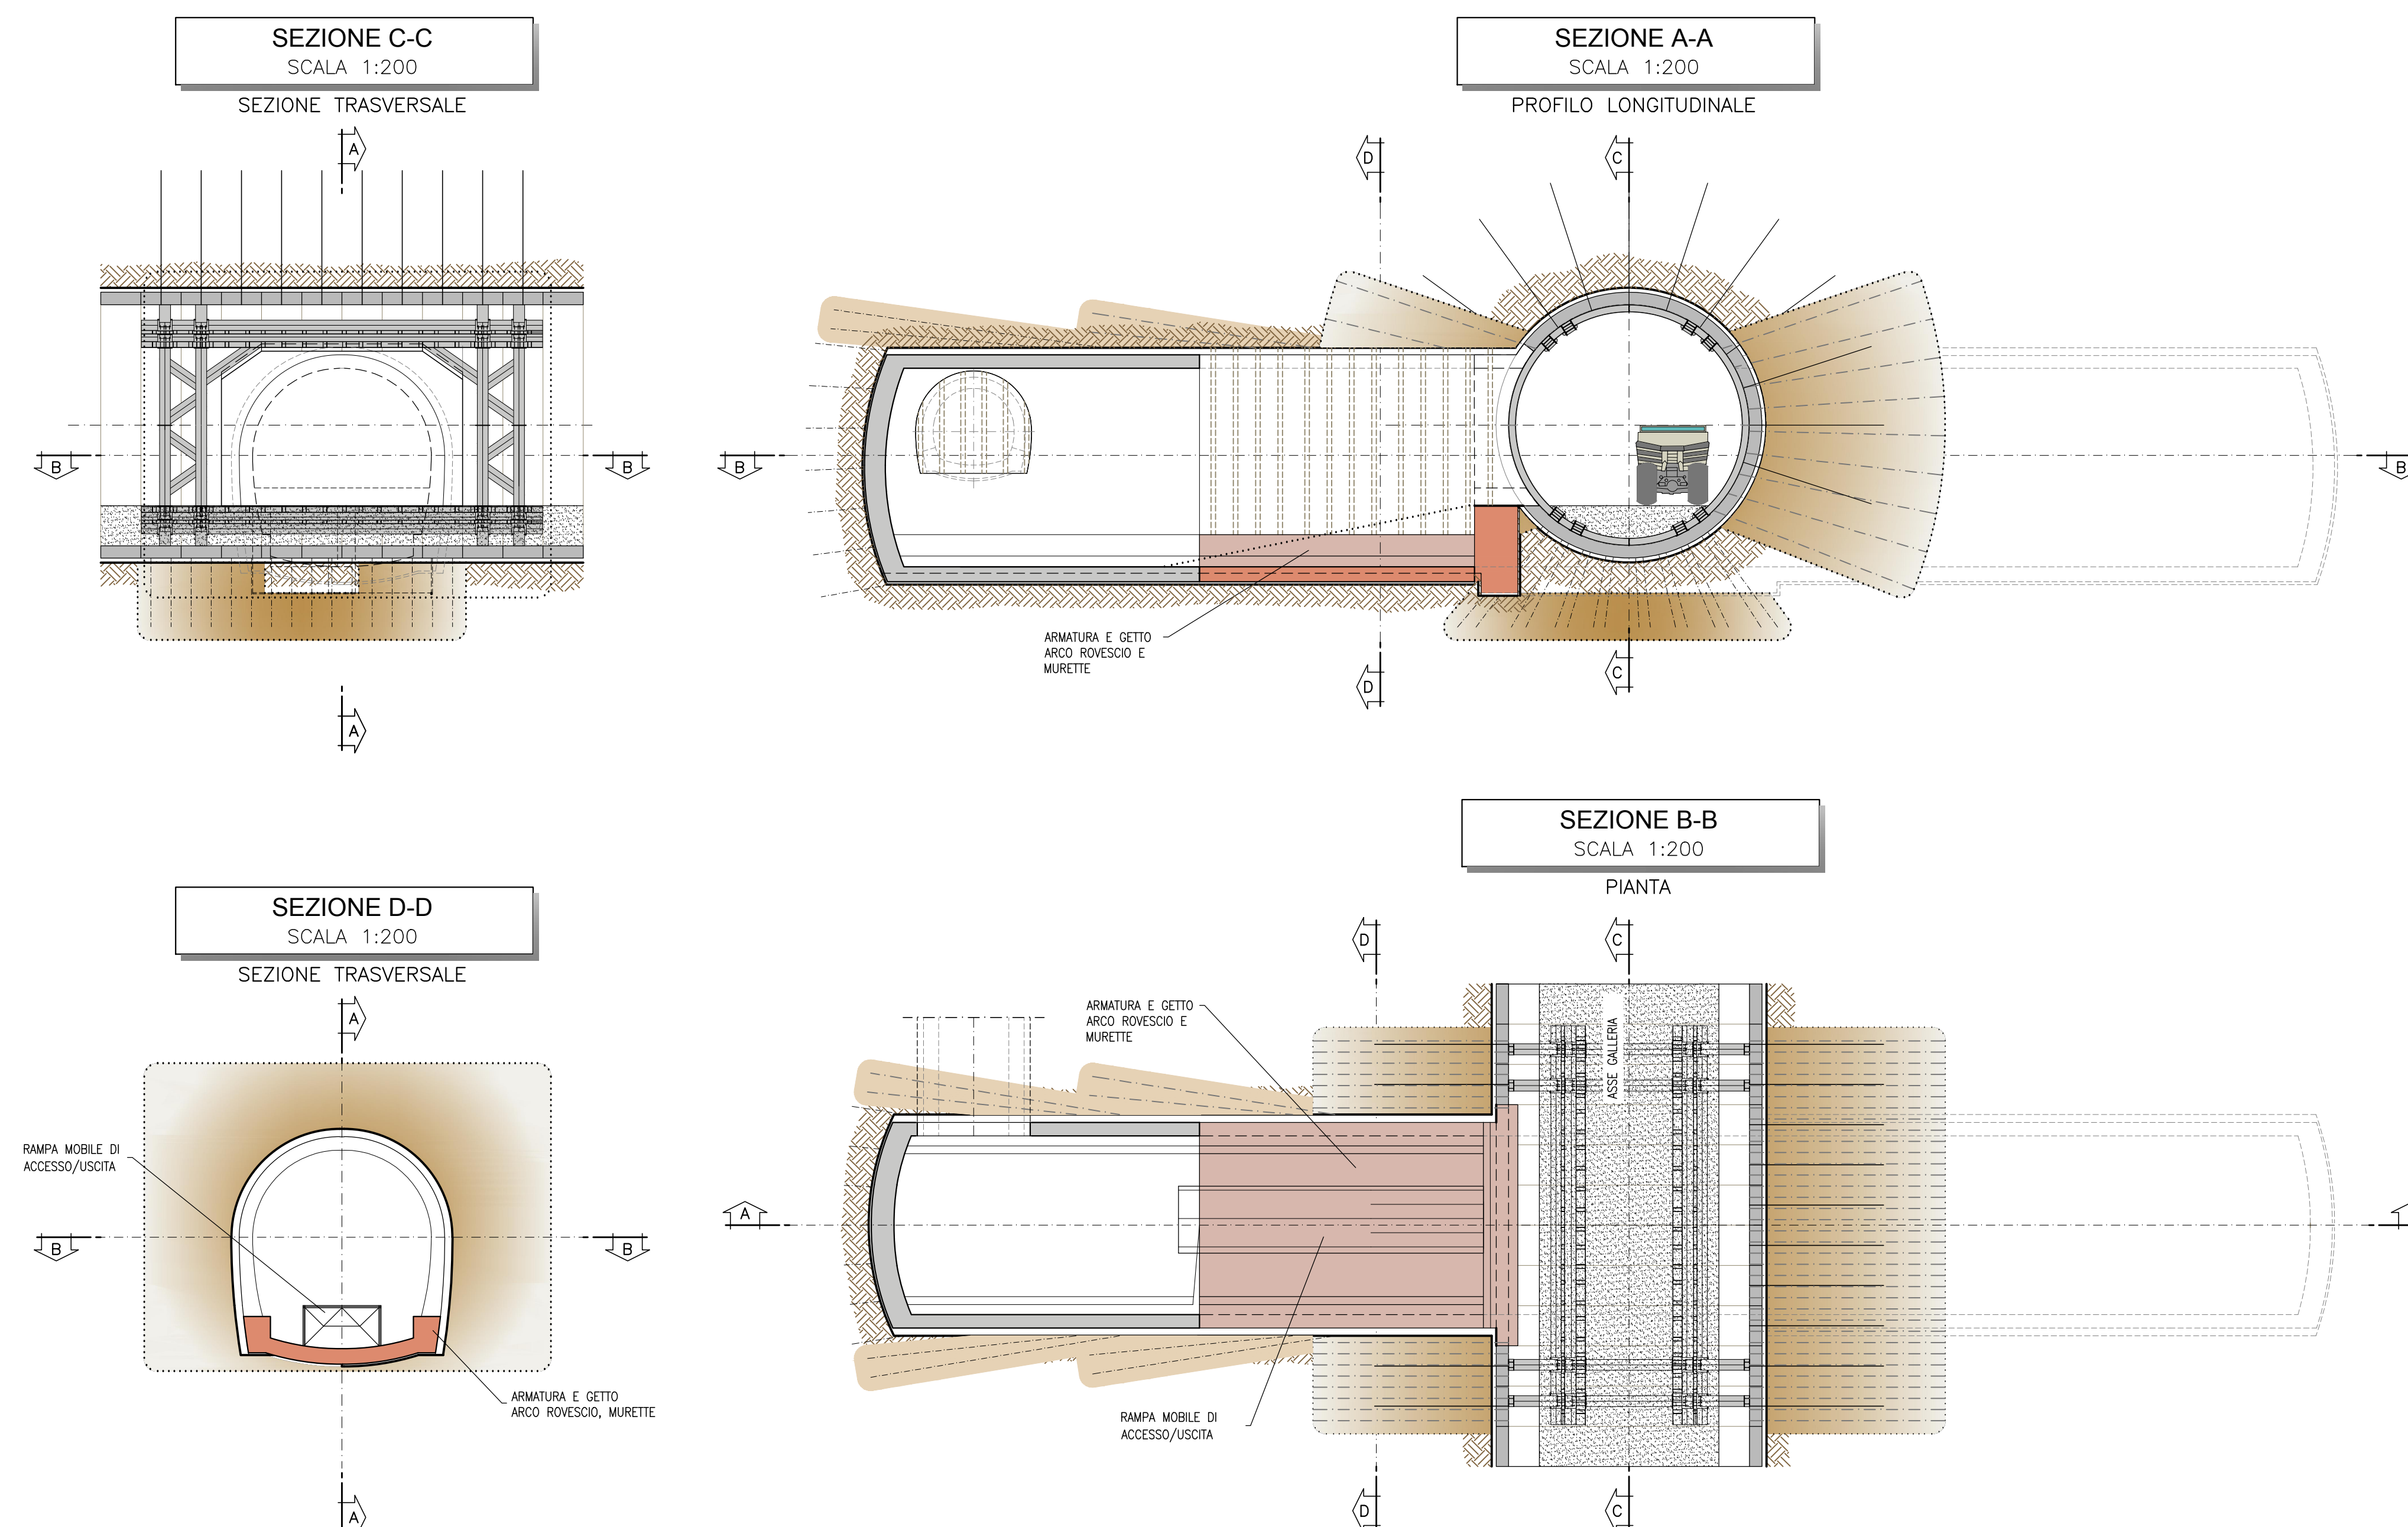

NOTA TABELLA MATERIALI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "IF2801EZZSPGN000002"



COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **HirpiniaAV** (Consorzio HIRPINIA AV e Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Mordillo 150902020)

SOGE: **salini impregio** and **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **ROKSOUL S.p.A.**

MANDANTE: **NETENGINEERING** and **Alpina S.p.A.**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA GN10 - GALLERIA ROCCHETTA - USCITA DI EMERGENZA PEDONALE F7 pk 15+700

ZONA DI INNESTO CON GALLERIA DI LINEA AL KM 15+700

FASI ESECUTIVE

Planimetria, sezioni - Tav. 2/4

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione per consegna	M. Agrippone	21/03/2020	B. Spagnoli	21/03/2020	M. Casti	21/03/2020	Ing. G. Cassari	
B	Revisione per struttura	M. Agrippone	04/04/2020	B. Spagnoli	04/04/2020	M. Casti	04/04/2020		16/03/2020

COMMESSA: **IF2801EZZSPGN000002**

LOTTO: **01**

FASE: **E**

ENTE: **ZZ**

TIPO DOC.: **DA**

OPERADISCIPLINA: **GN1000**

PROGR.: **002**

REV.: **B**

SCALA: **1:50**

File: IF2801EZZSPGN000002.dwg n. Elab.: -
