



GRUPPO FS ITALIANE

ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Sede legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Viale dei Mille, 36 - 50131 Firenze - Tel. 055.56401 - Fax. 075.573497
Pec: anas.toscana@postacert.stradeanas.it

STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA - AREA GESTIONE RETE

S.S.330 – Lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Magra al km 10+422 STRALCIO 2 – PROGETTO DEL NUOVO PONTE E DELLE OPERE COMPLEMENTARI

PROGETTO DEFINITIVO

COD. ACMSFI00586

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTE:



MANDANTE:

MATILDI+PARTNERS

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Ing. Filippo Busola – TECHNITAL
Ordine Ingegneri Provincia di Verona al n. A2165

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Emanuele Fresia – TECHNITAL
Ordine dei Geologi Regione Veneto – n. 501/A

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Geom. Stefano Caccianiga – POLITECNICA
Collegio Geometri Provincia di Firenze n.3403/12

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giocchino Del Monaco

VISTO: IL DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ing. Mirko Fagioli

IL PROGETTISTA:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE STRADALE,
GEOTECNICA E RAPPORTI CON ENTI:

Ing. Luciano Viscanti (Politecnica)–Ordine ingegneri Prov. Firenze n.5709

STRUTTURE:

Ing. Carlo Vittorio Matildi (Matildi+P)–Ord. ingegneri Prov. Bologna n.6457/A

IDROLOGIA ED IDRAULICA:

Ing. Alessandro Cecchelli (Politecnica)–Ord. ingegneri Prov. Grosseto n.760

AMBIENTE E PAESAGGIO:

Arch. Maria Cristina Fregni(Politecnica)–Ord. Architetti Prov.Modena n. 611

CANTIERIZZAZIONE E FASI ESECUTIVE:


Geom. Stefano Caccianiga–(Politecnica)–Collegio geometri Firenze n.3403/12

PROTOCOLLO:

DATA:

12 – CANTIERI E FASI Cronoprogramma dei lavori

CODICE PROGETTO			NOME FILE		PROGR. ELAB.	REV.	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	1208_T02CA00CANCRO1A		1208		
MSFI	37	P	2001	CODICE ELAB.	T02CA00CANCRO1	A	–
D							
C							
B							
A	EMISSIONE		10/2020	POLITECNICA	F.Fatichi	S.Caccianiga	F.Busola
REV.	DESCRIZIONE		DATA	SOCIETA'	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

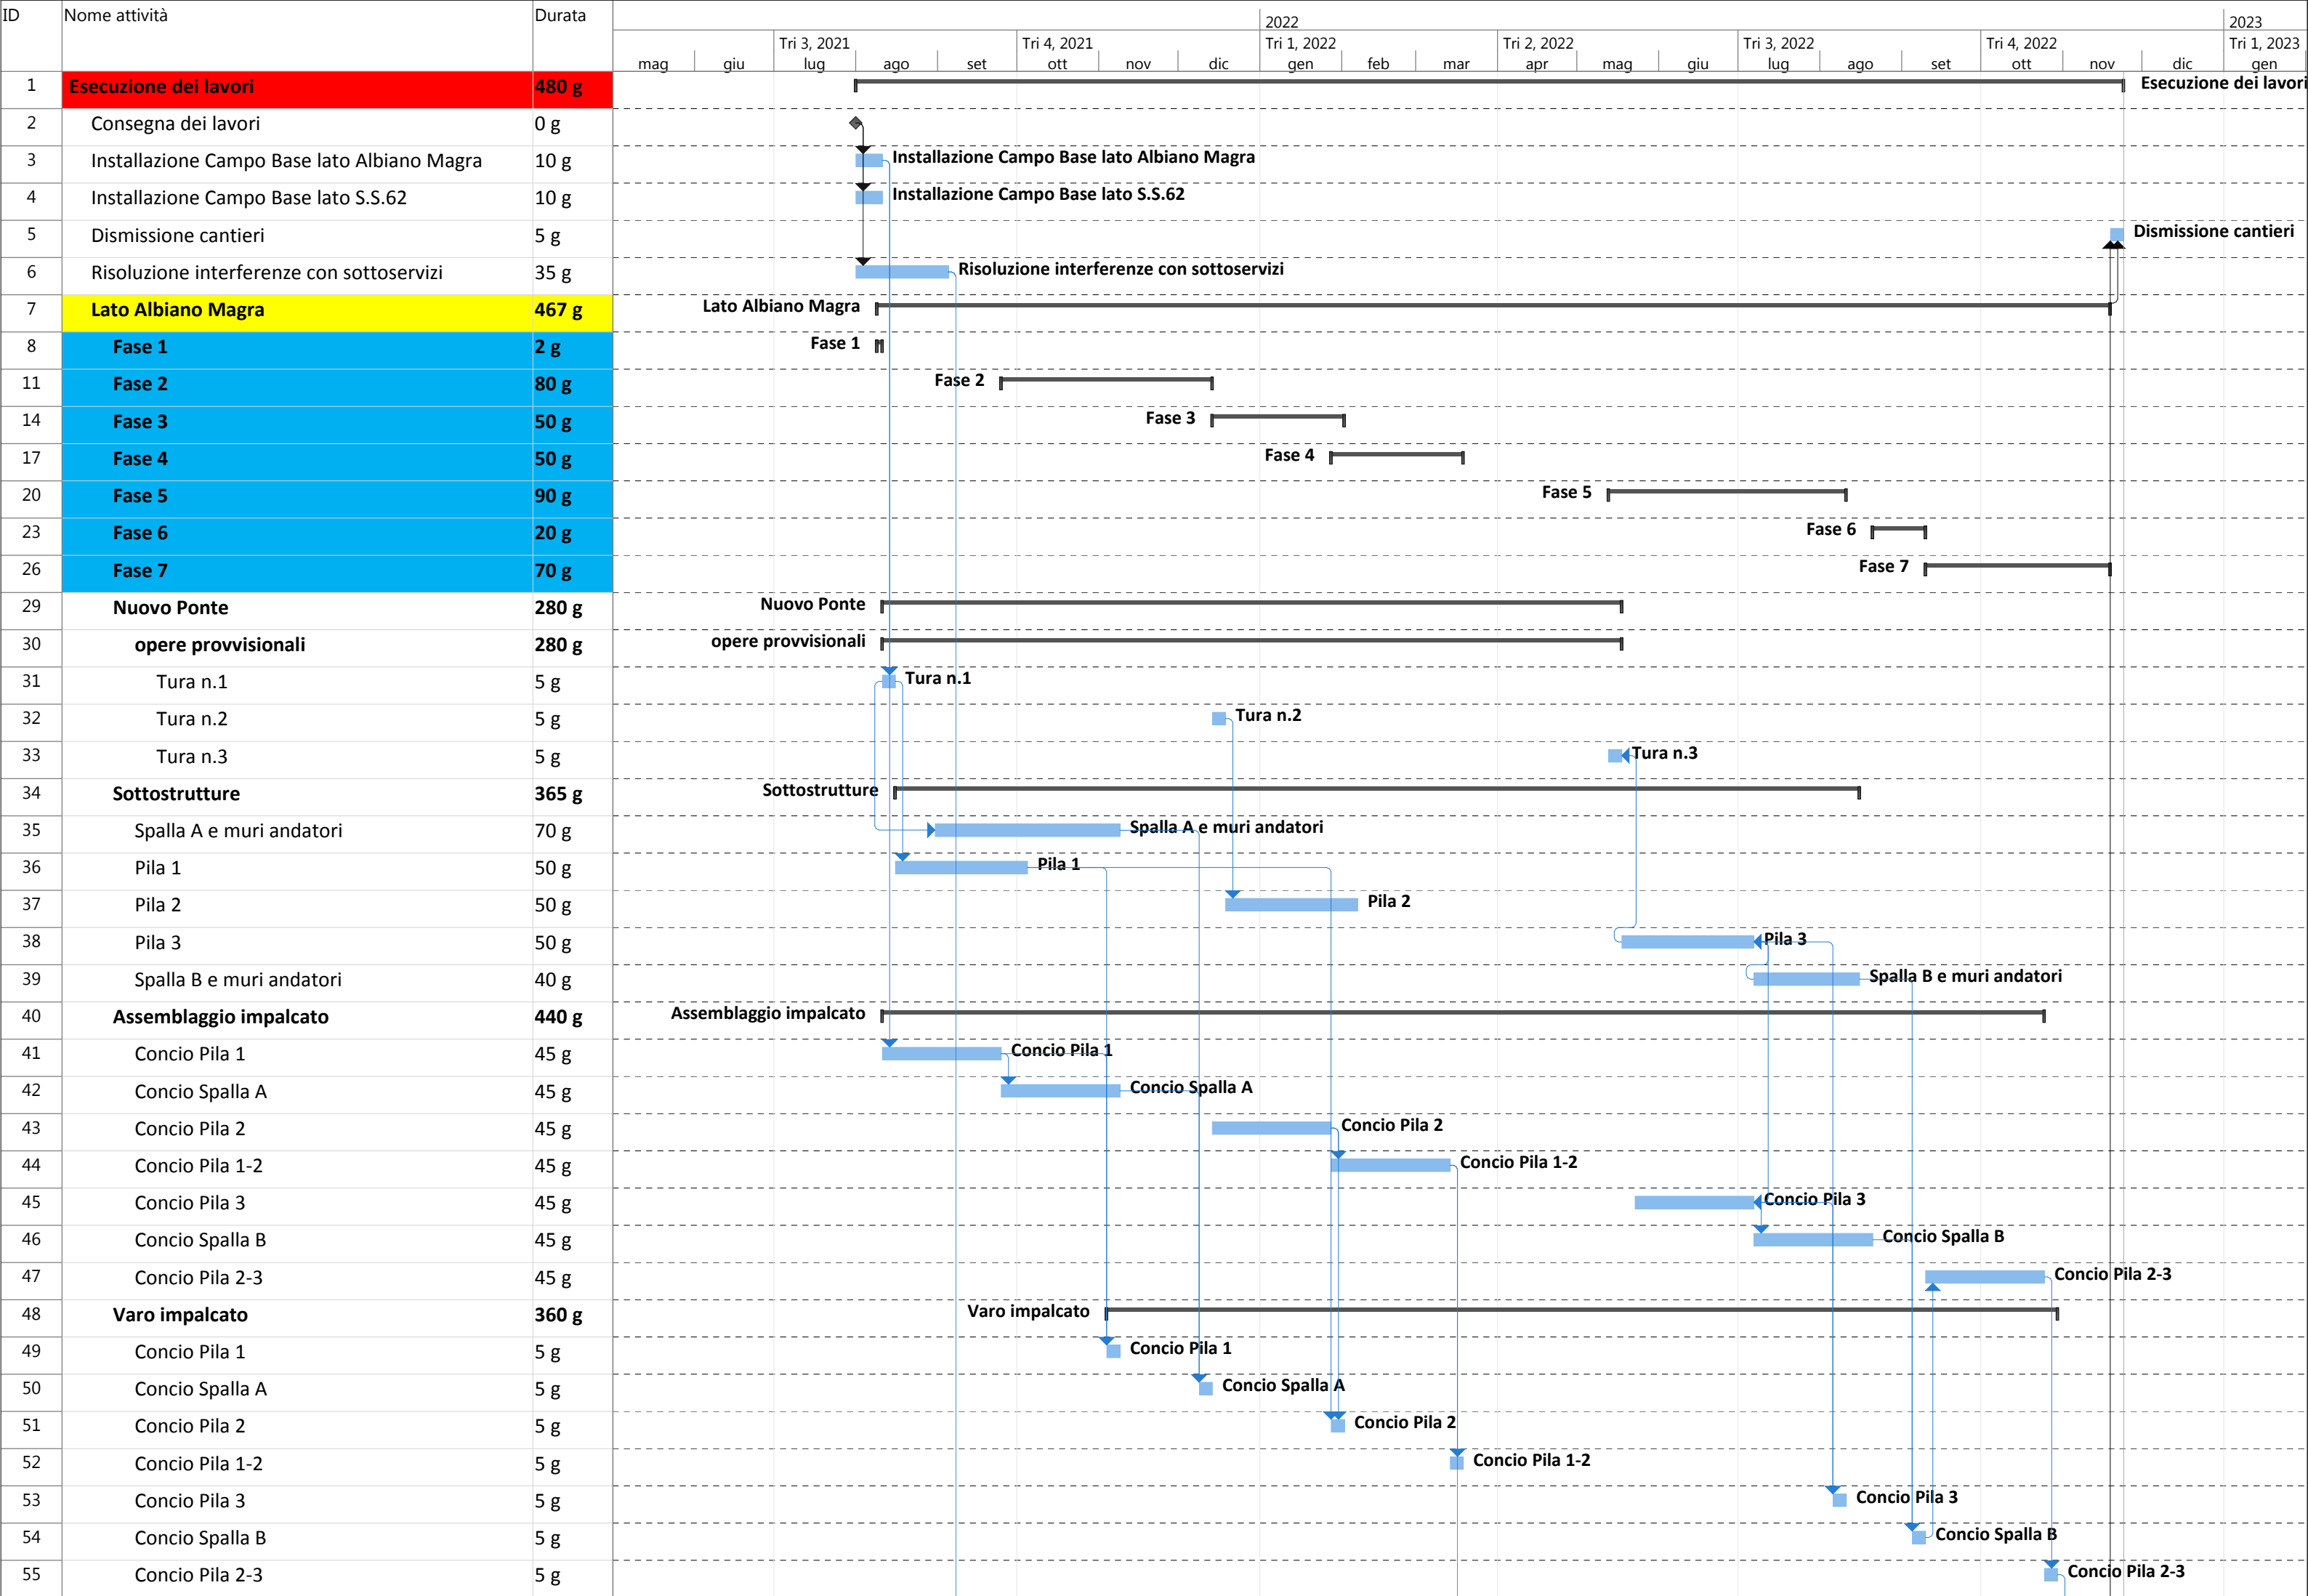

ID	Nome attività	Durata	Cronologia																							
			mag	giu	Tri 3, 2021		set	Tri 4, 2021			2022			Tri 2, 2022		Tri 3, 2022			Tri 4, 2022		2023					
			lug	ago		ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	Tri 1, 2023					
56	Getto soletta ed opere di completamento	250 g	Getto soletta ed opere di completamento																							
57	Prima parte	40 g	Prima parte																							
58	Seconda parte	20 g	Seconda parte																							
59	Posa barriere antirumore	20 g	Posa barriere antirumore																							
60	Sistemazioni viabilità minori	20 g	Sistemazioni viabilità minori																							
61	Lato SS260	380 g	Lato SS260																							
62	Fase 1	195 g	Fase 1																							
65	Fase 2	70 g	Fase 2																							
68	Fase 3	50 g	Fase 3																							
71	Fase 4	25 g	Fase 4																							
74	Opere di sostegno	365 g	Opere di sostegno																							
75	Opera n.1	20 g	Opera n.1																							
76	Opera n.2	30 g	Opera n.2																							
77	Opera n.3	45 g	Opera n.3																							
78	Opera n.4	170 g	Opera n.4																							
79	Parte non interferente	20 g	Parte non interferente																							
80	Parte interferente	10 g	Parte interferente																							
81	Opera n.5	20 g	Opera n.5																							
82	Opera n.6	20 g	Opera n.6																							
83	Opera n.7	140 g	Opera n.7																							
84	Parte non interferente	20 g	Parte non interferente																							
85	Parte interferente	10 g	Parte interferente																							
86	Nuovo sottopasso pedonale	30 g	Nuovo sottopasso pedonale																							
87	Nuovo Ponticello	40 g	Nuovo Ponticello																							
88	Nuovo Tombino scatolare	285 g	Nuovo Tombino scatolare																							
89	Parte non interferente	30 g	Parte non interferente																							
90	Parte interferente	20 g	Parte interferente																							
91	Lavori stradali	380 g	Lavori stradali																							
92	Variante alla SS 62	265 g	Variante alla SS 62																							
93	Parte non interferente	95 g	Parte non interferente																							
94	Parte interferente	30 g	Parte interferente																							
95	Attacchi alla viabilità esistente	10 g	Attacchi alla viabilità esistente																							
96	Nuova rotatoria	265 g	Nuova rotatoria																							
97	Parte non interferente	30 g	Parte non interferente																							
98	Parte interferente	10 g	Parte interferente																							
99	Vaibilità minore e ciclabile	30 g	Vaibilità minore e ciclabile																							
100	intersezione tra Via Nuova e la S.S.62 della CISA	15 g	intersezione tra Via Nuova e la S.S.62 della CISA																							
101	Demolizione rilevato ferroviario e sovrappasso	15 g	Demolizione rilevato ferroviario e sovrappasso																							
102	Opere di compensazione	30 g	Opere di compensazione																							
