


- FASE COSTRUTTIVA 01**
- INTERSEZIONE AL TRAFFICO DEL RAMO NORD DELL'INTERSEZIONE ESISTENTE.
  - ESECUZIONE SPALLA 2 E PILA.
  - VARO DELLA CARPENTERIA METALLICA DELLA CAMPATA SPALLA 2-PILA.
- FASE COSTRUTTIVA 02**
- DEVIAZIONE SU VARIANTE ALTERNATIVA DEL TRAFFICO VEICOLARE IN TRANSITO SULLA S.S.640 ESISTENTE.
  - ESECUZIONE SPALLA 1.
  - VARO DELLA CARPENTERIA METALLICA DELLA CAMPATA SPALLA 1-PILA.
- FASE COSTRUTTIVA 03**
- PONER PREMESSE IMPALCATO, PISA-ARMATURA E GETTO SOLIDA.
  - REALIZZAZIONE OPERE DI FINITURA IMPALCATO (BARRIERE, PAVIMENTAZIONI, ECC.).


FASE COSTRUTTIVA 01

FASE COSTRUTTIVA 02

PLANIMETRIA

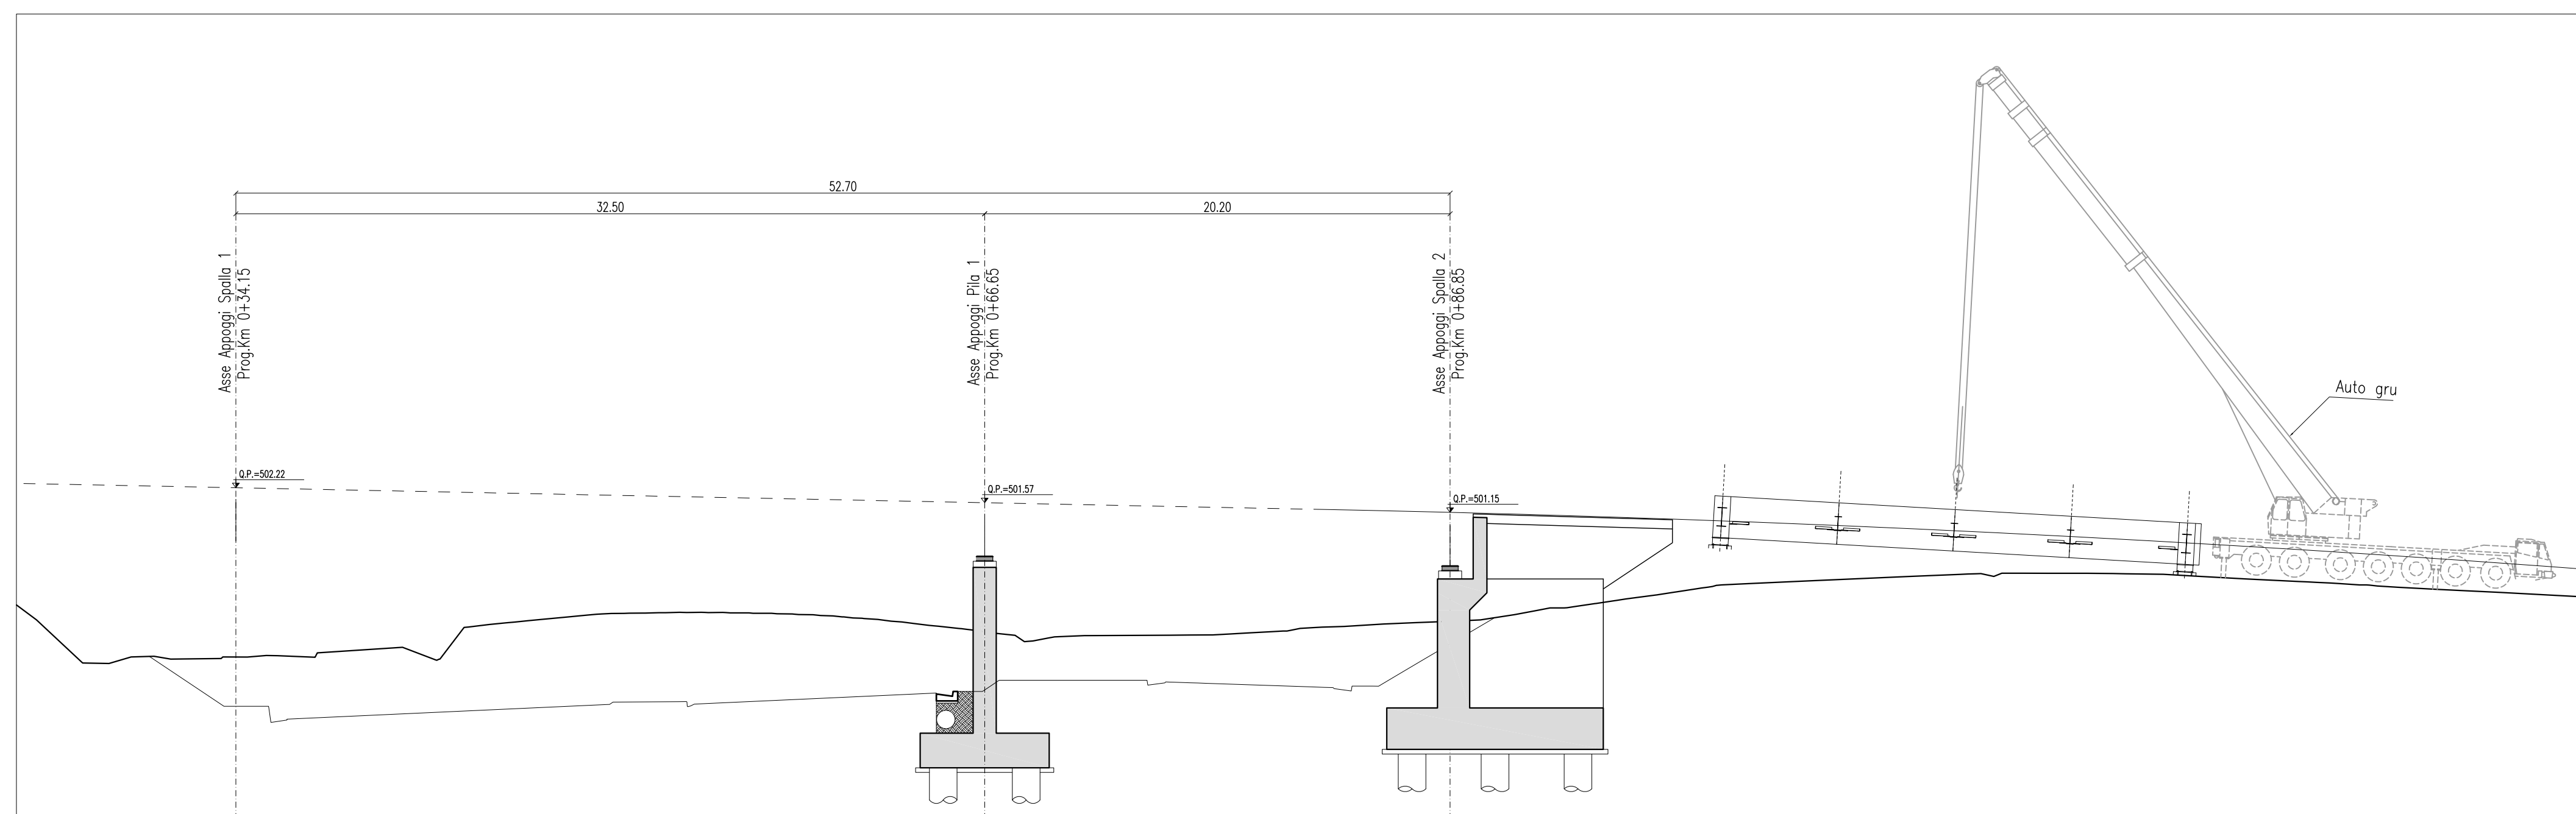

FASE COSTRUTTIVA 01

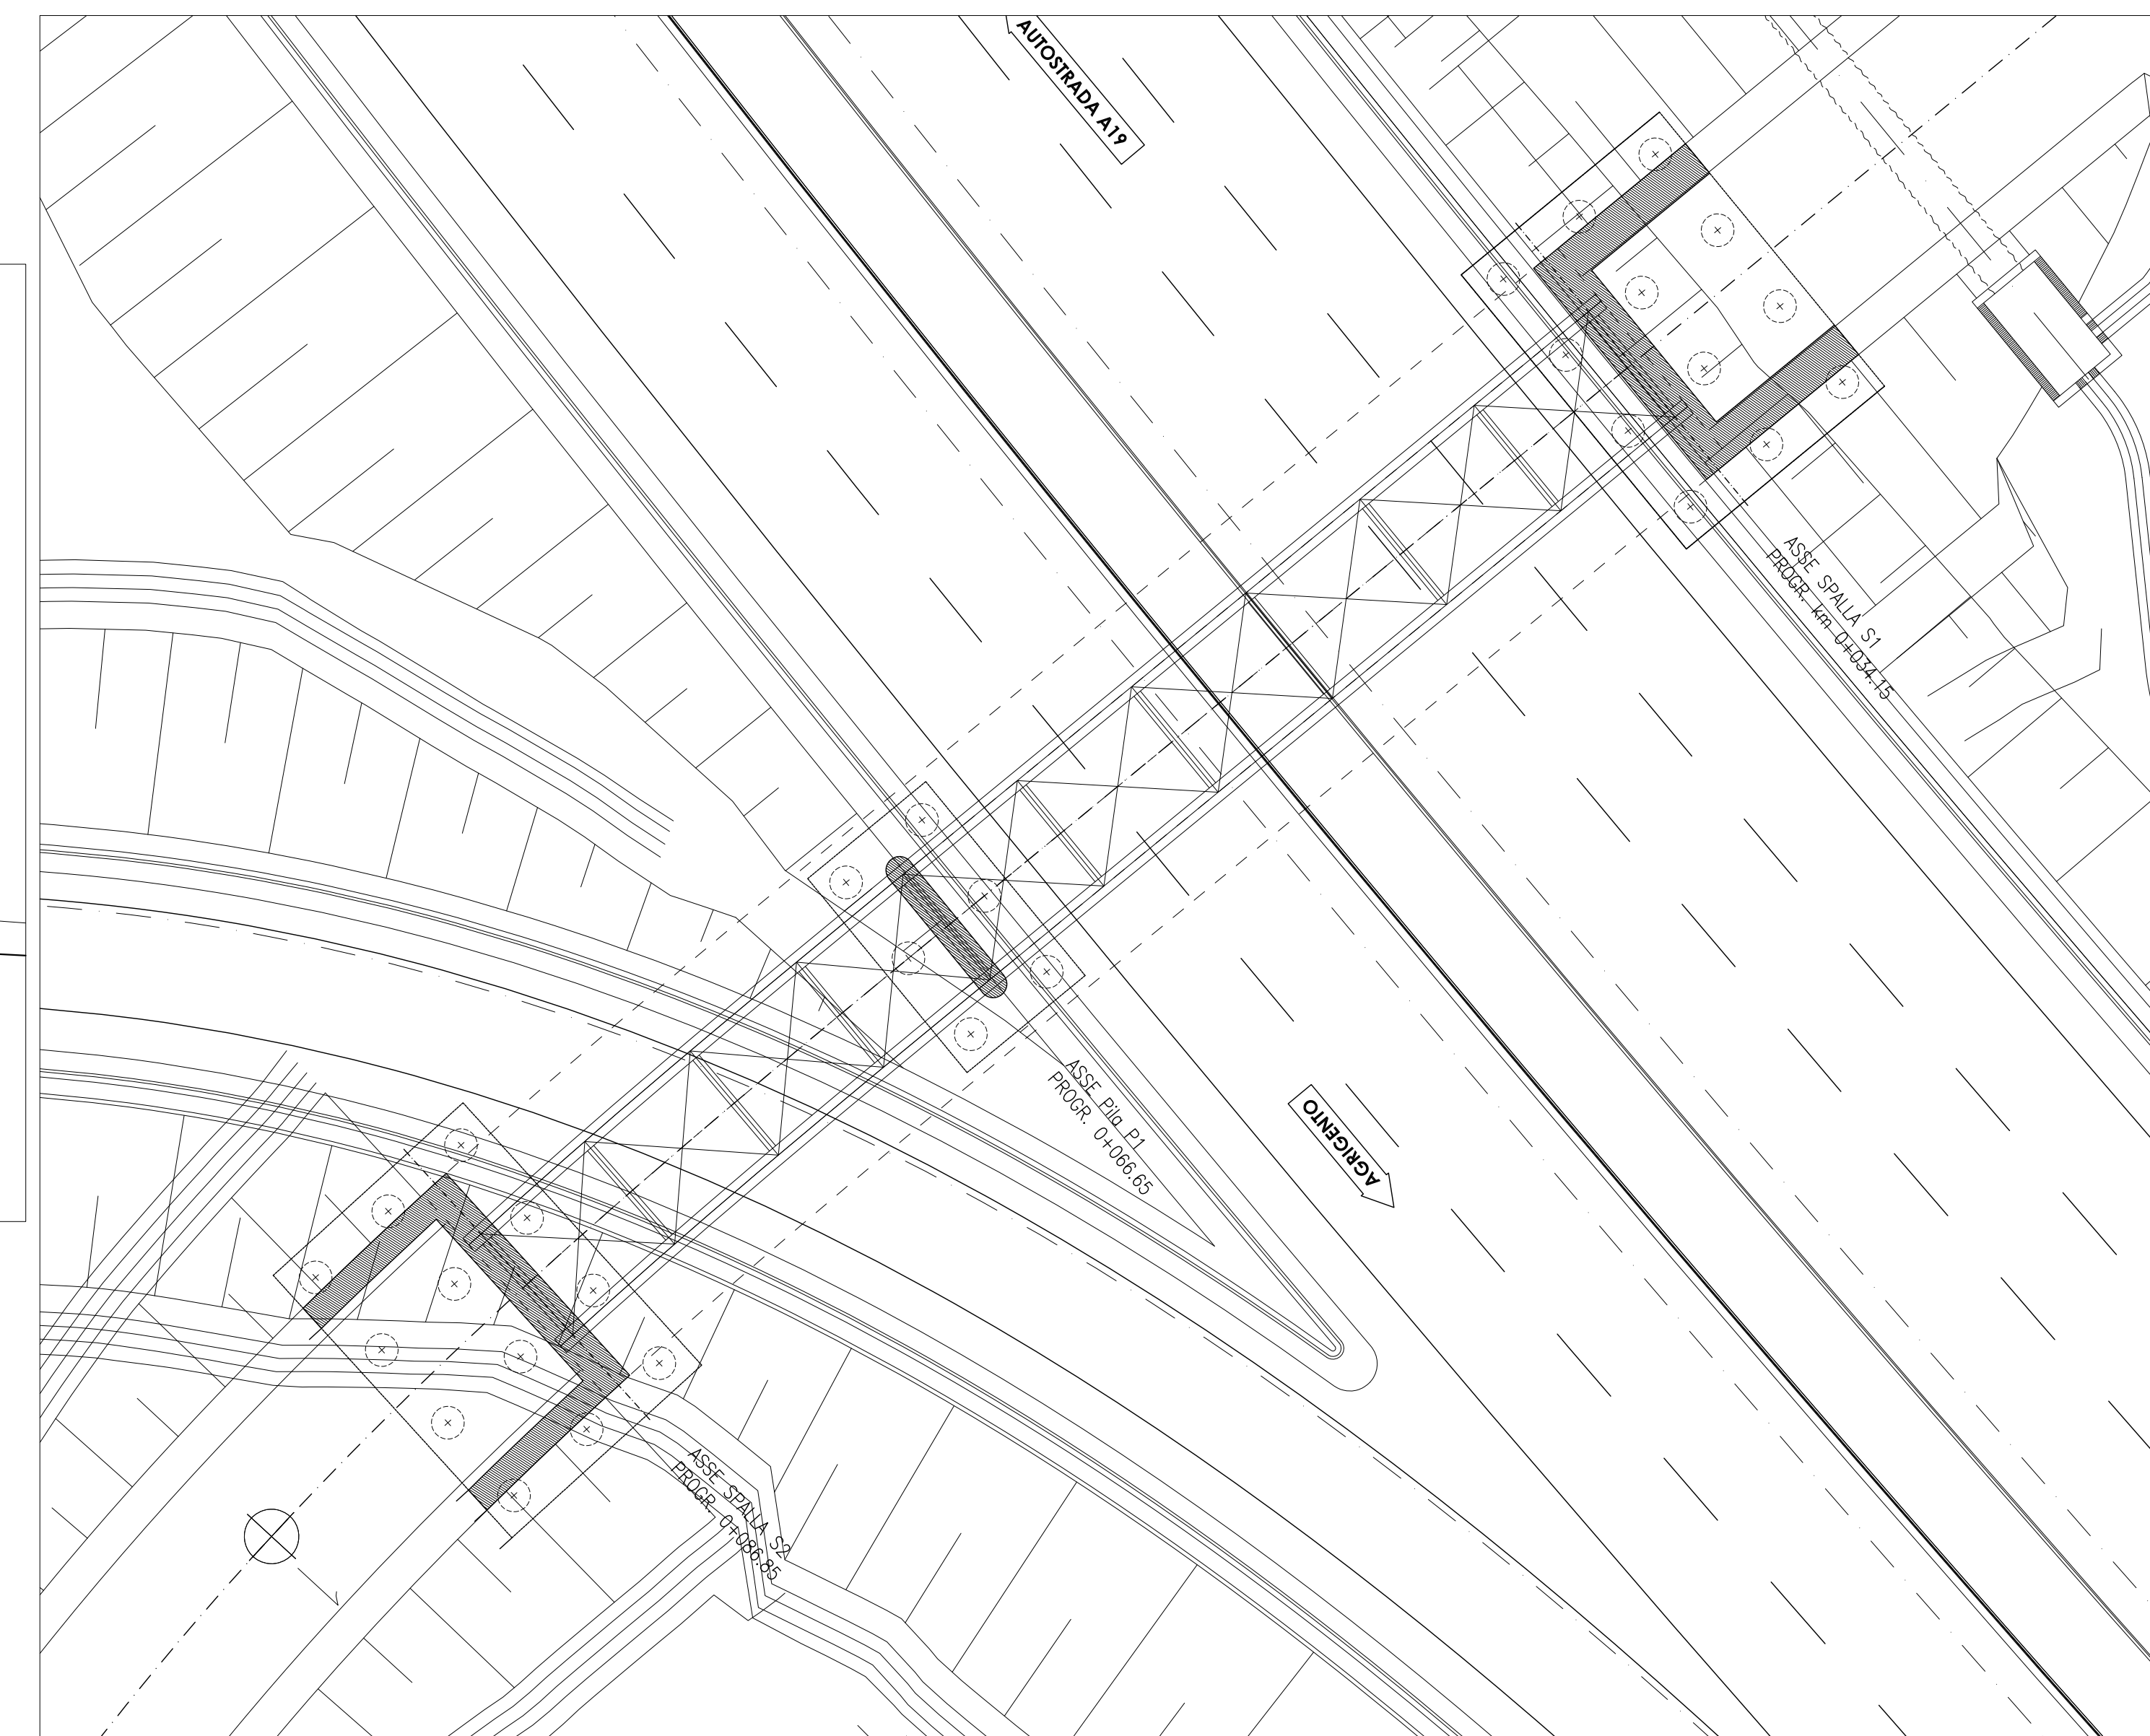

FASE COSTRUTTIVA 03



PA 12/09  
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA  
ITINERARIO AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19  
S.S. N° 640 "DI PORTO EMPEDOCLE"  
AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA CAT. B DEL D.M. 5.11.2001  
Dal km 44+000 allo svincolo con l'A19

PROGETTO ESECUTIVO



OPERE D'ARTE MINORI  
CAVALCAVIA  
Cavalcavia alla progressiva 19+380  
Fasi costruttive

Codice Unico Progetto (CUP) : F91B0900070001

Codice Elaborato:  
PA12\_09 - E 1 3 3 C V 2 0 8 C V 0 8 L D X 0 1 9 A VARIE

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
A	Aprile 2011	EMISSIONE	T. FASOLO	F. NEGRELLI	M. LITI	P. PAGLINI

Responsabile del procedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI

