



Fase 1

- Costruzione spalle provvisorie
- Realizzazione rilevati deviazione provvisoria
- Assemblaggio fuori opera della struttura metallica (compreso predalles metalliche, tubazioni smaltimento acque, velette e reti di protezione)

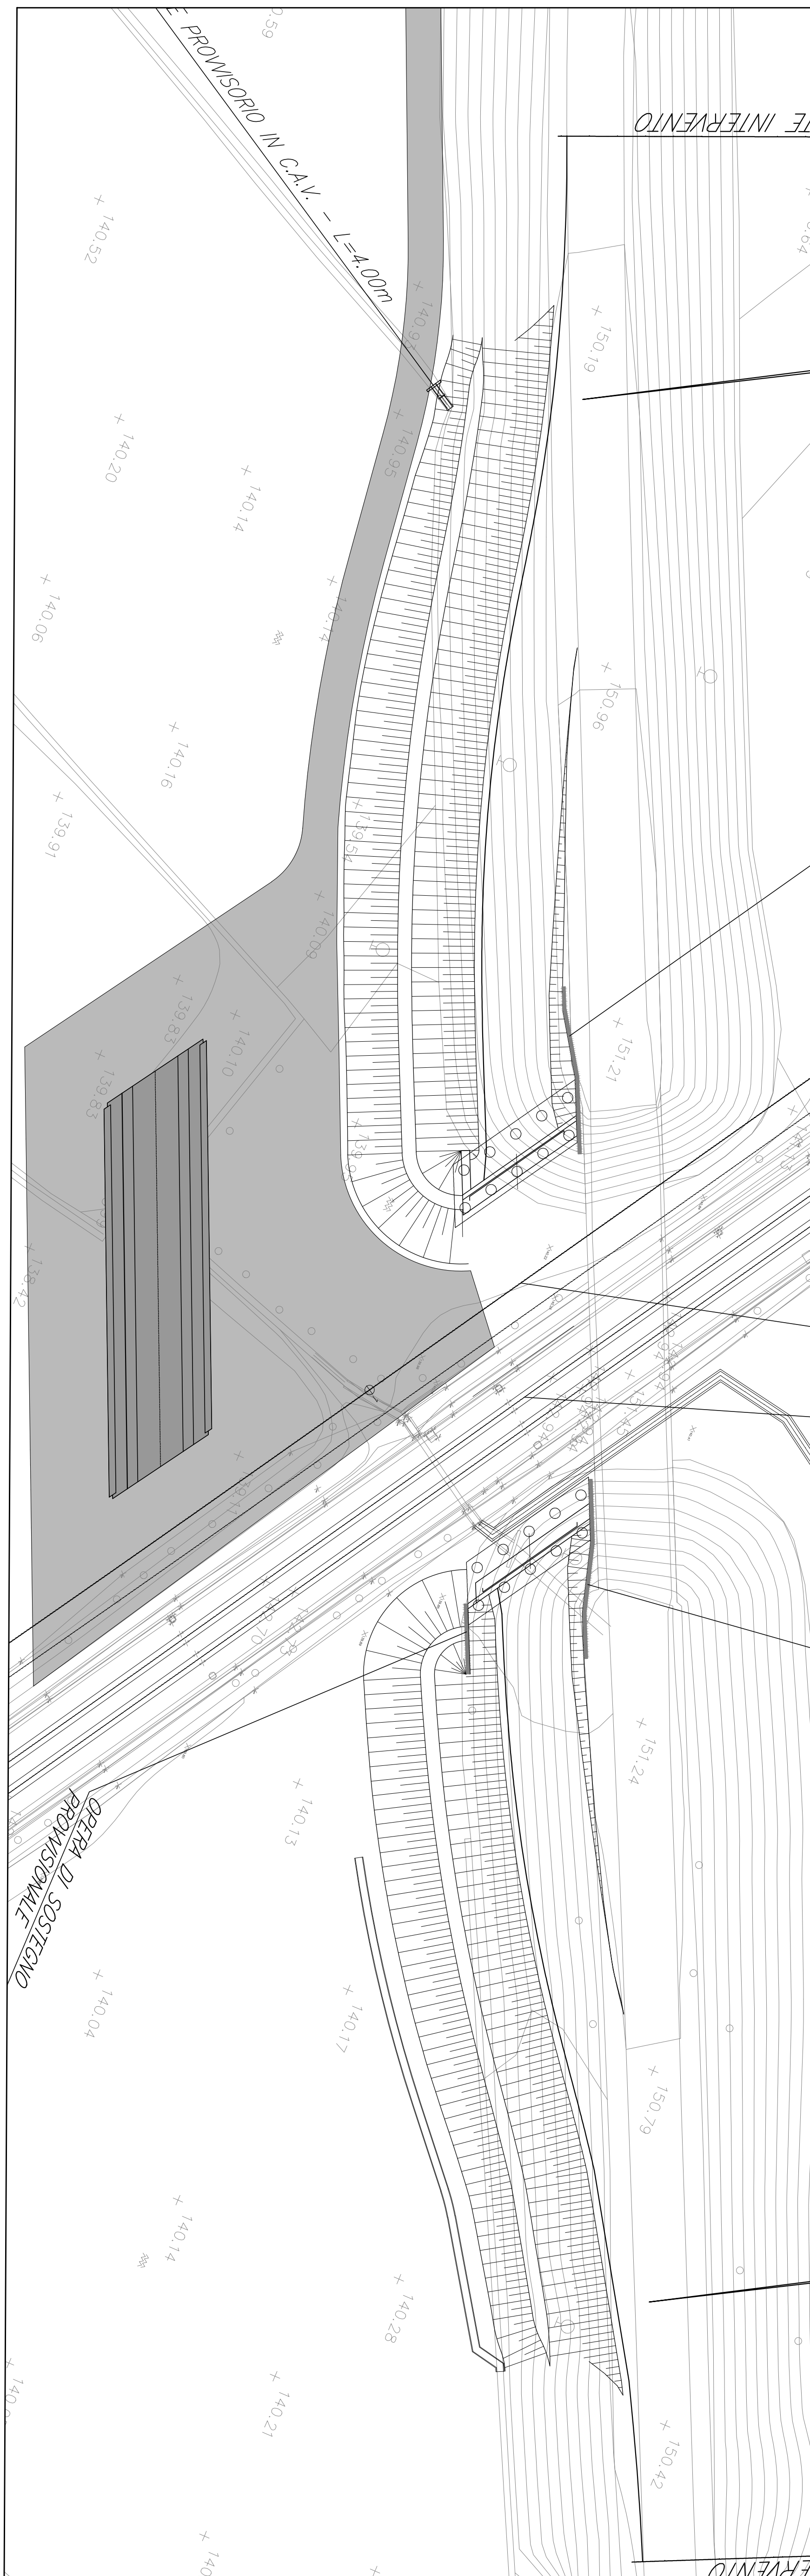


Fase 2

- Posizionamento gru (portata minima 600t)
- Avvicinamento impalcato mediante carrelli idraulici (S1)
- Sollevamento e posizionamento del viadotto nella posizione provvisoria (S2)
- Getto soletta, realizzazione opere di finitura
- Apertura al traffico viabilità provvisoria

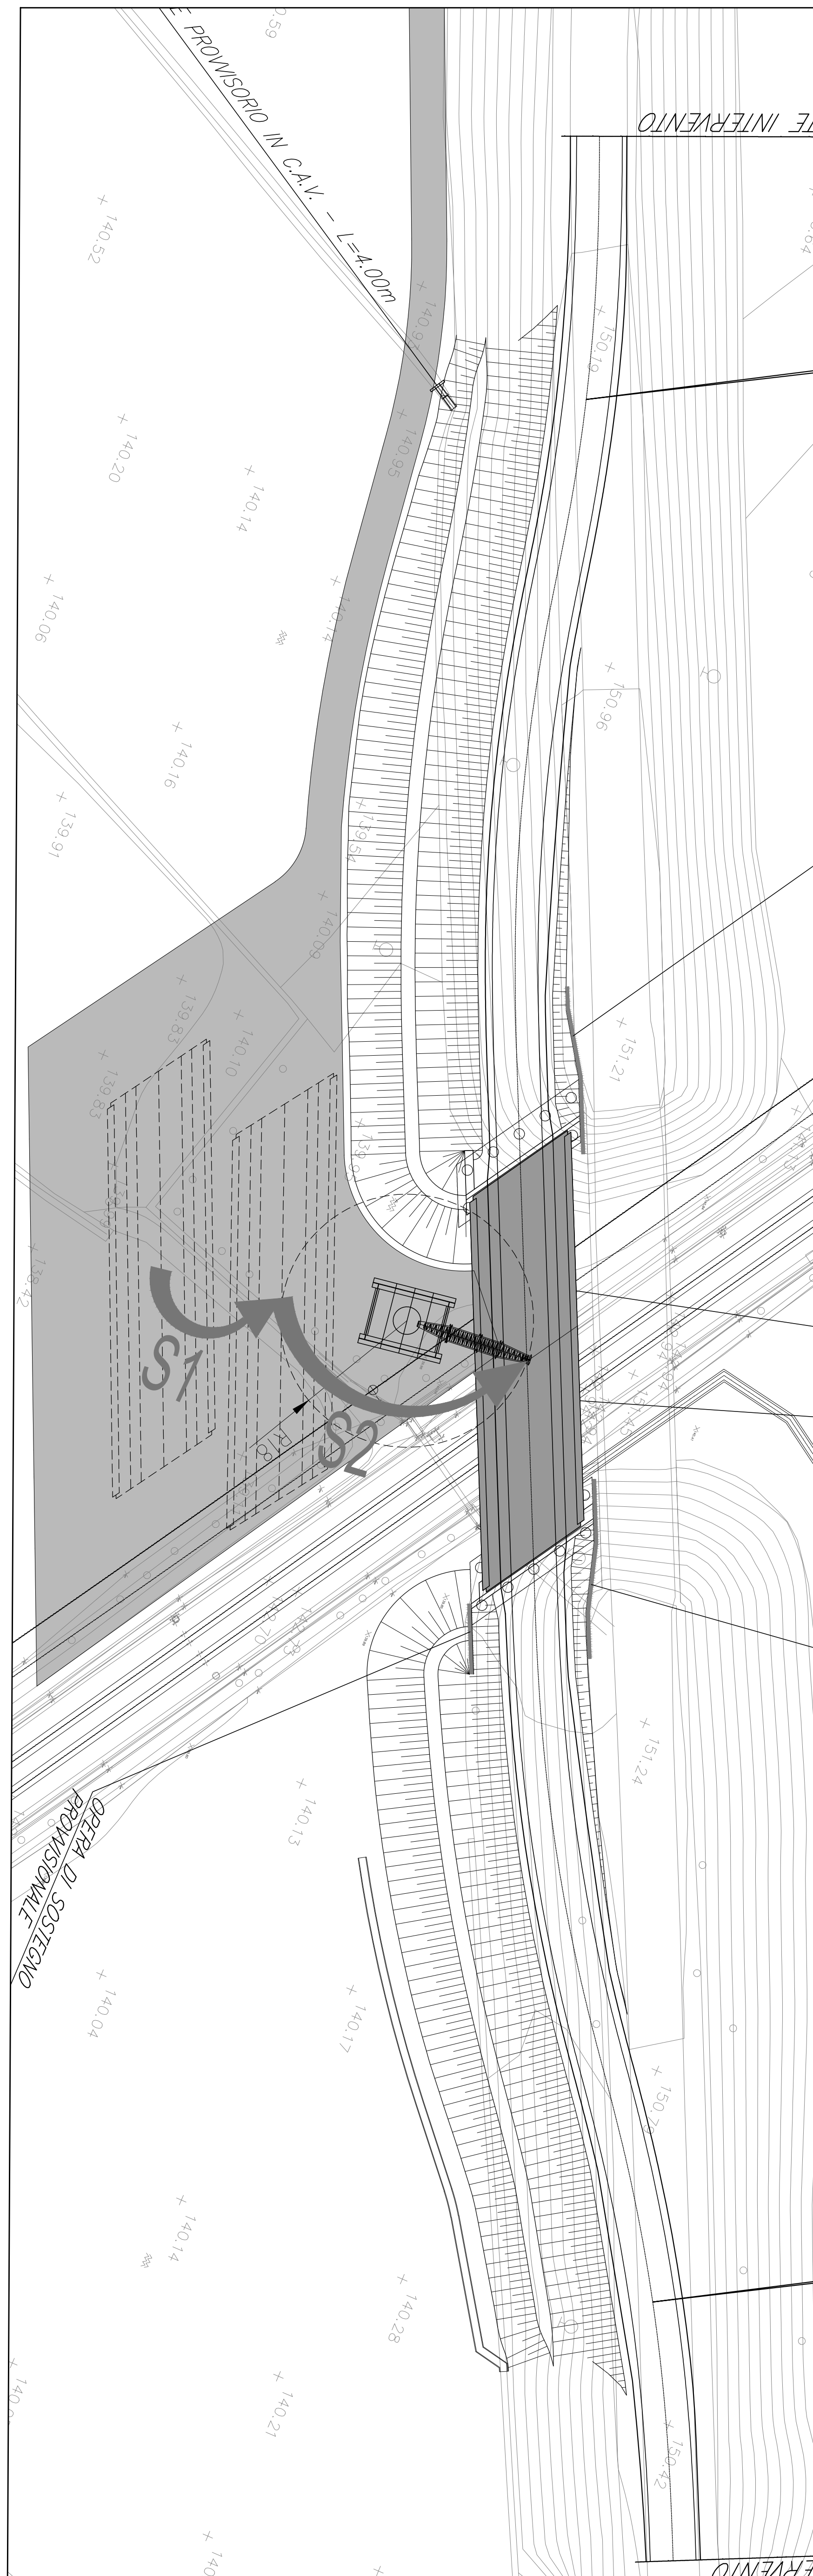


Fase 3

- Realizzazione spalle definitive
- Realizzazione rilevati definitivi
- Posizionamento gru (portata minima 2x400t)
- Sollevamento viadotto, montaggio nuove zanche apparecchi di appoggio
- Calaggio del viadotto nella posizione definitiva sfruttando le riserve opportunamente predisposte nelle spalle definitive
- Apertura al traffico viabilità definitivo

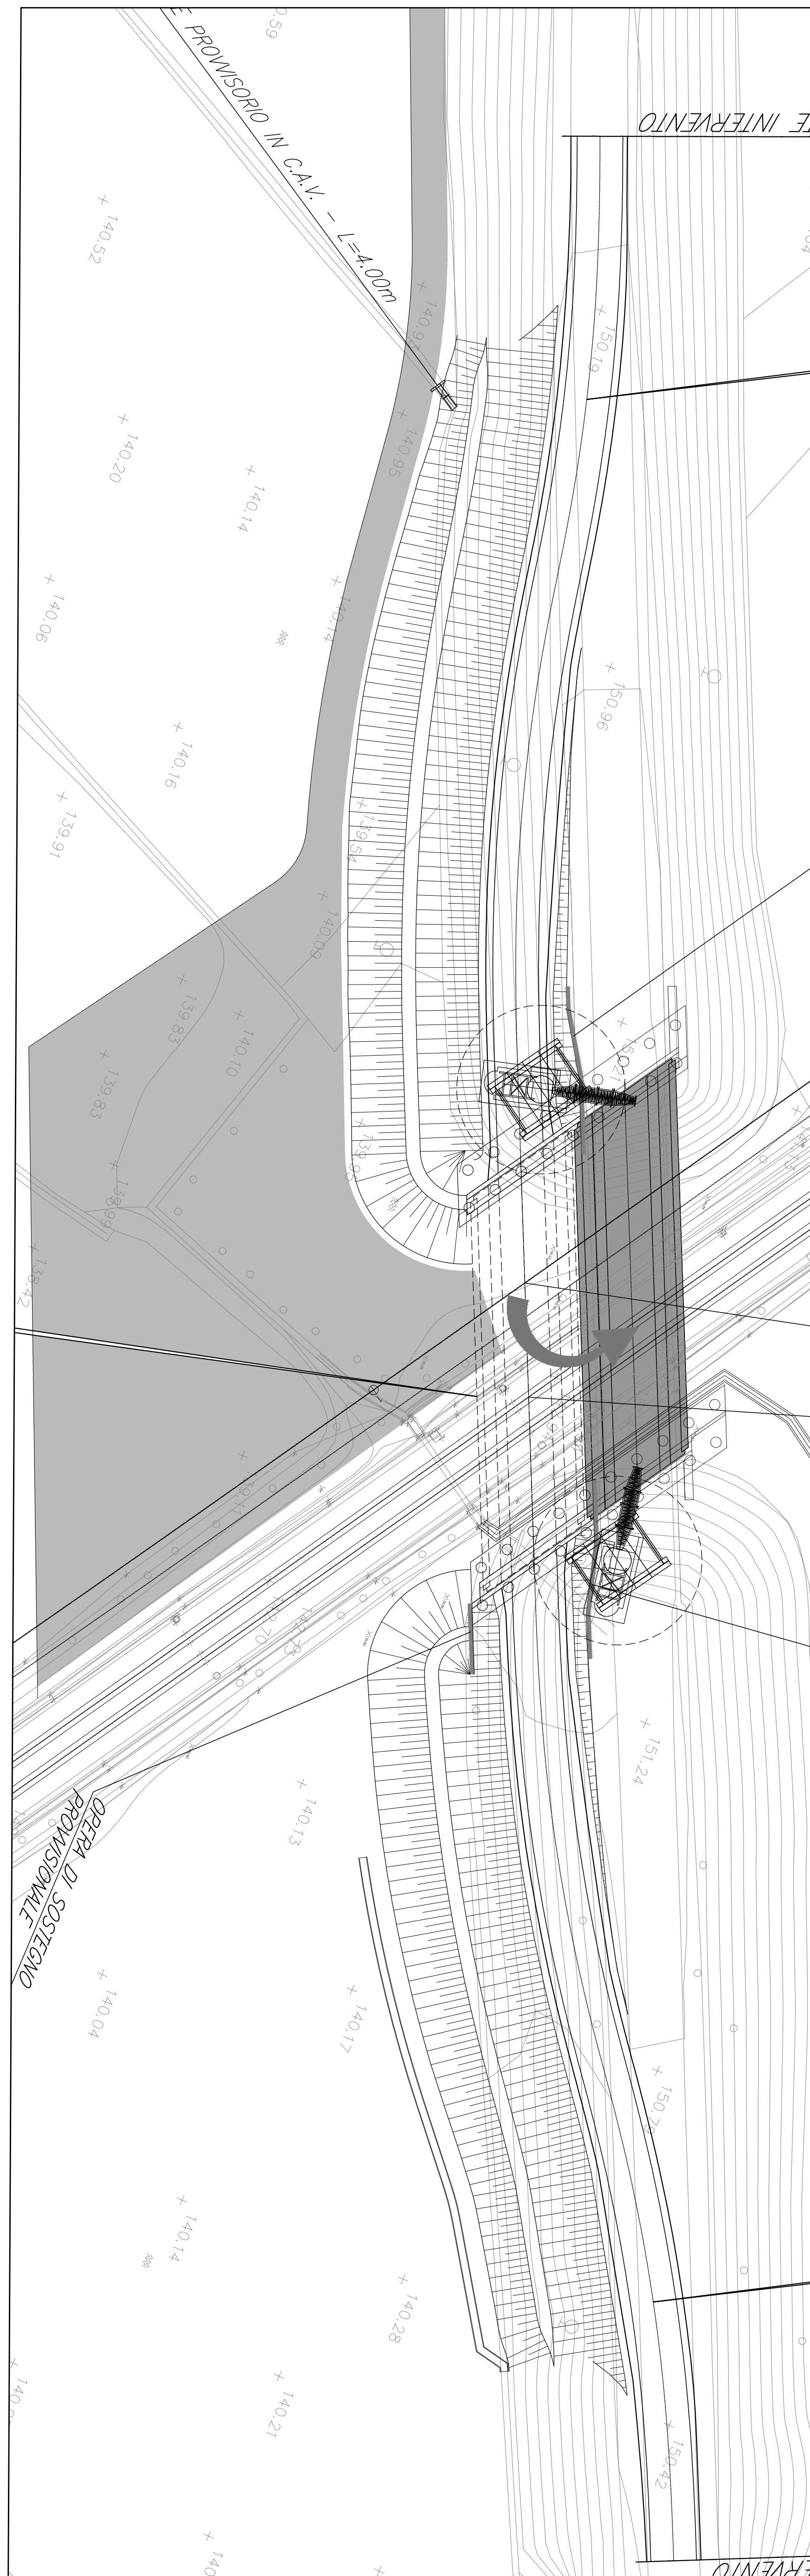

Fase 4

- Rimozione rilevati provvisori
- Demolizione parziale delle spalle definitive
- Realizzazione opere di finitura e completamento
- Smobilizzo aree di cantiere

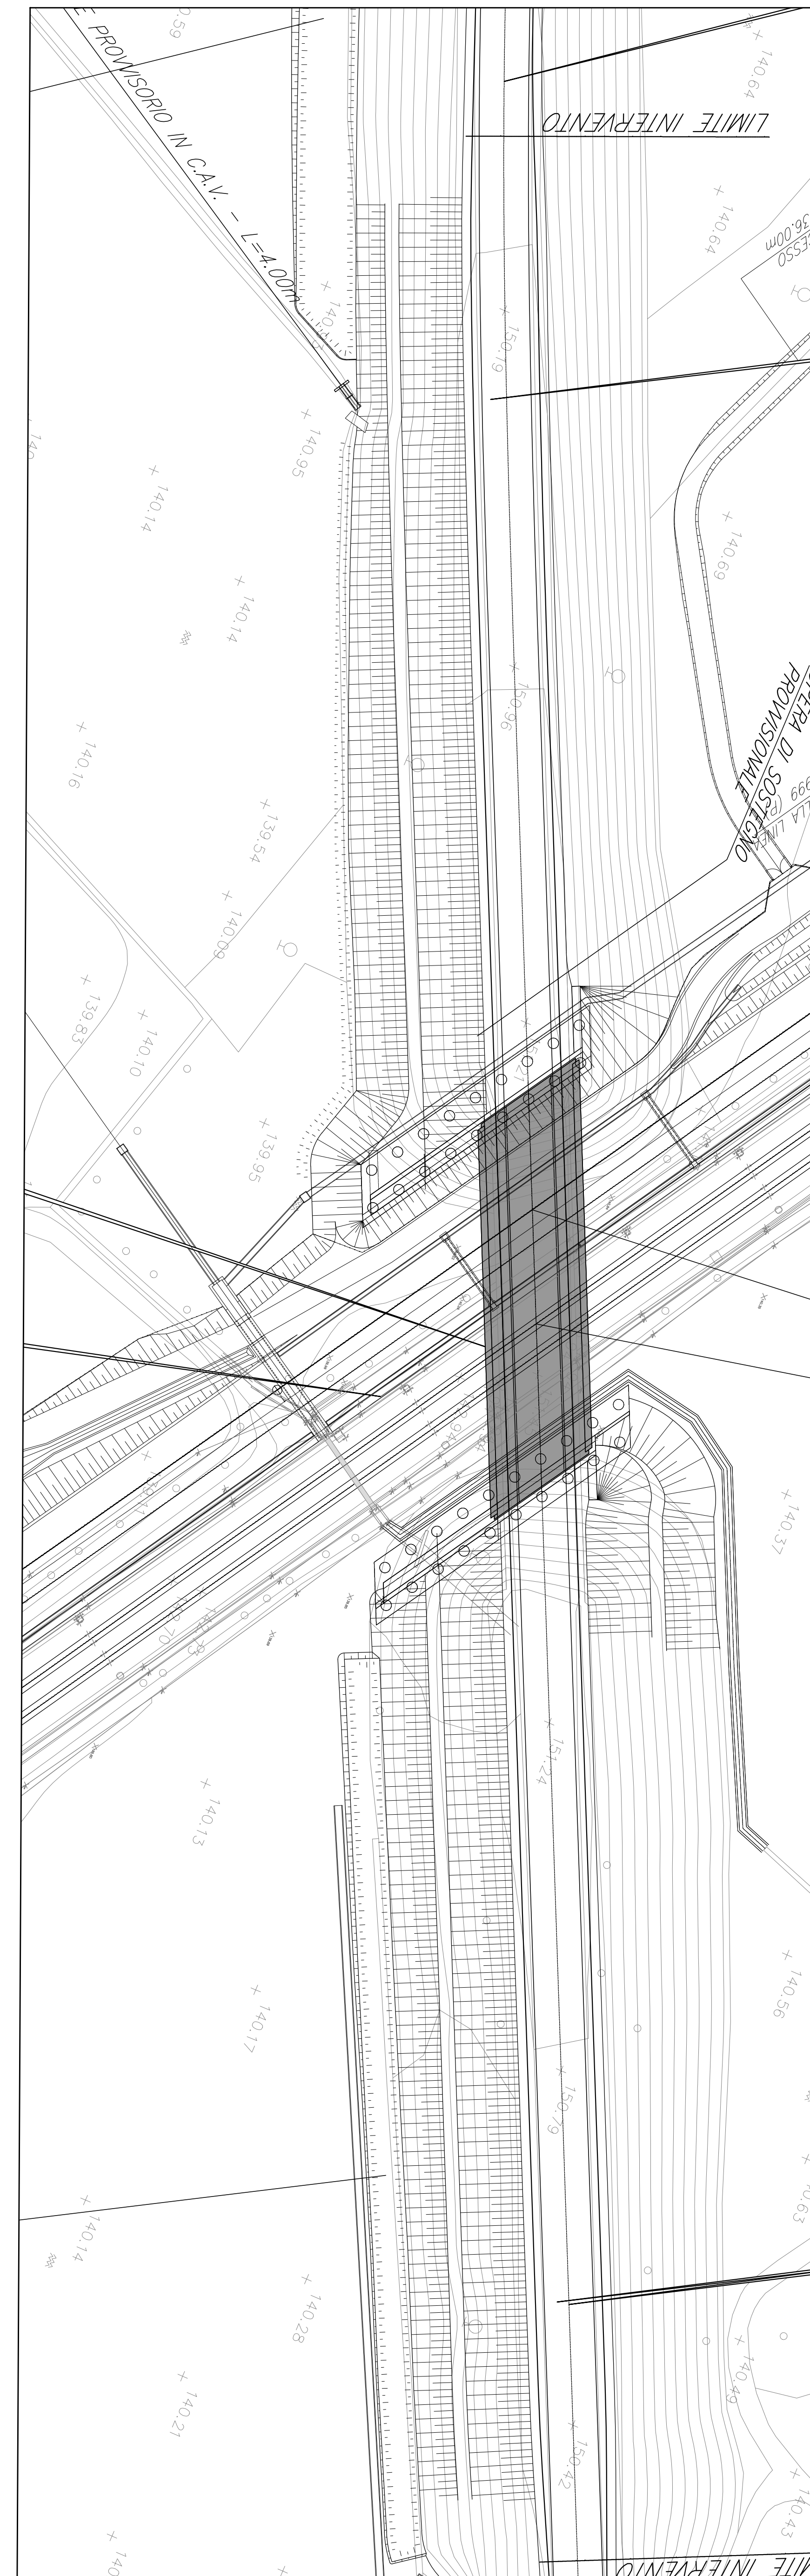

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
IV28 - CAVALCAFERROVIA TANG. SUD BS - COLLEGAMENTO QB5/AC km 107+055.597	
PRESCRIZIONI MATERIALI E NOTE GENERALI	INOR11EE24TV0000001
SOLLEVAMENTO ESCLUSIVO IMPALCATO	INOR11EE28TV0000001
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - CANTINA CON BOCACCIO	INOR11EE29TV0000001
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - ELEMENTO DI AGGIUNTA CONNESSIONE TRD C	INOR11EE29TV0000002
ARREDO IMPALCATO - RETE DI PROTEZIONE H.100CM	INOR11EE29TV0000003
ARREDO IMPALCATO - PARAPETTO FERRUGINEO H.110CM	INOR11EE29TV0000004
IV28 - CAVALCAFERROVIA TANG. SUD BS - COLLEGAMENTO QB5/AC km 107+055.597	
RELAZIONE TECNICA GENERALE CANTALONIERA	INOR11EE29TV0000001
SEZIONE LONGITUDINALE, PROSPETTO LONGITUDINALE E SEZIONE TRASVERSALE	INOR11EE29TV0000002
PIANTA TRACCIAMENTO SOTTOSTRUTTURE E PUNTI DI FONDAZIONE	INOR11EE29TV0000003
CARPENTERIA SPALLA A - TAVOLA 1/2	INOR11EE29TV0000004
CARPENTERIA SPALLA A - TAVOLA 2/2	INOR11EE29TV0000005
CARPENTERIA SPALLA B - TAVOLA 1/2	INOR11EE29TV0000006
CARPENTERIA SPALLA B - TAVOLA 2/2	INOR11EE29TV0000007
DISPOSITIVI DI APPROSSO E GIUNTI	INOR11EE29TV0000008
CARPENTERIA IMPALCATO - DETTAGLI ED ASSEMBLAGE	INOR11EE29TV0000009
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - DISCORSO D'ASSEMBLAGE	INOR11EE29TV0000010
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - SEZIONI TRASVERSALI E DETTAGLI	INOR11EE29TV0000011
CARPENTERIA METALLICA IMPALCATO - TRAVERSI	INOR11EE29TV0000012
LASTRE TRALICCIATE IMPALCATO - TAVOLA 1/2	INOR11EE29TV0000013
LASTRE TRALICCIATE IMPALCATO - TAVOLA 2/2	INOR11EE29TV0000014
ARMATURA SOLETTA IMPALCATO	INOR11EE29TV0000015
FASI COSTRUTTIVE - TAVOLA 1/2	INOR11EE29TV0000016

NOTE GENERALI

- TUTTE LE Misure SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PER PRESCRIZIONI MATERIALI E NOTE GENERALI VERGERE ELABORATO:
 PRESCRIZIONI MATERIALI E NOTE GENERALI INOR11EE24TV0000001

COMMITTENTE:

ALTA SORVEGLIANZA:

GENERAL CONTRACTOR:

CONSORZIO ENI PER L'ALTA VELOCITA'

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. I.A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA
 Lotto funzionale Brescia-Verona
 PROGETTO ESECUTIVO
 IV28 - CAVALCAFERROVIA TANG. SUD BS - COLLEGAMENTO QB5/AC km 107+055.597
 Fasi costruttive. Tavola 2/2

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:					
Comitato		1:250					
Cepav due							
Data:	Data:						
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
INOR	12	E	E2	B2	IV28A1	002	A
PROGETTISTAZIONE							
Rev.	Descrizione	Autore	Data	Verifica	Data	Approvazione	Data
A	Emissione	Boni	08/05/20	Planifera	08/05/20	Libri	08/05/20
B							
C							
CHG. 751447334A File: INOR12EE28ZV28A1002A_10.dwg Progetto collaborato da: Itiner Europei Scale di plot: 1:1							
