



SEZIONE TRASVERSALE B-B - USCITA STI. FASE 1:

- Scavo di 1° fase fino alla quota di intradesso della copertura e spostamento dei sottoservizi
- Realizzazione dei cordoli guida
- Realizzazione dei tappi di fondo in cls e dei diaframmi
- Getto magrone e posa telo in pvc

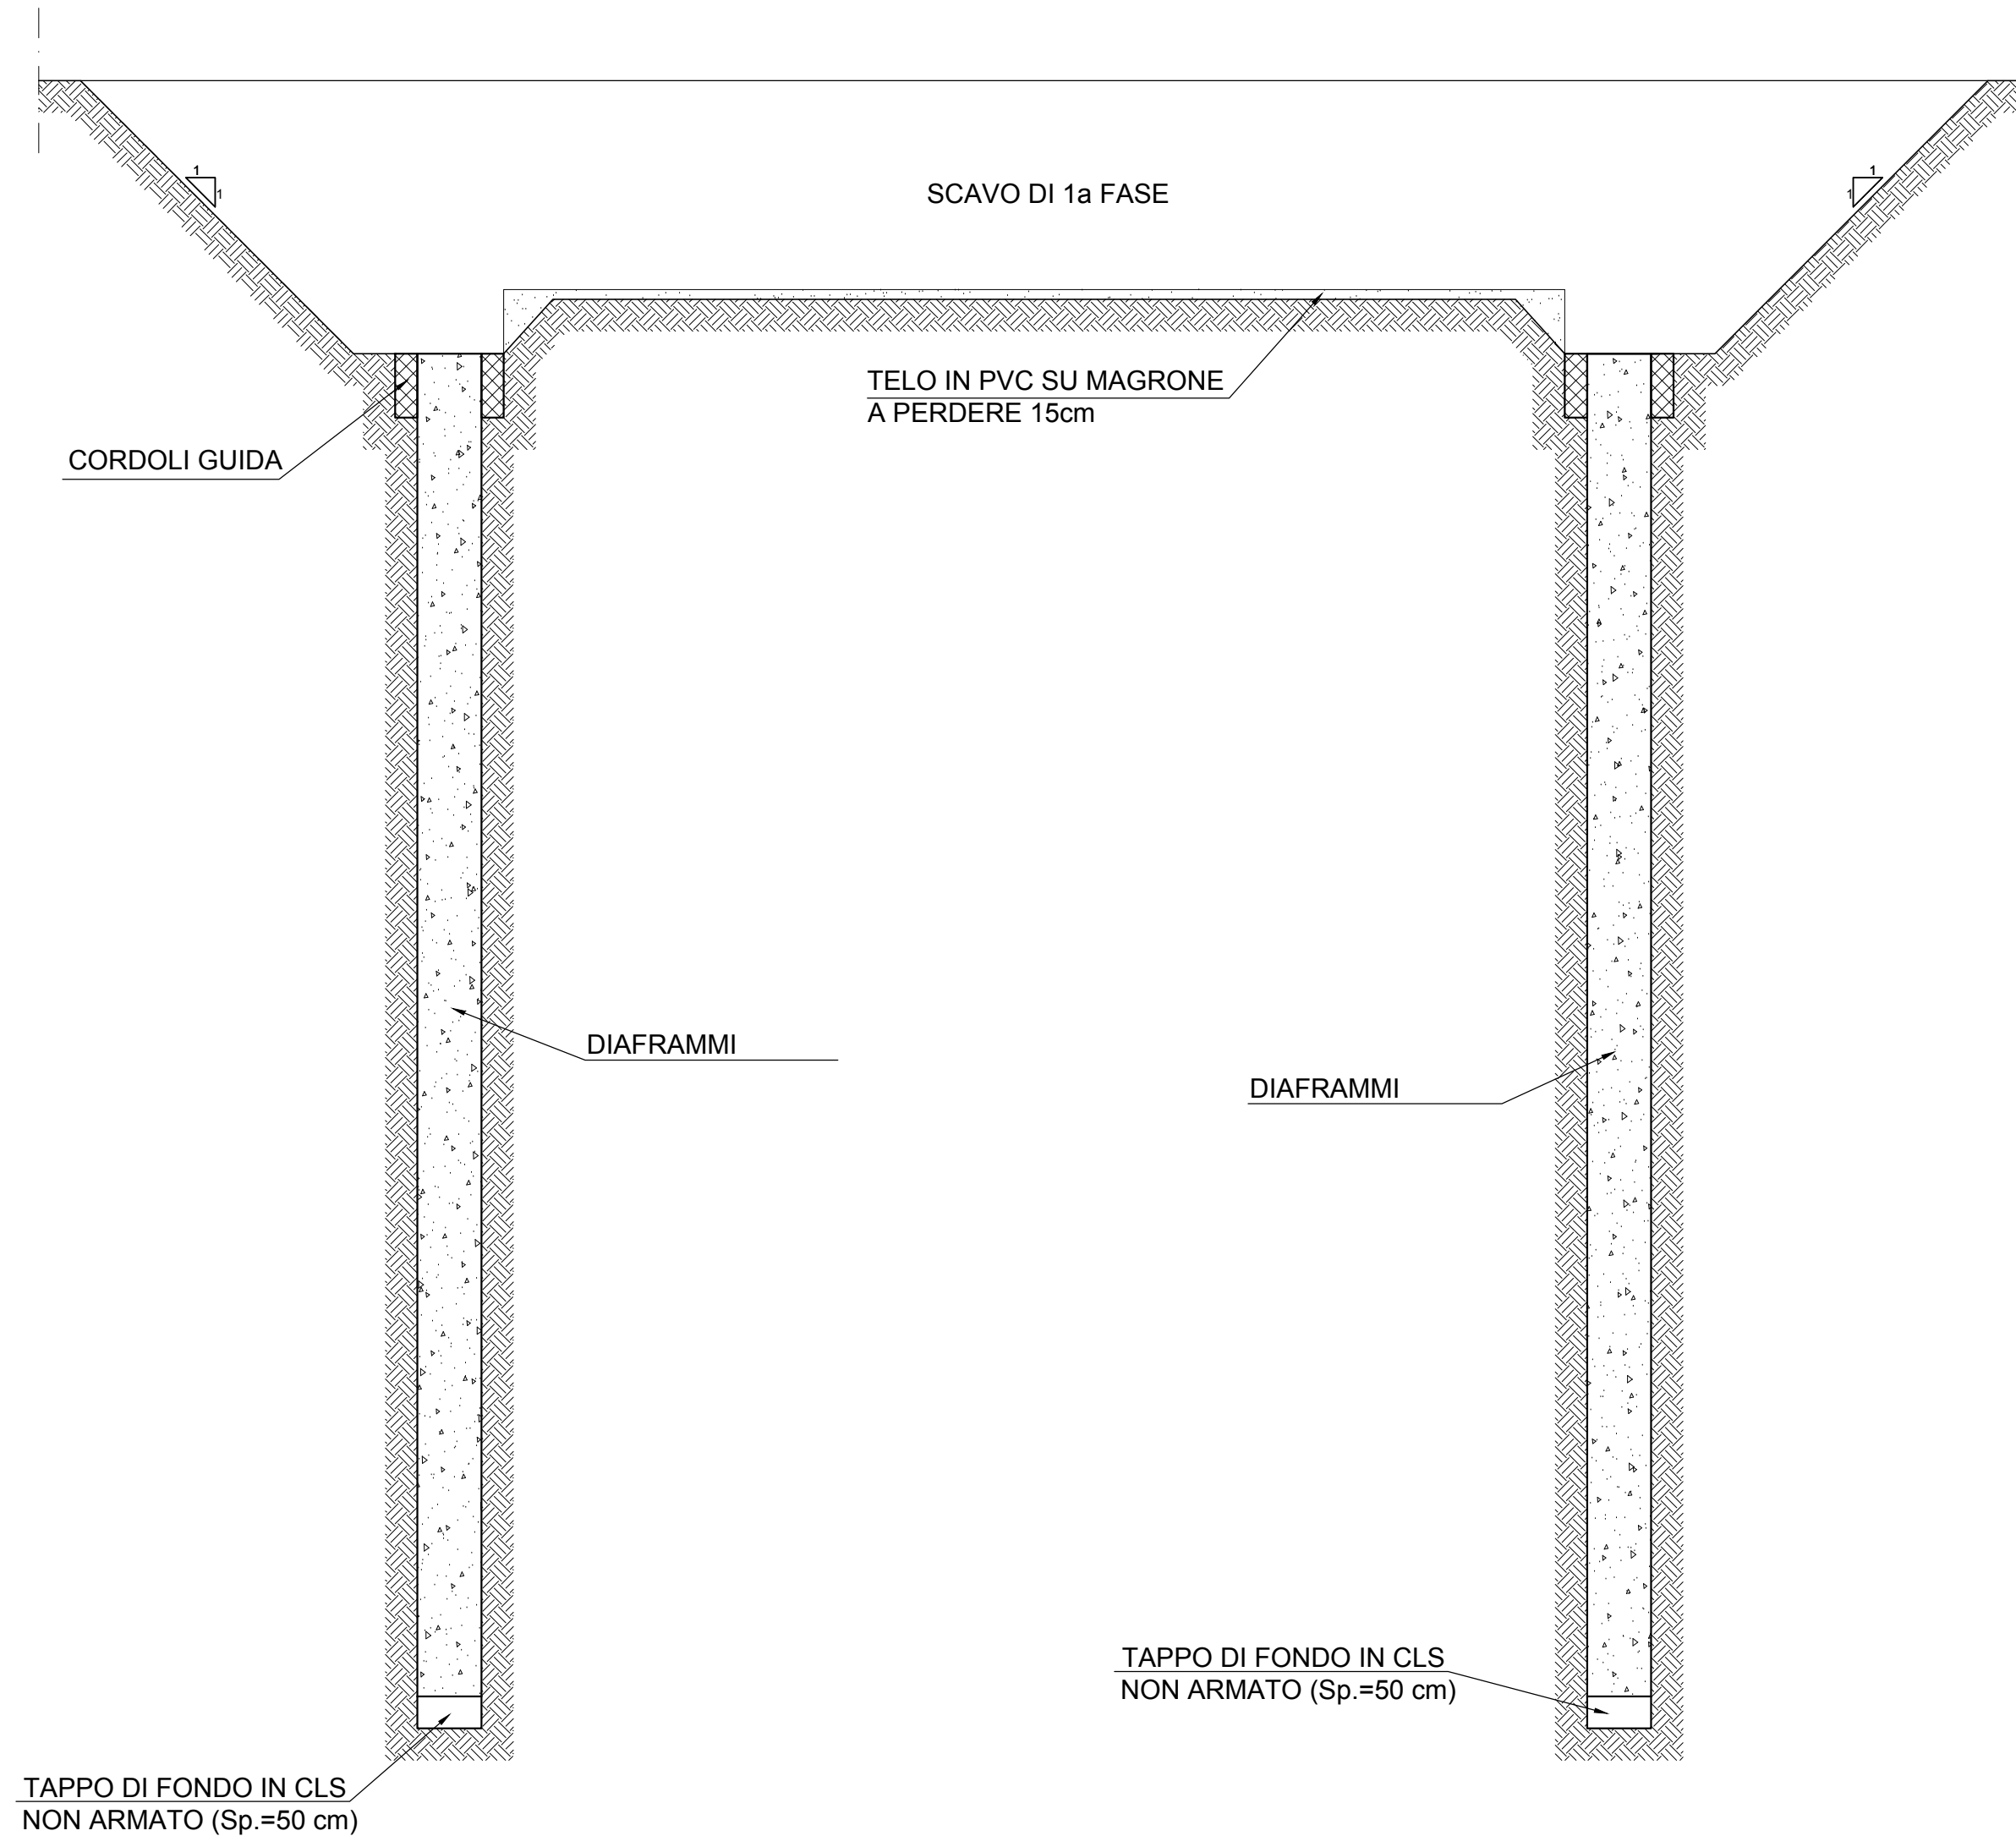


SEZIONE TRASVERSALE B-B - USCITA STI. FASE 4

- Scavo di 2° fase a foro cieco fino a quota imposta fondazione, con mantenimento di aria in pressione durante l'esecuzione delle lavorazioni per garantire l'abbassamento del livello di falda al di sotto del fondo scavo
- Posa 1° strato di magrone di fondo scavo sp. 15 cm
- Posa strato di impermeabilizzazione
- Posa 2° strato di magrone sp. 5 cm a protezione strato impermeabile

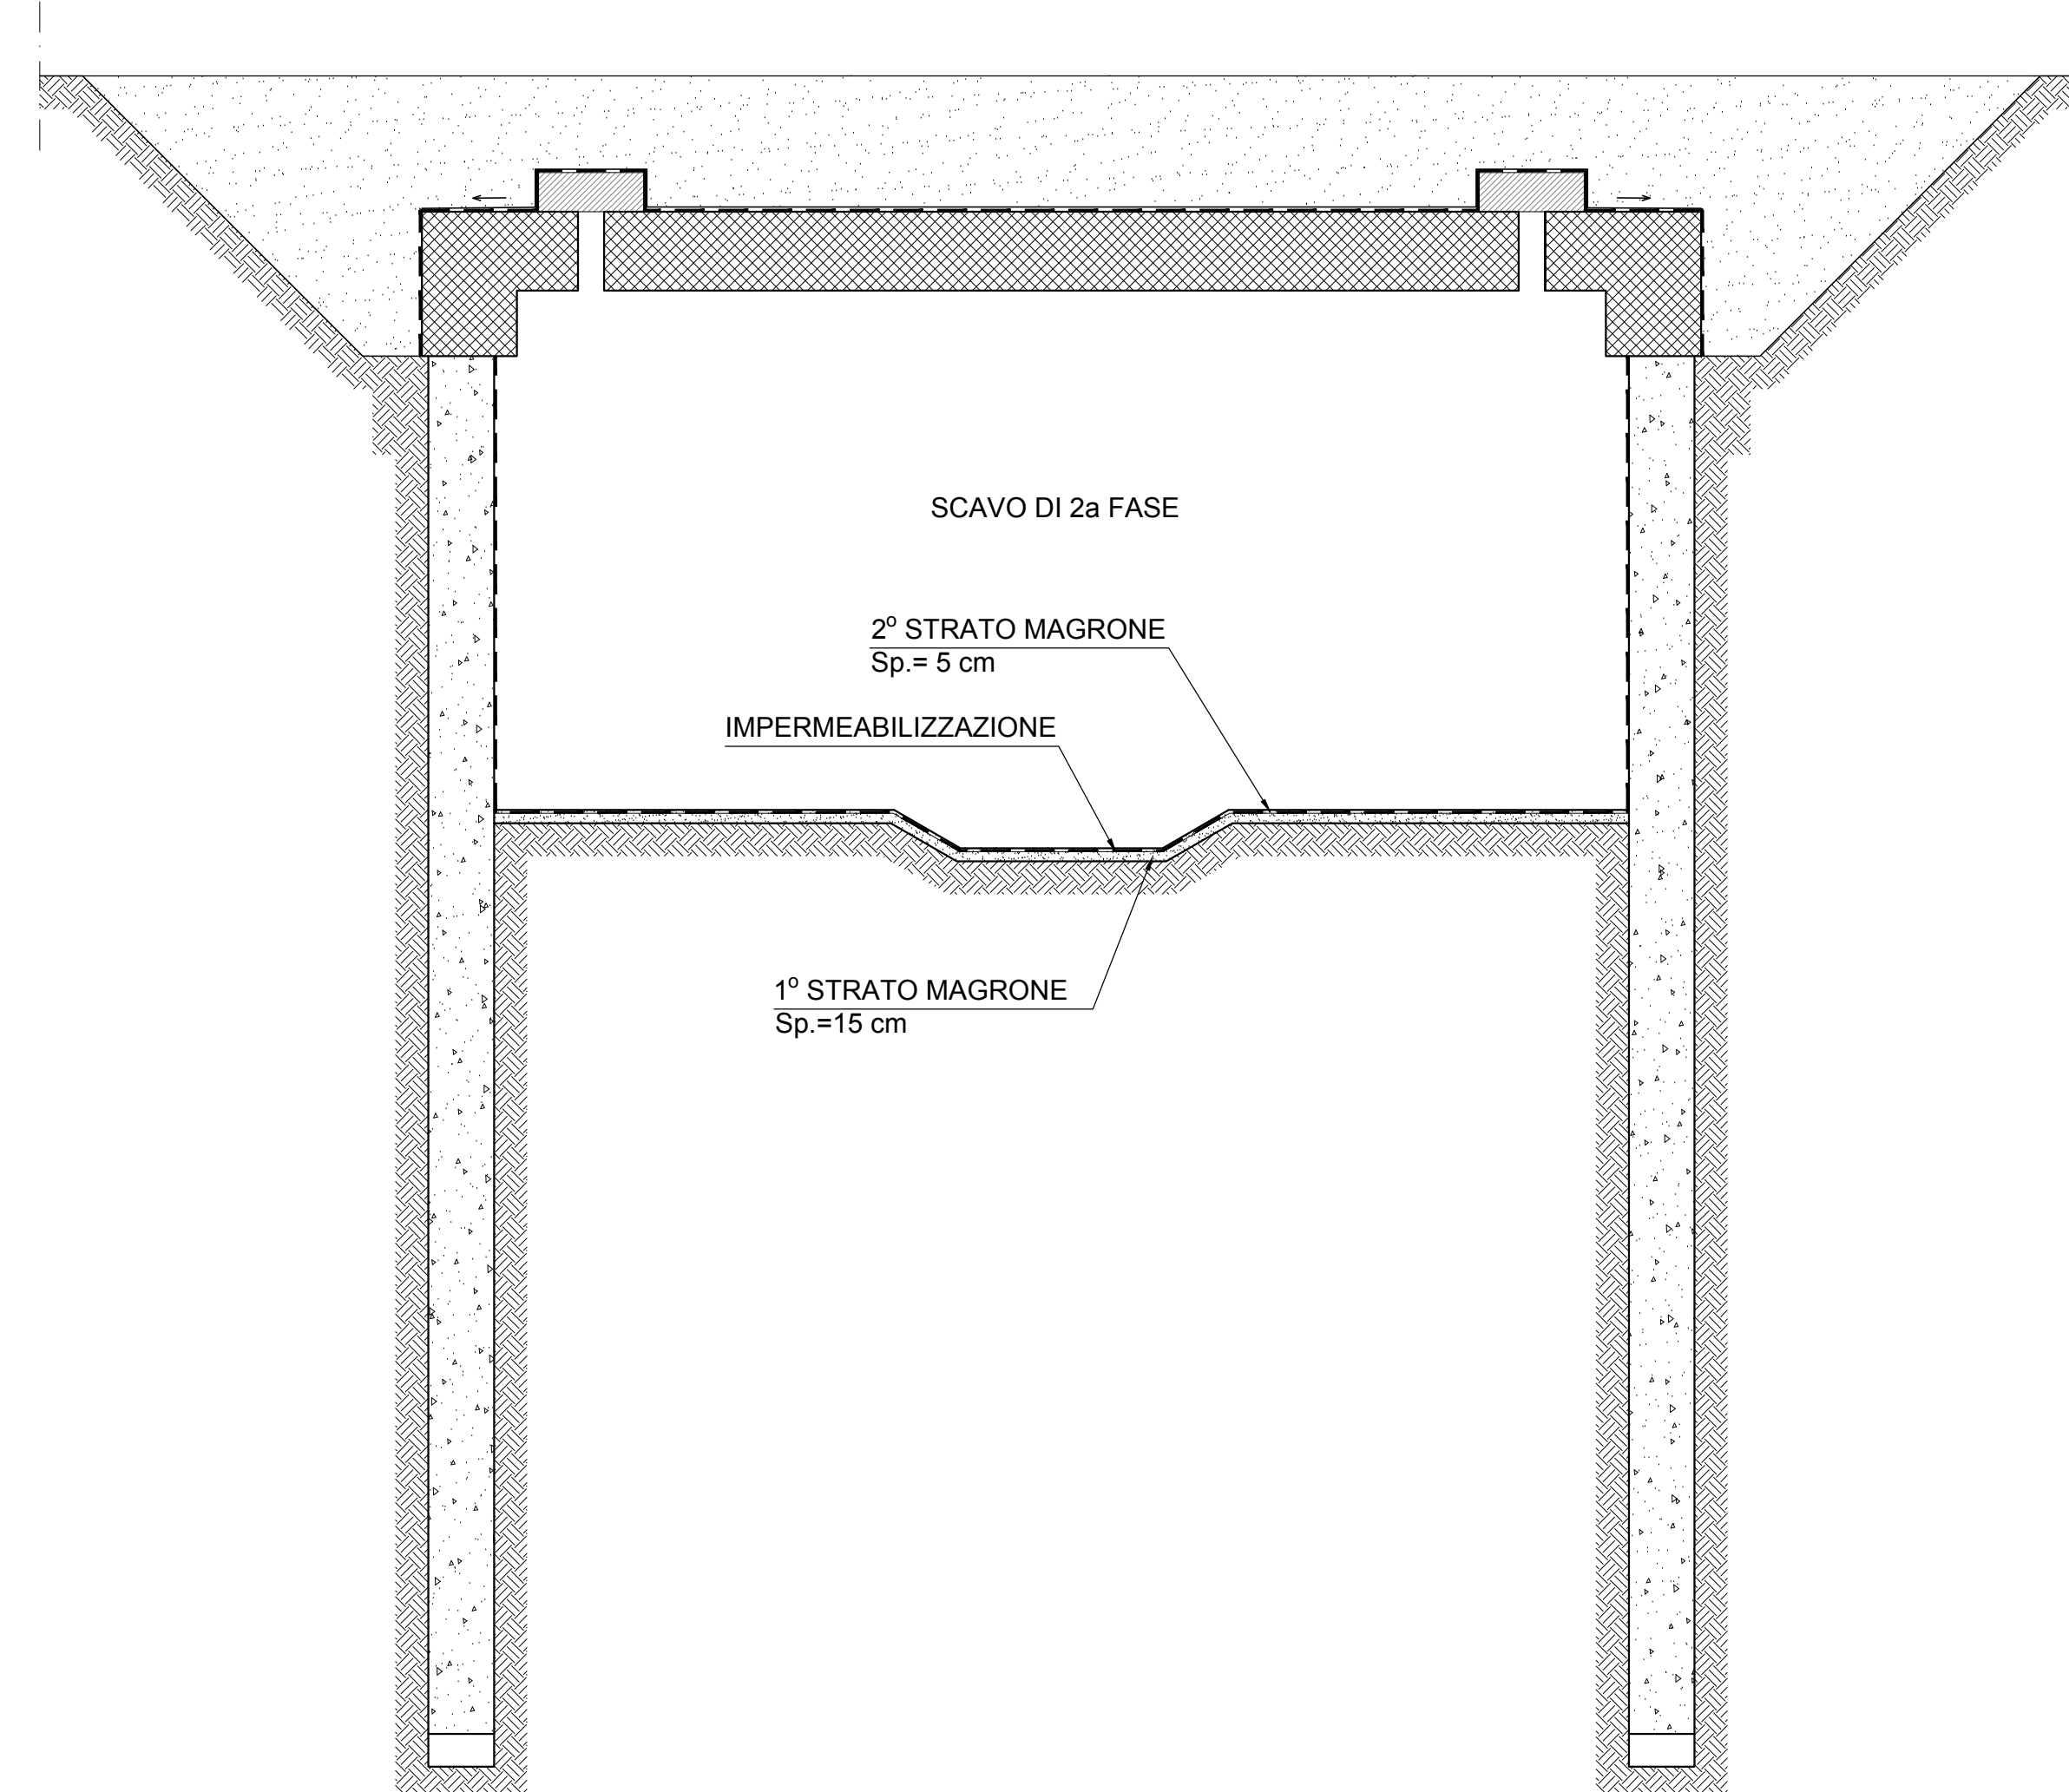


SEZIONE TRASVERSALE B-B - USCITA STI. FASE 2

- Realizzazione solettoni di copertura
- Realizzazione di strutture in C. A. per la chiusura delle aperture in copertura
- Posa strato impermeabilizzazione e massetto delle pendenze

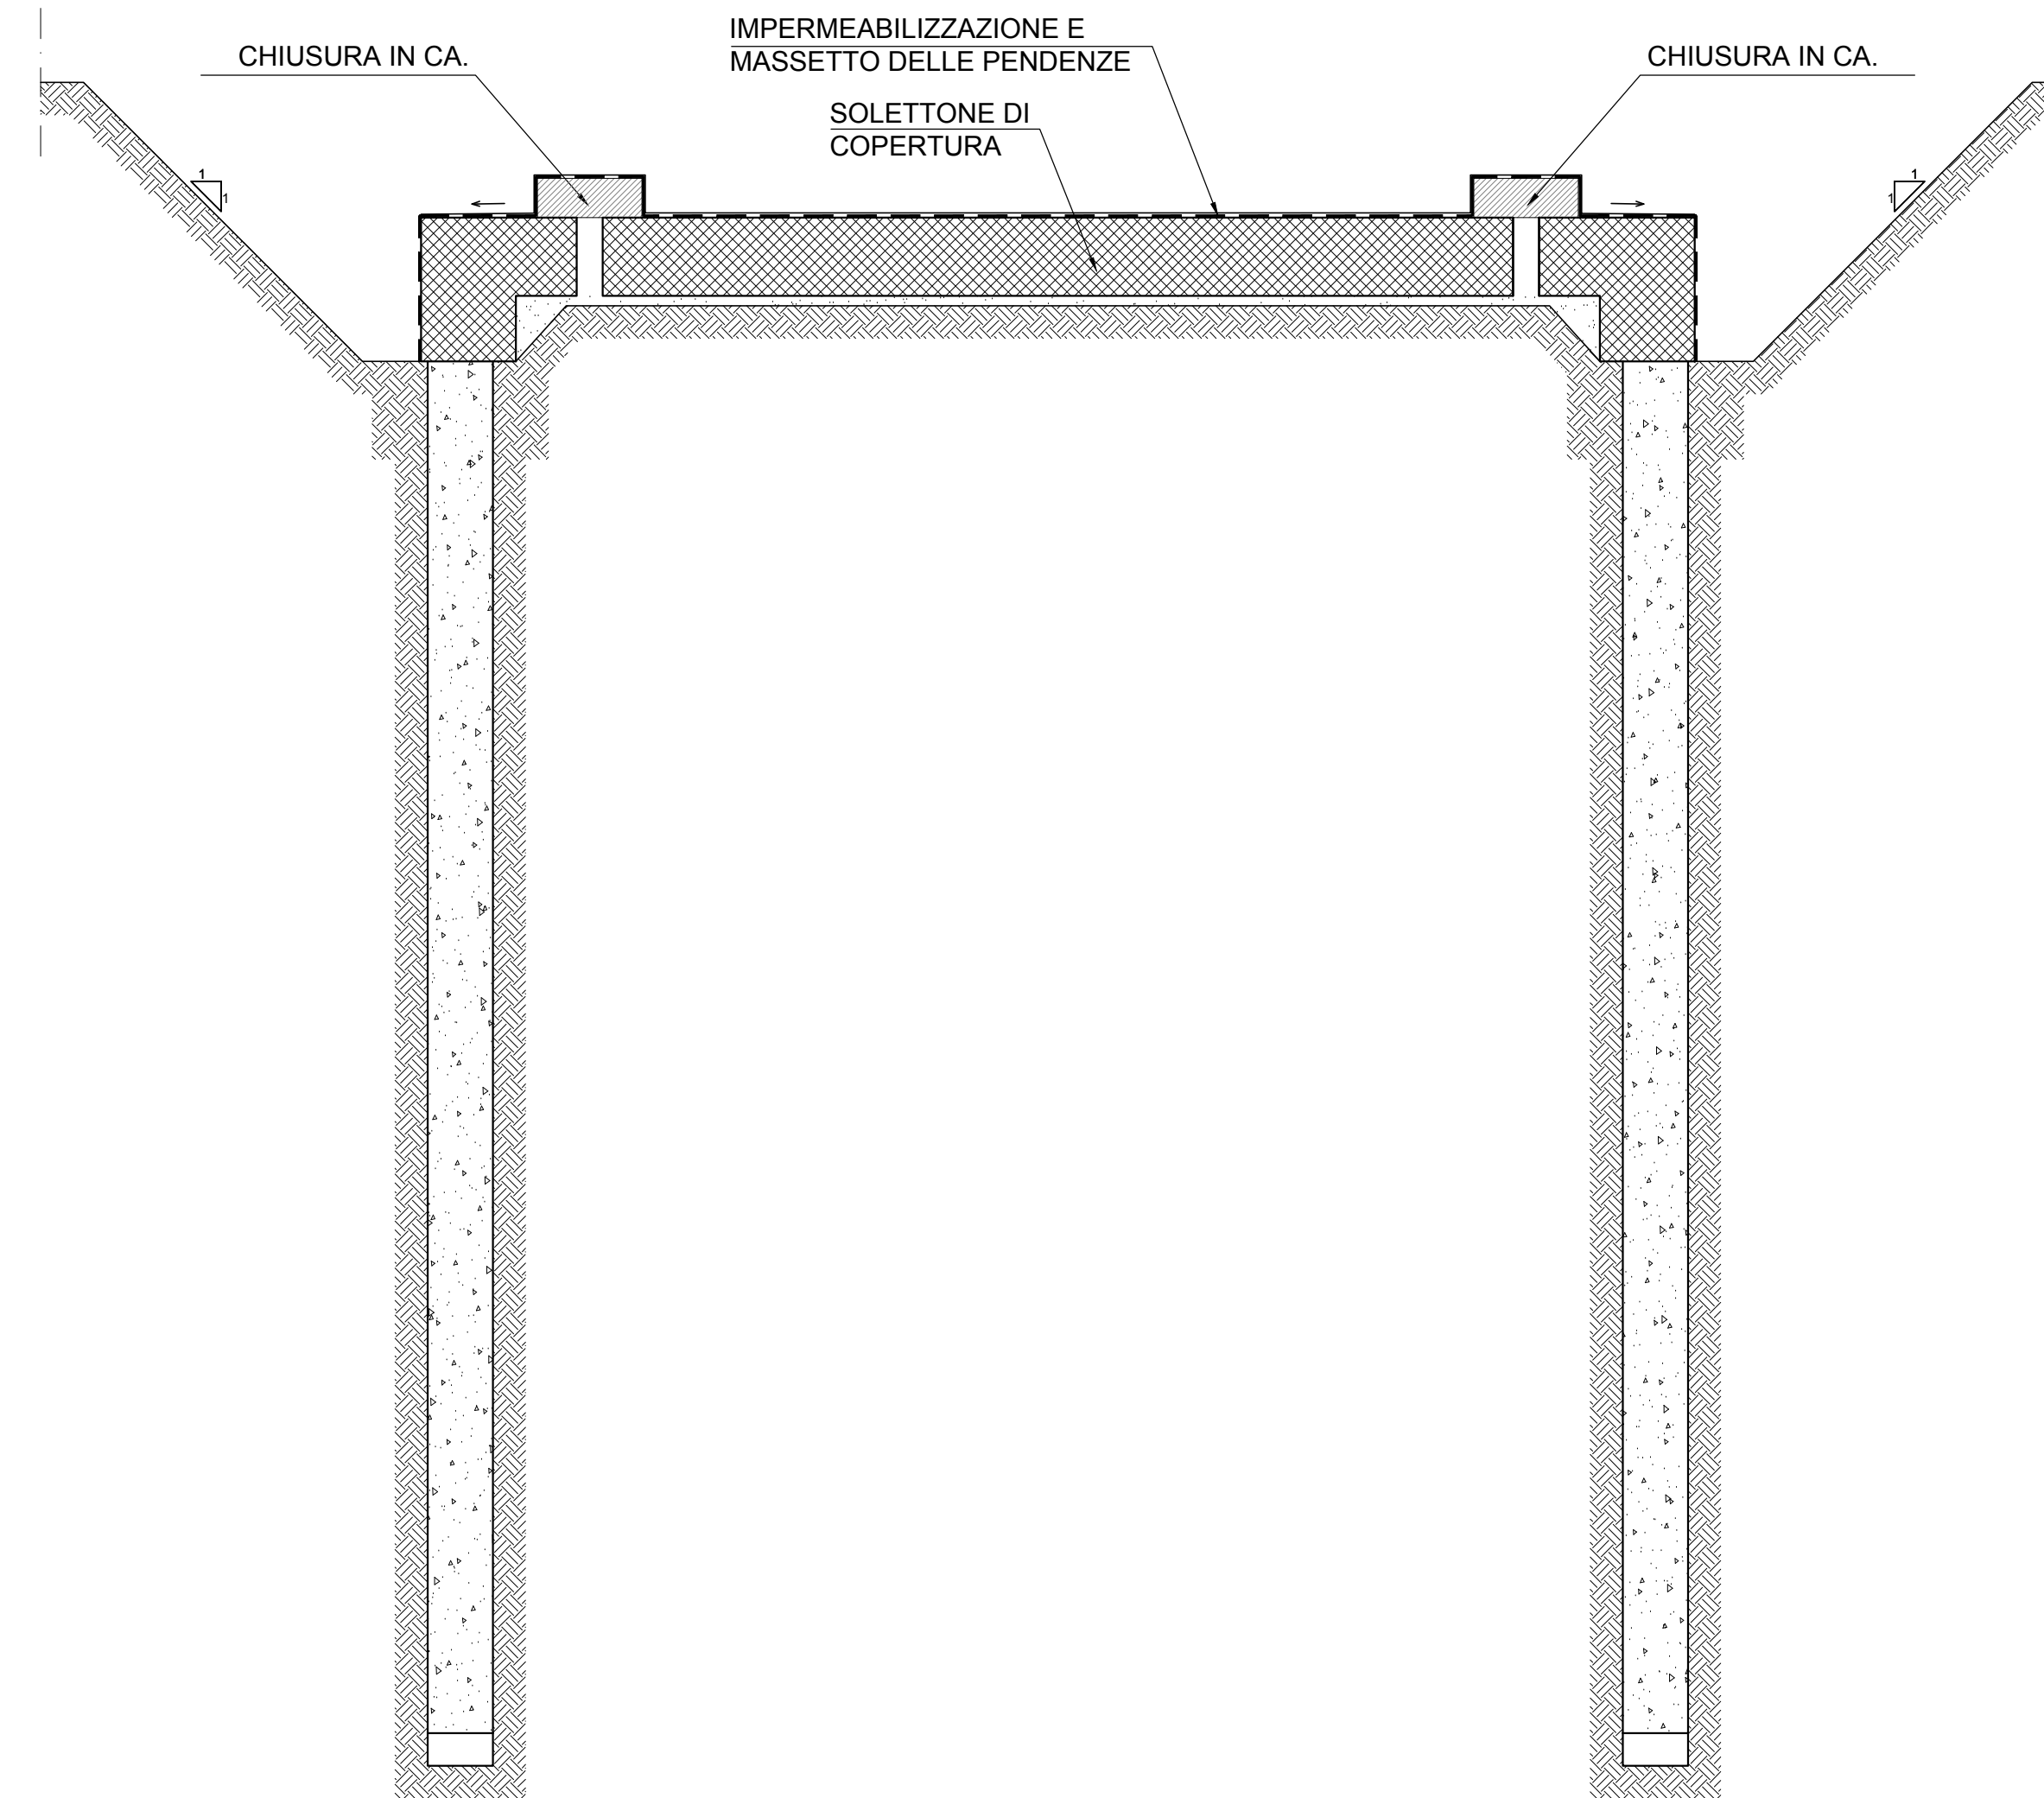



SEZIONE TRASVERSALE B-B - USCITA STI. FASE 5

- Realizzazione soletta di fondazione
- Realizzazione fodere con completamento con malta antiritiro sp. 10 cm
- Disattivazione della pressione interna

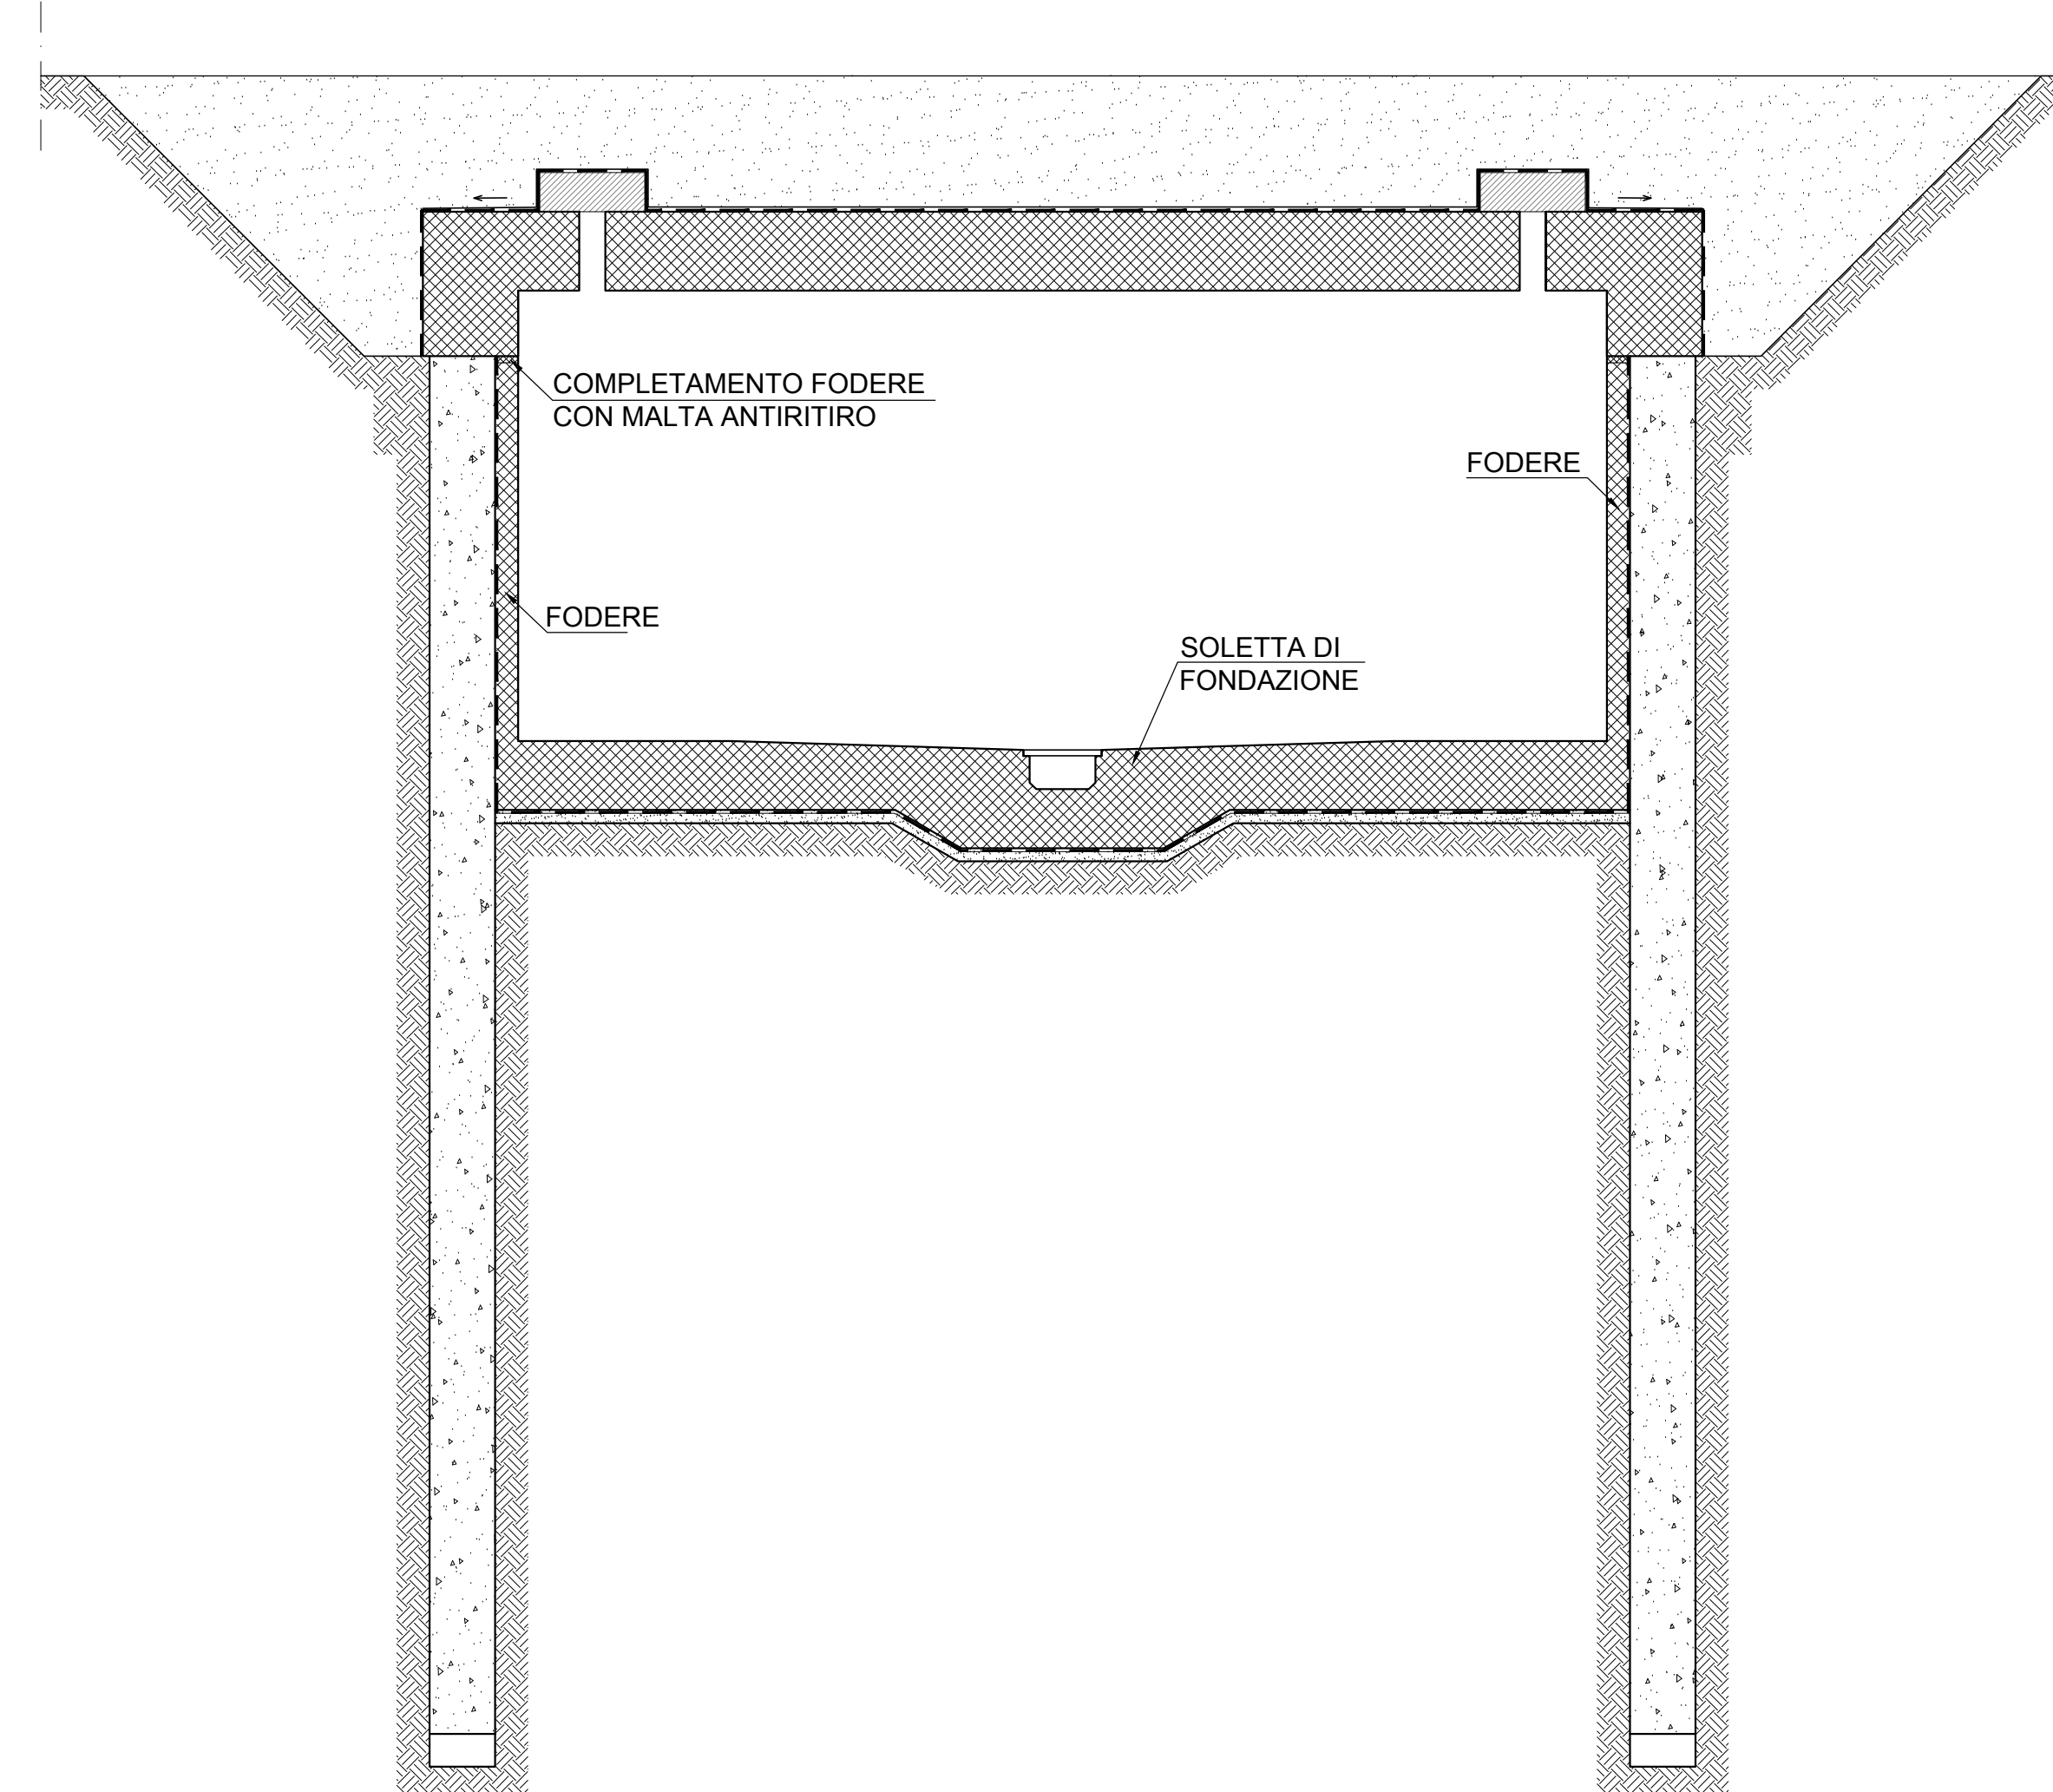

SEZIONE TRASVERSALE B-B - USCITA STI. FASE 3


- Rientro dello scavo sino alla quota di piano campagna

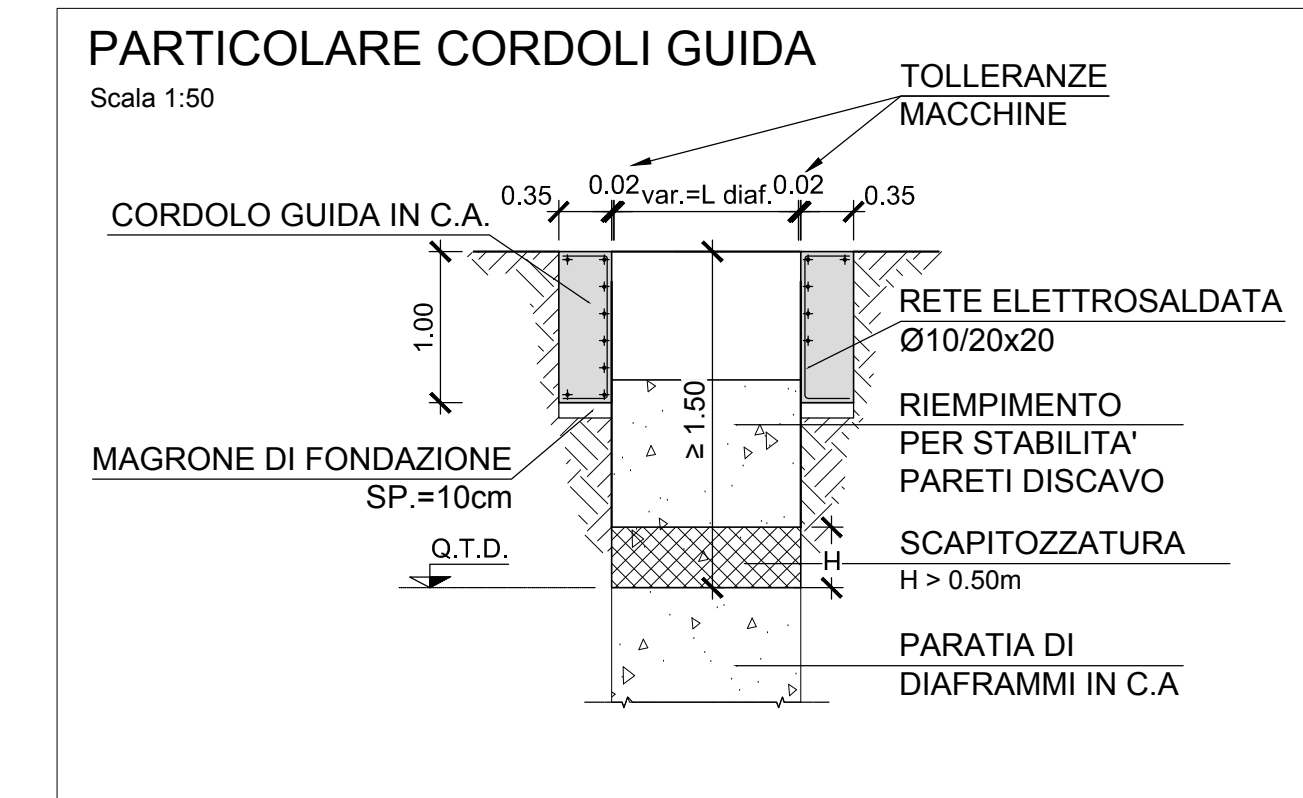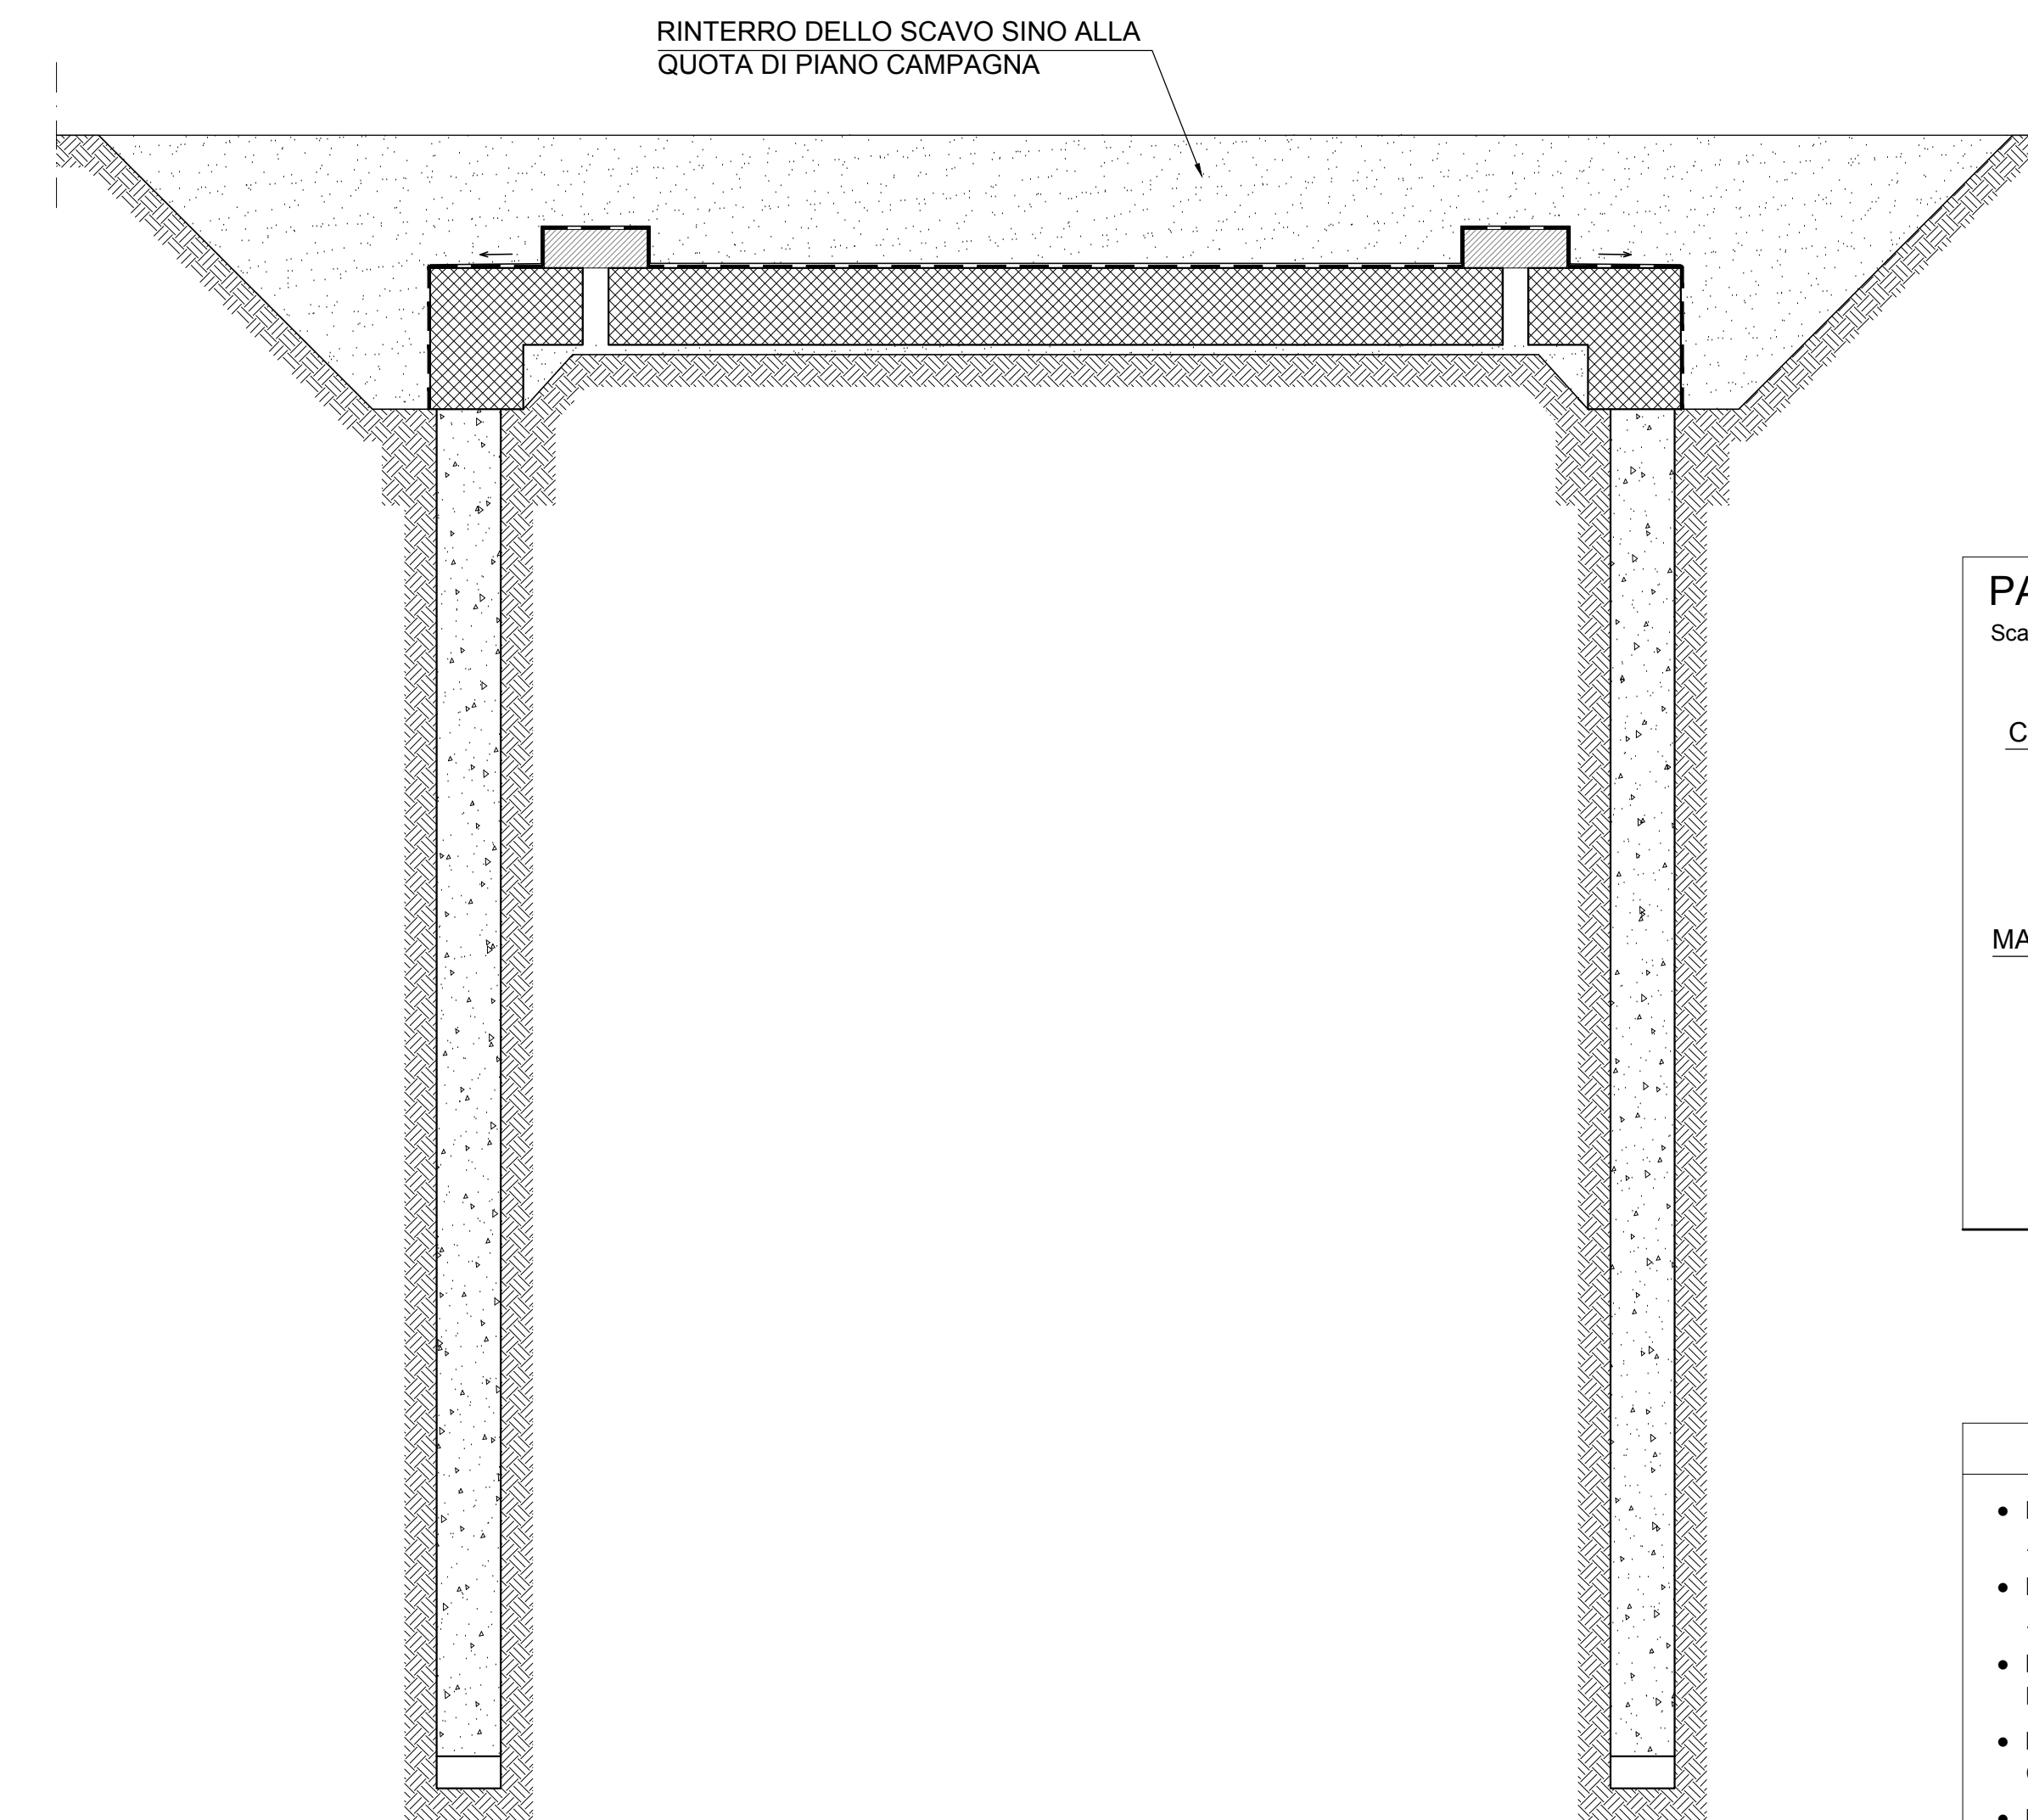

- NOTE**
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI SI FACCIÀ RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO ELABORATO (IF1M.0.0.E.ZZ.TT.GA.00.0.0.001)
 - PER LE INCIDENZE DI ARMATURA DELLE STRUTTURE SI FACCIÀ RIFERIMENTO ALLO SPECIFICO ELABORATO (IF1M.0.0.E.ZZ.TT.GA.00.0.0.001)
 - LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI SALVO DOVE ESPLICITAMENTE INDICATO
 - LE PROGRESSIVE INDICATE SONO RELATIVE AL BINARIO PARI DELLA LINEA CASSINO
 - LE LUNGHEZZE INDICATE SULLO SVILUPPO DELLA GALLERIA SONO RELATIVE AL BINARIO PARI DELLA LINEA CASSINO
 - PER I DETTAGLI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SI FACCIÀ RIFERIMENTO AGLI ELABORATI SPECIFICI DI DETTAGLIO

SEZIONE TRASVERSALE B-B - USCITA STI. FASE 6

- Realizzazione setti intermedi e scale
- Completamento opere di finitura interna, compreso riempimento con cls magro
- Realizzazione fabbricato

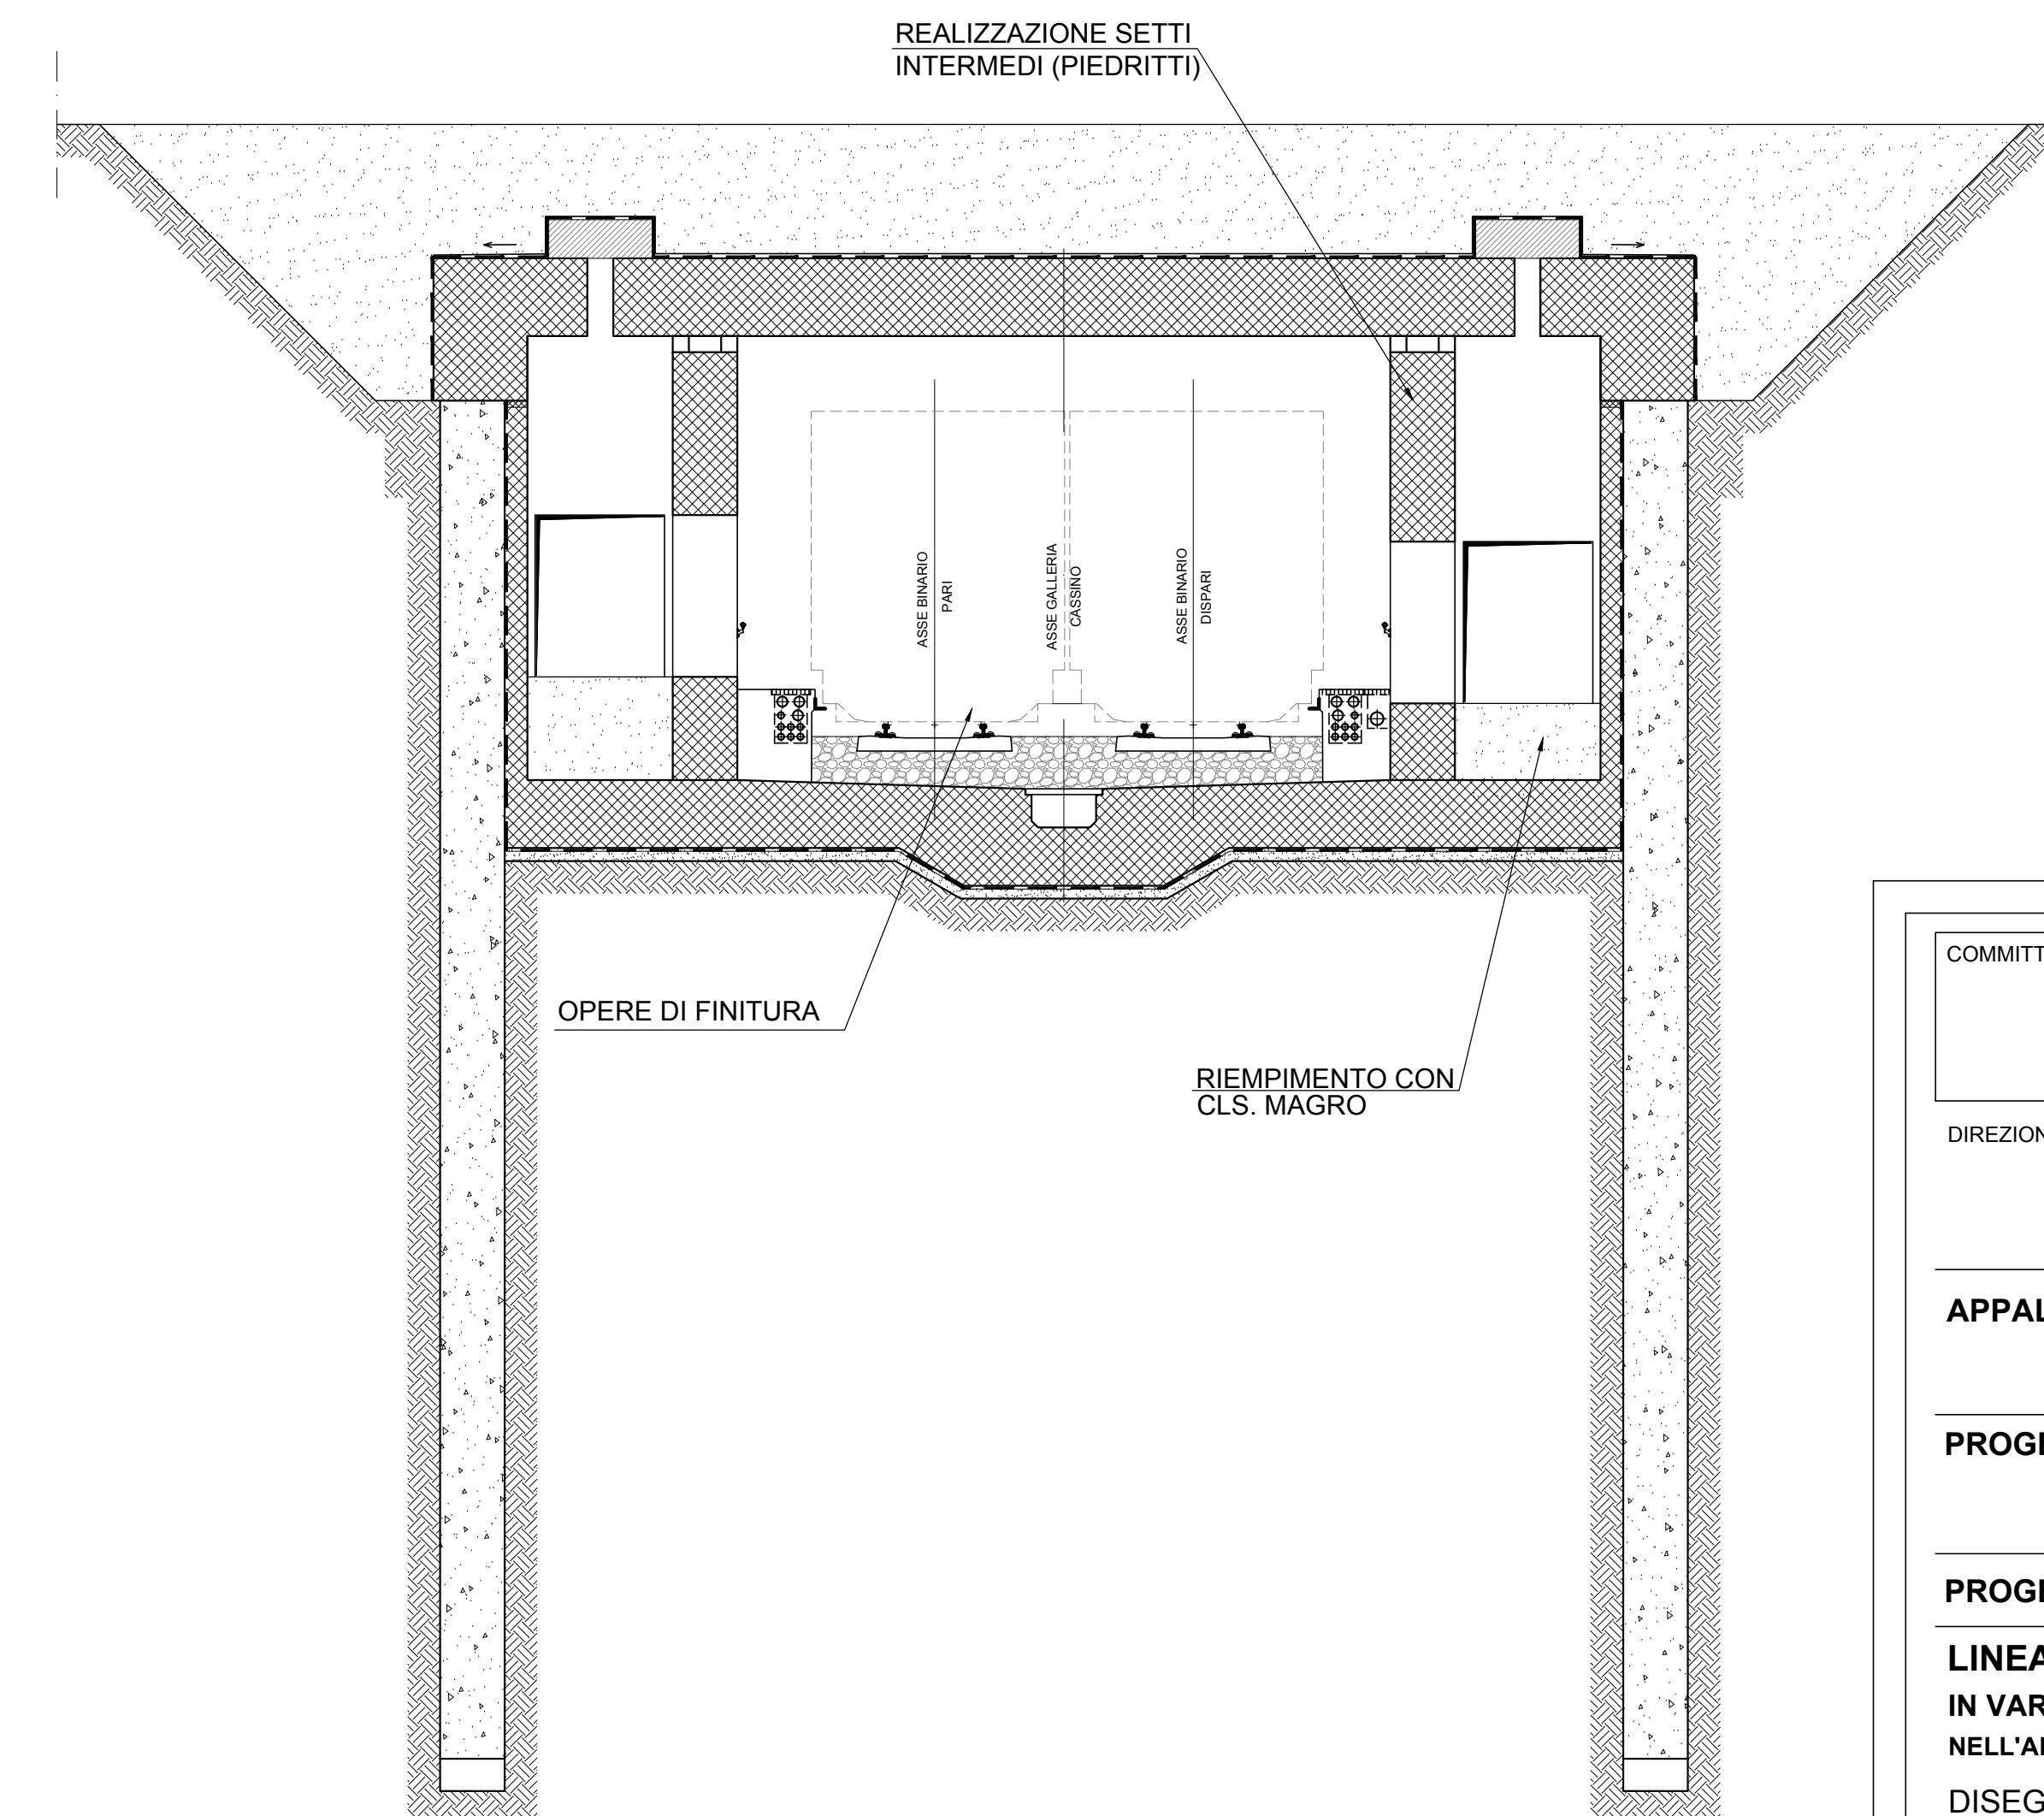

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE: **salini impregilo** MANDATARIA: **ASTALDI**

PROGETTAZIONE: **SYSTRA** MANDATARIA: **SOTECNI** **ROCKSOIL**

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO

ELIMINAZIONE USCITE STI SU G.A. CASALNUOVO - TRATTA B1
GA01 - GALLERIA CASALNUOVO DA KM 0+550,00 A KM 2+860,21
SEZIONE TIPO B1 - TRATTO CIRCUMVESUVIANA DA KM 1+164,00 A KM 1+221,10
USCITA STI - FASI COSTRUTTIVE

| | |
|---|--|
| APPALTATORE | PROGETTAZIONE |
| DIRETTORE DELLA TECNICA Ing. M. PANISI | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|--------|
| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. | SCALA: |
| IF1M | 00 | V | ZZ | AZ | GA01B0 | 003 | A | VARIE |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato | Data |
|------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| A | EMMISSIONE | GARIBOLDI | 05/05/2020 | LORENZINI | 05/05/2020 | BELLICCHIO | 05/05/2020 | CASSANI | 05/05/2020 |

File: IF1M.0.0.V.ZZ.AZ.GA.01B.0.003-A.DWG n. Elab: _____
