



# MACROFASE 1

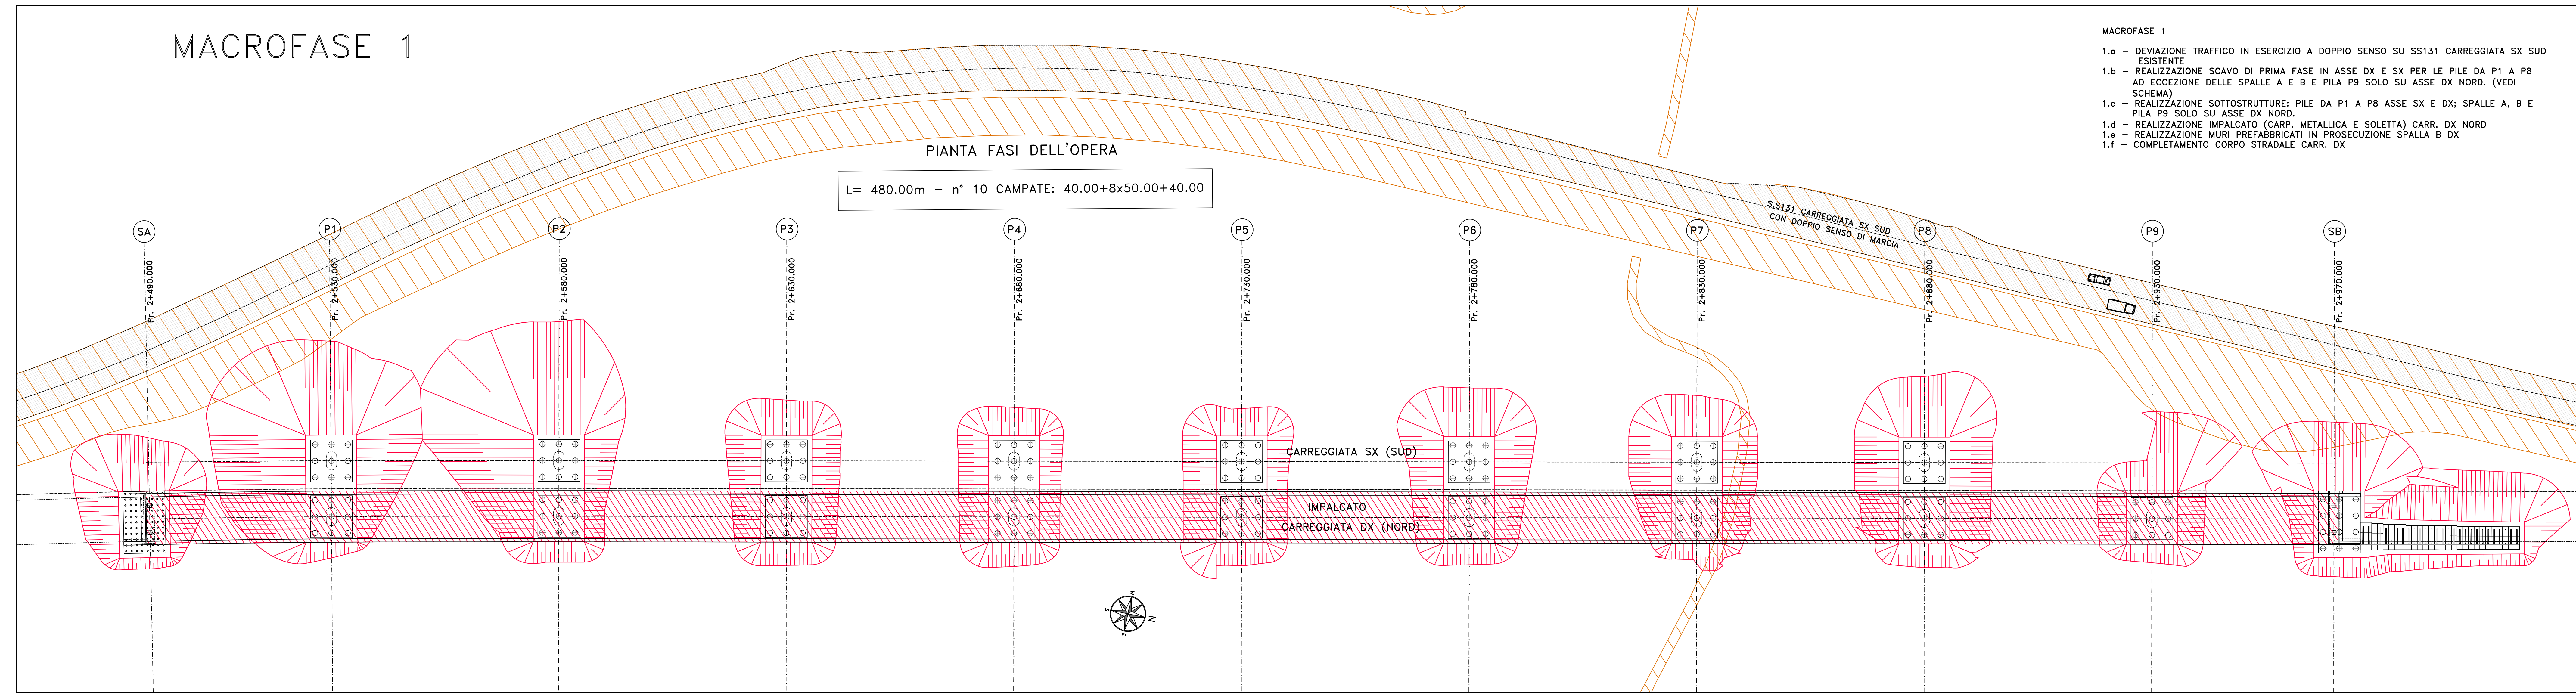

- MACROFASE 1**
- 1.a - DEVIATIONE TRAFFICO IN ESERCIZIO A DOPPIO SENSO SU SS131 CARREGGIATA SX SUD ESISTENTE
  - 1.b - REALIZZAZIONE SCAVO DI PRIMA FASE IN ASSE DX E SX PER LE PILE DA P1 A P8 AD ECCEZIONE DELLE SPALLE A E B E PILA P9 SOLO SU ASSE DX NORD. (VEDI SCHEMA)
  - 1.c - REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE: PILE DA P1 A P8 ASSE SX E DX; SPALLE A, B E PILA P9 SOLO SU ASSE DX NORD.
  - 1.d - REALIZZAZIONE IMPALCATO (CARP. METALLICA E SOLETTA) CARR. DX NORD
  - 1.e - REALIZZAZIONE MURI PREFABBRICATI IN PROSECUZIONE SPALLA B DX
  - 1.f - COMPLETAMENTO CORPO STRADALE CARR. DX

# MACROFASE 2

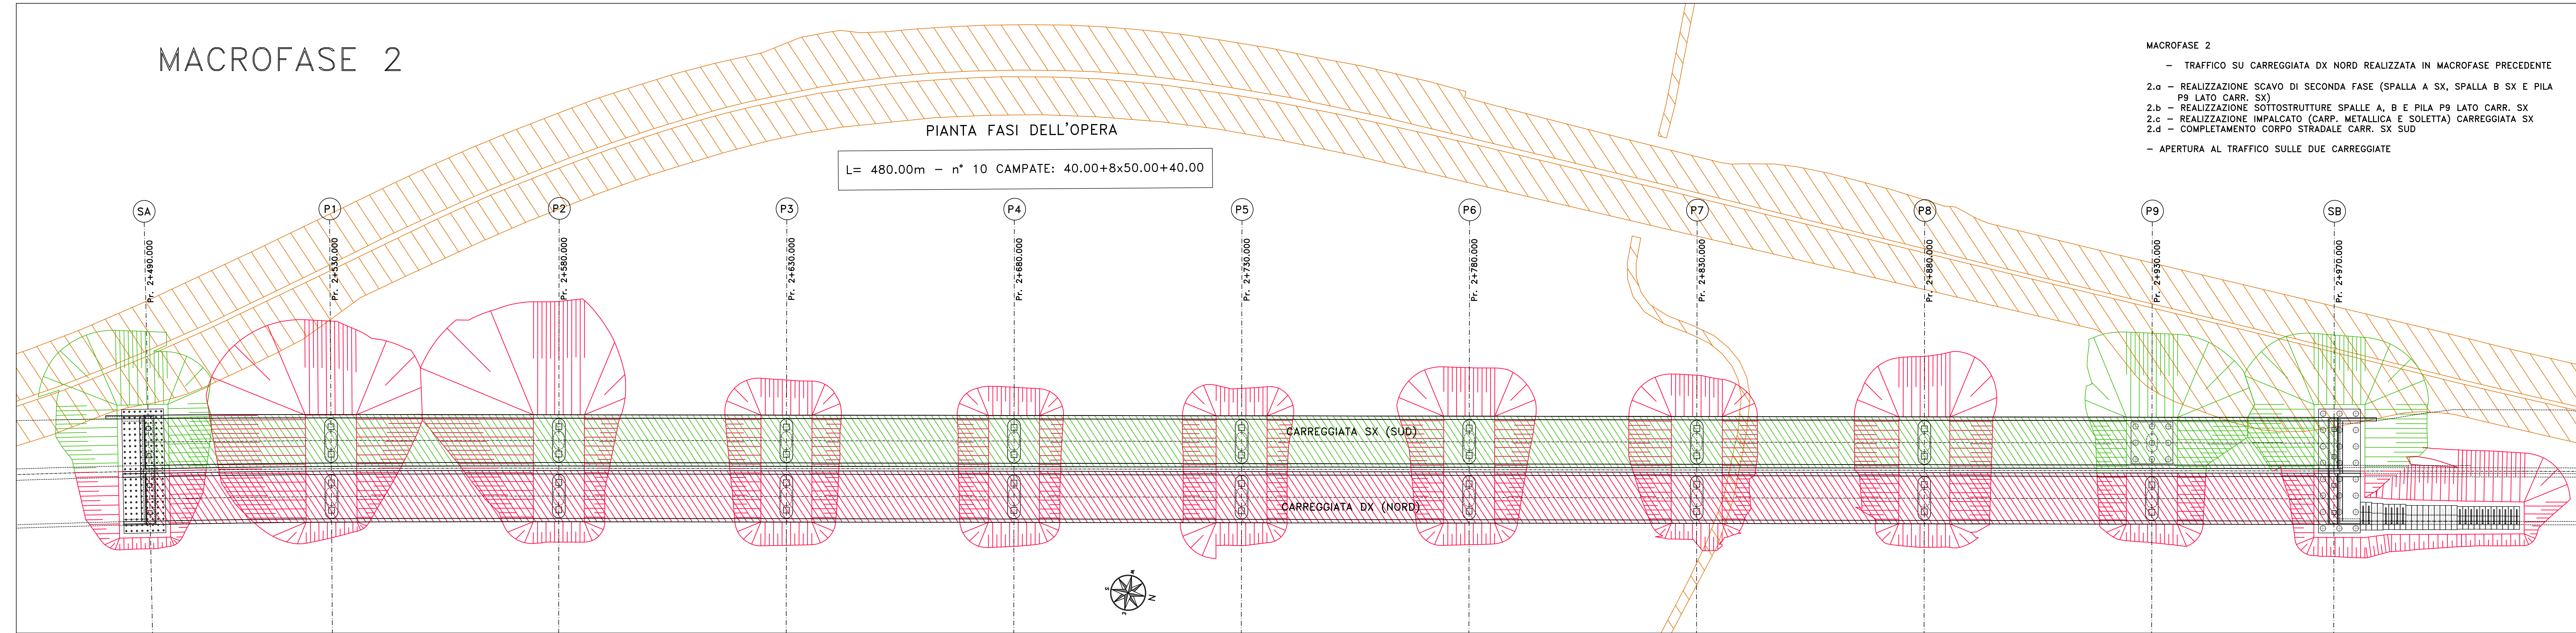


- MACROFASE 2**
- TRAFFICO SU CARREGGIATA DX NORD REALIZZATA IN MACROFASE PRECEDENTE
  - 2.a - REALIZZAZIONE SCAVO DI SECONDA FASE (SPALLA A SX, SPALLA B SX E PILA P9 LATO CARR. SX)
  - 2.b - REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE SPALLE A, B E PILA P9 LATO CARR. SX
  - 2.c - REALIZZAZIONE IMPALCATO (CARP. METALLICA E SOLETTA) CARREGGIATA SX
  - 2.d - COMPLETAMENTO CORPO STRADALE CARR. SX SUD
  - APERTURA AL TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE

**LEGENDA**


- OPERE REALIZZATE MACROFASE 1
- OPERE REALIZZATE MACROFASE 2

**NOTA:**  
LA SUCCESSIONE DELLE FASI DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DELLE SINGOLE MEMBRATURE STRUTTURALI ALL'INTERNO DI CIASCUNA MACROFASE, E' DETTAGLIATA NELL'ELABORATO: OPERE D'ARTE MAGGIORI/ELABORATI COMUNI/METODI COSTRUTTIVI.

## SEZIONE TIPO 1^ FASE

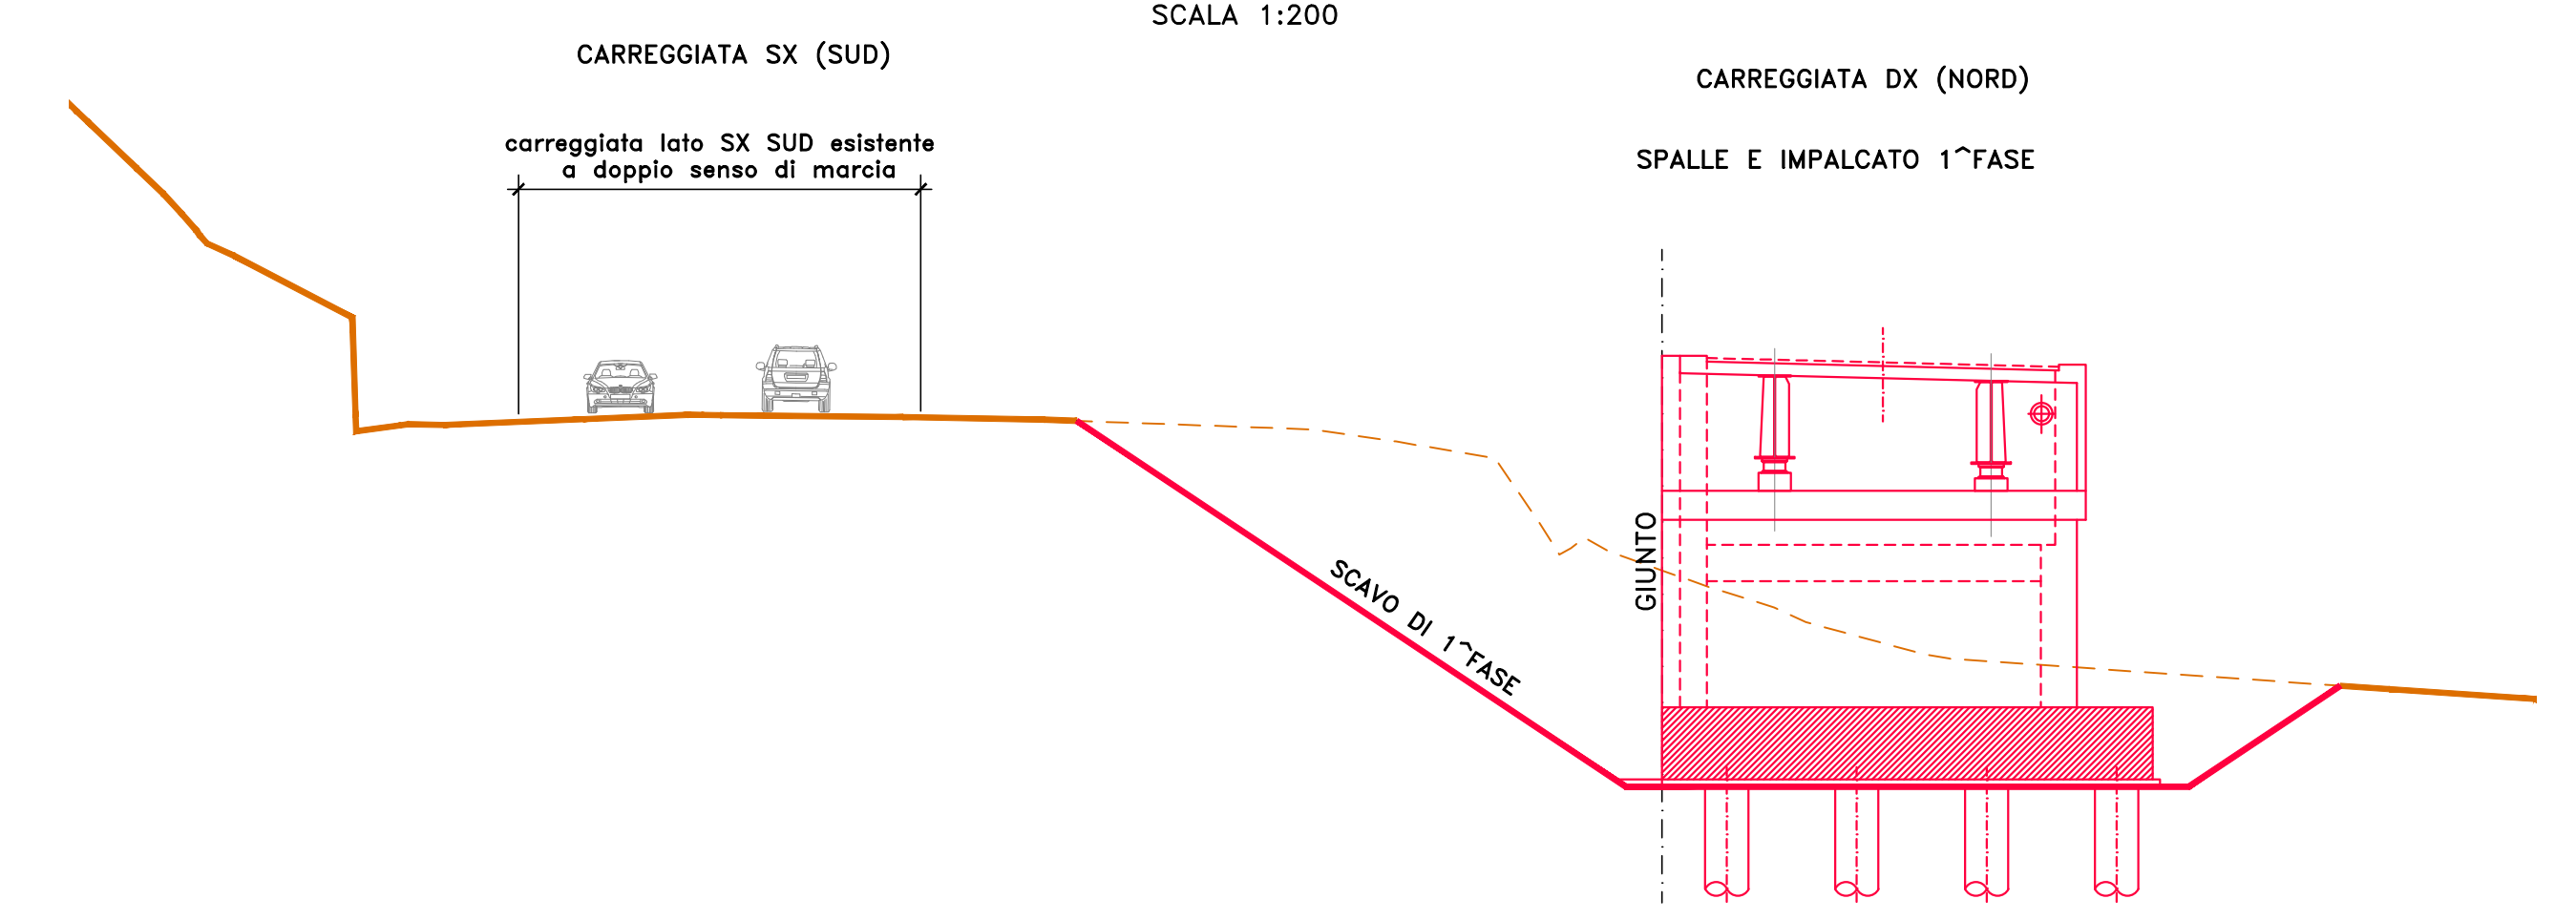

## SEZIONE TIPO 2^ FASE

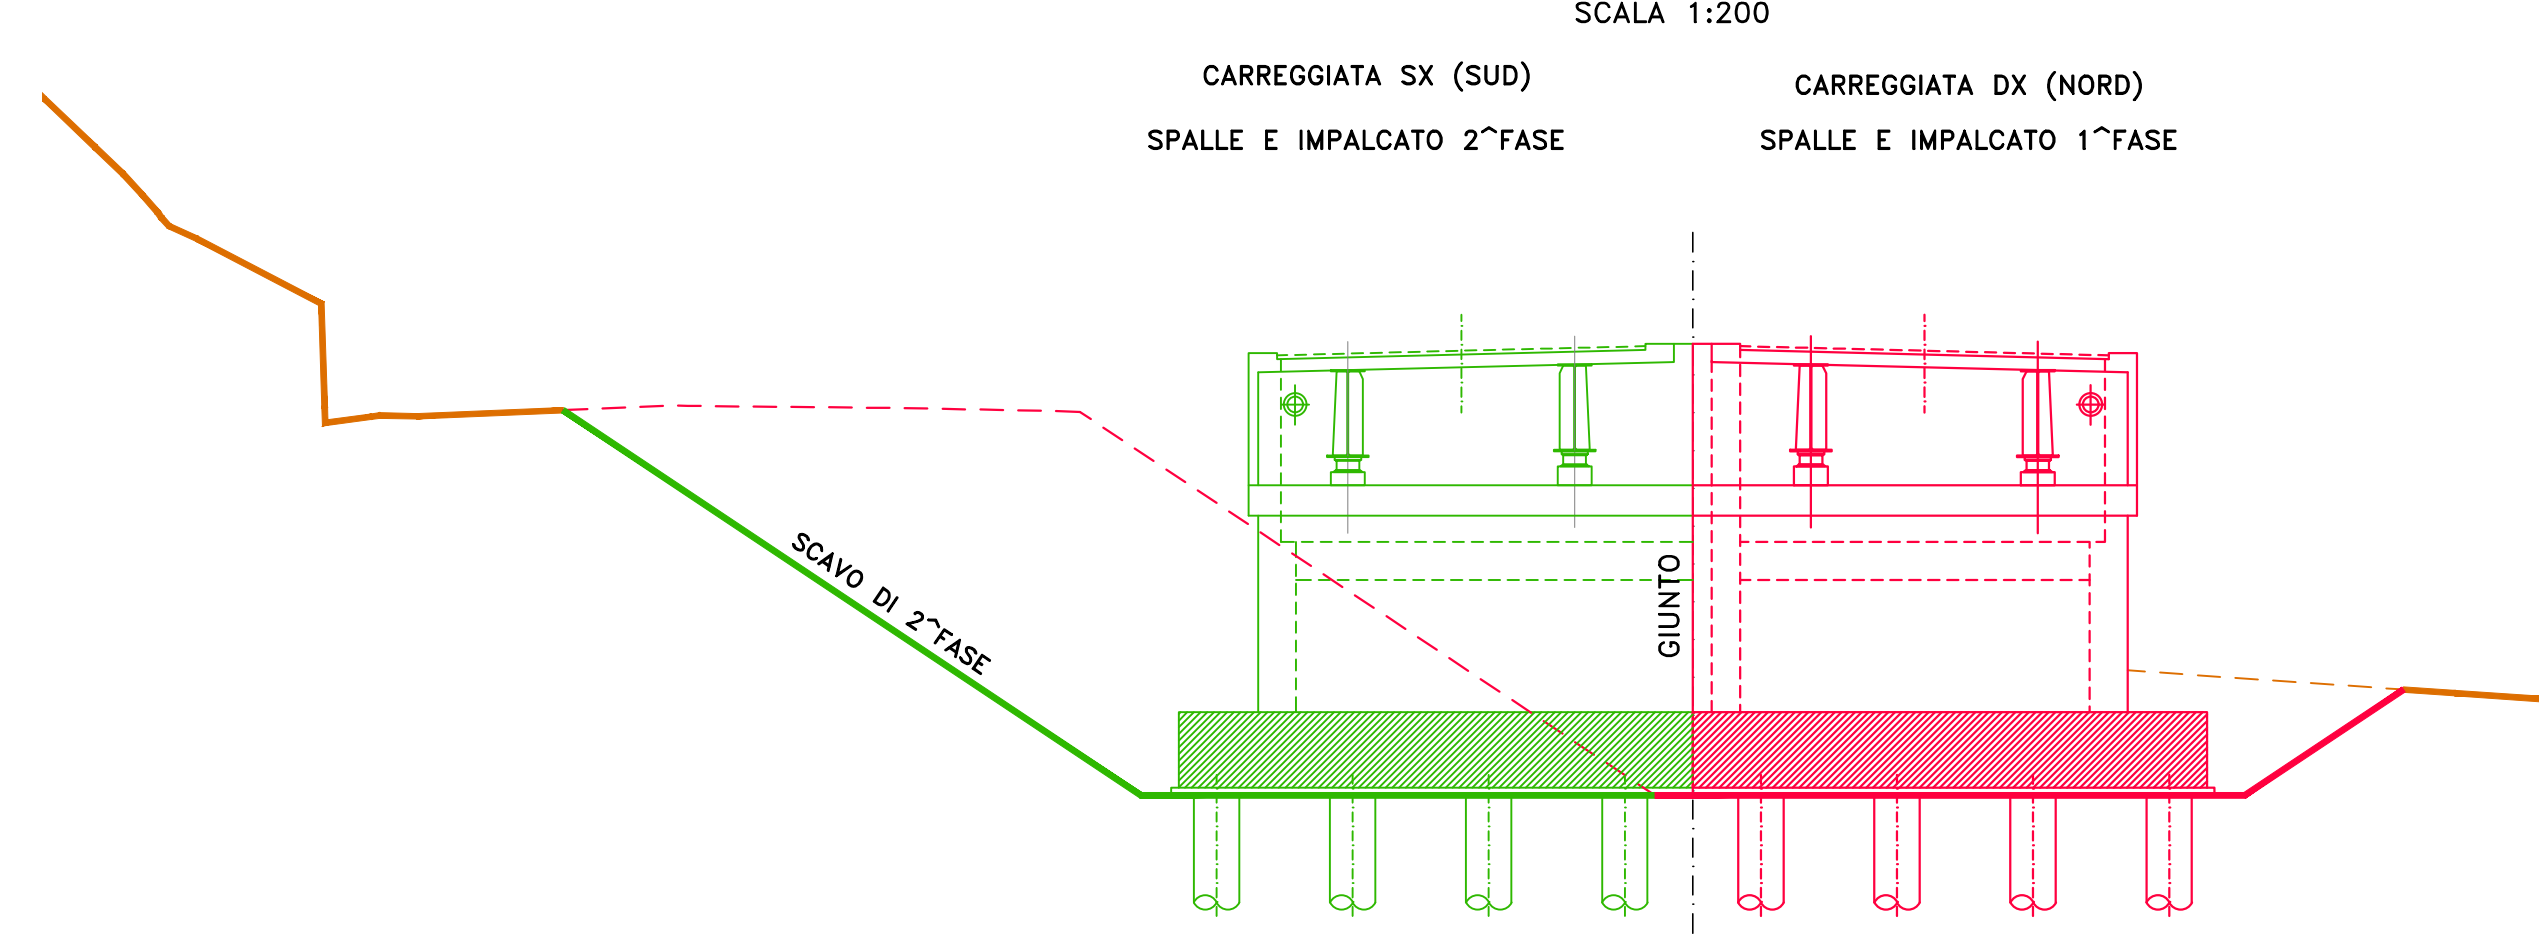

**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. n.131 "Carlo Felice"  
Completamento itinerario Sassari - Olbia  
Potenziamento-Messa in sicurezza dal km 192+500 al km 209+500  
1° lotto (dal km 193 al km 199)

**PROGETTO DEFINITIVO** COD. CA349

PROGETTAZIONE: **ATI VIA - SERINGIA - VDP - BRENIG**

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALI: **ING. ELISABETTA PIAZZA (Dist. Ing. Prov. Roma 2/298)**

RESPONSABILI D'OPERA:  
Responsabile Tracciato stradale: **Dist. Ing. Massimo Caporaso (Dist. Ing. Prov. Roma 2/298)**  
Responsabile Stradale: **Dist. Ing. Giovanni Pignone (Dist. Ing. Prov. Roma 2/298)**  
Responsabile Impalcato, Sottostruttura e supporti: **Dist. Ing. Sergio Di Masi (Dist. Ing. Prov. Palermo 2/292)**  
Responsabile Impalcato, Sottostruttura e supporti: **Dist. Ing. Francesco Venturoli (Dist. Ing. Prov. Roma 1/488)**

GEOLOGO:  
**Dist. Geol. Enrico Corradini (Dist. Geol. Regione Sicil. 946)**

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
**Dist. Ing. Roberto Di Giovanni (Dist. Ing. Prov. Roma 1/1148)**

RESPONSABILE SIA:  
**Dist. Ing. Francesco Venturoli (Dist. Ing. Prov. Roma 1/488)**

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
**Dist. Ing. Salvatore Piretti**

**OPERE D'ARTE MAGGIORI**  
**VIADOTTI E PONTI**  
**VIADOTTO - VI03**  
**Fasi di costruzione**

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DPIA0349	CA349_POOVIO3STRPE01	A	Varie
D			
C			
B			
A	EMISSIONE	NOV. 2020	P. COSMELLI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO
