
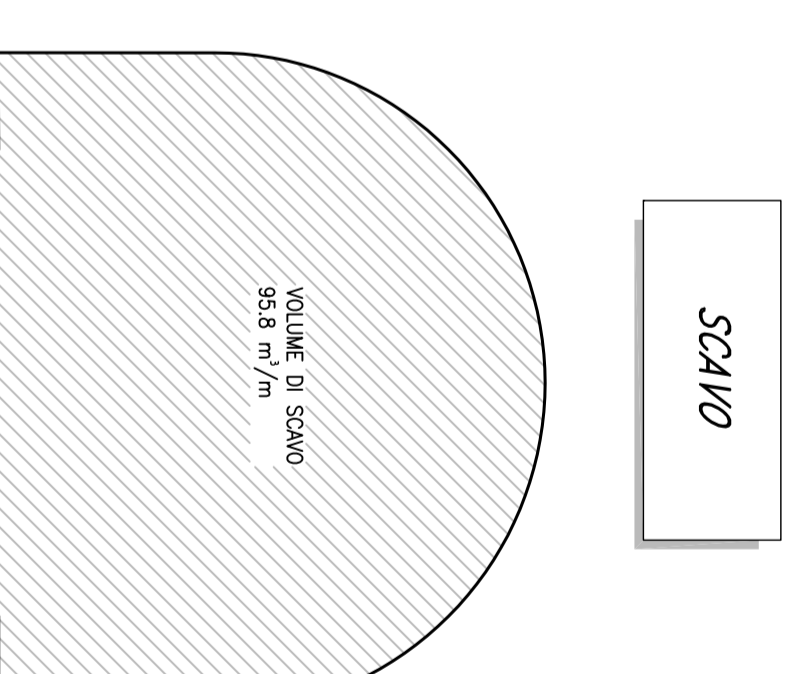


DATI E CAMPI DI VARIABILITA'

AREA DI SCAVO	95,80 mc
SFONDO MASSIMO	3,00 m
SPRITZ-BETON	AL CONTORNO sp. 20 cm/AL FRONTE sp. 5 cm ovunque
CHIODI	4x4,5m - PASSO 1,50 x 1,50m a quinconce
CALOTTA	sp. 60 cm
ARCO ROVERSO	sp. 70 cm
IMPERMEABILIZZAZIONE	PVC+TNT sp. 2mm (SULLUPO MEDIO 21:50 m)
DRENAGGI	EVENTUALI 3x3 (L=36m OGNI 18,00m)

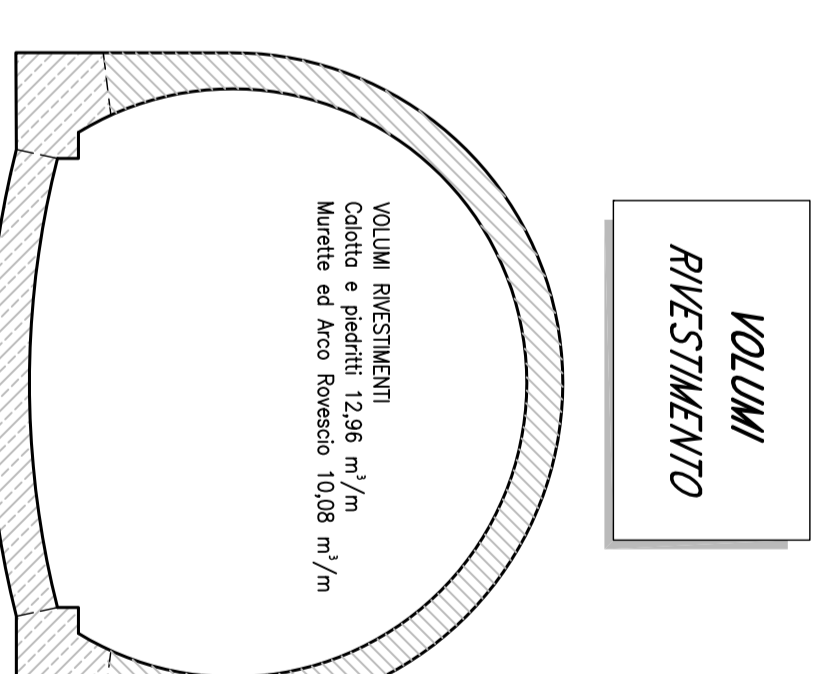


INCIDENZA ARMATURA

ARCO ROVERSO E MURETTE: 60 Kg/Kg/mc
CALOTTA E FIBRATI: -


Sezione B-B

1:50

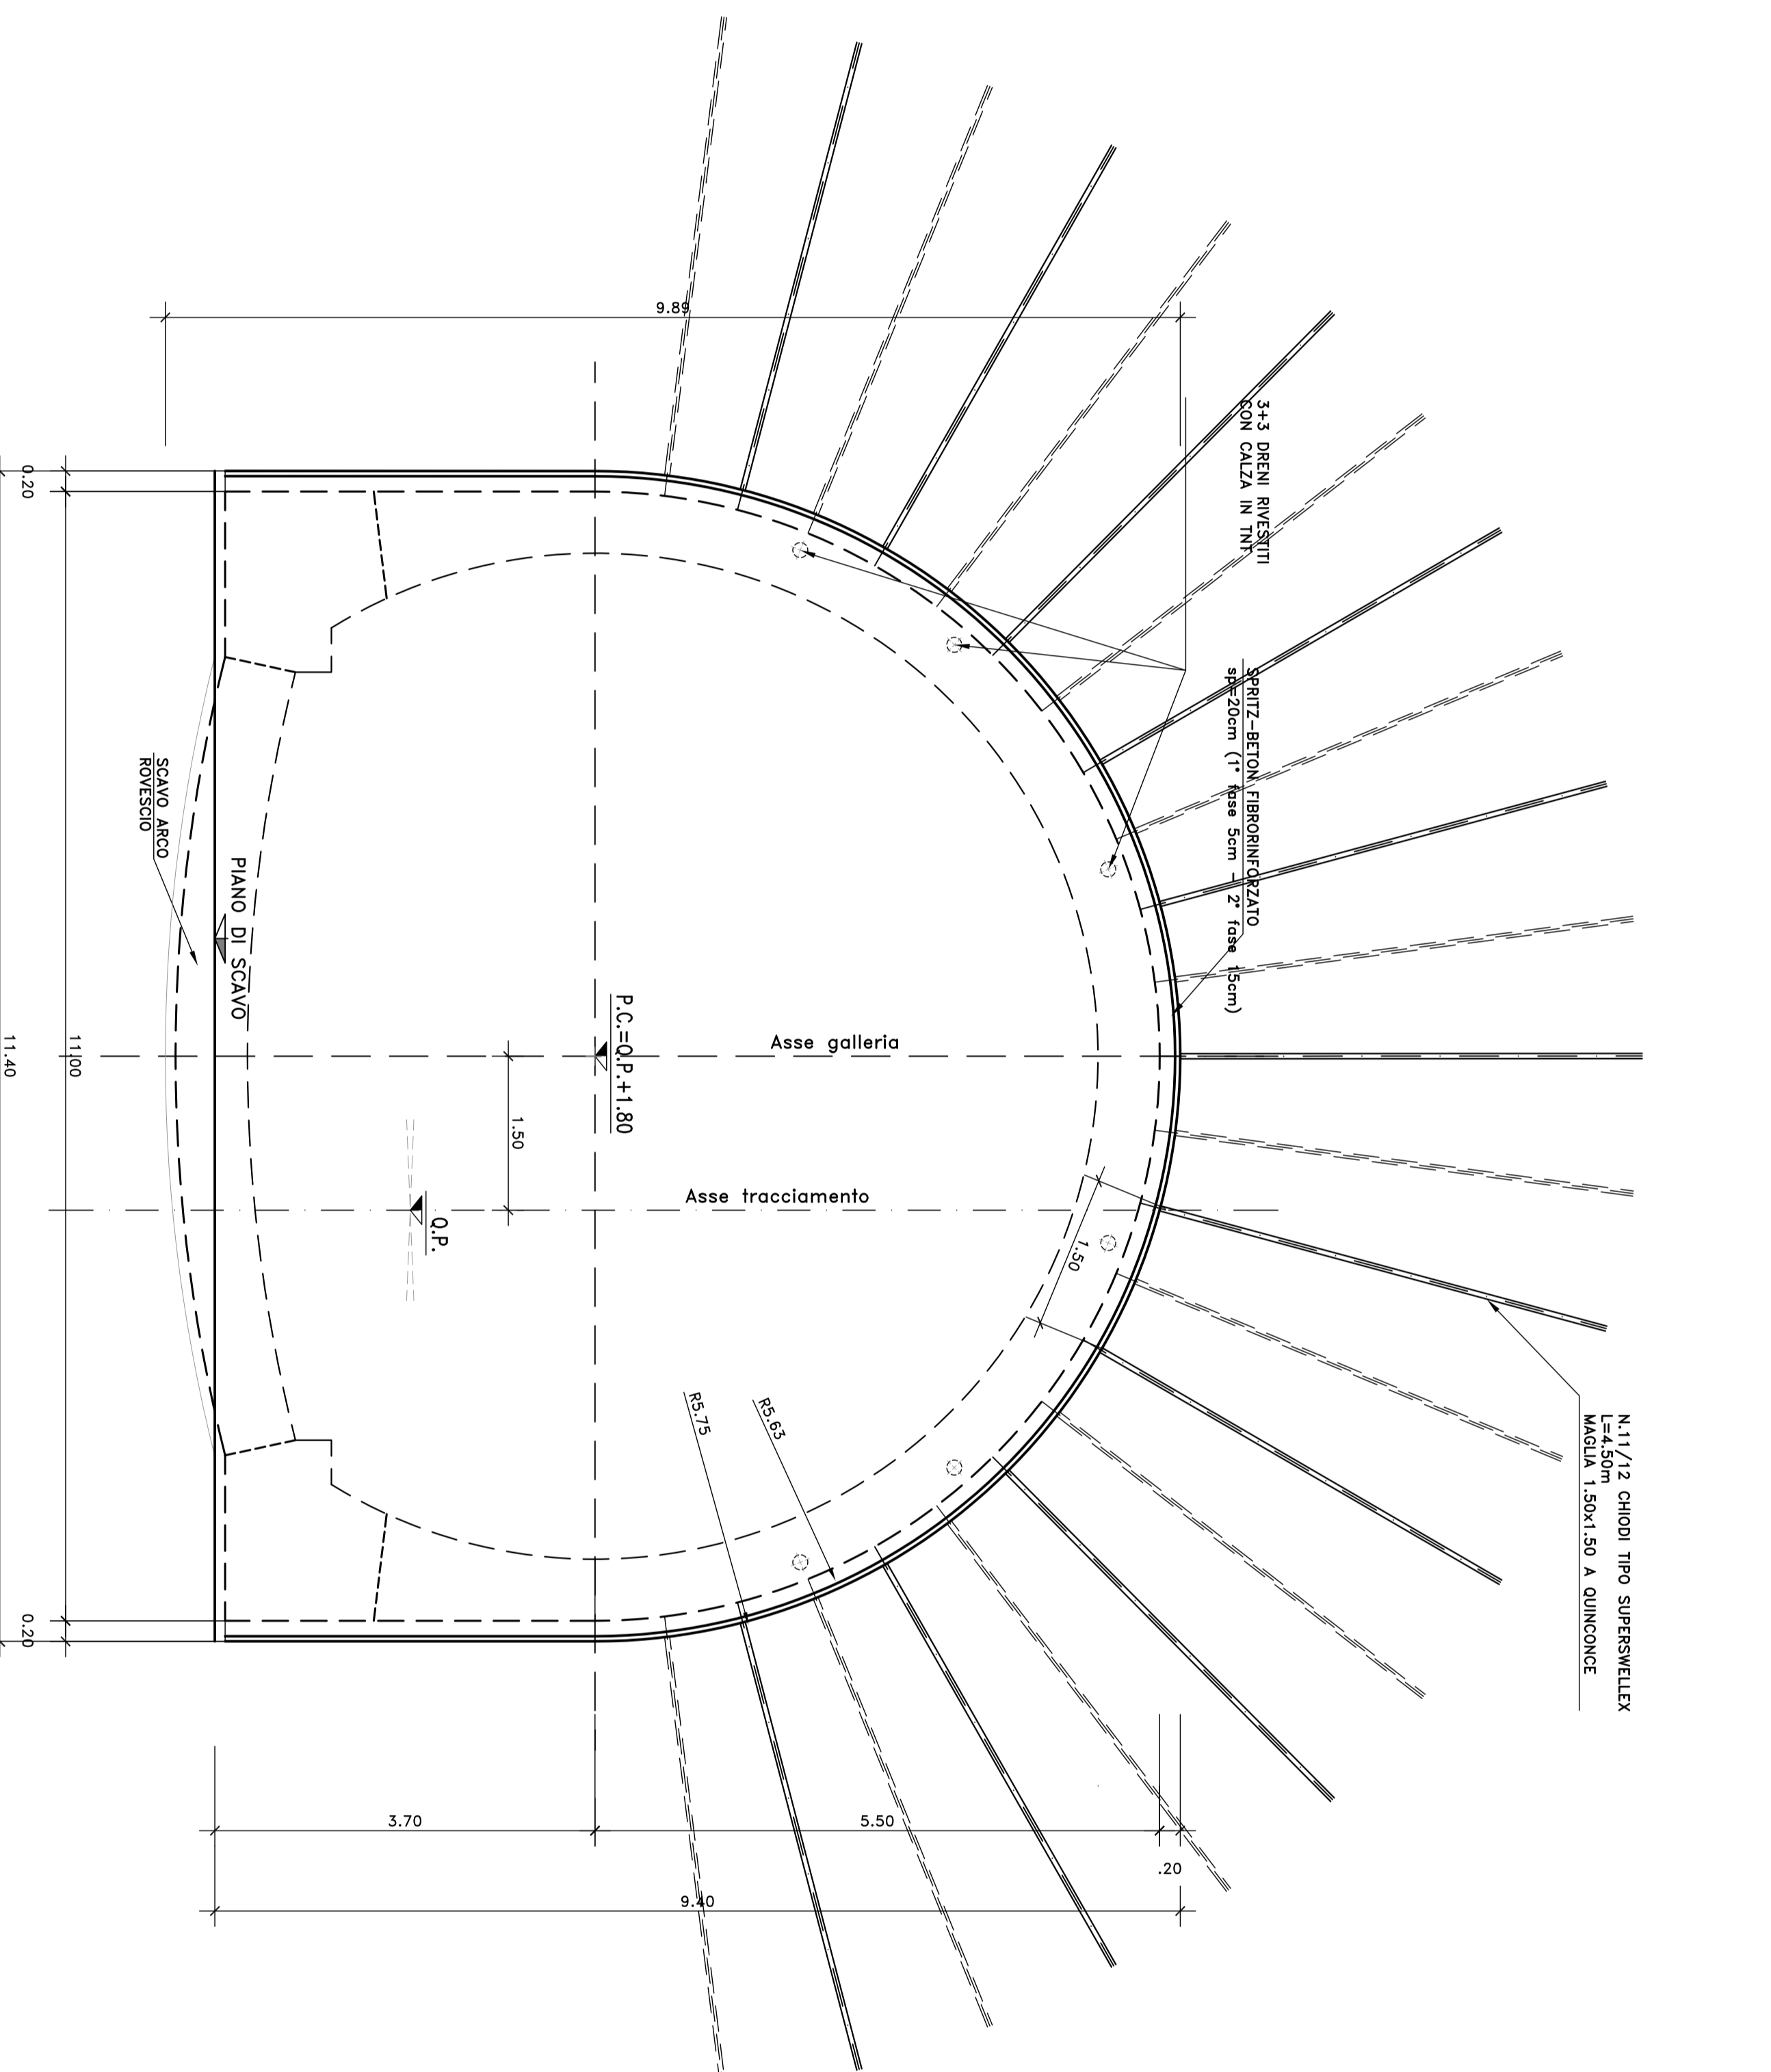


PARTICOLARE CHIODI

SCALA 1:10

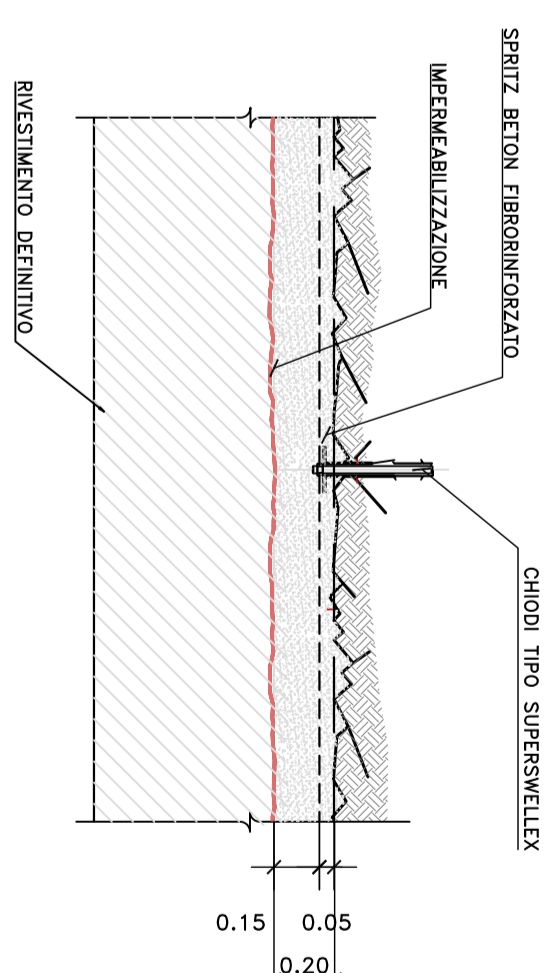

PARTICOLARE TUBO IN PVC

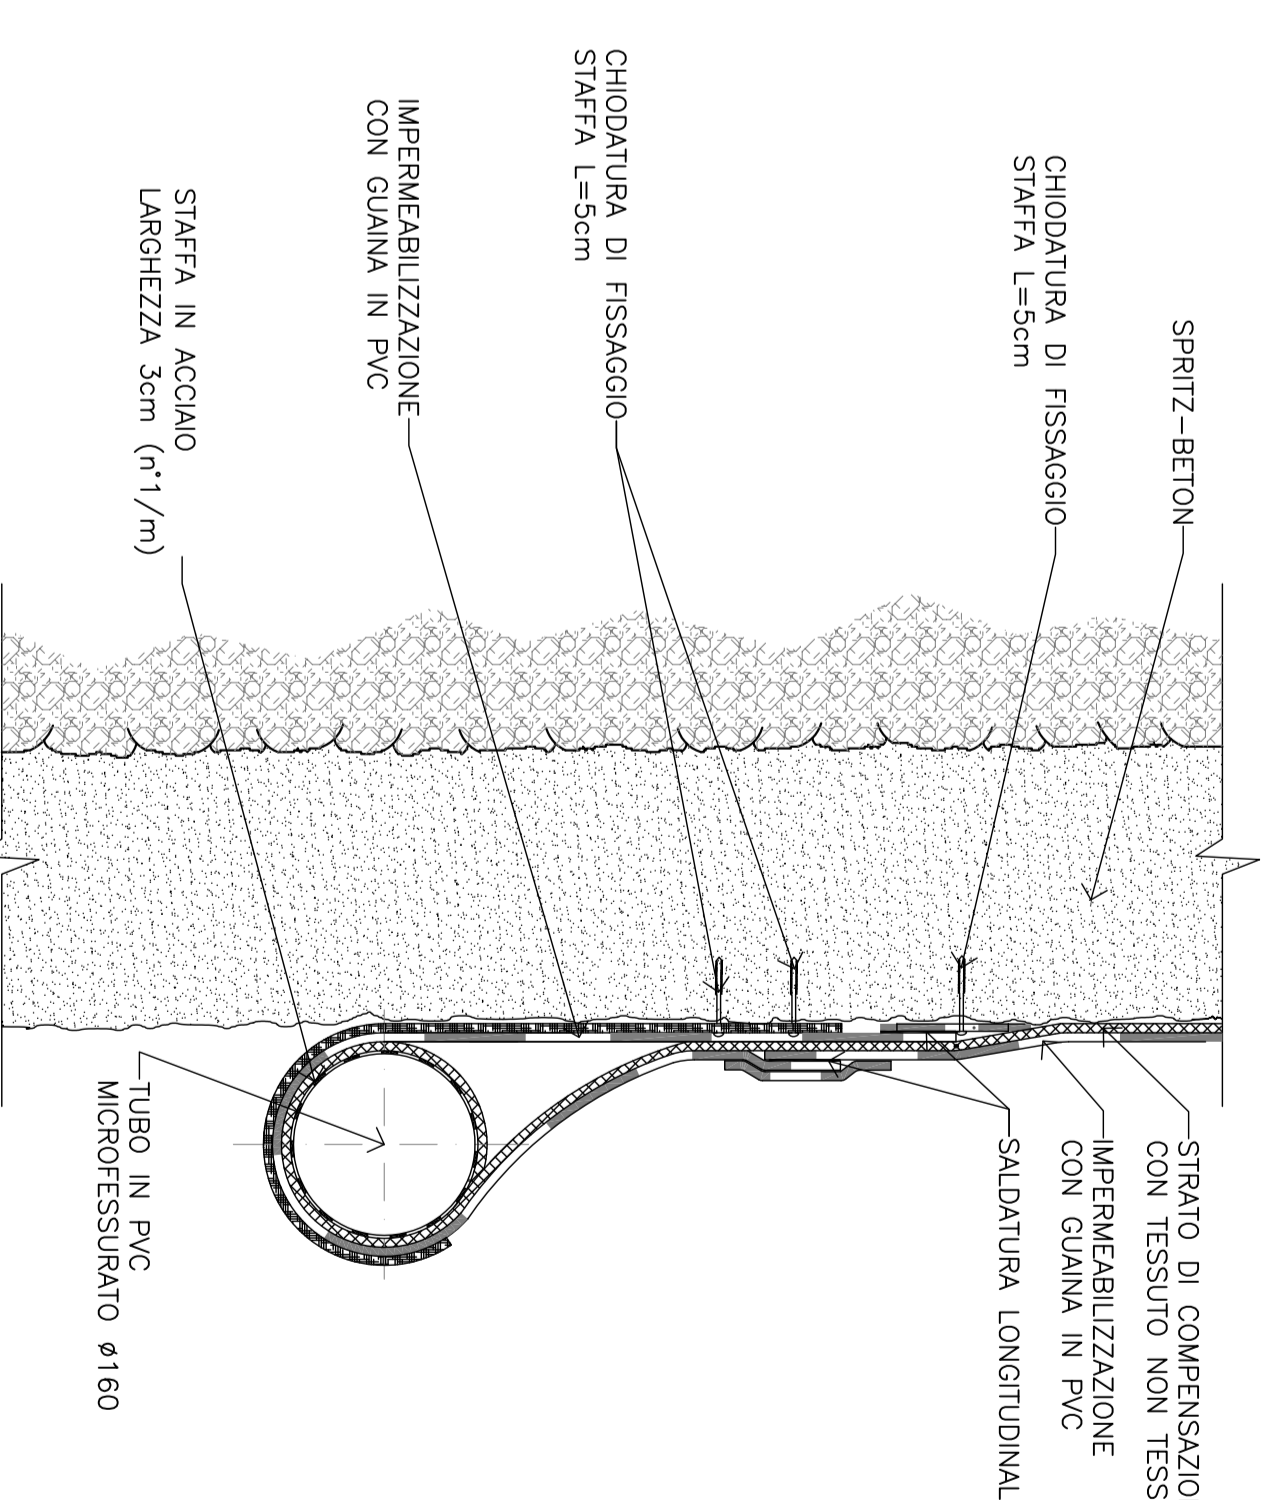

FASI ESECUTIVE

- FASE 1 : SCAVO E FOSA SPRITZ PRIMA FASE**
Eseguito lo scavo a piano sezione per singoli strati (max. 3m) definiti nella tabella 'DATI E CAMPI DI VARIABILITA''. Il fronte verrà sagomato a mano con cura e in una lunghezza massima dello strato e di 30m. Il fronte dovrà essere protetto con rete di sicurezza, l'escavazione sistematica dello strato avverrà a mano.
- FASE 2 : CHIODATURA RADIALE**
Chiodatura radiale mediante chiodi tipo Superswellex a distanza massima dal fronte di scavo pari a 6,00m
- FASE 3 : PERNESTIMENTO**
Completamento del rivestimento di 1° fase mediante passa in opera del 2° strato di spritz beton fibrorinforzato con il disaggio delle fibre di 30 Kg/mc, a distanza massima dal fronte di scavo pari a 6m.
- FASE 4 : GETTO ARCO ROVERSO E MURETTE**
Il getto di arco roverso e murette dovrà avvenire contemporaneamente ad una distanza max di 45 m in corso d'opera. Il monitoraggio del corso di estrazione del fronte, convergenza del corso, potrà indicare l'eventuale necessità di distanze più ristrette dal fronte. Il trafilato sarà consentito quando il conglomerato cementizio avrà raggiunto una resistenza di 5 N/mm².
- FASE 5 : IMPERMEABILIZZAZIONE**
Passo in opera dell'impermeabilizzazione eseguito prima del getto del rivestimento definitivo secondo le condizioni di progetto.
- FASE 6 : GETTO RIVESTIMENTO DEFINITIVO**
La distanza di passi in opera dovrà essere regolata in funzione del gonfiamento per detto sezione tipo in distanza di getto del rivestimento definitivo dal fronte non è vincolato.

NOTE PER EVENTUALI SOSPENSIONI DELLE LAVORAZIONI:

Quando le operazioni di scavo vengono interrotte per un tempo superiore alle 12 ore, il fronte dovrà essere protetto con rete di sicurezza, l'escavazione sistematica dello strato avverrà a mano. Il fronte dovrà essere protetto da uno strato di spritz-beton sp.20cm e l'impermeabilizzazione dovrà essere evitata in corrispondenza di strati.


NOTE

N.B. IN CORRESPONDENZA DELLE MURETTE DI GETTO, SARÀ APPLICATO UN CORDOINO IN ACCIAIO PER IL MONITORAGGIO DELLA CONVERGENZA DEL FRONTE. IL MONITORAGGIO DEL FRONTE SARÀ EFFETTUATO PER INTERA LINEA DI CROCI E PAVI (CROCHI-PAVI) IN OTTIMITRANZA A QUANTO DISPOSTO NELLA CIRCOLARE PROT.CIV-CO4070-B-1 DEL 30/07/2018. SI PRESERVE CHE L'ESECUZIONE DEI GETTI DI RIVESTIMENTO AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI. LA FASE DI GETTO DEVE ESSERE ESEGUITA CON CANTIERE IN SECONDO ALLA STRADA COMUNALE DI SCAVO E SOTTO AL CANTIERE DI SCAVO. LA STRADA COMUNALE SARÀ CHIUSA PER IL DURANTE DEI LAVORI. PER INFORMAZIONI CONSULTARE IL PROGETTO (LASER-SCANNER).

LEGENDA

- P.C. PIANO DEI CENTRI
- O.P. QUOTA PROGETTO
- P.S. PIANO DI SCAVO

RICHIAMI:
- PER LA TABELLA MATERIALI VEDERE LA TAVOLA: 100GE00031DC01



S.S. 45bis - Gardesana Occidentale
Opere di costruzione della galleria in variante tra il km 86+567 e il km 88+800 finalizzata a sostenere le attuali gallerie ogivali a sezione ristretta

PROGETTO DEFINITIVO cod. M/92


PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTA: ANAS
INGEGNERE: ANAS
DATA: 2023

REDAZIONE: ANAS
DATA: 2023


GALLERIA NATURALE MISTIONE
Sezione tipo A1
Scavo, consolidamento e carpenterie

CODICE PROGETTO	NOVE FILE	REVISIONE	SCALA
DP/M/0092	D 18	A	1:50
C			
B			
A	EMMISSIONE		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE

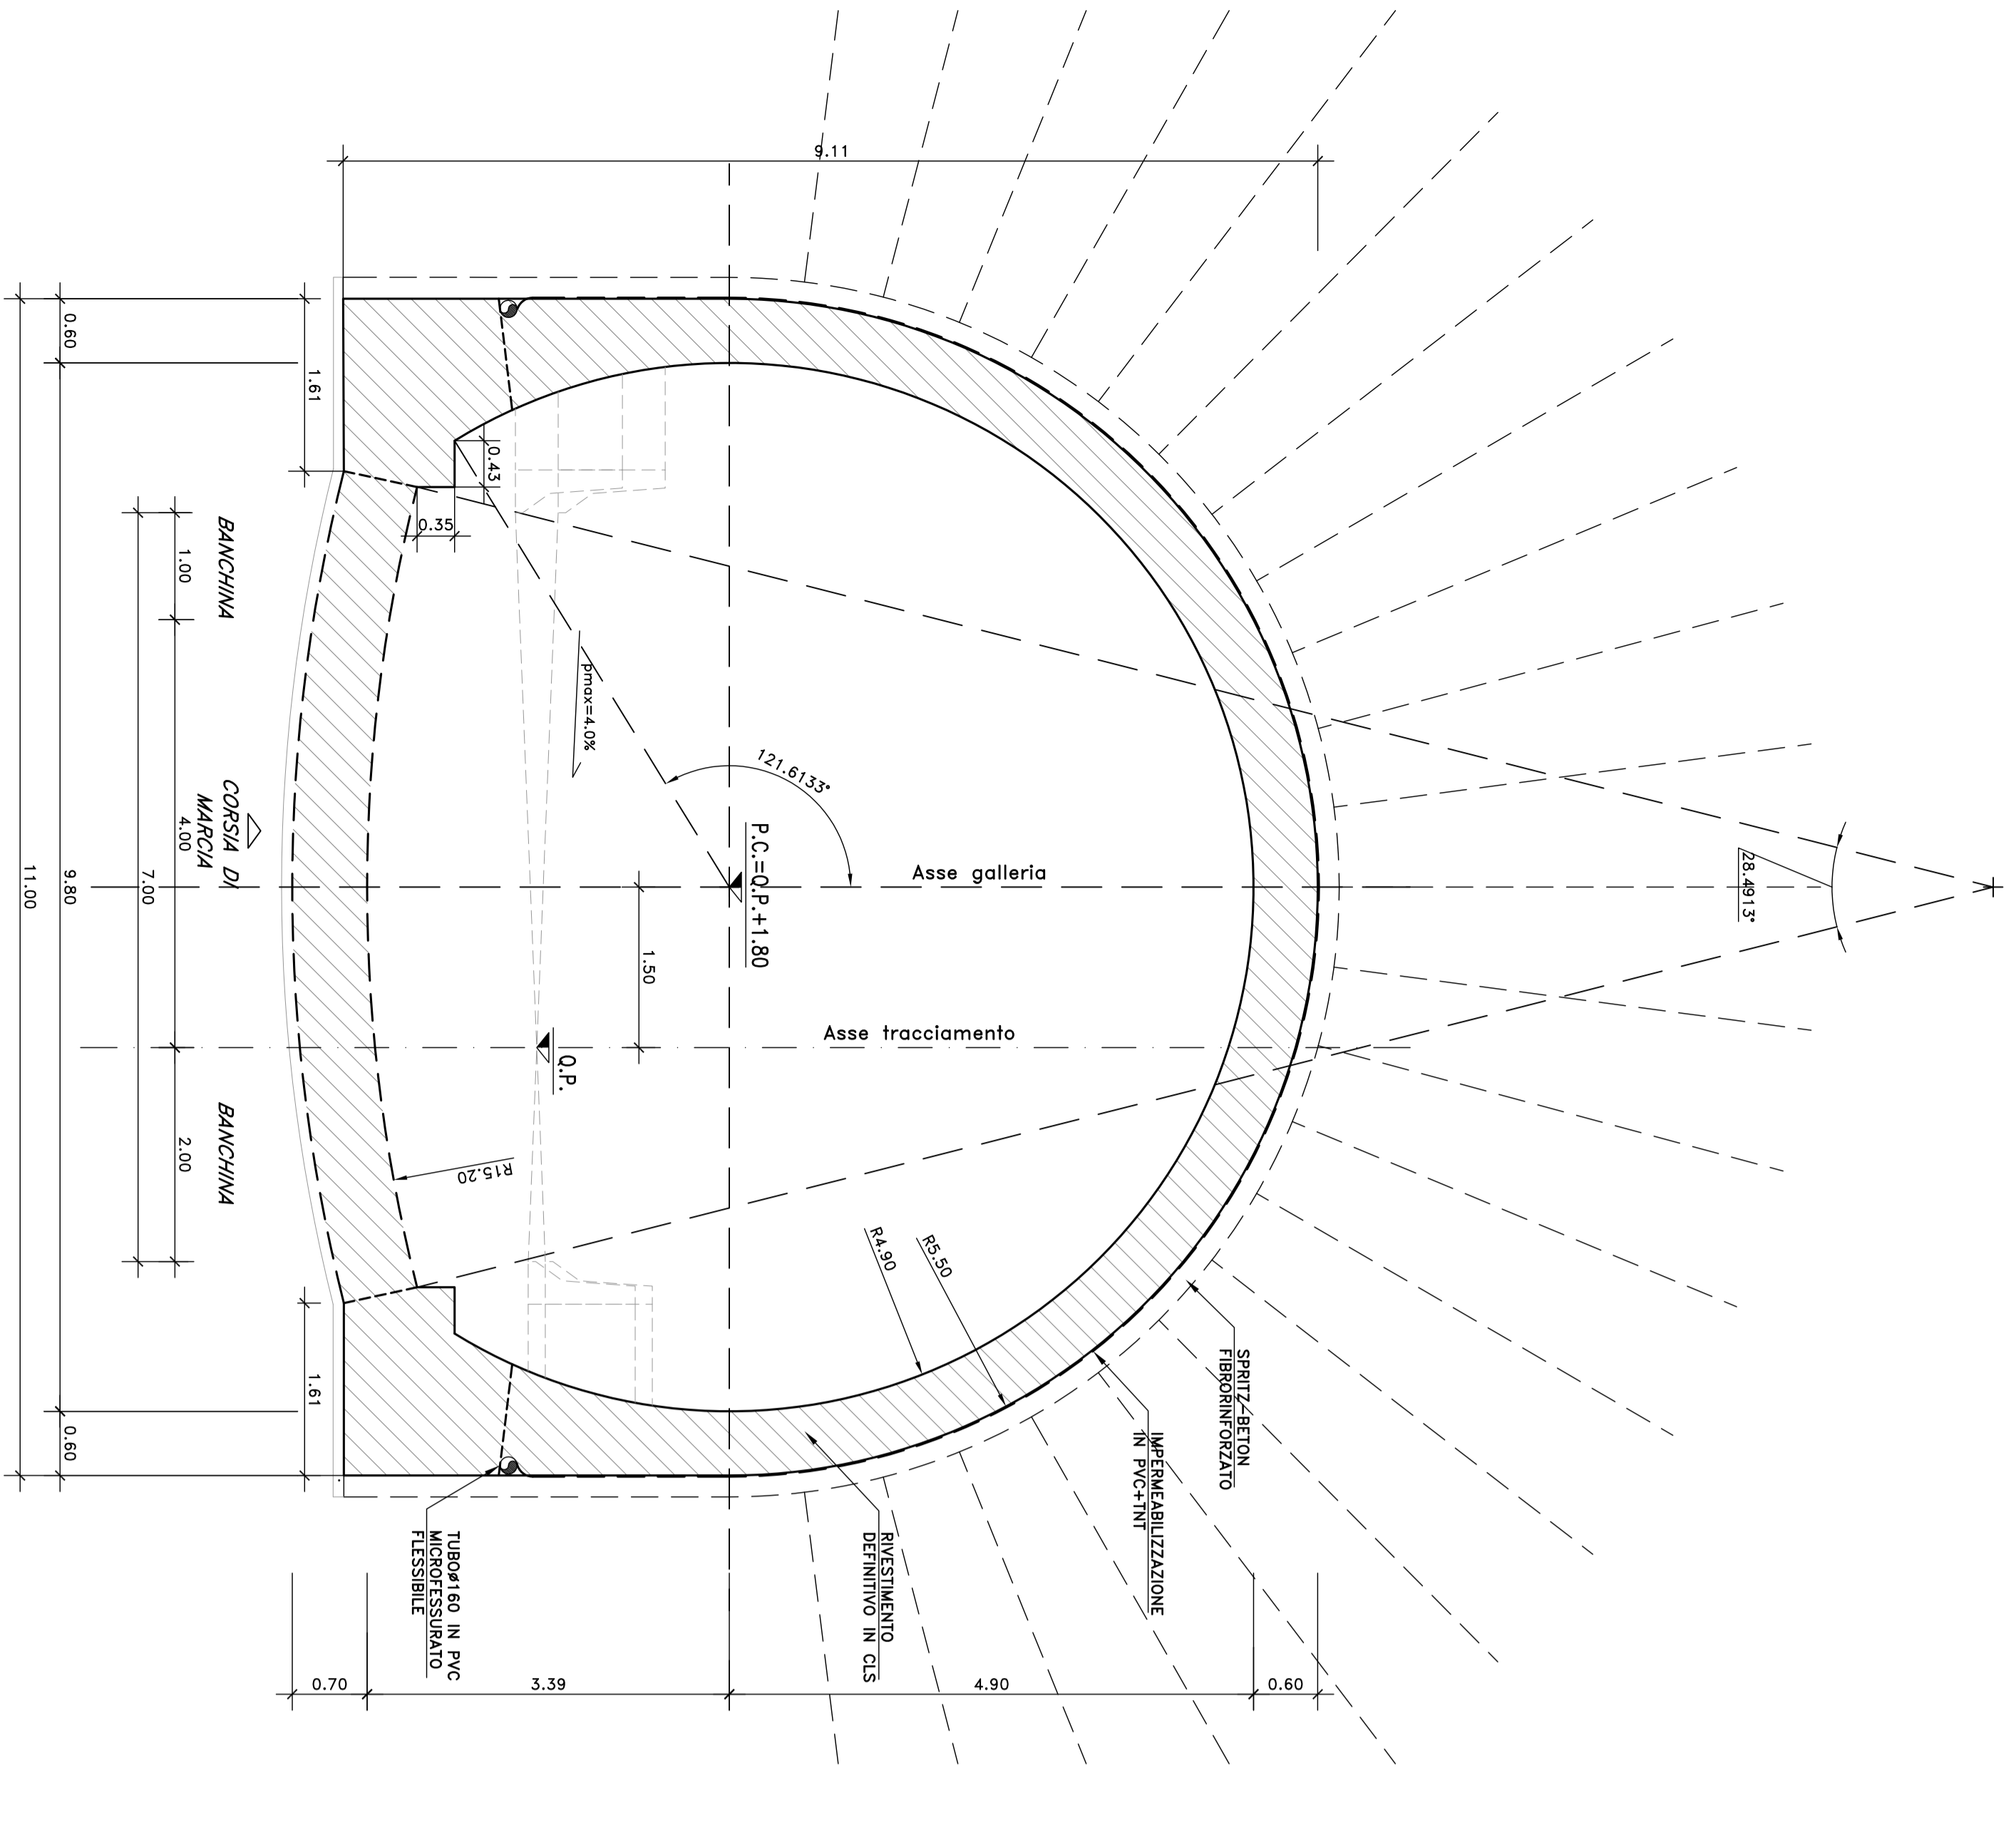


Sezione A-A

1:50

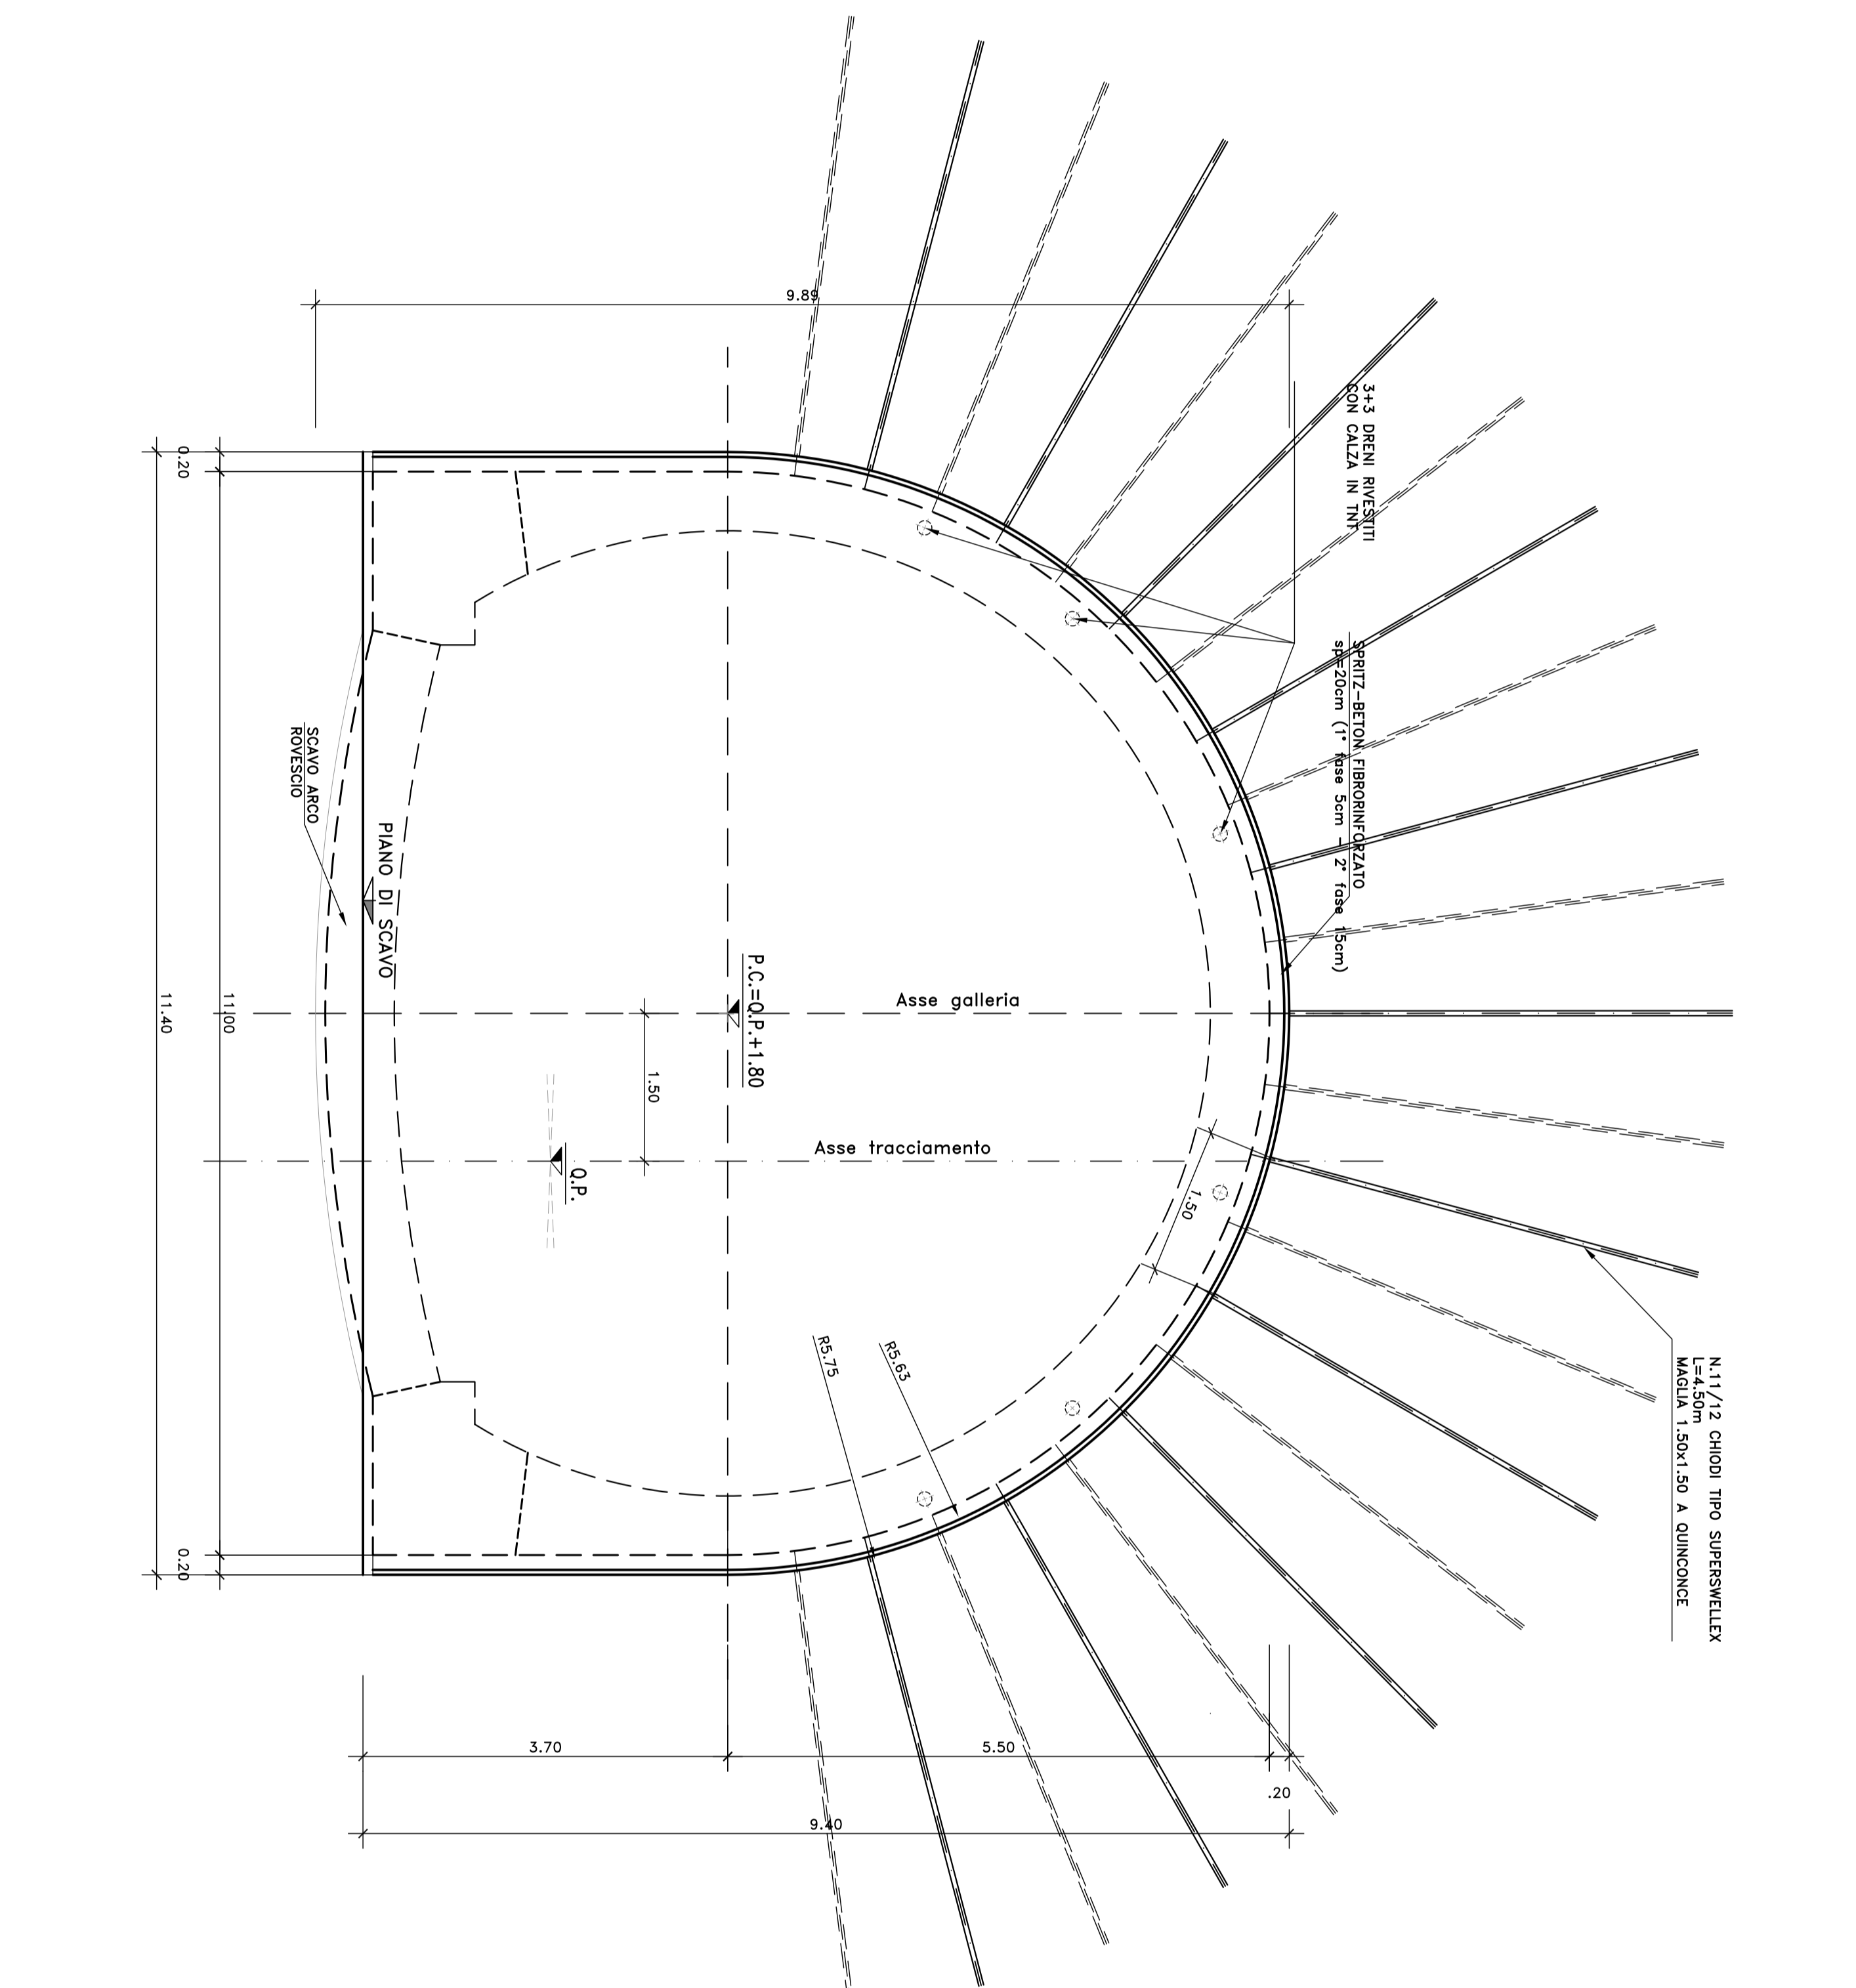

PARTICOLARE CHIODI

SCALA 1:10

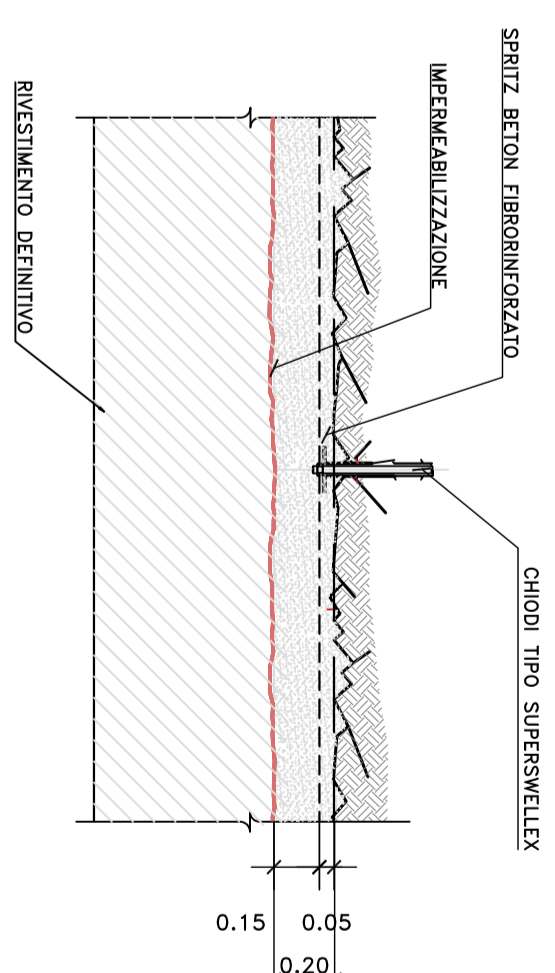

PARTICOLARE TUBO IN PVC

