


FASE 0
 - LA CIRCOLAZIONE AVVIENE ATTRAVERSO LA VIABILITA' ESISTENTE SS18



FASE 1
 - LA CIRCOLAZIONE SULLA SS18 AVVIENE SULLE VIABILITA' LOCALI, DEVANDO IL TRAFFICO SU VIA G. LEOPARDI, VIA MONTE TERMINILLO FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA SICILIA ED INFINE VIA CALABRIA, VIA SARDEGNA E VIA TOSCANA
 - REALIZZAZIONE ROTATORIA, ASSE 1 E 2 DELL'INTERVENTO NV06B
 - REALIZZAZIONE ASSE 0 E ASSE 1 DELL'INTERVENTO NV06A, GARANTENDO L'ACCESSO ESISTENTE DELLA VILLETTA

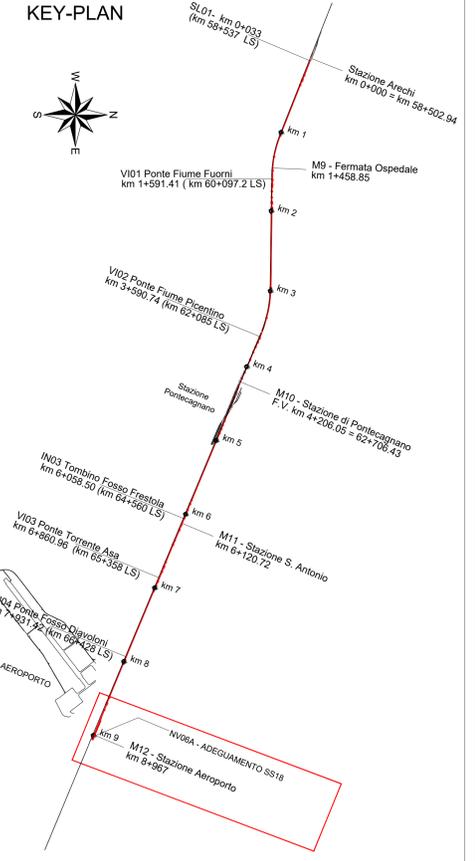

FASE 2
 - DEVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE SUGLI ASSI DI PROGETTO ATTIVATI, MANTENENDO PERO' SEMPRE UNA PARTE DI PERCORSO ALTERNATIVO (CHE INCLUDE VIA G. LEOPARDI)
 - REALIZZAZIONE ASSE 3 DELL'INTERVENTO NV06B
 - COMPLETAMENTO ASSE 0 CON CHIUSURA DELL'ACCESSO ESISTENTE DELLA VILLETTA
 - ATTIVAZIONE ASSI ROTATORIA 1 E 2 DELLA NV06B E ASSI 0 E 1 DELLA NV06A



FASE 3
 - ATTIVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLA SUA FASE FINALE



COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
 INFRASTRUTTURE SUD

U.O. INFRASTRUTTURE SUD
PROGETTO DEFINITIVO
LINEA SALERNO - PONTECAGNANO AEROPORTO
COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI SALERNO
TRATTA ARECHI - PONTECAGNANO AEROPORTO
 NUOVA VIABILITA'
 NV06A - NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE M12
 Planimetria fasi

SCALA: _____

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NN1X	00	D	78	P7	NV06A0	004	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	A. Rossi	08/2020	M. Di Stefano	08/2020	M. Di Stefano	08/2020	M. Di Stefano	08/2020
B	Emissione Esecutiva	A. Rossi	08/2021	M. Di Stefano	08/2021	M. Di Stefano	08/2021	M. Di Stefano	08/2021

File: NN1X.0.0.D.78.P7.NV.06.A.0.004.B.DWG n. Elab.: _____
