



FASI COSTRUTTIVE

- 1) PREPARAZIONE DELLA PISTA DI LAVORO DA CUI ESEGUIRE I PAU DELL'OPERA DI CONTROPPA
- 2) REALIZZAZIONE DEI PAU
- 3) SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO CON SCARPOZZATURA DEI PAU
- 4) COSTRUZIONE DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO
- 5) SCAVO DI FRONTE ALL'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRADALE DEFINITIVO, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DELLA CHIODATURA SULLA SCARPA DI TERRENO DI FRONTE ALLA PARATIA E L'INSTALLAZIONE DEI MICROCORNI
- 6) COMPLETAMENTO CON PARETE A VERDE E REALIZZAZIONE TRINCEA DRENANTE E CANALETTA DI RACCOLTA ACQUA A MONTE

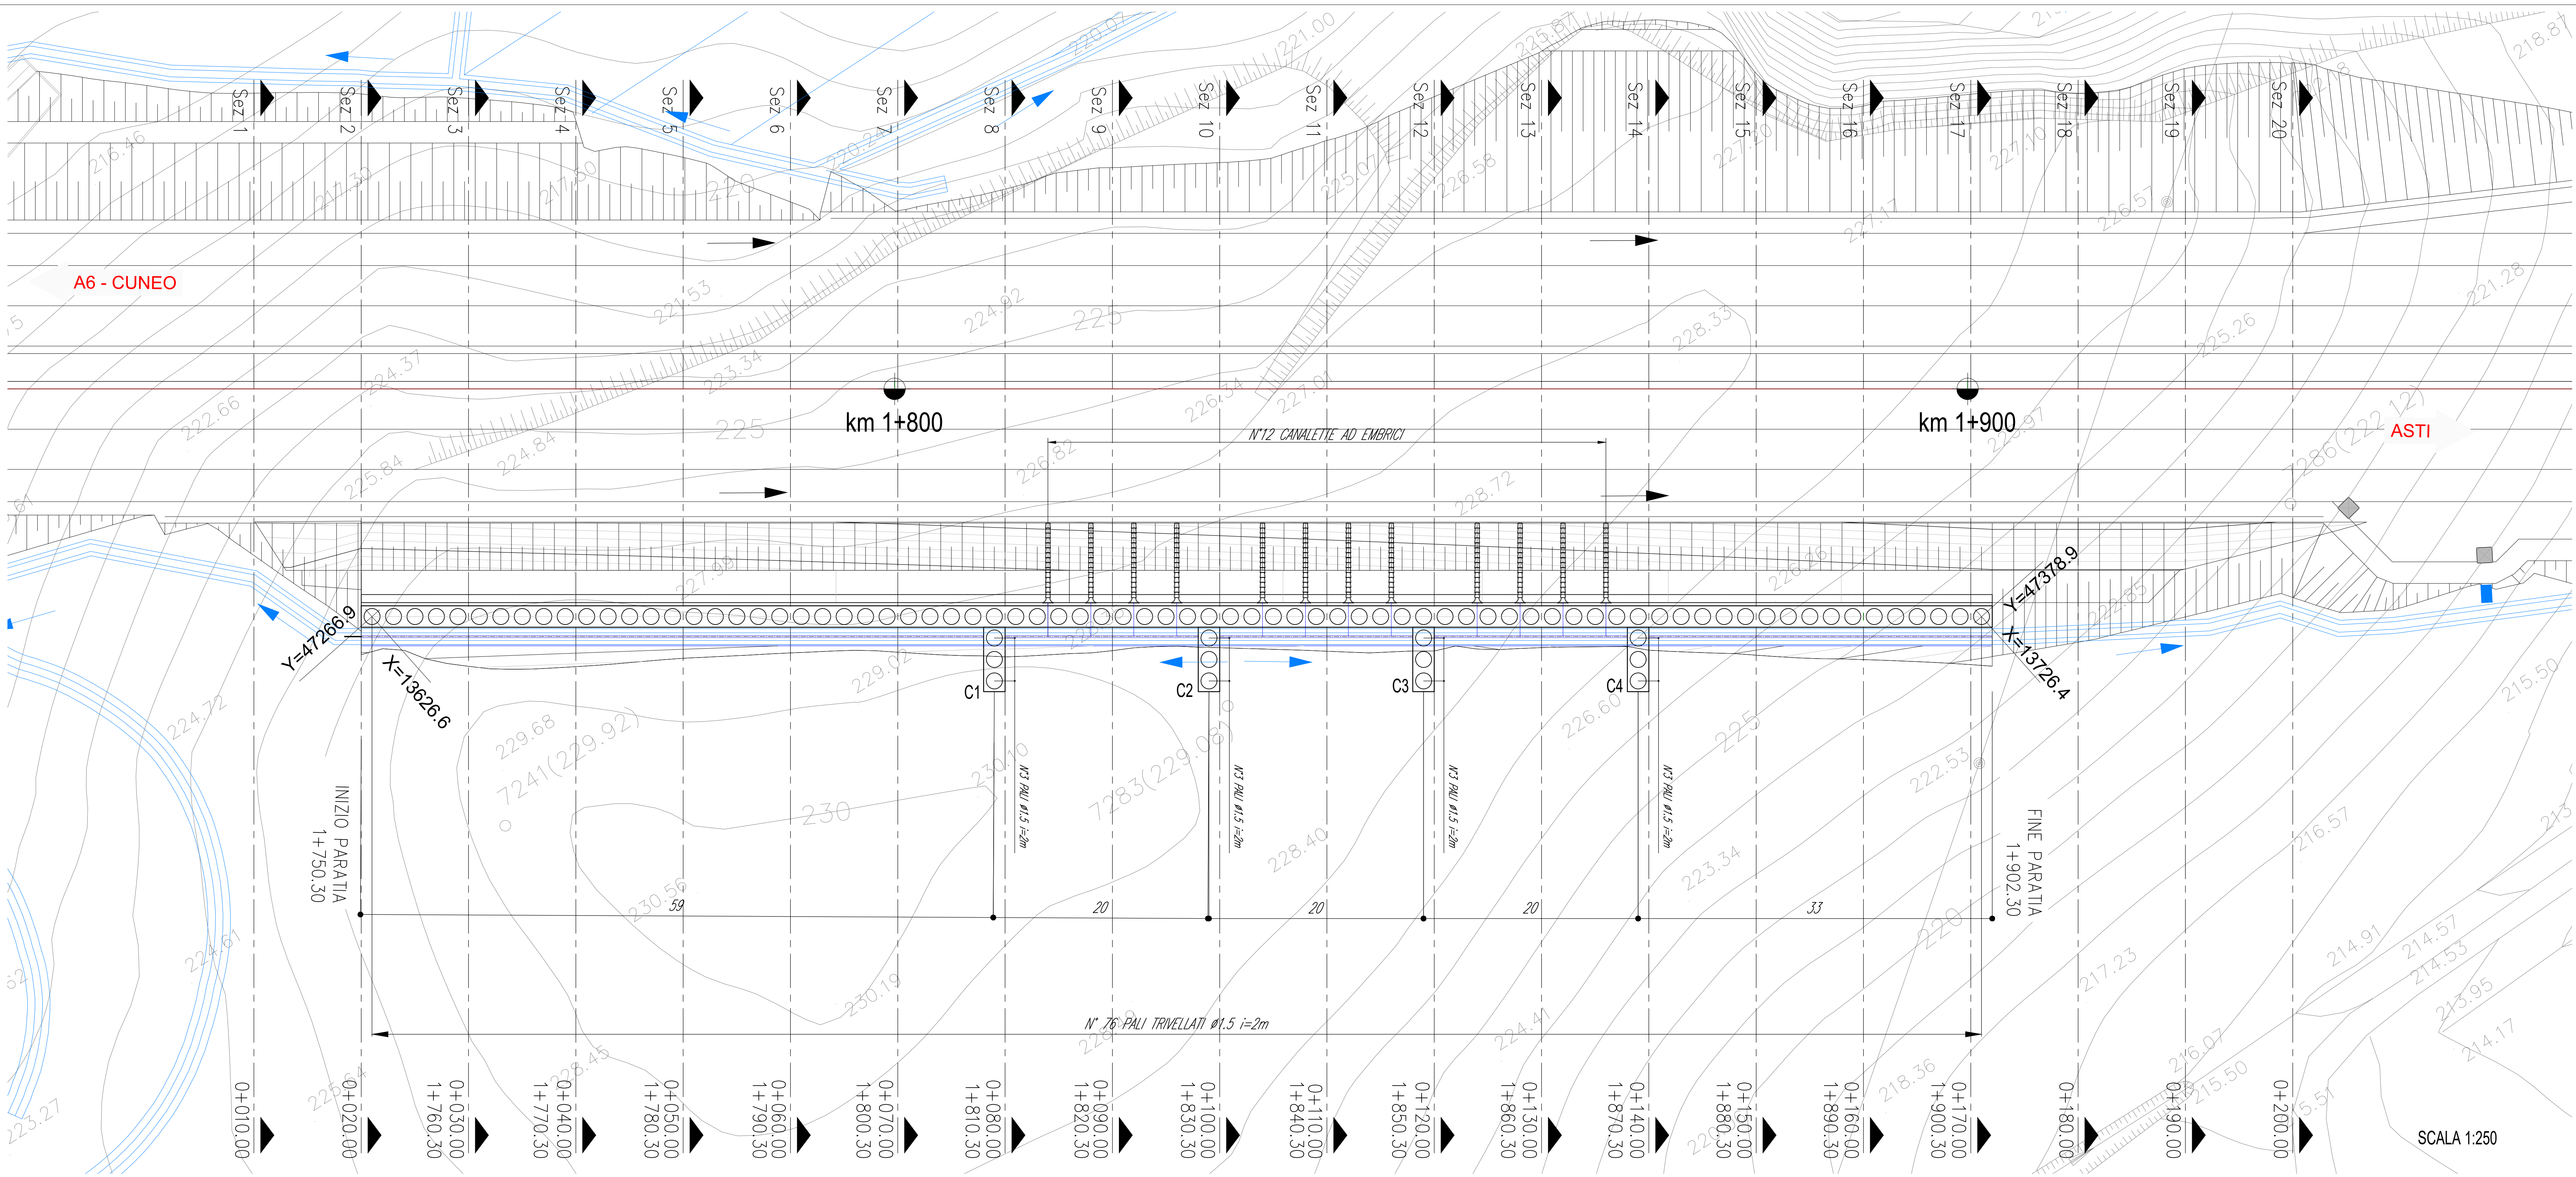

Profilo: PARATIA 4  
Scala: 1:250

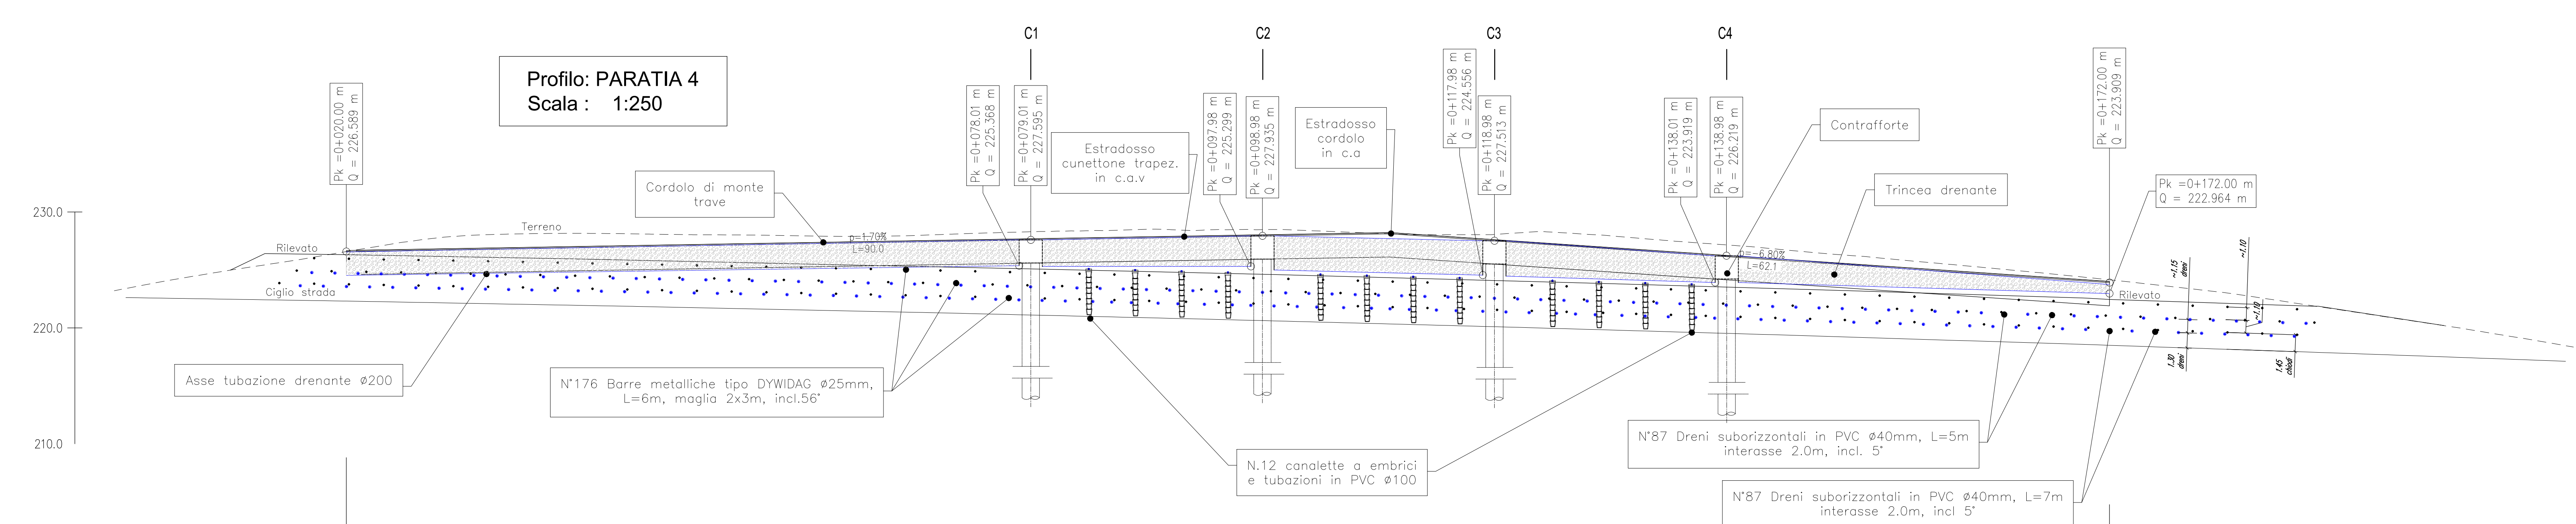

NUMERO SEZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DISTANZE PROGRESSIVE	0+000.00	0+020.00	0+040.00	0+060.00	0+080.00	0+100.00	0+120.00	0+140.00	0+160.00	0+180.00	0+200.00	0+220.00	0+240.00	0+260.00	0+280.00	0+300.00	0+320.00	0+340.00	0+360.00	0+380.00	0+400.00
QUOTE TERRENO	224.99	226.59	227.94	228.16	228.04	227.83	228.01	228.32	228.51	228.49	228.12	228.15	227.86	227.09	226.23	225.32	224.36	223.27	221.84	220.33	218.74
QUOTE ESTRADOSSO TRAVE		226.59	226.76	226.93	227.10	227.27	227.44	227.61	227.78	227.95	228.12	228.14	228.76	228.08	225.40	224.72	224.04	223.04	221.84	220.33	
QUOTE CUNETONE TRAPEZ.		226.55	226.73	226.91	227.09	227.27	227.45	227.60	227.78	227.93	227.70	227.51	226.79	226.22	225.45	224.68	223.50	222.27	221.84	220.33	
QUOTE TUBAZ. DRENANTE Ø200		224.54	224.68	224.82	224.97	225.11	225.25	225.30	225.30	224.99	224.75	224.47	224.16	223.92	223.62	223.32	223.02	222.59	221.87		
QUOTE RILEVATO	224.99	226.32	227.13	227.27	227.55	227.72	227.89	228.07	228.24	228.40	228.53	228.68	228.79	228.82	228.80	228.72	228.57	228.23	227.89	227.54	
QUOTE CICLO STRADA	222.48	222.32	222.13	221.95	221.75	221.54	221.33	221.09	220.86	220.60	220.34	220.08	219.79	219.50	219.20	218.89	218.57	218.23	217.89	217.54	



TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)  
LOTTO 6 RODDI-DIGA ENEL

STRALCIO a  
TRA IL LOTTO II.7 E LA PK. 5+000

PROGETTO DEFINITIVO  
OPERE GEOTECNICHE  
TRINCEE  
PLANIMETRIA E PROFILI  
OPERA DI SOSTEGNO TRN04 - Tav. 1

IMPRESA	PROGETTISTA	INTEGRATORE ATTIVITA' SPECIALISTICHE	COMMITTENTE					
ITINERA	PROGER	PROGER	Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. Divisione e Contrattato S41.14 (Strada A21) Via G. Galvani, 102 00187 Roma					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA	SCALA
A	05/2021	EMISSIONE	M. Condari	S. Corti	Ing. Spazzoli	Ing. Spazzoli	MAGGIO 2021	1:250
							06.01.10	
CODIFICA		PROGETTO	OPERA	DOCUMENTO	REV.	NBS		
P0117		01	P2	019	A	A31126A00		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		VISTO DELLA COMMITTENTE						
