
# PLANIMETRIA FASE ESECUTIVE Scala 1:500

#### FASE 1

Realizzazione paratia provvisoria di micropali a protezione della sede ferroviaria;

- Avvio scavi per raggiungere la quota di esecuzione dei micropali sia per il piedritto nord che per quello sud, per il sottovia e per le opere di sostegno in imbocco;

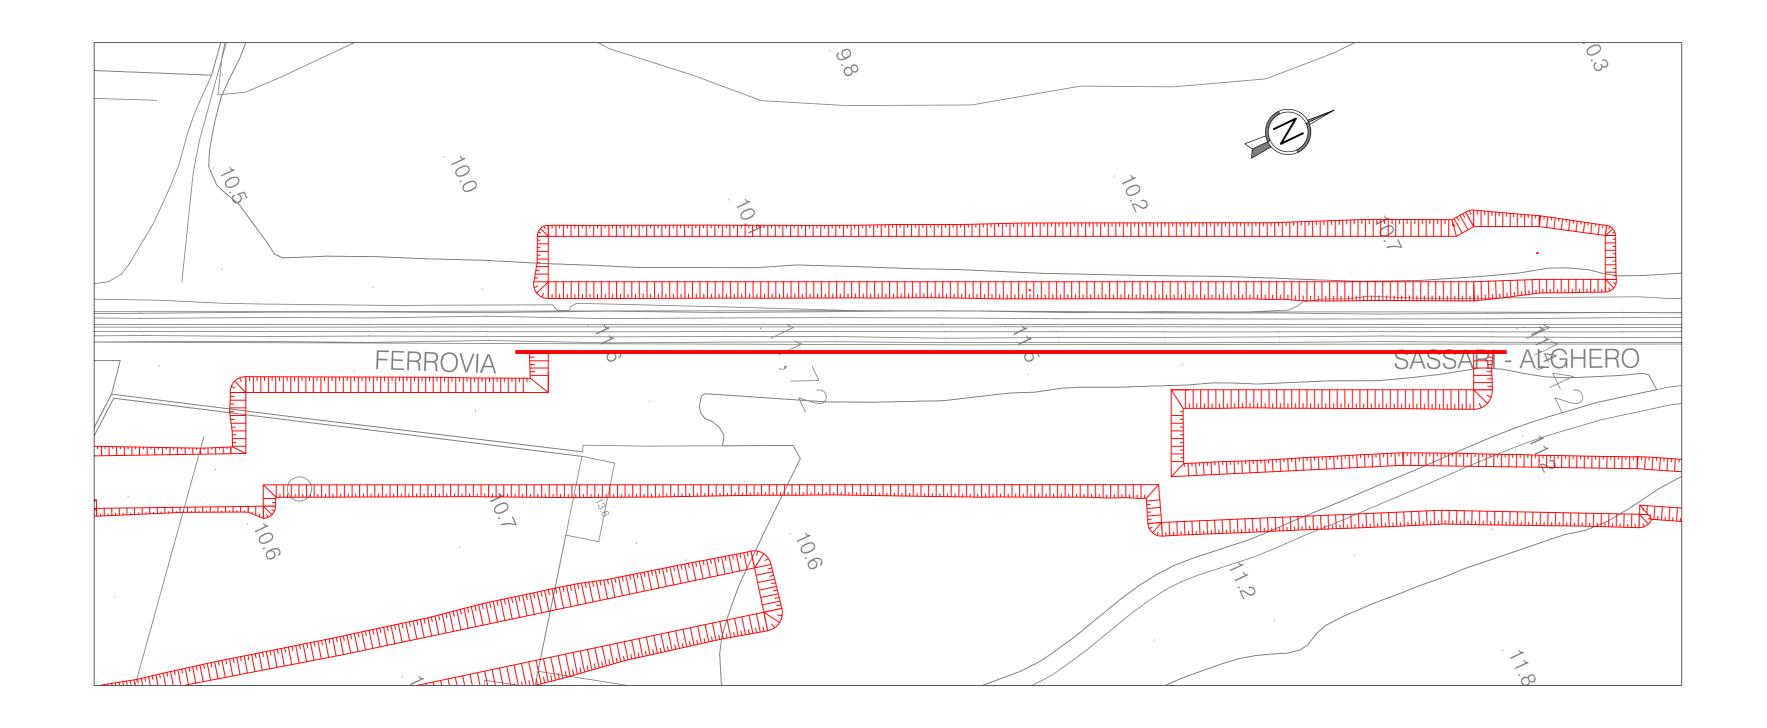


### FASE 2

- Esecuzione dei micropali;

- Getto dei magroni di fondazione, posa in opera armature di fondazione e ferri di ripresa della galleria lato nord;

Getto fondazione della galleria lato nord;Posa in opera armature piedritto destro e getto fino a quota di appoggio travi, lato nord;

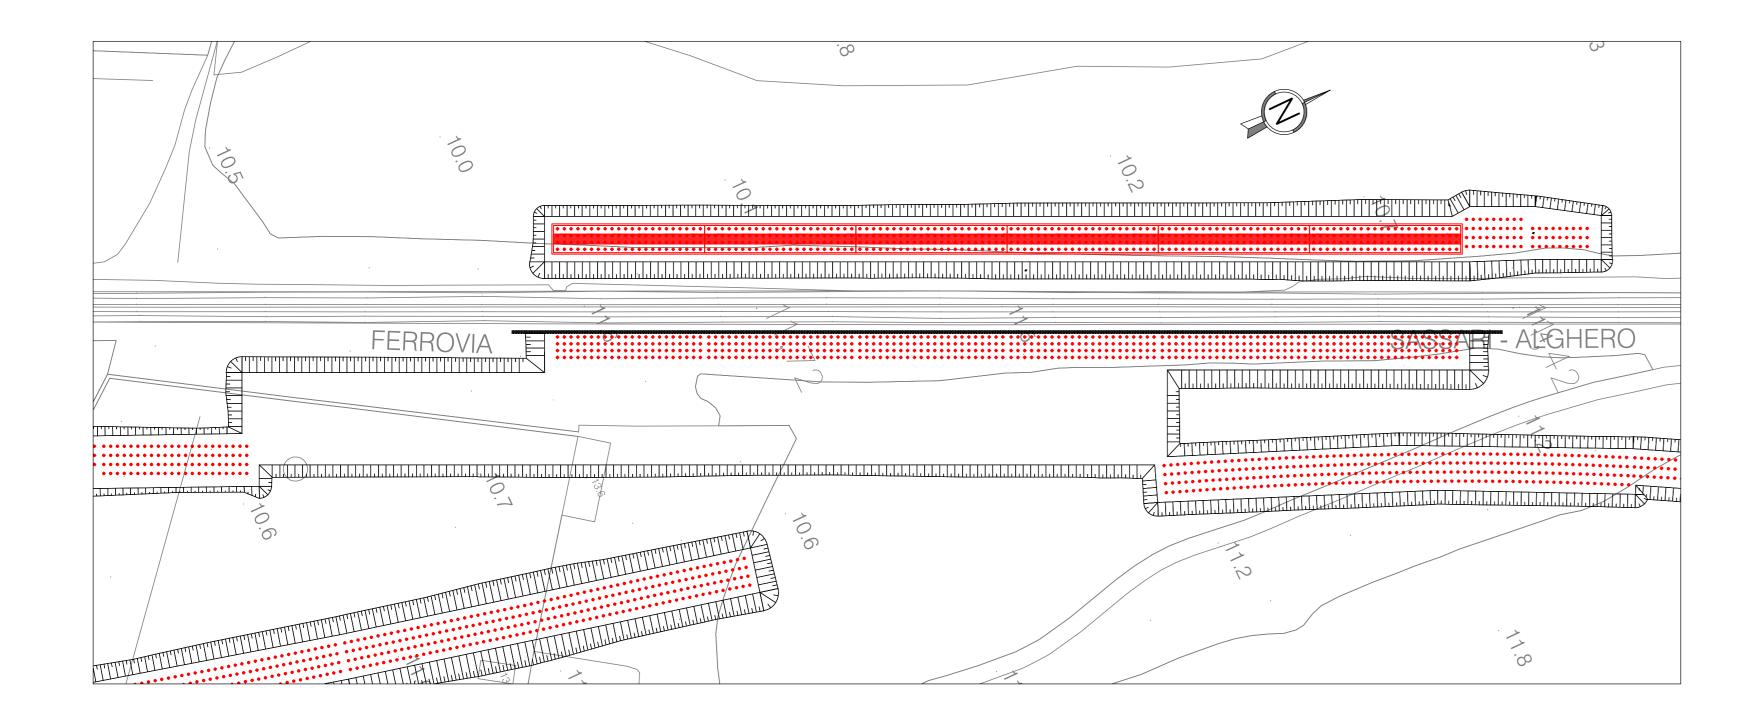


## FASE 3

- Getto dei magroni di fondazione, posa in opera armature di fondazione e ferri di ripresa della galleria lato sud;


- Getto fondazione della galleria lato sud;

Posa in opera armature piedritto sinistro e getto fino a quota di appoggio travi, lato sud;

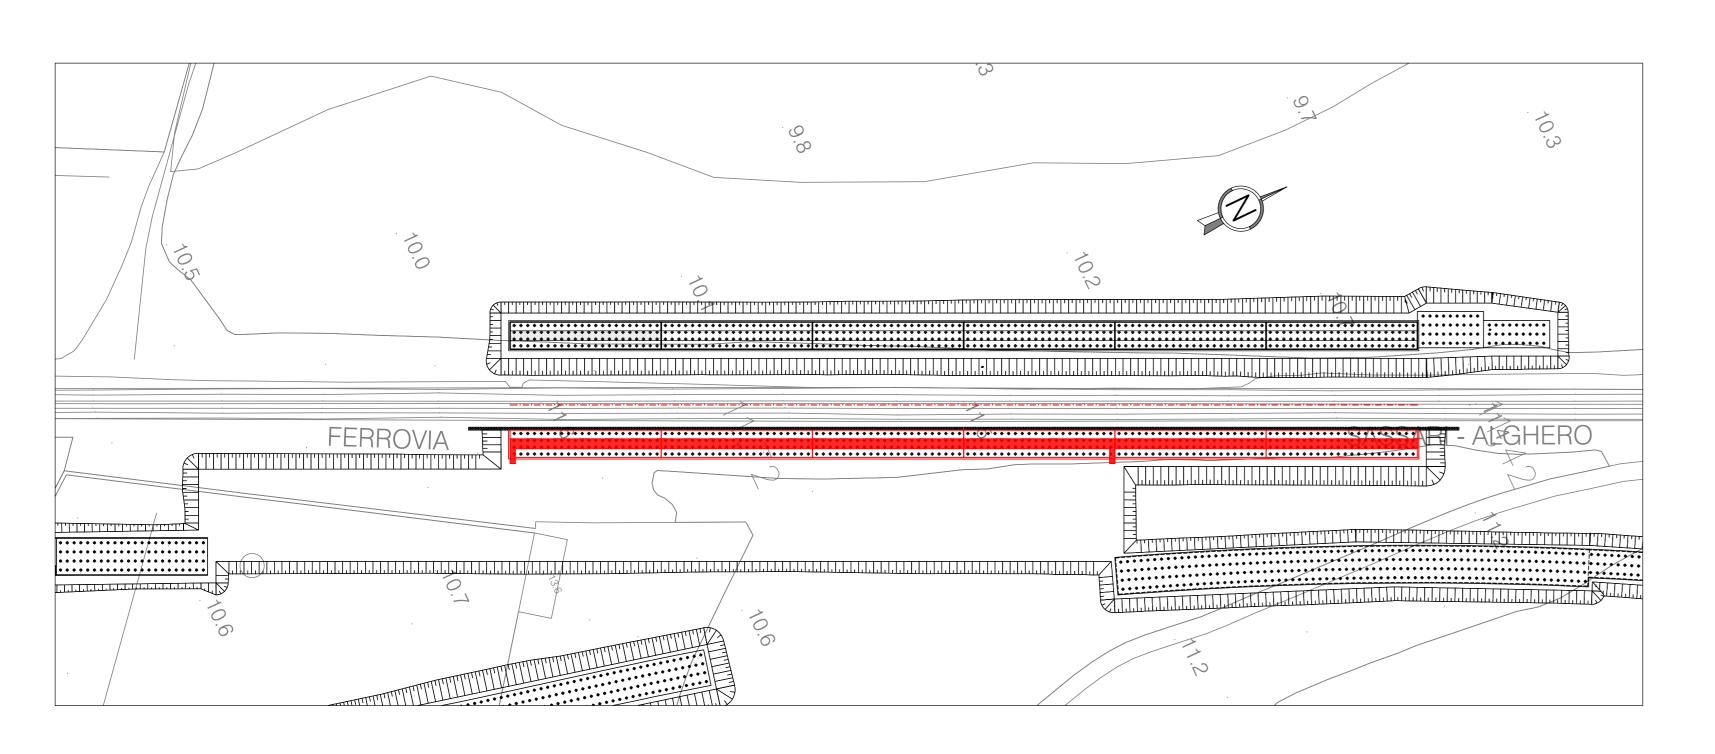

## FASE 4


Da eseguire durante il rallentamento notturno:
Posa in opera travi, procedendo per segmenti longitudinali di 20 travi (circa 20 m);
Posa in opera armatura trasversi e soletta integrativa per il primo modulo da 20 m;
Getto del primo modulo da 20 m;

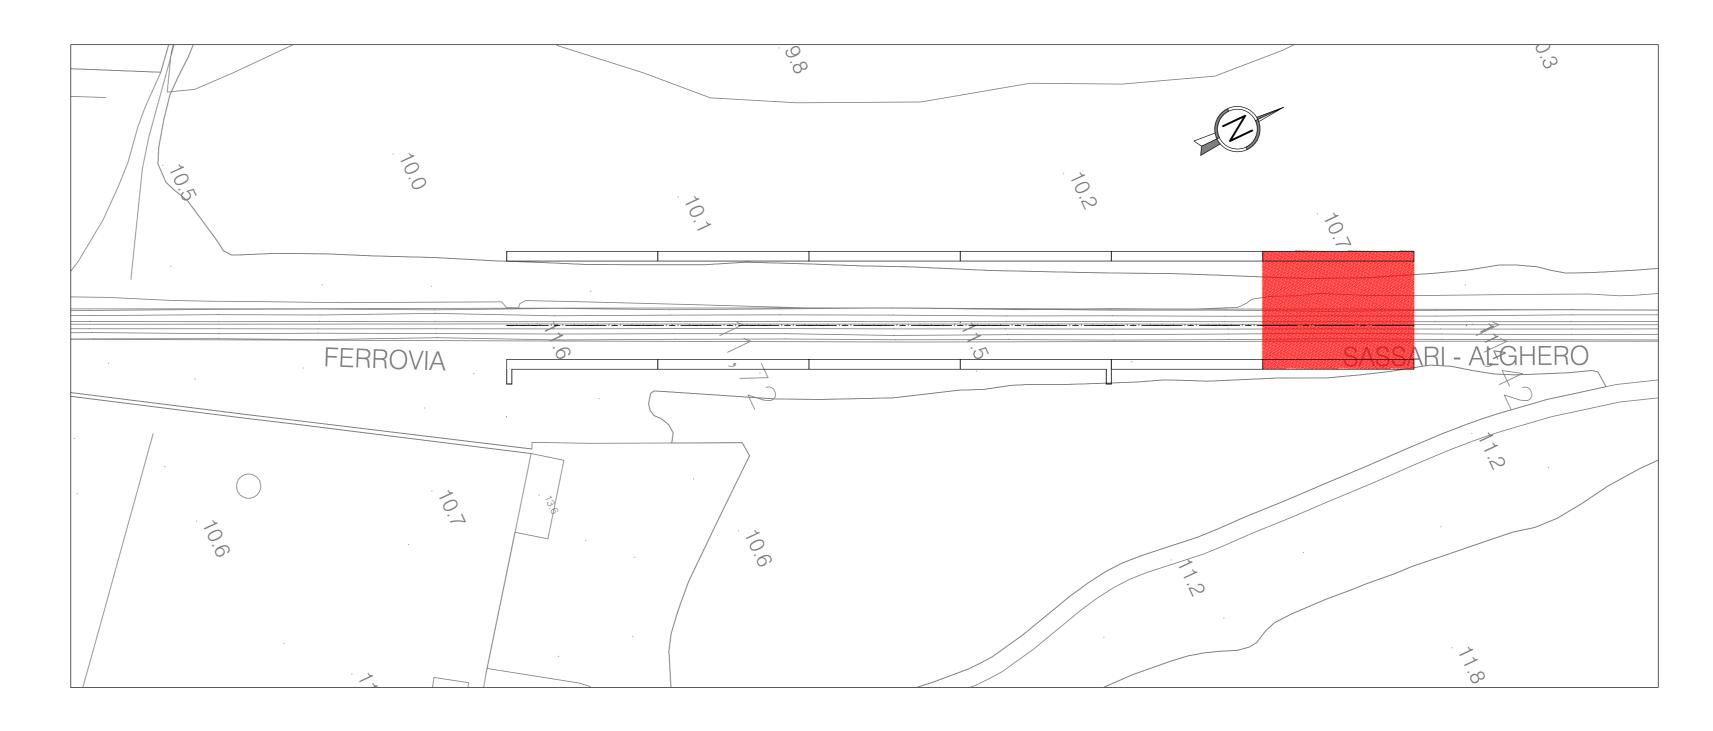

#### FASE 5

- Ripetizione delle attività della fase 4 per i moduli successivi (totale ulteriori 5 moduli da 20 m);

Esecuzione del sottovia lato sud;
 Getto dei cordoli sulla soletta superiore, esecuzione dell'impermeabilizzazione a spruzzo e realizzazione massetto delle pendenze;

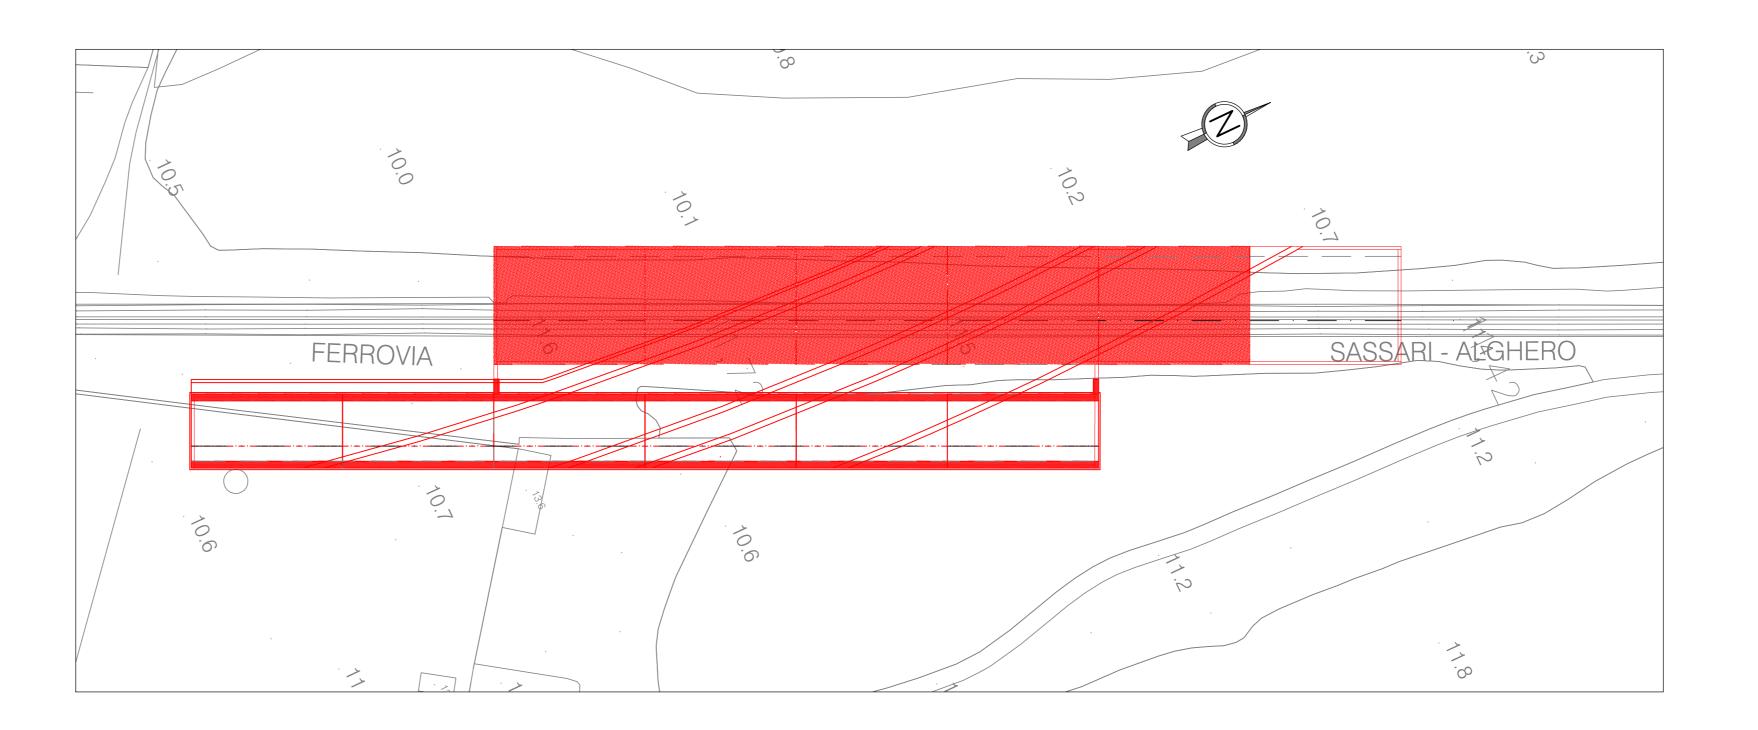

## FASE 6

- Esecuzione dei muri agli imbocchi;

Realizzazione dei ritombamenti e delle solette di transizione;Realizzazione arredo stradale sull'opera.


PARSKRILLA PLID MEIALLO

PARSKRILLA PLIDONALLA PLIDONALA PLIDONAL PLIDONA

LEGENDA BARRIERE

- - RETE ANTILANCIO

- - BARRIERA H4BP

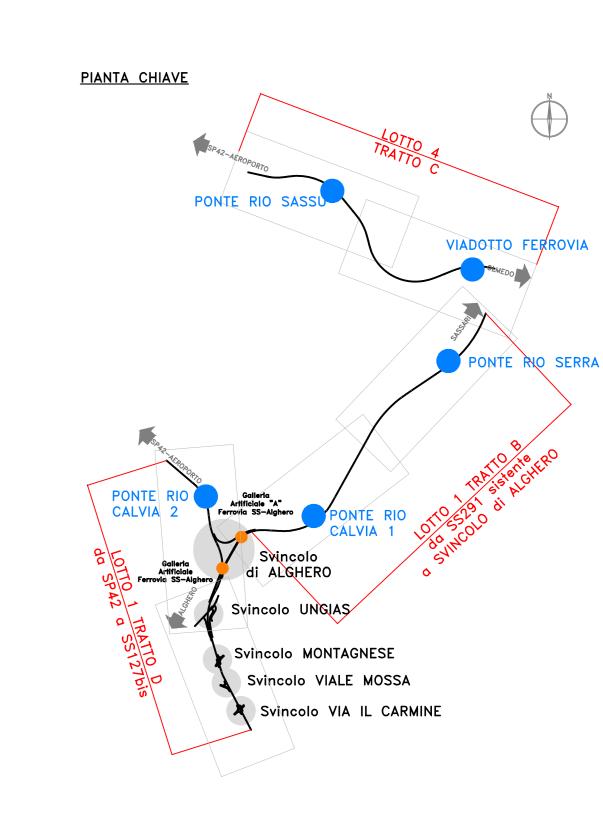



DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

REV. DESCRIZIONE
