



NV54A- ADEGUAMENTO EX SS 121  
COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA)

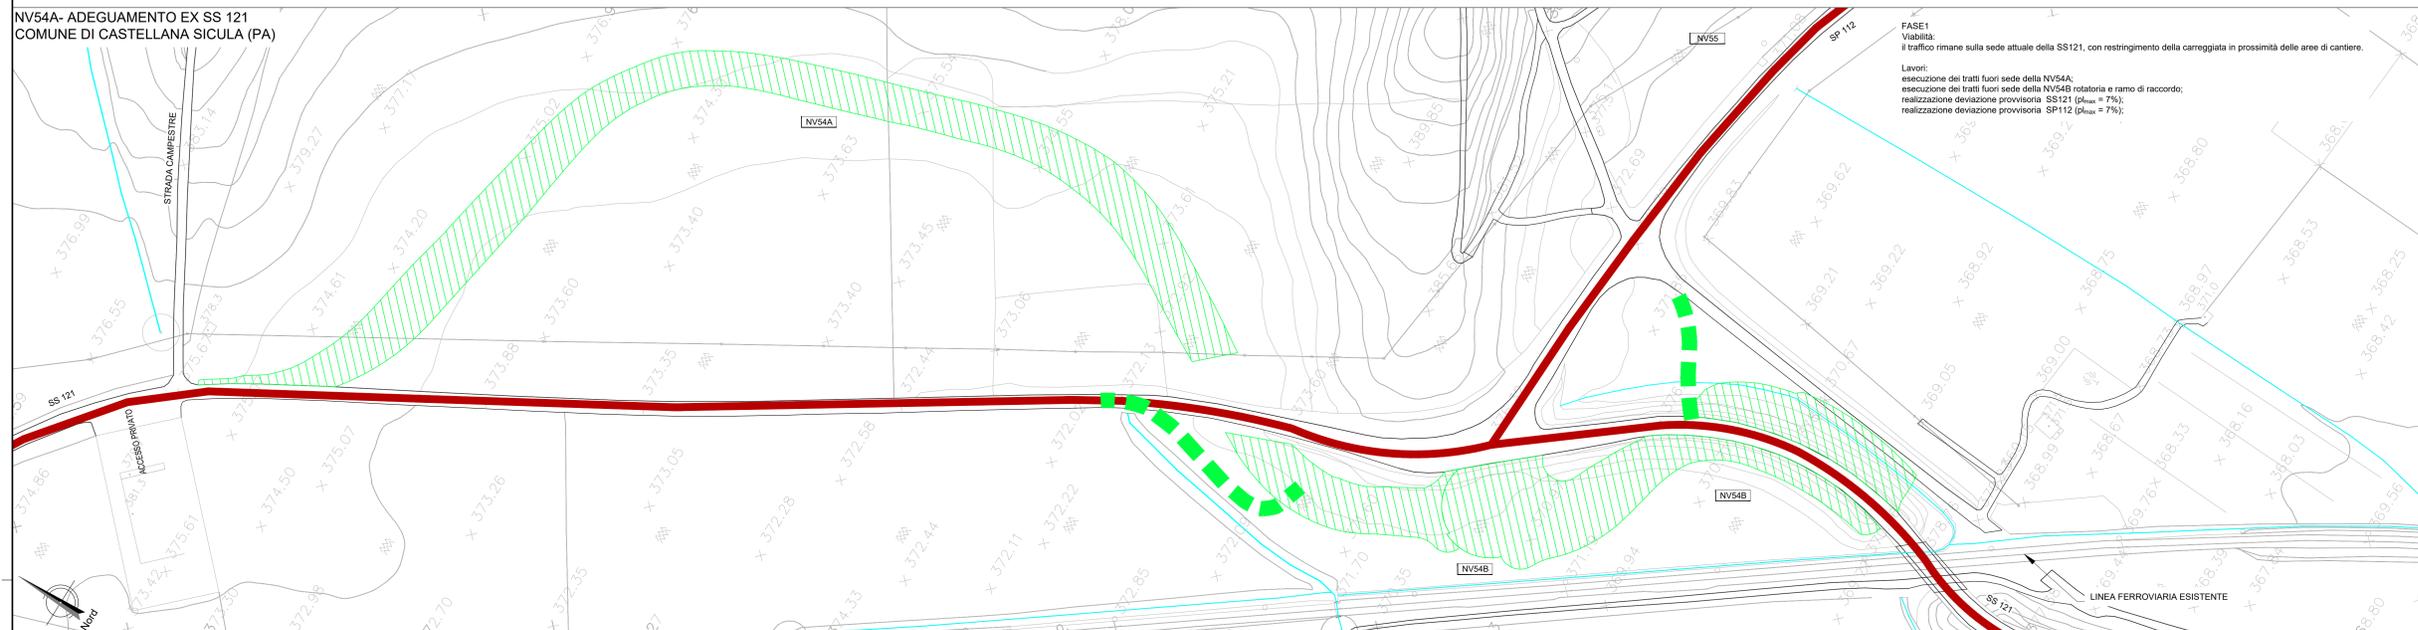


**FASE1**  
Viabilità:  
il traffico rimane sulla sede attuale della SS121, con restringimento della carreggiata in prossimità delle aree di cantiere.  
  
Lavori:  
esecuzione dei tratti fuori sede della NV54A;  
esecuzione dei tratti fuori sede della NV54B rotatoria e ramo di raccordo;  
realizzazione deviazione provvisoria SS121 (p<sub>max</sub> = 7%);  
realizzazione deviazione provvisoria SP112 (p<sub>max</sub> = 7%);

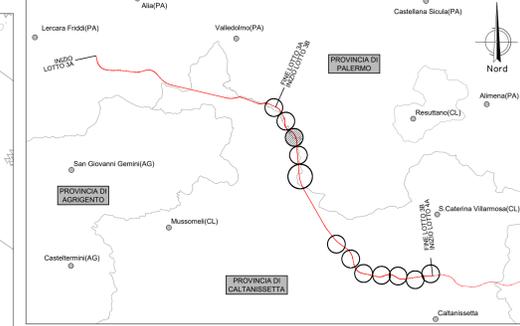

**LEGENDA FASI**

SIMBOLO	NOME	SIMBOLO	NOME
	TRAFFICO: VIABILITÀ IN ESERCIZIO NELLA FASE		LAVORI: TRATTO DI VIABILITÀ IN COSTRUZIONE NELLA FASE
	LAVORI: REALIZZAZIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA		LAVORI: TRATTO DI VIABILITÀ COSTRUITA NON IN ESERCIZIO

NV54A- ADEGUAMENTO EX SS 121  
COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA)

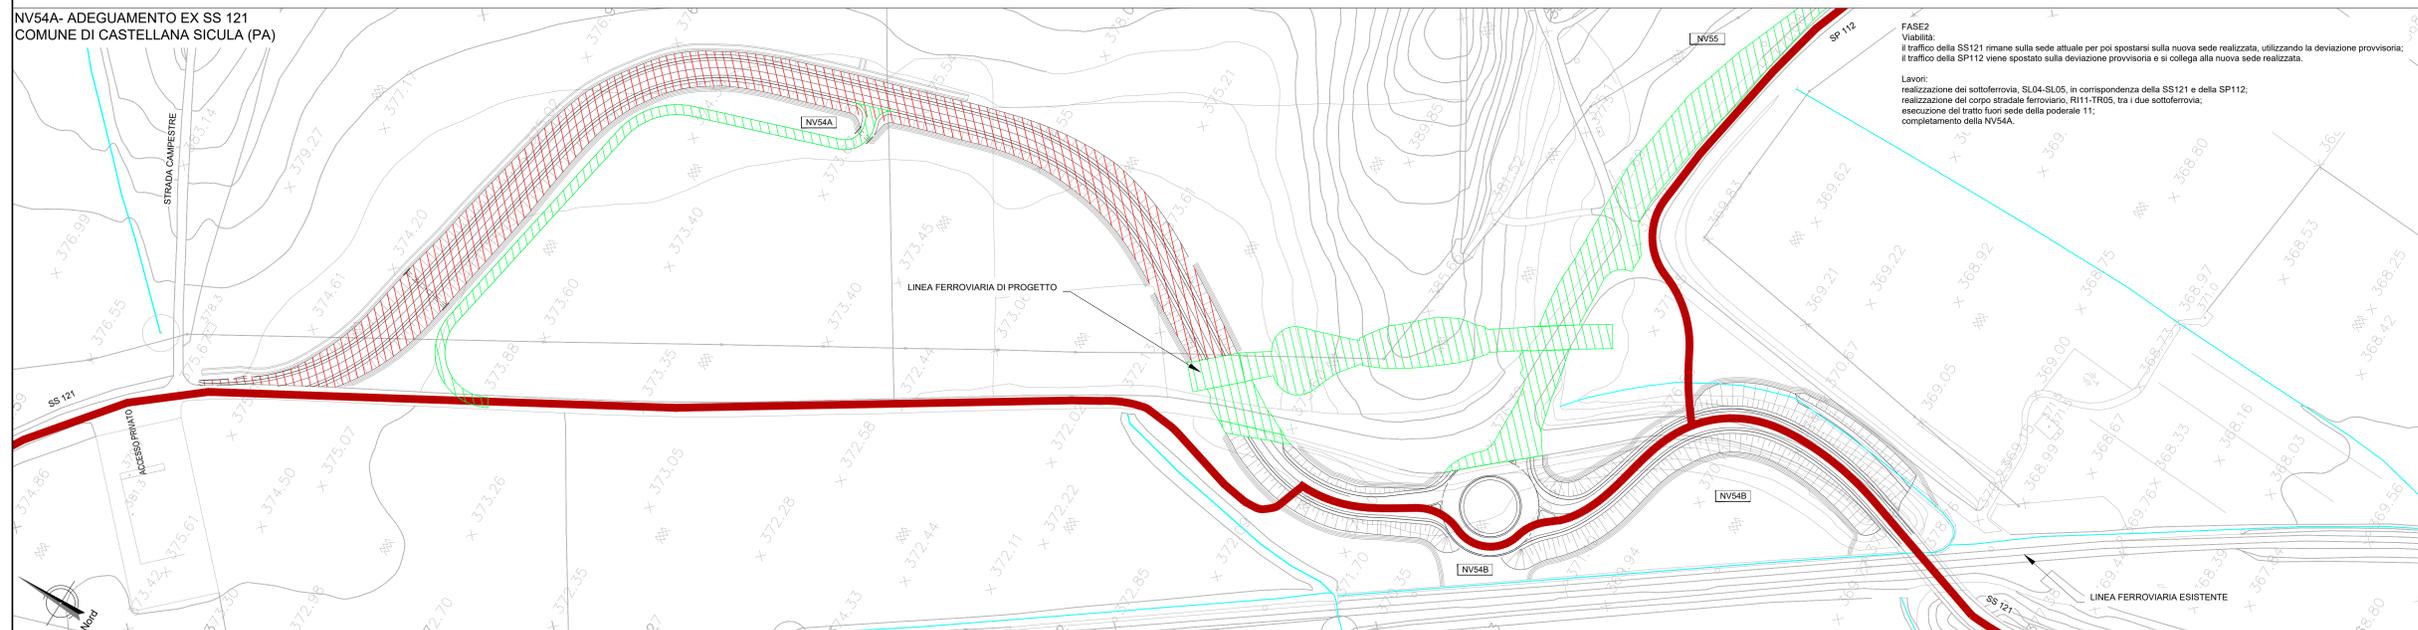

**FASE2**  
Viabilità:  
il traffico della SS121 rimane sulla sede attuale per poi spostarsi sulla nuova sede realizzata, utilizzando la deviazione provvisoria; il traffico della SP112 viene spostato sulla deviazione provvisoria e si collega alla nuova sede realizzata.  
  
Lavori:  
realizzazione dei sottoriferimenti: SL04-SL05, in corrispondenza della SS121 e della SP112;  
realizzazione del corpo stradale ferroviario, R111-R106, tra i due sottoriferimenti;  
esecuzione del tratto fuori sede della podereale 11;  
completamento della NV54A.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. INFRASTRUTTURE SUD**  
**PROGETTO DEFINITIVO**  
**TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)**

VIABILITA'  
NV54A - Adeguamento ex SS121 da pk 22+766 a pk 23+300  
Planimetria fasi


SCALA: 1:1000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3T	30	D	78	P7	NV54A0	003	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev. Data
A	Emissione Esecutivo	M. Venturi	Feb-2020	M. Venturi	Feb-2020		Feb-2020	D 18/495 Mar-2021
B	Emissione Esecutivo	M. Venturi	Mar-2021	M. Venturi	Mar-2021		Mar-2021	D 18/495 Mar-2021

File: RS3T.3.0.D.78.P7.NV.54.A.0.003.B n. Elab.: 78\_254.1

NV54A- ADEGUAMENTO EX SS 121  
COMUNE DI CASTELLANA SICULA (PA)

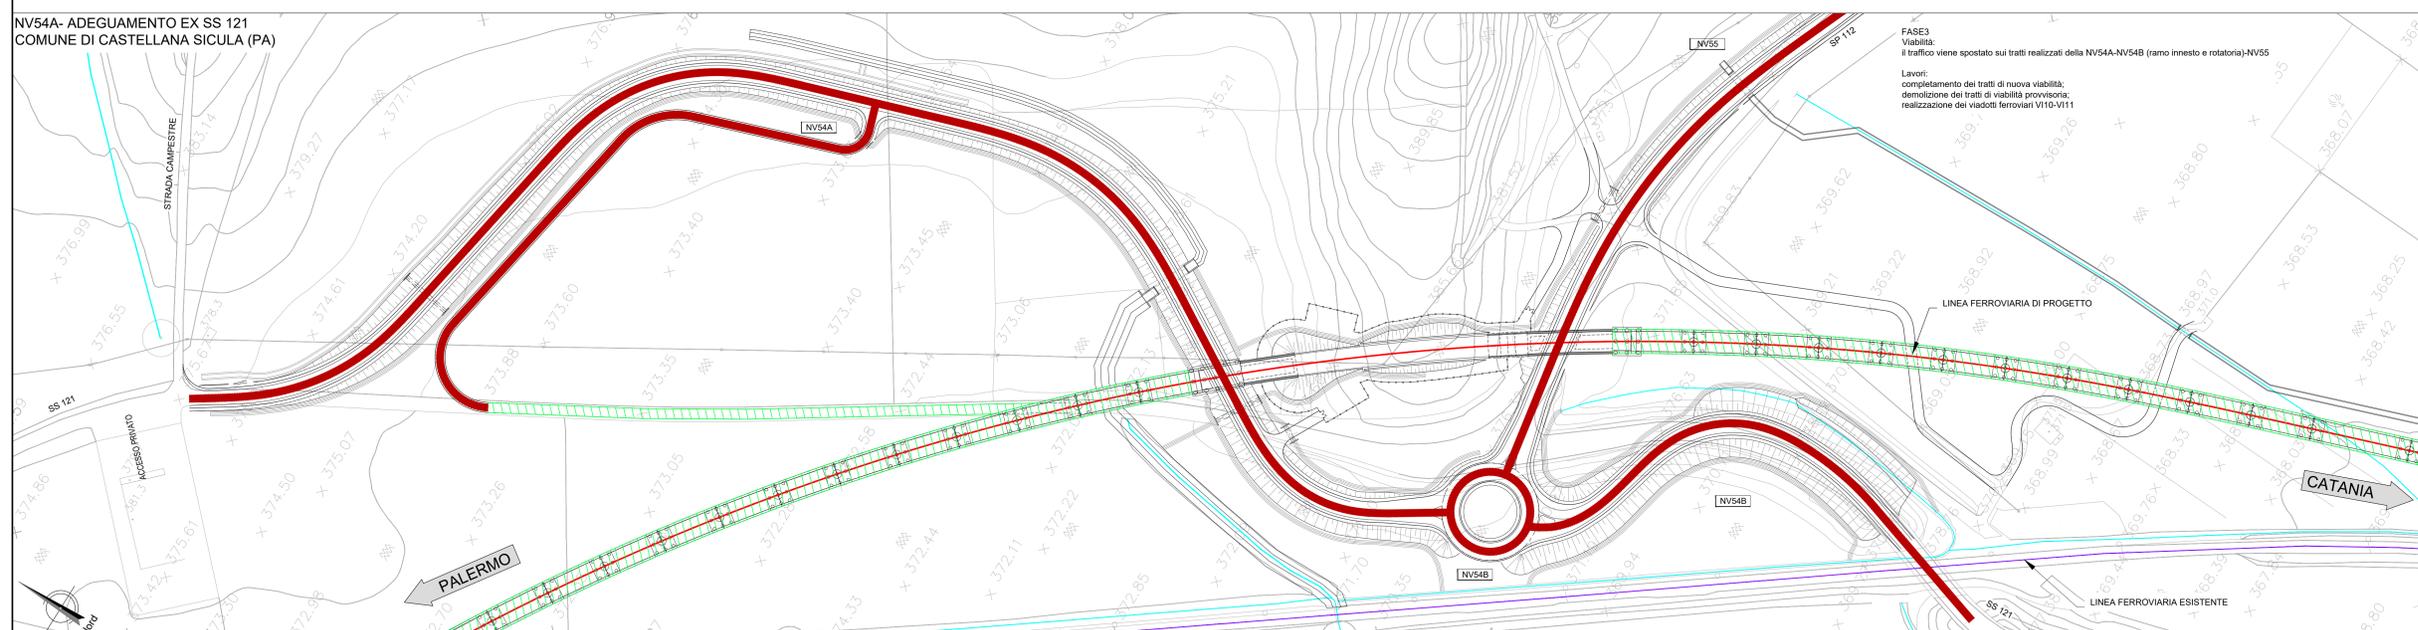

**FASE3**  
Viabilità:  
il traffico viene spostato sui tratti realizzati della NV54A-NV54B (ramo innesto e rotatoria)-NV55  
  
Lavori:  
completamento dei tratti di nuova viabilità;  
demolizione dei tratti di viabilità provvisoria;  
realizzazioni dei viadotti ferroviari V110-V111

CATANIA

PALERMO
