


FASE 1
Viabilità:
Il traffico rimane sulla sede attuale sia della SP145 (NV62A-NV62B) che della SP44 (NV62C), eventuali restringimenti o sensi unici alternati sono presenti nelle zone cerchiate.


Lavori:
esecuzione dei tratti fuori sede della NV62A (SP145), sia viadotto NV04 che nuovo corpo stradale;
esecuzione dei tratti fuori sede della NV62B (SP145), corpo stradale non interferente con esistente;
esecuzione dei tratti fuori sede della NV62C (SP44), sia viadotto NV04 che nuovo corpo stradale;

NB
Per l'attacco della NV62A con la NV61 si vedano le fasi relative a questa ultima: RS3T.3.0.D.78.P7.NV.61.0.0.004.A

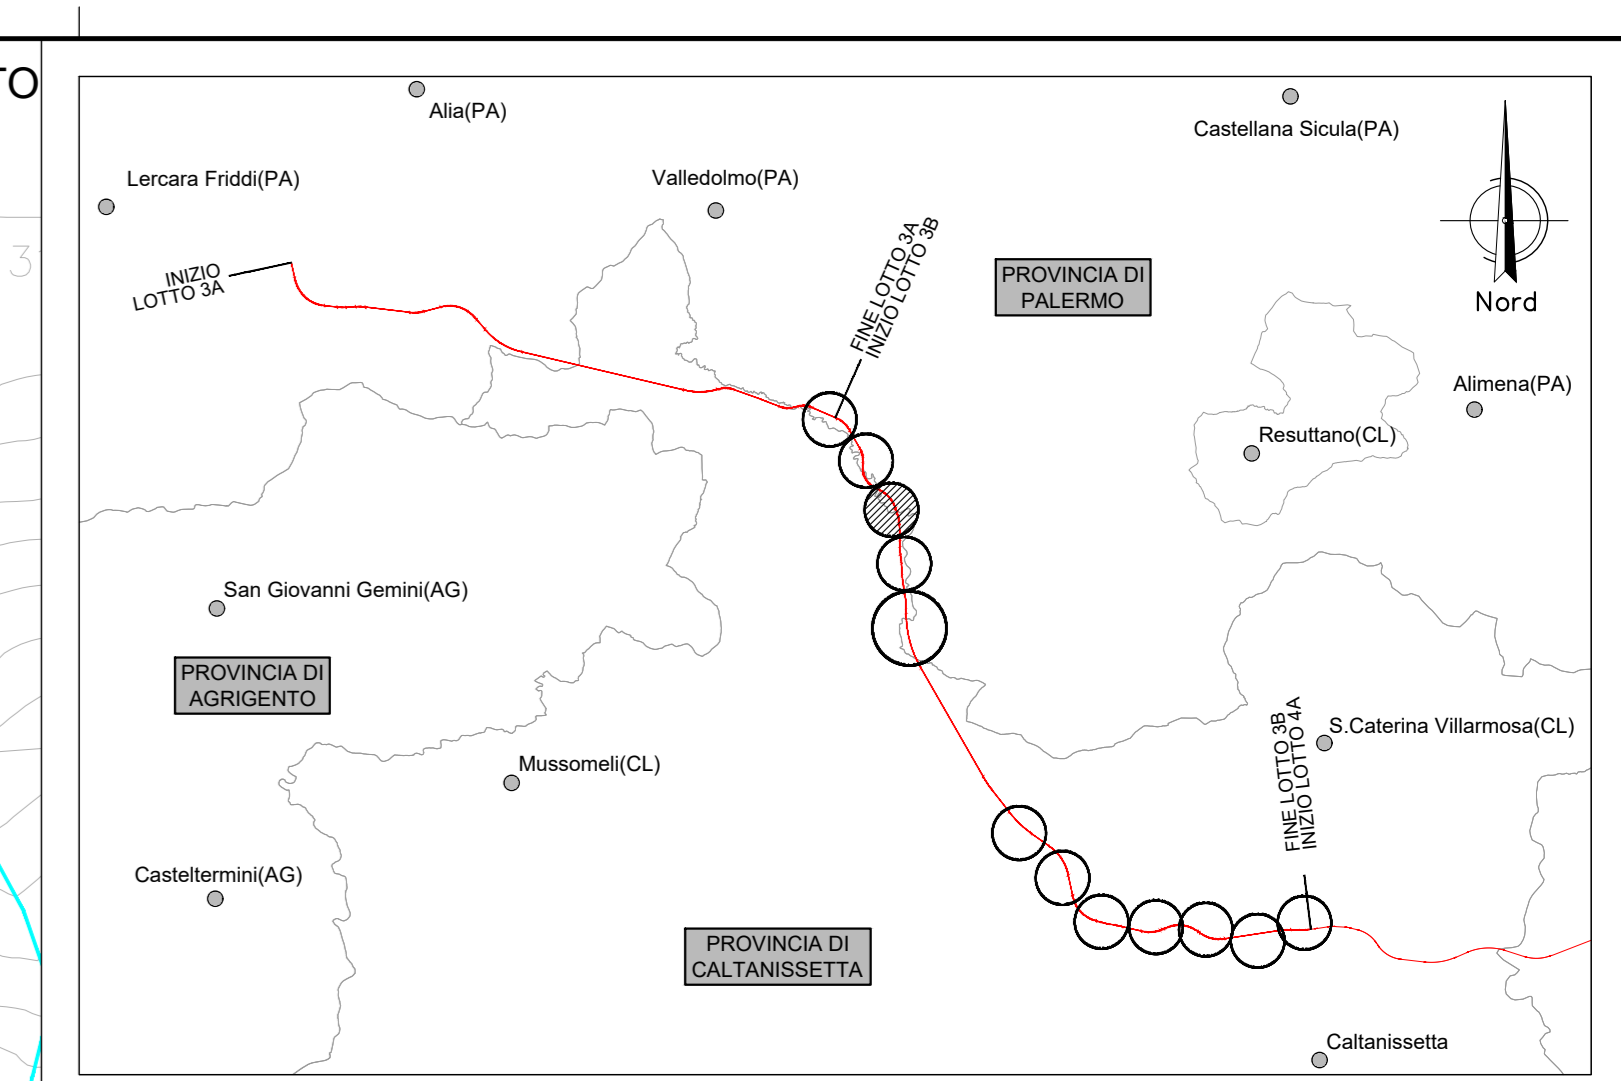

LEGENDA FASI

SIMBOLO	NOME	SIMBOLO	NOME
	TRAFFICO: VIABILITÀ IN ESERCIZIO NELLA FASE		LAVORI: TRATTO DI VIABILITÀ IN COSTRUZIONE NELLA FASE
	LAVORI: REALIZZAZIONE DEVIAZIONE PROVVISORIA		LAVORI: TRATTO DI VIABILITÀ COSTRUITA NON IN ESERCIZIO

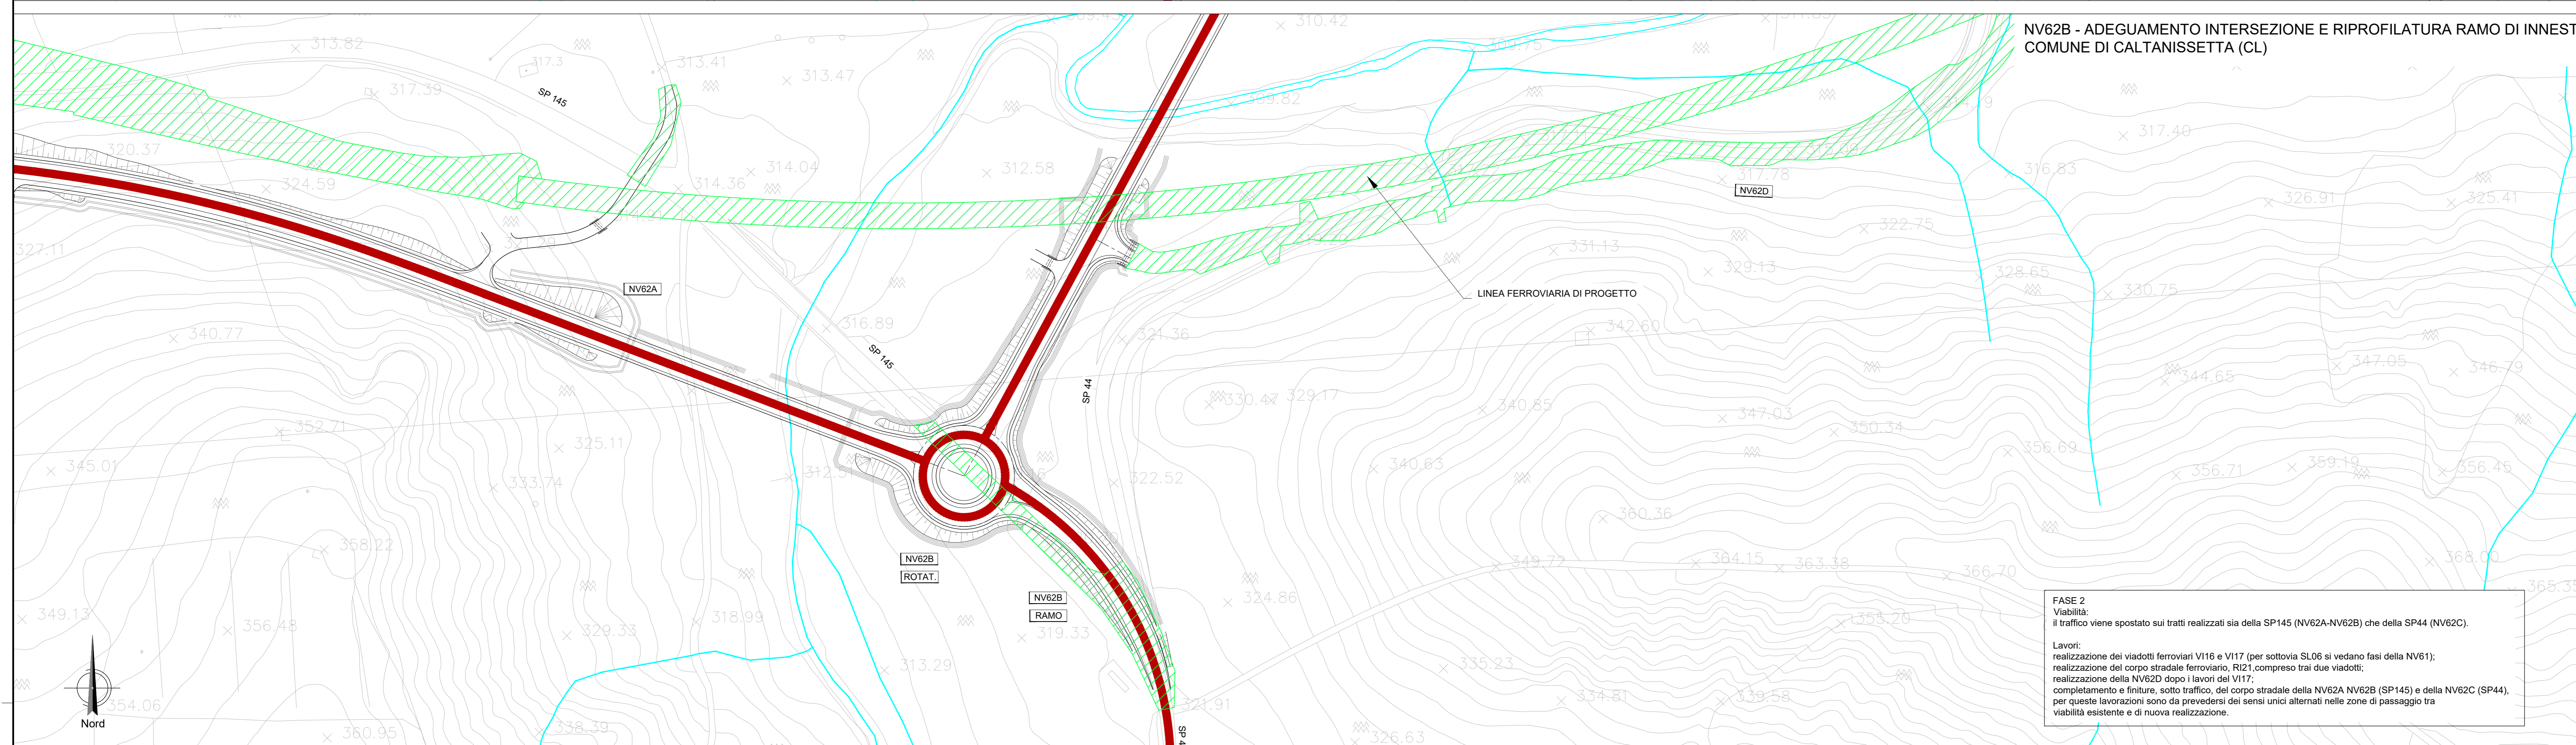

FASE 2
Viabilità:
Il traffico viene spostato sui tratti realizzati sia della SP145 (NV62A-NV62B) che della SP44 (NV62C).

Lavori:
realizzazione dei viadotti ferroviari V116 e V117 (per sottovia SLO6 si vedano fasi della NV61);
realizzazione del corpo stradale ferroviario, R21, compreso tra i due viadotti;
realizzazione della NV62D dopo i lavori del V117;
completamento e finiture, sotto traffico, del corpo stradale della NV62A NV62B (SP145) e della NV62C (SP44), per queste lavorazioni sono da prevedersi dei sensi unici alternati nelle zone di passaggio tra viabilità esistente e di nuova realizzazione.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA LERCARA DIR. - CALTANISSETTA XIRBI (LOTTO 3)


VIABILITA'
NV62B - Adeguamento intersezione e riprofilatura ramo di innesto
Planimetria fasi

SCALA: **1:1000**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3T	30	D	78	P7	NV62B0	005	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutivo		Feb-2020		Feb-2020		Feb-2020	Feb-2020

File: RS3T.3.0.D.78.P7.NV.62.B.0.005.A n. Elab.: 78_339_1

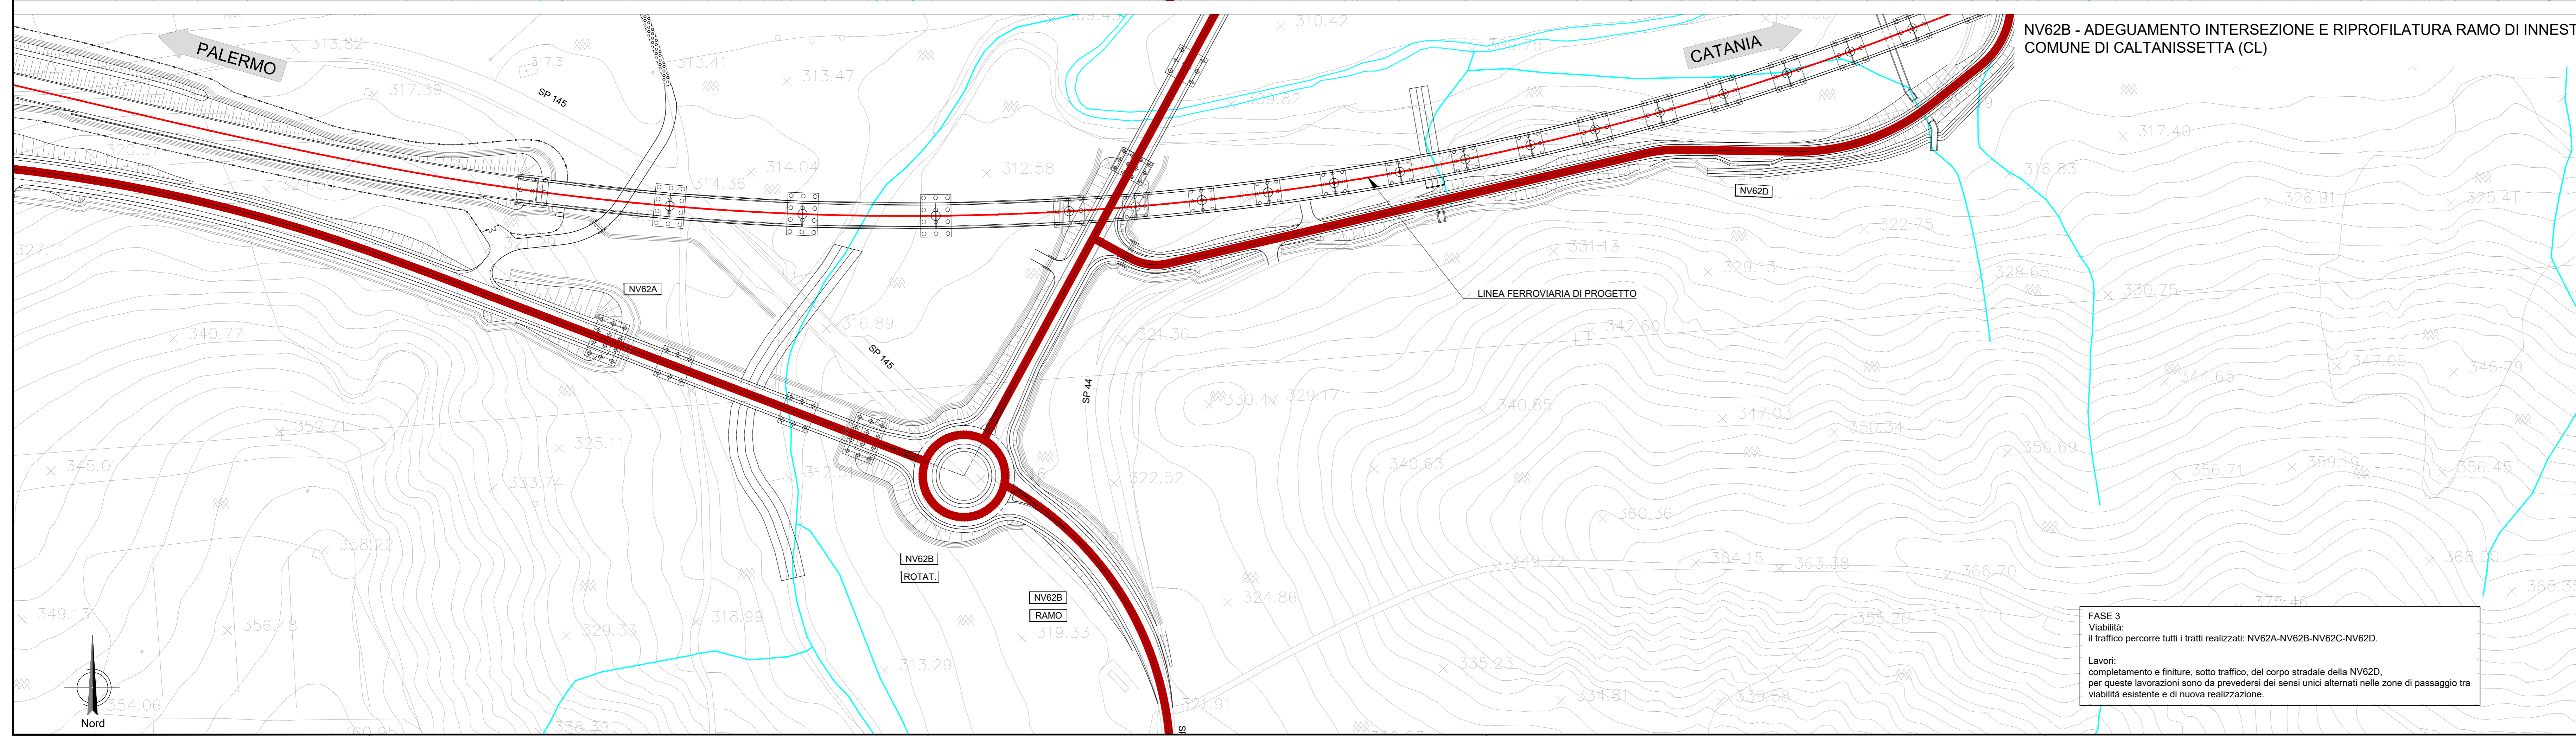

FASE 3
Viabilità:
Il traffico percorre tutti i tratti realizzati: NV62A-NV62B-NV62C-NV62D.

Lavori:
completamento e finiture, sotto traffico, del corpo stradale della NV62D, per queste lavorazioni sono da prevedersi dei sensi unici alternati nelle zone di passaggio tra viabilità esistente e di nuova realizzazione.
