


TRACCIAMENTO DEVIAZIONI - FASE 3 - QUADRO 1  
SCALA 1:500

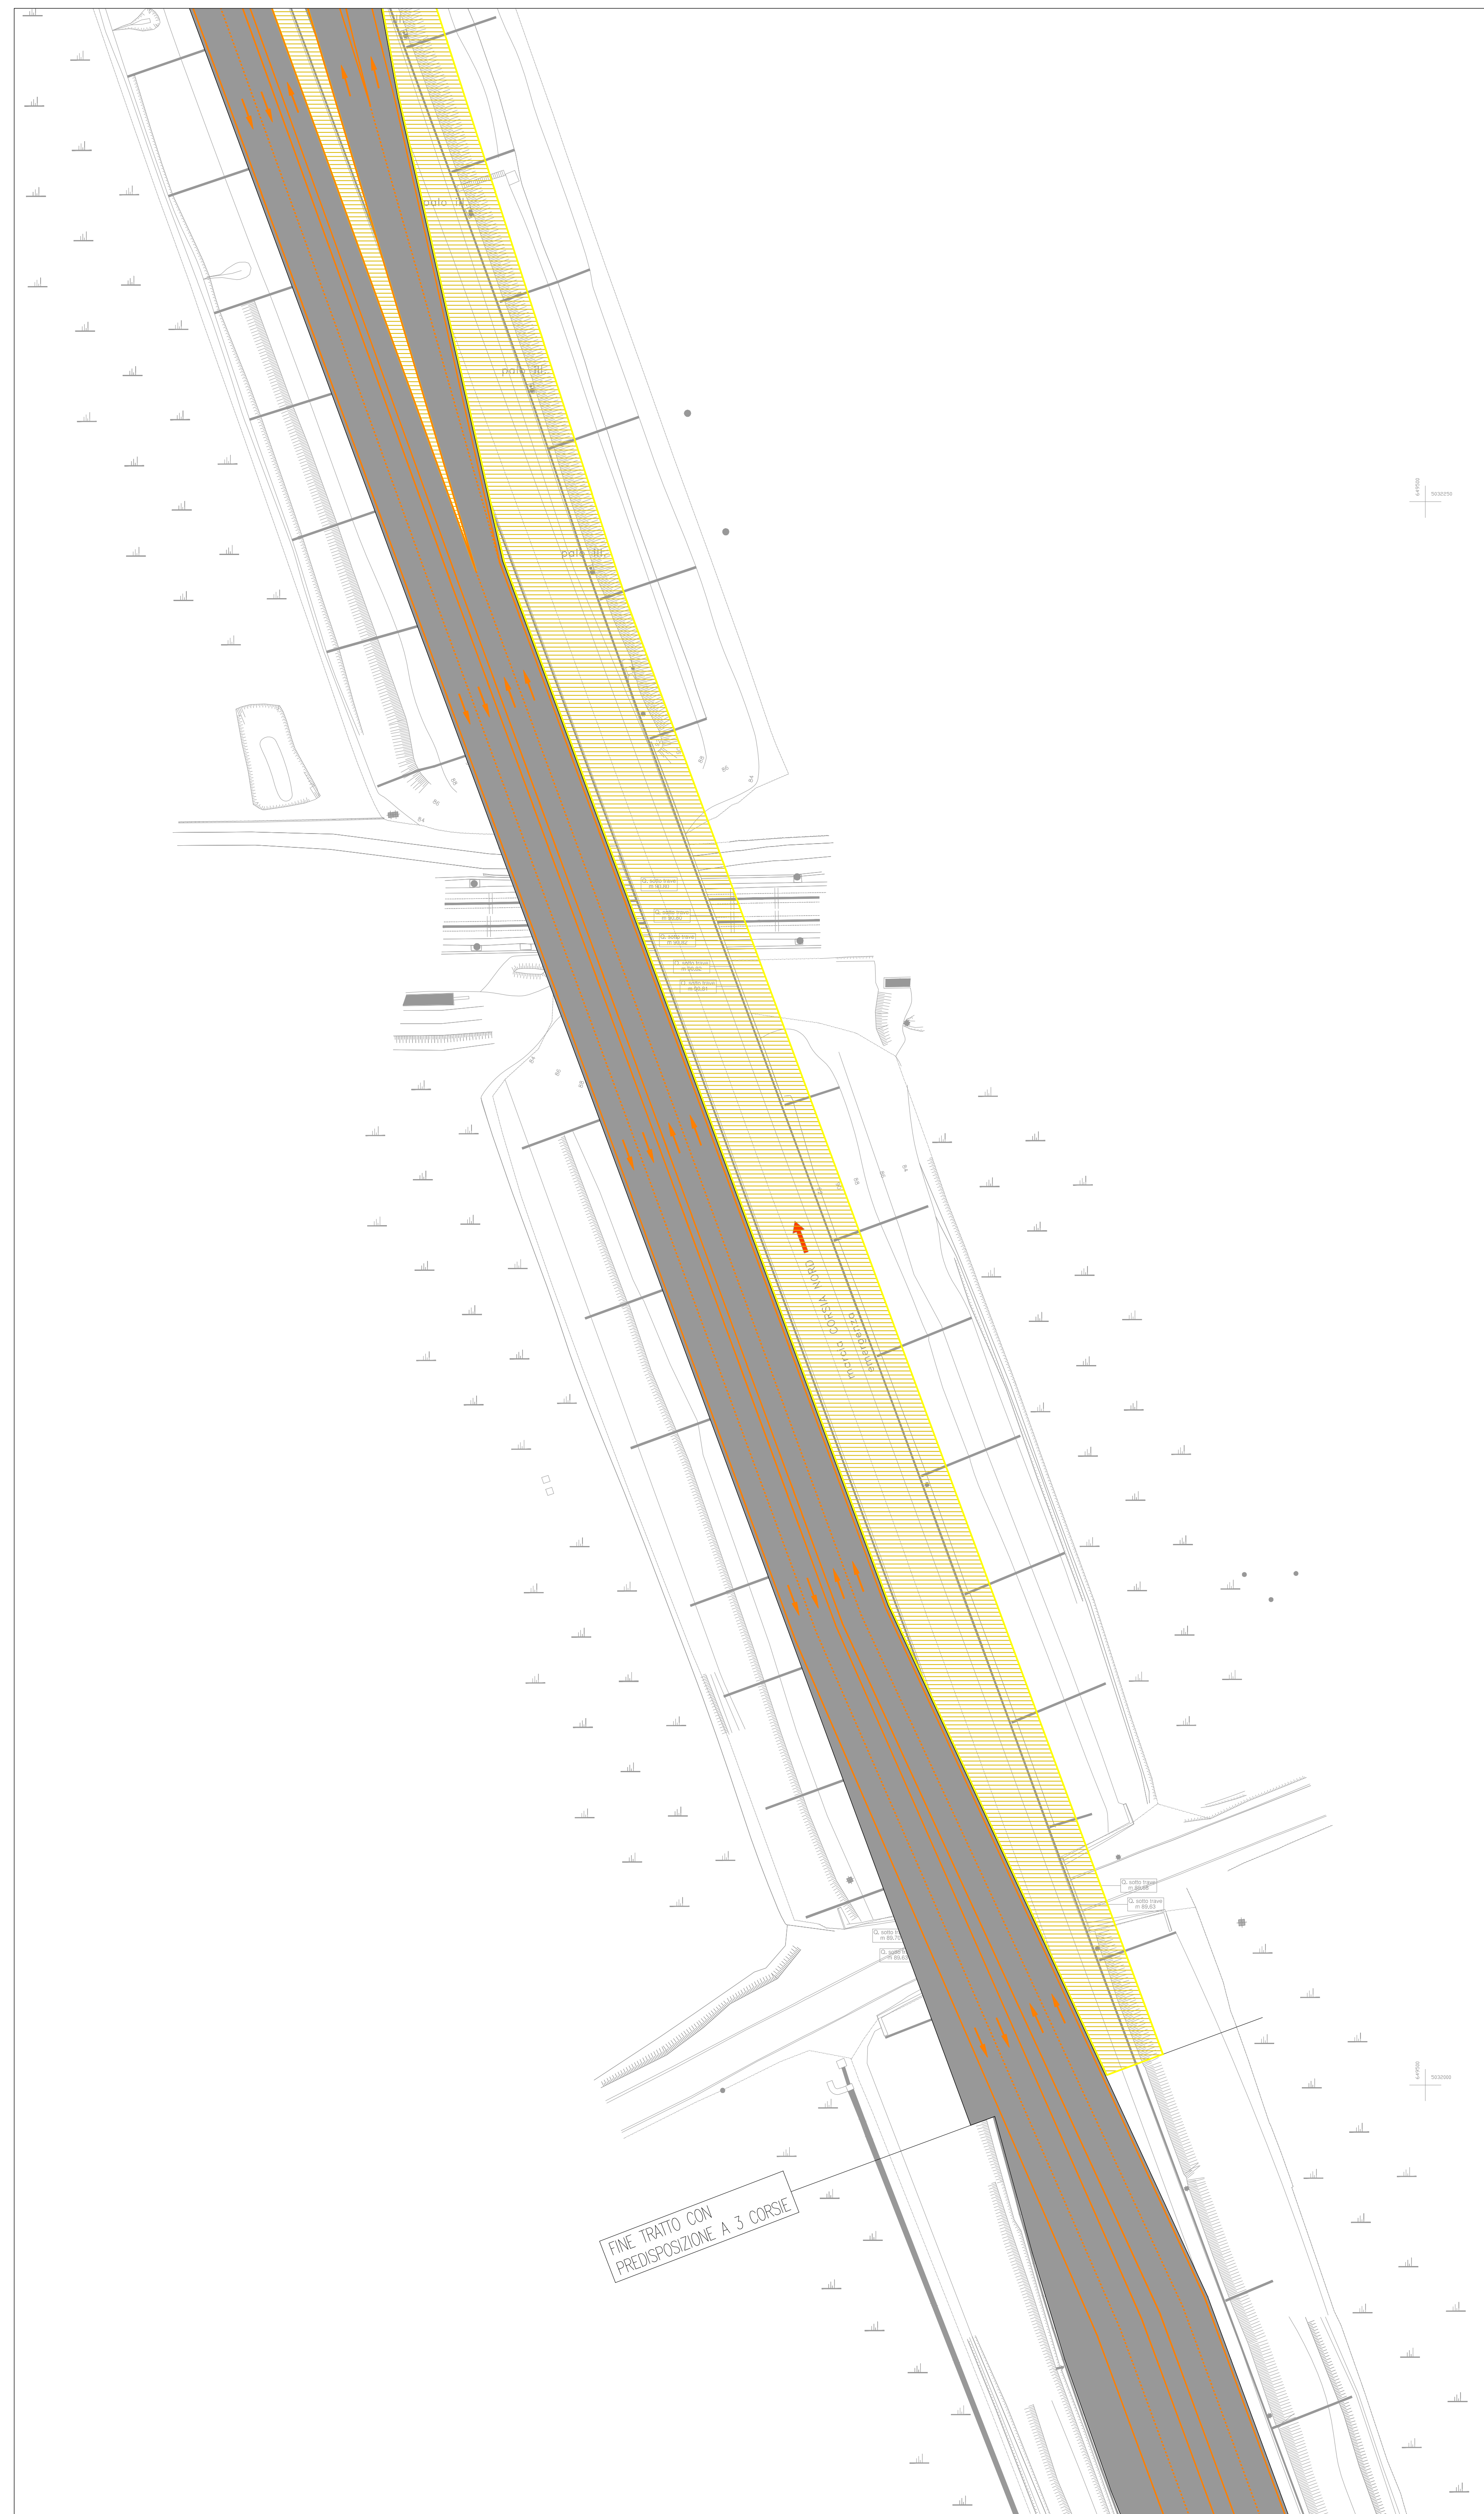


TRACCIAMENTO DEVIAZIONI - FASE 3 - QUADRO 2  
SCALA 1:500

**FASE ESECUTIVE**

- FASE 1a:** Restringimento della carreggiata Nord, occupando la corsia di emergenza per consentire la cantierizzazione. Allargamento del rilevato stradale della carreggiata Nord mediante la riprofilatura delle scarpate e l'adeguamento della piattaforma stradale alla terza corsia nel tratto di intervento. Adeguamento plano-altimetrico della rampa di uscita M0-V6 e della rampa in ingresso VR-1N.
- FASE 1b:** Restringimento della carreggiata Sud e Nord in estero carreggiata occupando la corsia di emergenza per consentire la cantierizzazione nella zona cantiere. Rimozione dello spartitraffico esistente e predisposizione del nuovo spartitraffico nel tratto di intervento.
- FASE 2:** Deviazione del traffico sulla carreggiata Nord, utilizzando le 3 corsie e la corsia di emergenza. Allargamento del rilevato stradale della carreggiata Sud mediante la riprofilatura delle scarpate e l'adeguamento della piattaforma stradale alla terza corsia nel tratto di intervento. Adeguamento plano-altimetrico della rampa di ingresso VR-M0.
- FASE 3:** Deviazione del traffico sulla carreggiata Sud, utilizzando le 3 corsie e la corsia di emergenza. Completamento delle opere di sistemazione stradale sulla carreggiata Nord.
- NOTA:** Le deviazioni del traffico, i restringimenti di corsia e i cambi di carreggiata saranno conformi a quanto previsto dal DM 10 luglio 2002 (GU n.226 del 26/09/2002 Suppl. Straordinario)

**LEGENDA**

- ALLARGAMENTO CORPO RILEVATO
- AREA DI CANTIERE
- SEGNALETICA DI CANTIERE

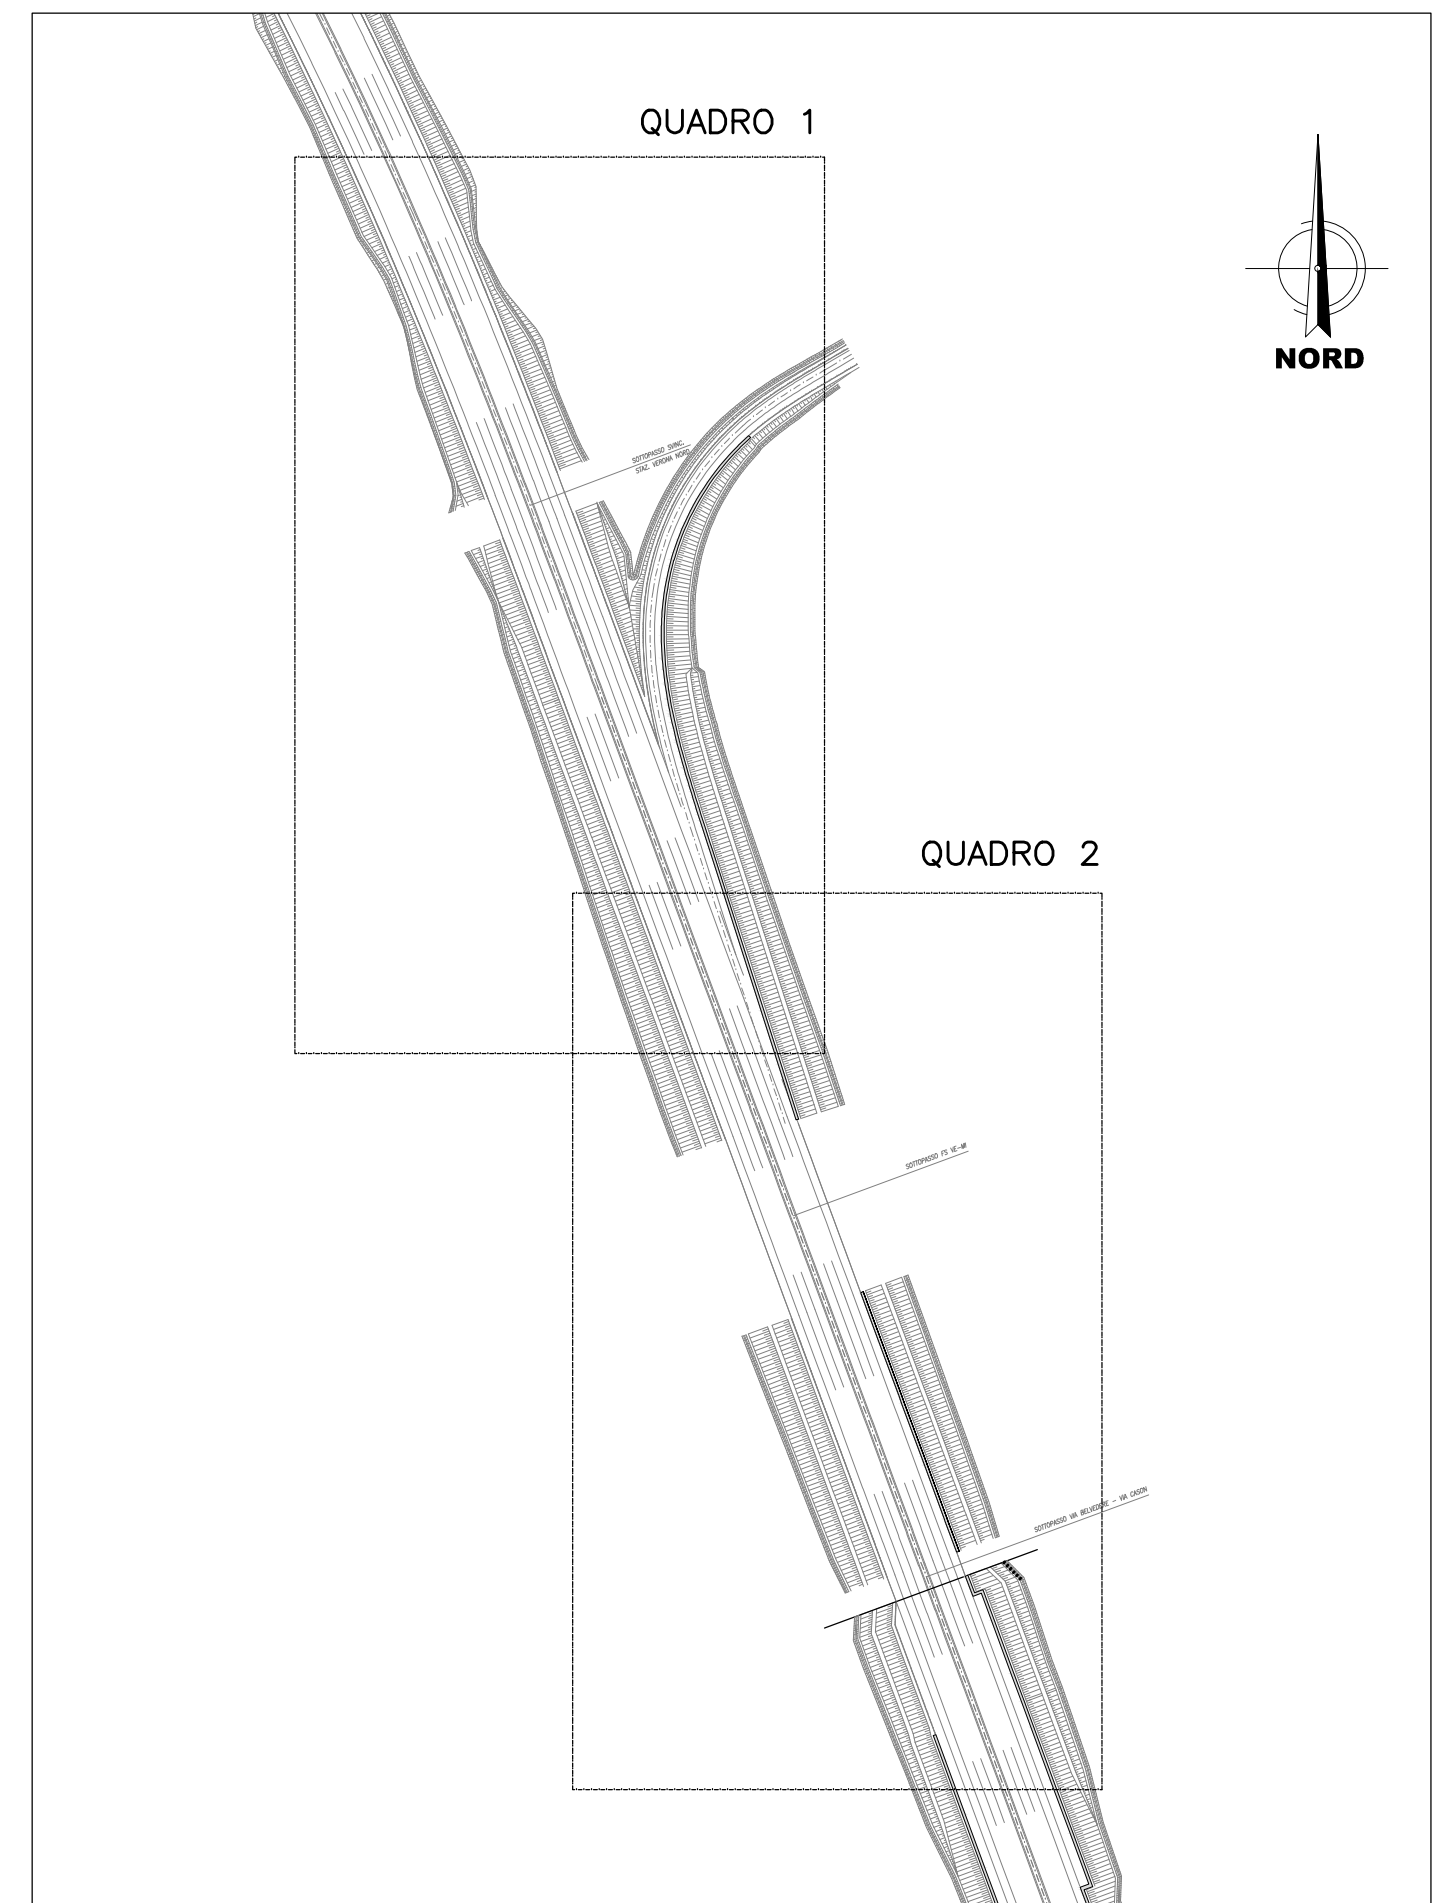

KEYPLAN

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i**

CUP: J14H2000440001

**UO PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA**

**LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC BRESCIA EST - VERONA**

**NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO OVEST**

NUOVO CAVALCAFERROVIA AUTOSTRADA DEL BRENNERO A22 PK LINEA STORICA

Planimetria di progetto e tracciamento deviazioni - Tav. 4/4

SCALA:  
1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IN10 10 D 26 P8 NV0100 010 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	F. Mastrelli	Set 2021	S. Sartoretti	Set 2021	C. Mazzocchi	Set 2021	A. Perigo Set 2021
