



Macrofase 1
Fase 1



CATANIA ➡

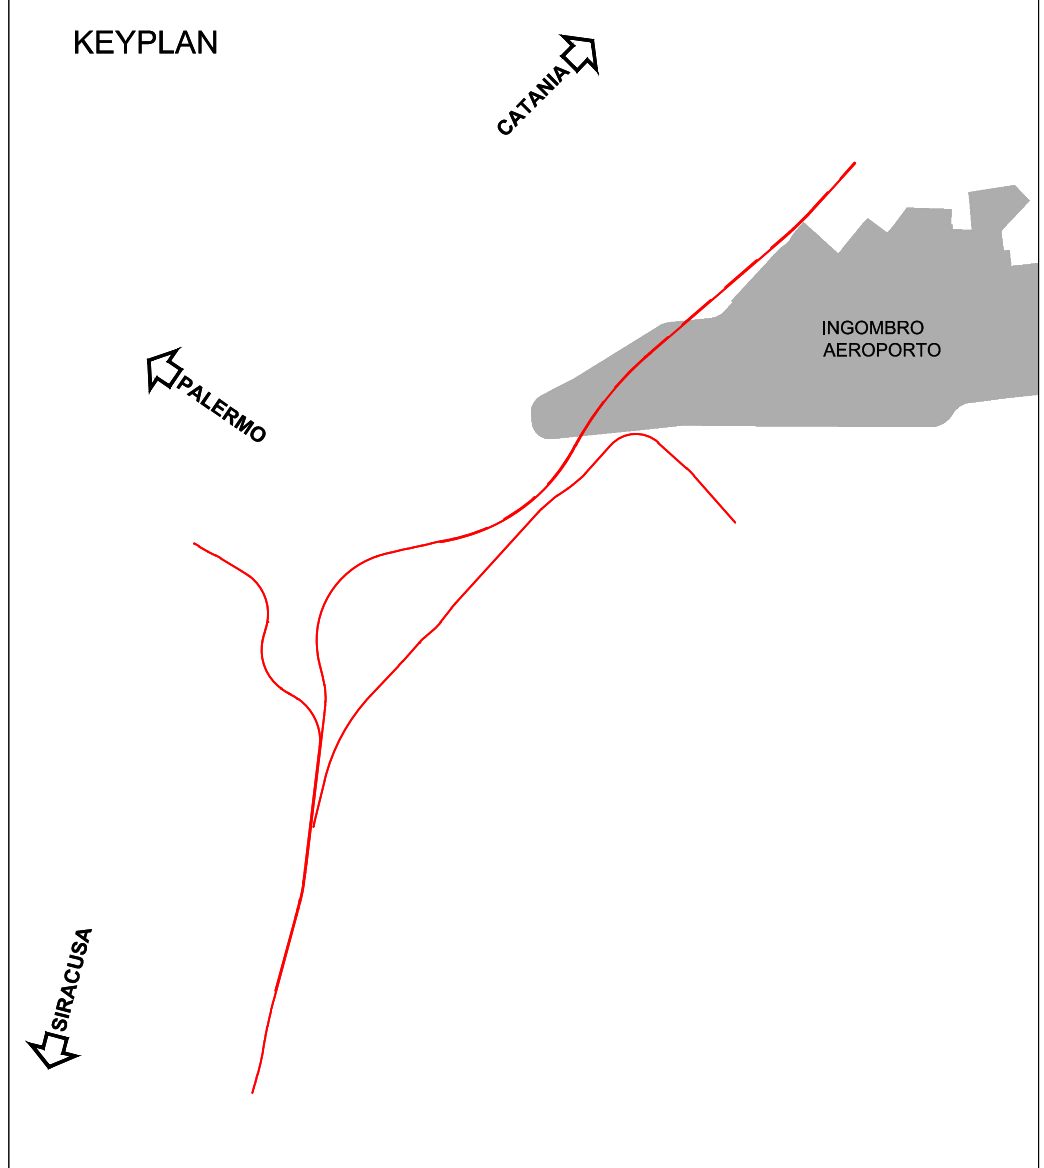

M1

Fase 01

1. Realizzazione bp e bd interrimento linea Pa_Ct.
2. Realizzazione variante linea storica CL_Sr dal ponte sul Buttaceto al sottovia della tangenziale.
3. Realizzazione binari di cantiere.
4. Realizzazione del binario di precedenza dispari della stazione di Fontanarossa e allungamento marciapiede esistente lato mare.
5. Realizzazione bretella CL_Sr.
6. Realizzazione n. 3 binari scalo A/P e 2 tronchini di sicurezza.
7. Realizzazione del binario pari e dispari del collegamento fascio A/P-Interporto Bicocca.

Il tutto realizzato fuori esercizio


M1

Fase 02

1. Realizzazione di parte del binario pari del collegamento fascio A/P-binari di cantiere.

Il tutto realizzato fuori esercizio.

Macrofase 1
Fase 2



CATANIA ➡

LEGENDA	
	Costruito nella fase corrente
	Costruito nelle fasi precedenti
	Atto di provvisori di cantiere
	Demolito nella fase corrente
	Blocca catenariale

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
NODO DI CATANIA

S.O. COORDINAMENTO TERRITORIALE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

ELABORATI GENERALI (EST E OVEST) - FASI REALIZZATIVE
Planimetria di fasi - Tav. 1/5

SCALA:
1:5000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA PROGR. REV.

RS3H 00 D 78 P5 IF0004 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	Elaborazione definitiva	L. Rossi	Marzo 2023	Dr. G. Caracciolo	Marzo 2023	Dr. G. Caracciolo	Marzo 2023	Dr. G. Caracciolo	Marzo 2023
B	Revisione per CSE	L. Rossi	Luglio 2023	Dr. G. Caracciolo	Luglio 2023	Dr. G. Caracciolo	Luglio 2023	Dr. G. Caracciolo	Luglio 2023

File: RSH.0.0.D.78.P5.IF.00.0.4.001.B

N. Ebb:
