


PLANIMETRIA OPERE DA REALIZZARSI NELLA FASE 5 DI ARMAMENTO

SCALA 1:100

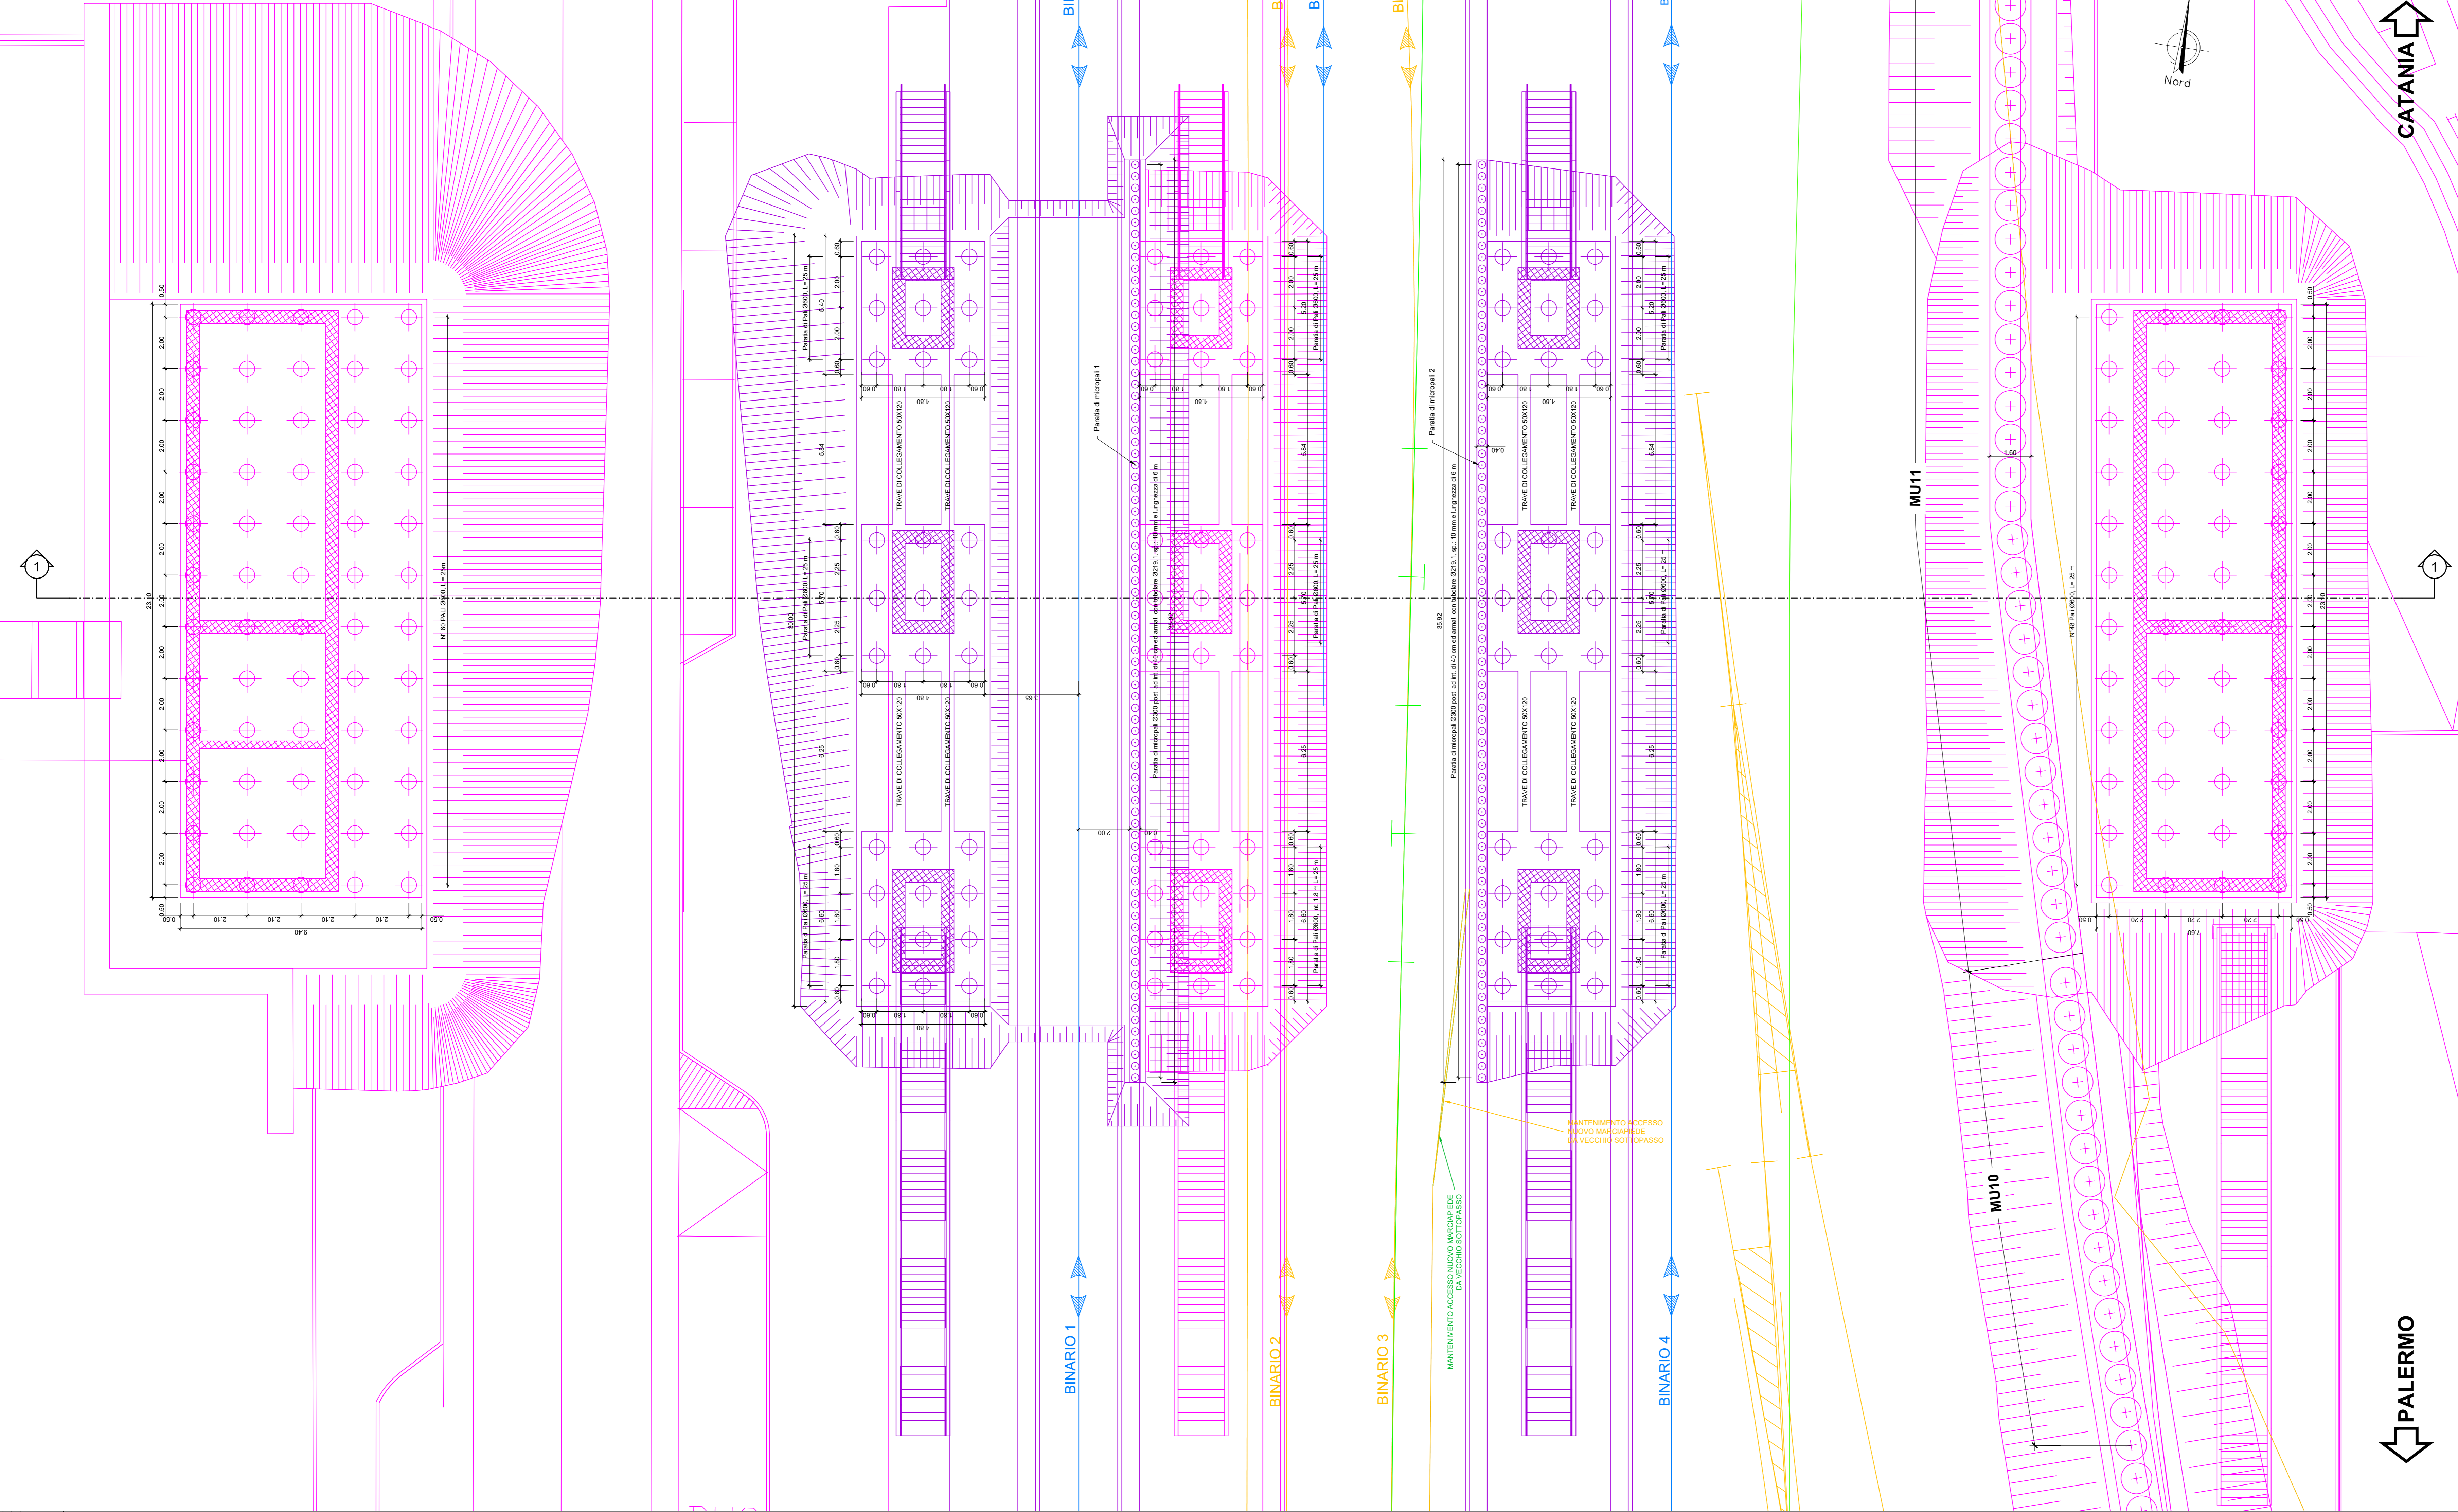

LEGENDA FASI


Binario esistente	—
Binario di progetto costruito nella fase corrente	—
Binario di progetto costruito nelle fasi precedenti	—
Binario demolito nella fase corrente	—
binario provvisorio costruito nella fase corrente	—
binario provvisorio costruito nelle fasi precedenti	—
Opere esistenti	—
Opere civili costruite nella fase corrente	—
Opere civili costruite nelle fasi precedenti	—
Opere civili demolite nella fase corrente	—

Fase C - Stazione Xirbi e allacciamenti provvisori LS FASE 5 dell'elaborato grafico "Stazione Xirbi e allacciamenti provvisori LS - Planimetria delle fasi - Tav. 5 di 10" (RS3U.4.0.D.29.PZ.FV.01.0.4.005)

- Lavorazioni**
- Allaccio provvisorio attuale 4° binario su nuovo 4° binario e attivazione deviatori nuova radice per collegamento linea storica con 1-2-3-4 binario lato CT.
 - Demolizione attuali binari di scalo se non necessari per lavorazioni di cantiere
 - Interruzione 3° binario
 - Allaccio provvisorio attuale 3° bin su nuovo 3° binario;
 - Interruzione 2° bin.
 - Demolizione 2° bin. e binari di collegamento con linea Storica lato PA e AG
 - Realizzazione plinti e dei corpi scala in c.a. della stazione interposti tra il 1° e il 2° binario
 - Costruzione nuovo 2° marciapiede
 - Costruzione 2° bin. fino interferenza con 3° bin. attuale
 - Completamento Rampe accesso nuovo sovrappasso e nuclei ascensori, dopo aver realizzato le paratie di pali MU10, MU11 e MU27 per il cui dettaglio si rimanda agli elaborati:
 - *TR01: Opere di sostegno MU10 - Pianta, prospetto e sezioni" (RS3U.4.0.D.29.P9.MU.10.0.0.001)
 - *TR01: Opere di sostegno MU11 - Pianta, prospetto e sezioni" (RS3U.4.0.D.29.P9.MU.11.0.0.001 - RS3U.4.0.D.29.P9.MU.11.0.0.002)
 - *TR01: Paratie di pali MU27 - Pianta, prospetto e sezioni" (RS3U.4.0.D.29.P9.MU.27.0.0.001)

SEZIONE 1-1 FASE 5

SCALA 1:100

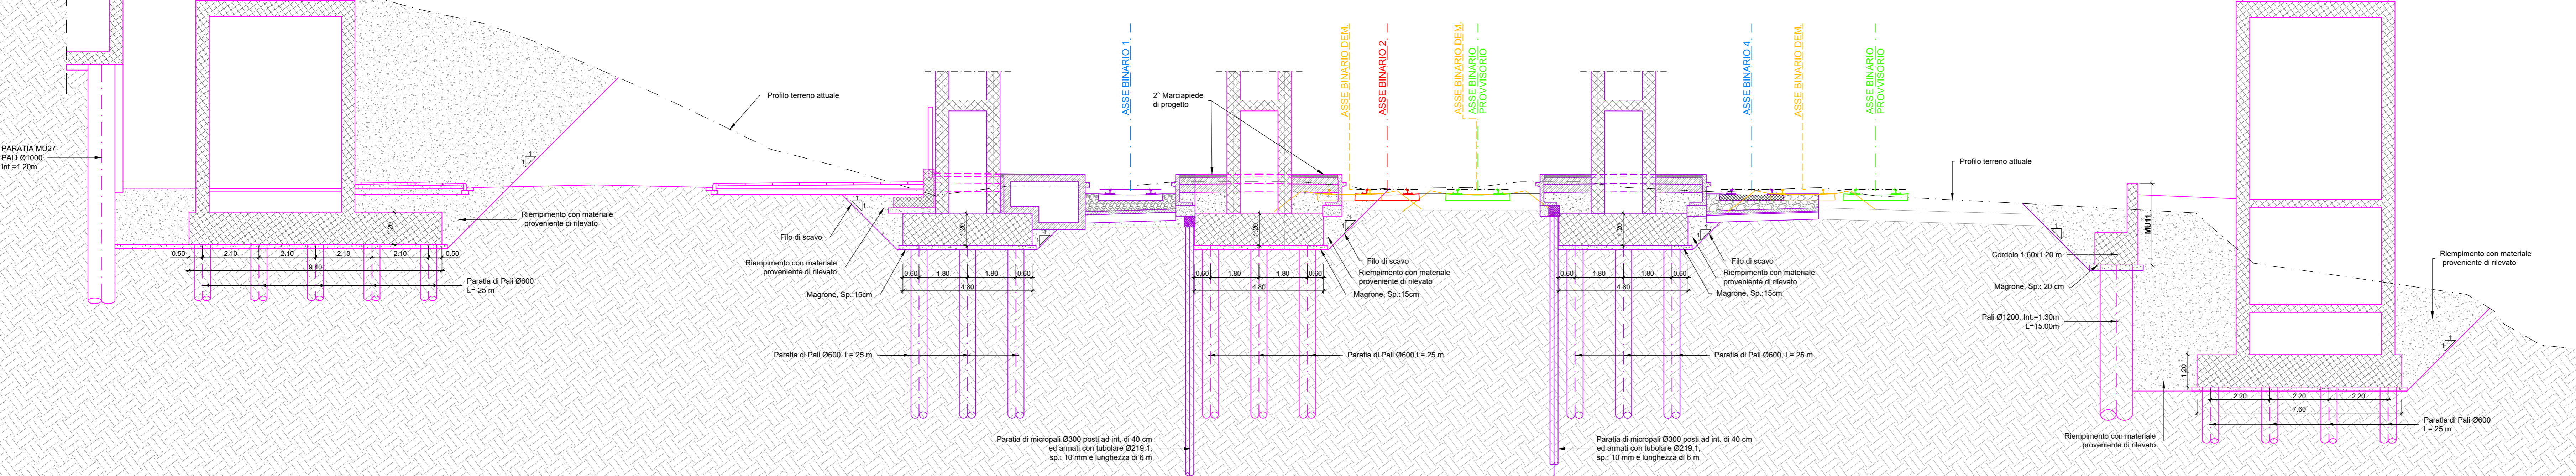

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)

STAZIONI E FERMATE
STAZIONE CALTANISSETTA XIRBI
Planimetria scavi e opere provvisorie per nuclei in c.a. - Tav. 3

SCALA: varie

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva - vgg. per VACOB	...	Lug-2021	...	Lug-2021	...	Lug-2021	Lug-2021

File: RS3U.4.0.D.29.PZ.FV.01.0.0.004.A n. Elab.: 29_698_3
