





Fase 1

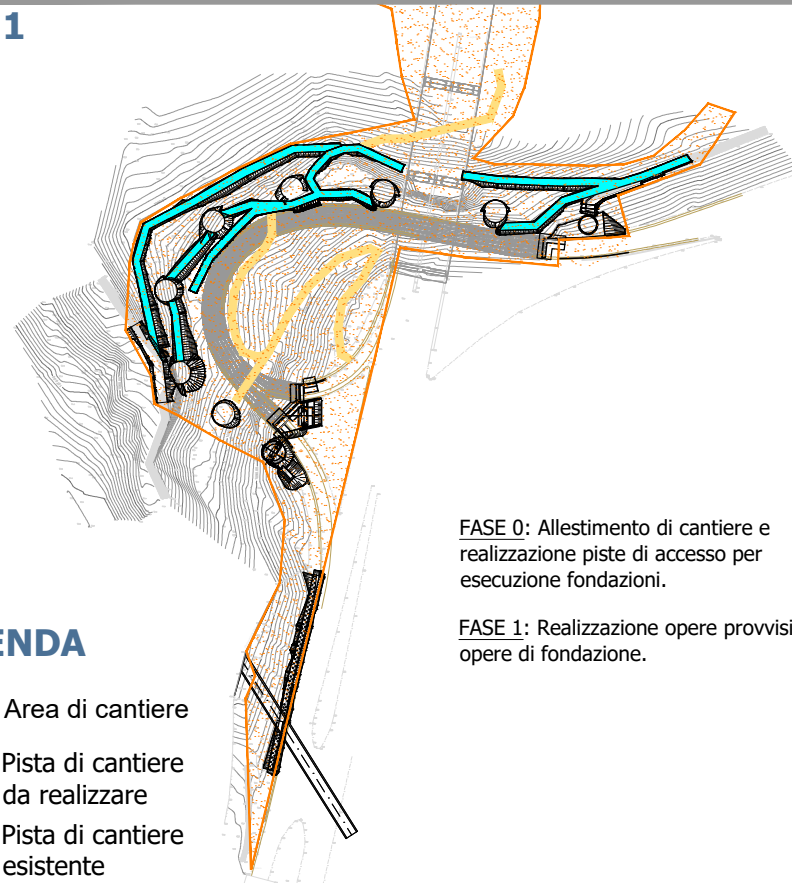

FASE 0: Allestimento di cantiere e realizzazione piste di accesso per esecuzione fondazioni.


FASE 1: Realizzazione opere provvisionali e opere di fondazione.

LEGENDA

-  Area di cantiere
-  Pista di cantiere da realizzare
-  Pista di cantiere esistente



Fase 2

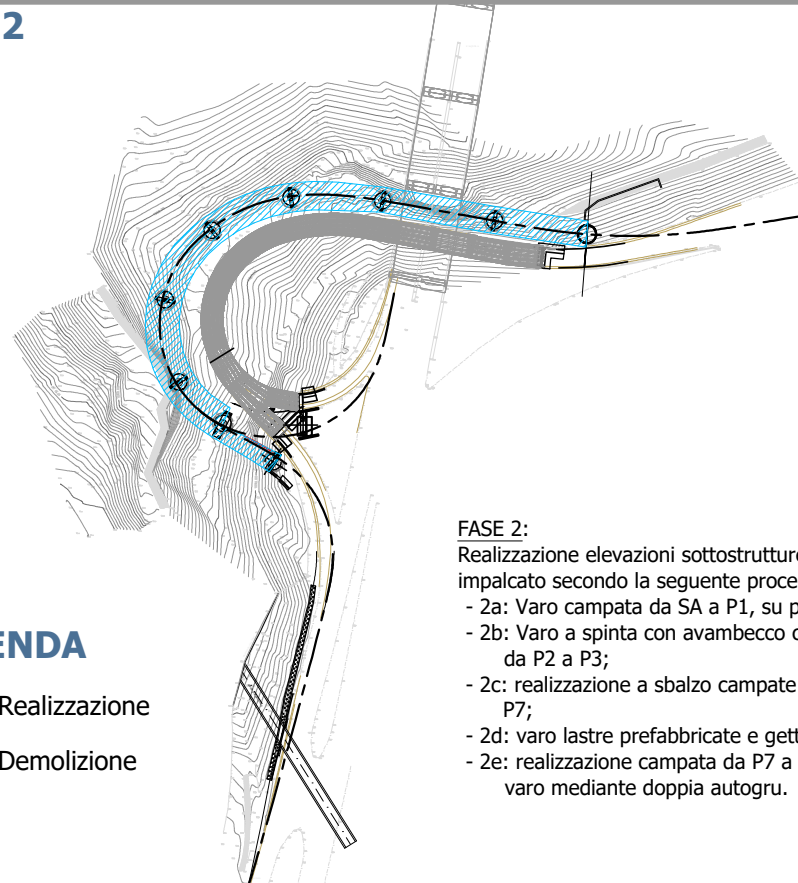


FASE 2:
Realizzazione elevazioni sottostrutture ed impalcato secondo la seguente procedura:
- 2a: Varo campata da SA a P1, su puntelli;
- 2b: Varo a spinta con avambecco campata da P2 a P3;
- 2c: realizzazione a sbalzo campate da P3 a P7;
- 2d: varo lastre prefabbricate e getto soletta;
- 2e: realizzazione campata da P7 a SC con varo mediante doppia autogru.

LEGENDA

-  Realizzazione
-  Demolizione

Fase 3

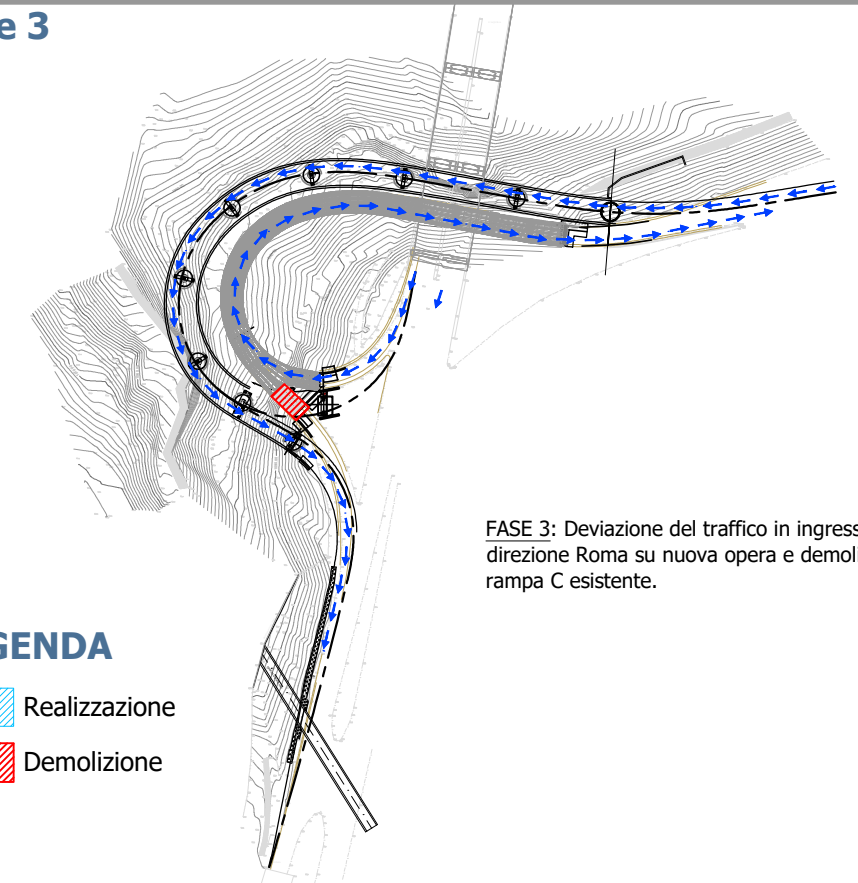


FASE 3: Deviazione del traffico in ingresso direzione Roma su nuova opera e demolizione rampa C esistente.

LEGENDA

-  Realizzazione
-  Demolizione

Fase 4

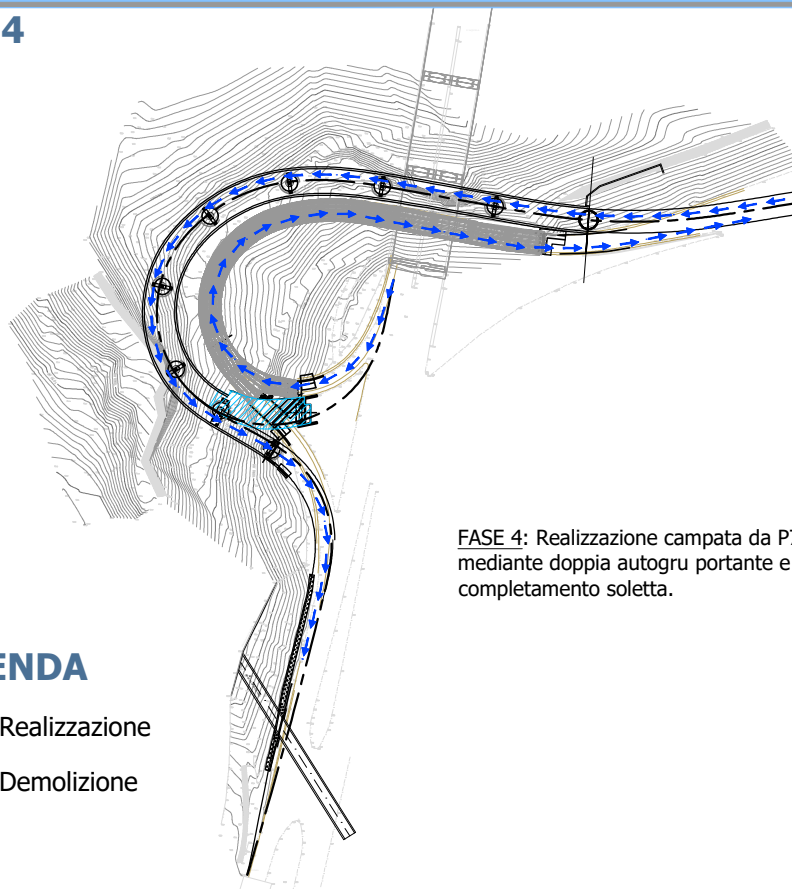


FASE 4: Realizzazione campata da P7 a SB mediante doppia autogru portante e completamento soletta.

LEGENDA

-  Realizzazione
-  Demolizione

Fase 5

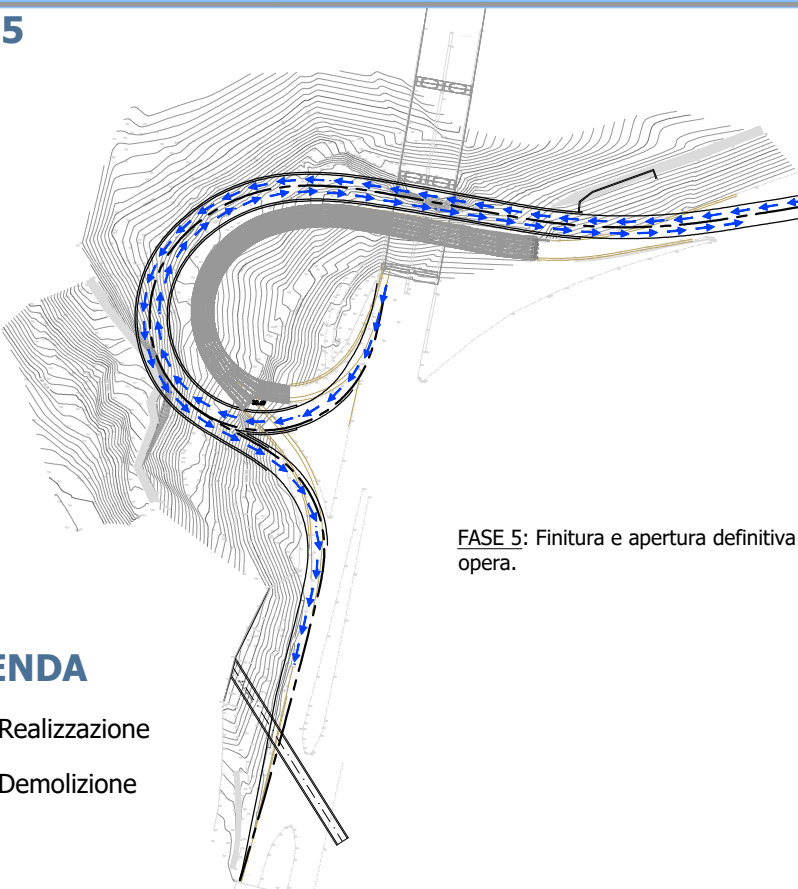


FASE 5: Finitura e apertura definitiva nuova opera.

LEGENDA

-  Realizzazione
-  Demolizione

Fase 6

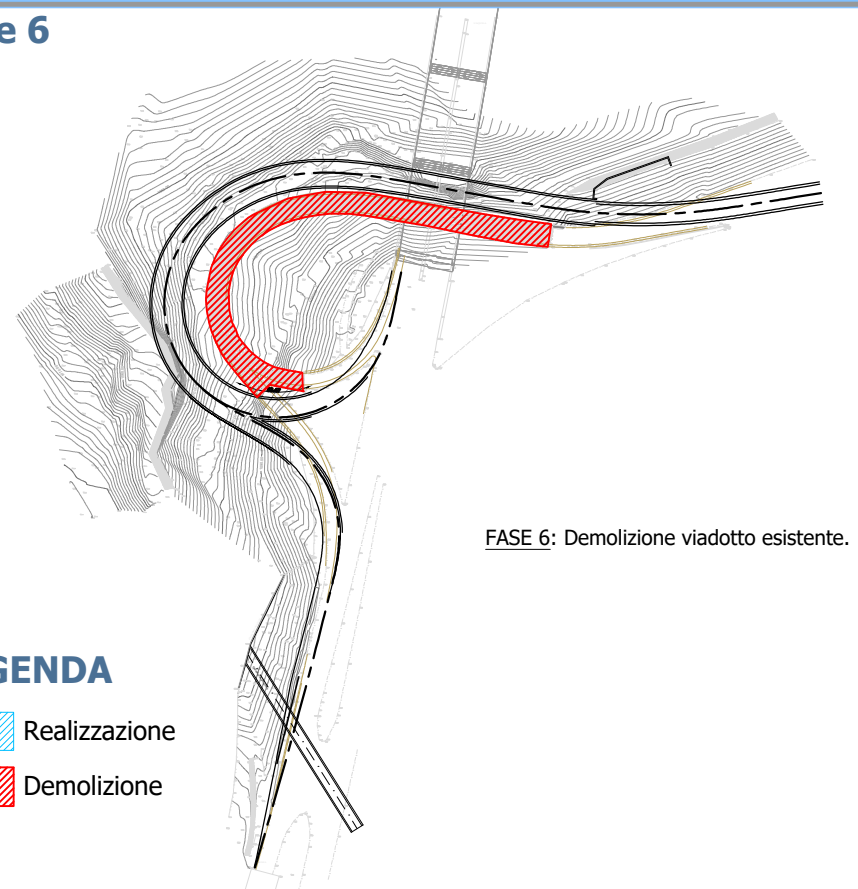

FASE 6: Demolizione viadotto esistente.

LEGENDA

-  Realizzazione
-  Demolizione
