

HUB PORTUALE ravenna



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro settentrionale



APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA,
ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI,
NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E
RIUTILIZZO MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE
AL P.R.P VIGENTE 2007 - I FASE - PORTO DI RAVENNA

PROGETTO ESECUTIVO

oggetto BANCHINE
BANCHINA N - NUOVO TERMINAL CONTAINER
CRONOPROGRAMMA - BANCHINA "N2"

file
1114-E-BAN-ETE-CR-21-1.mpp

codice
1114-E-BAN-ETE-CR-21-1

scala
-

Revisione	data	causale	redatto	verificato	approvato
0	28/07/2021	Emissione per approvazione	L. Masiero	L. Masiero	T. Tassi
1	06/12/2021	Revisione per riscontro validazione	L. Masiero	L. Masiero	T. Tassi

responsabile delle Integrazioni Specialistiche: **Ing. Lucia de Angelis**

responsabile del Procedimento: **Ing. Matteo Graziani**

committente



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale
Via Antico Squero, 31
48122 Ravenna

contraente generale



Consorzio Stabile Grandi Lavori Srl
Piazza del Popolo 18
00187 Roma



DEME - Dredging International NV
Haven 1025 - Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht - Belgium

progettisti



Technital S.p.A.
Via Carlo Cattaneo, 20
37121 Verona

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Filippo Busola



F&M Ingegneria SpA
Via Belvedere 8/10
30035 Mirano (VE)

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Tommaso Tassi



SISPI srl
Via Filangieri 11
80121 Napoli

Direttore Tecnico
Dott. Ing. Marco Di Stefano

PROGETTO ESECUTIVO

BANCHINE


Cronoprogramma – Banchina “N2”

6 dicembre 2021

SOMMARIO

1	CRONOPROGRAMMA	3
---	-----------------------------	----------

1 CRONOPROGRAMMA

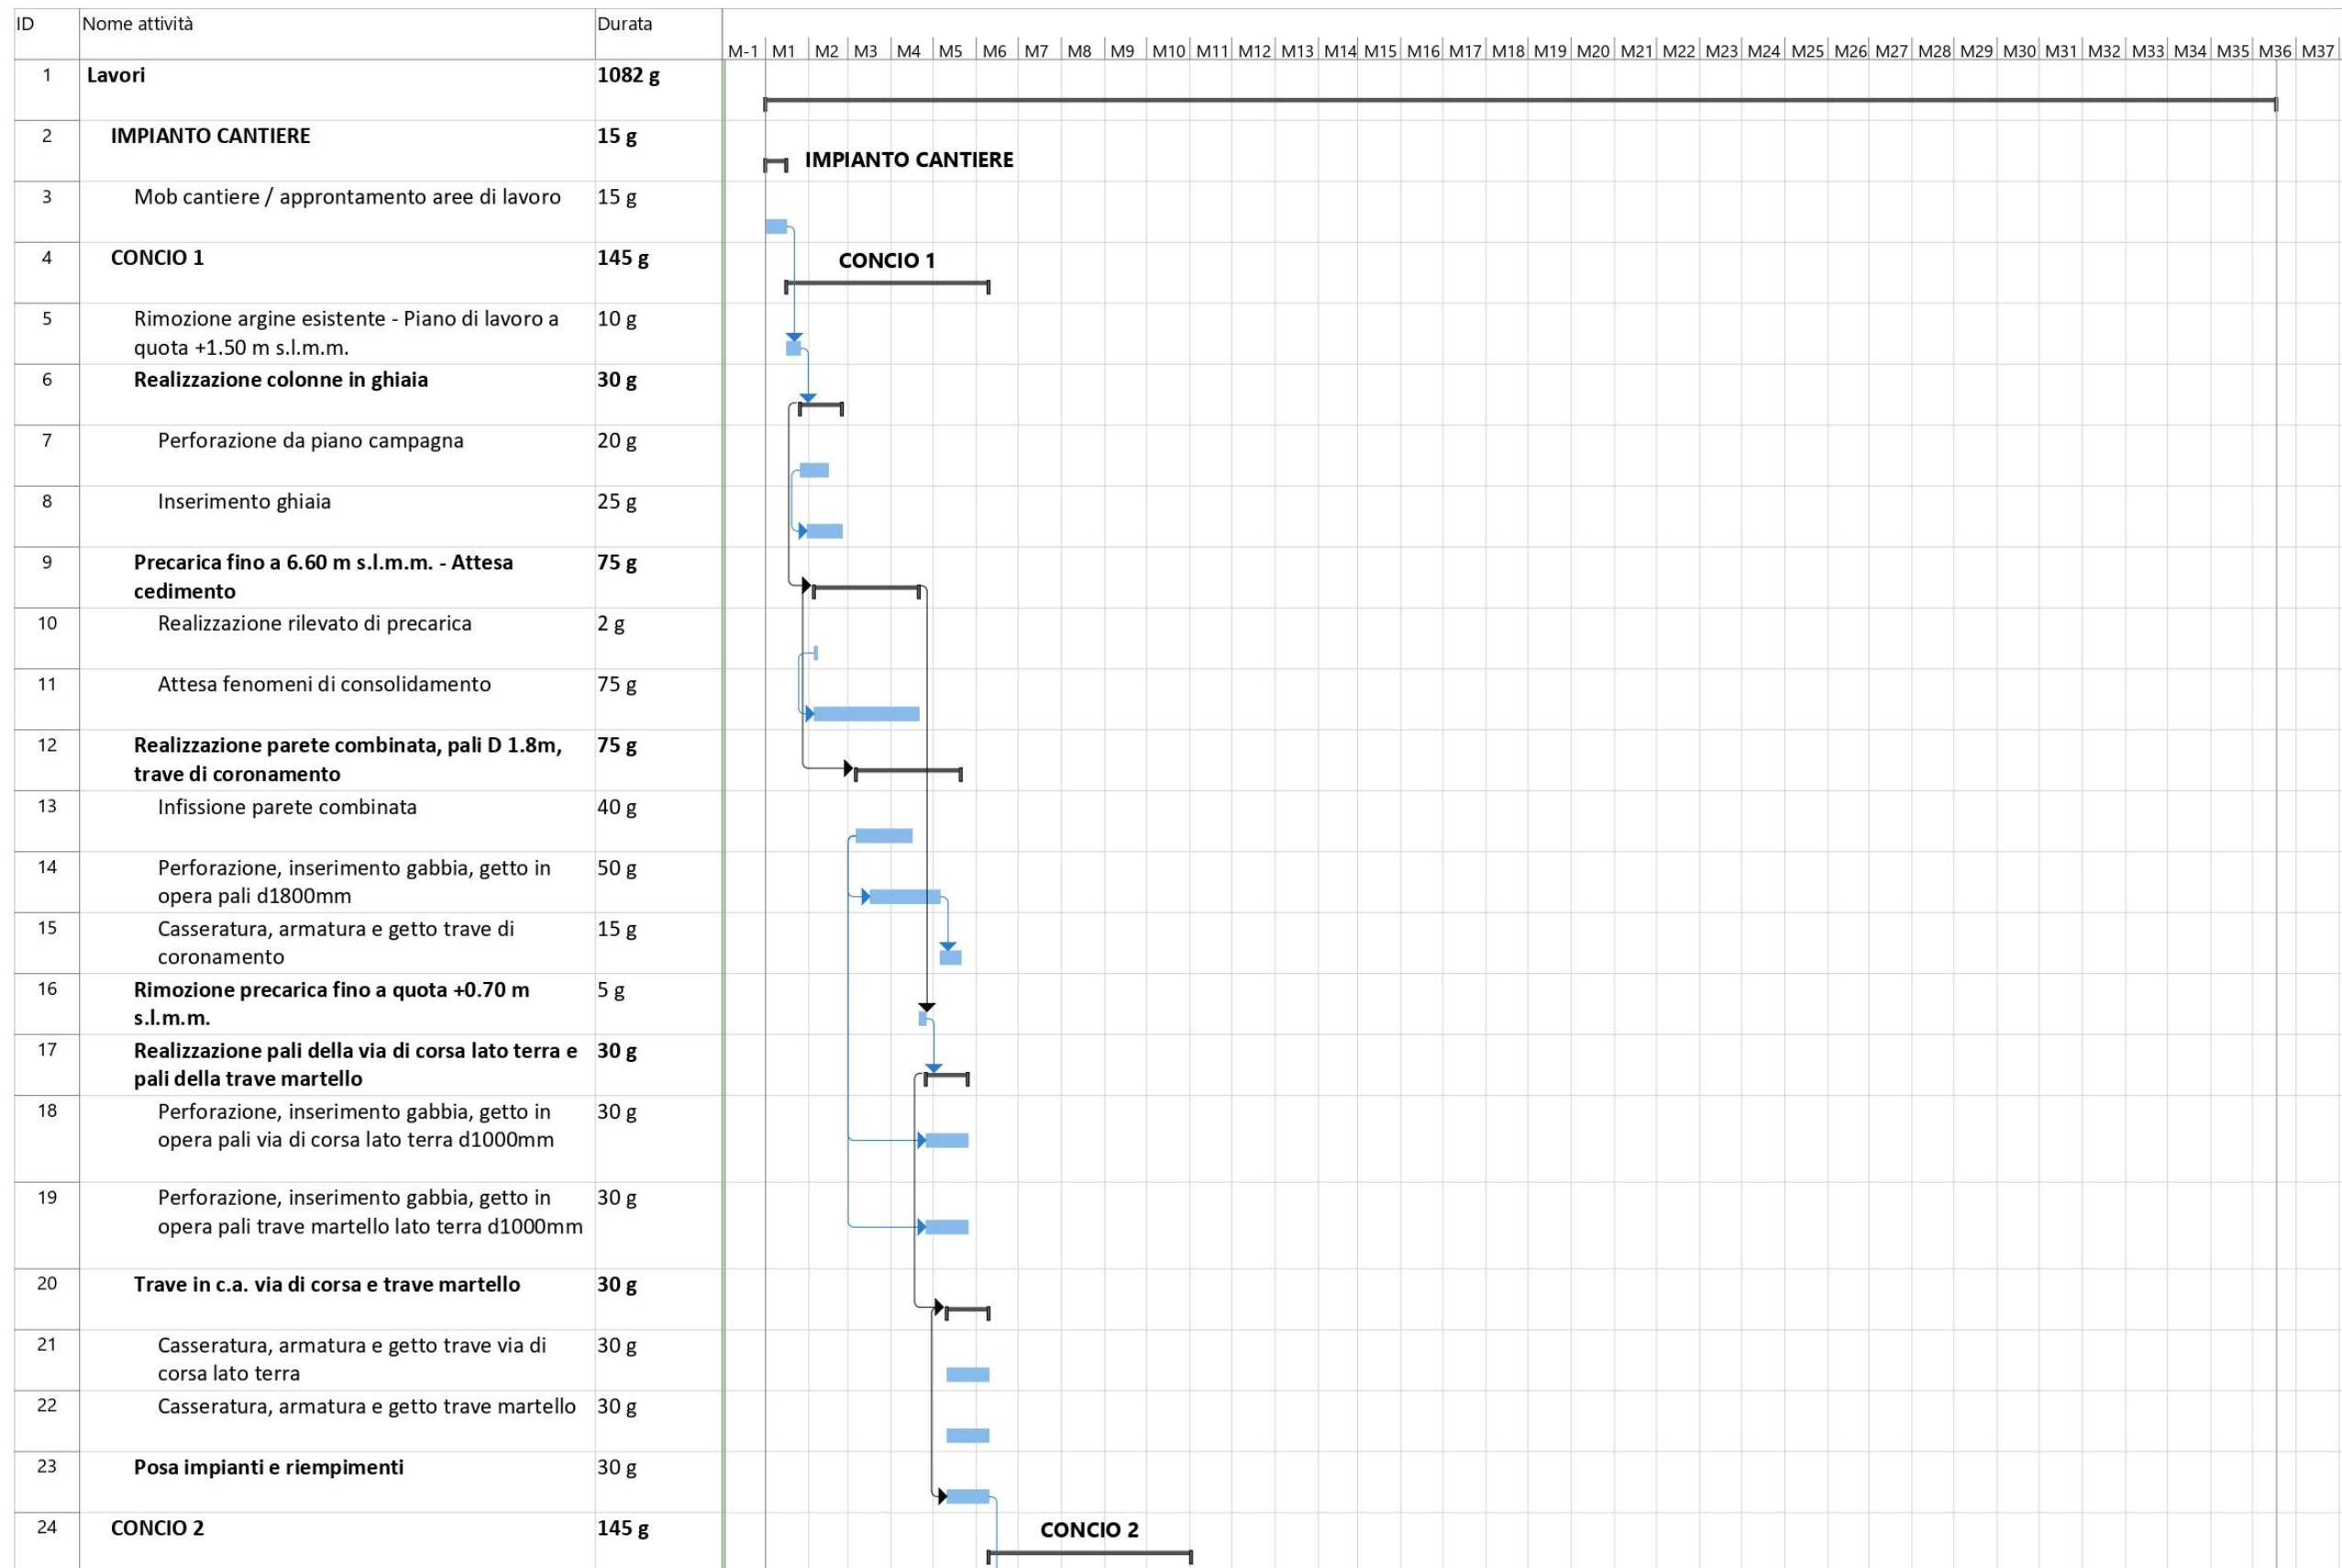

ID	Nome attività	Durata																																																				
			M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37														
121	Casseratura, armatura e getto trave via di corsa lato terra	30 g																																																				
122	Casseratura, armatura e getto trave martello	30 g																																																				
123	Posa impianti e riempiamenti	30 g																																																				
124	CONCIO 7	145 g																																																				
125	Rimozione argine esistente - Piano di lavoro a quota +1.50 m s.l.m.m.	10 g																																																				
126	Realizzazione colonne in ghiaia	30 g																																																				
127	Perforazione da piano campagna	20 g																																																				
128	Inserimento ghiaia	25 g																																																				
129	Precarica fino a 6.60 m s.l.m.m. - Attesa cedimento	75 g																																																				
130	Realizzazione rilevato di precarica	2 g																																																				
131	Attesa fenomeni di consolidamento	75 g																																																				
132	Realizzazione parete combinata, pali D 1.8m, trave di coronamento	75 g																																																				
133	Infissione parete combinata	40 g																																																				
134	Perforazione, inserimento gabbia, getto in opera pali d1800mm	50 g																																																				
135	Casseratura, armatura e getto trave di coronamento	15 g																																																				
136	Rimozione precarica fino a quota +0.70 m s.l.m.m.	5 g																																																				
137	Realizzazione pali della via di corsa lato terra e pali della trave martello	30 g																																																				
138	Perforazione, inserimento gabbia, getto in opera pali via di corsa lato terra d1000mm	30 g																																																				
139	Perforazione, inserimento gabbia, getto in opera pali trave martello lato terra d1000mm	30 g																																																				
140	Trave in c.a. via di corsa e trave martello	30 g																																																				
141	Casseratura, armatura e getto trave via di corsa lato terra	30 g																																																				
142	Casseratura, armatura e getto trave martello	30 g																																																				
143	Posa impianti e riempiamenti	30 g																																																				
144	FINITURE	52 g																																																				

