


SEZIONE A-A

SCALA 1:100

SEZIONE TRASVERSALE TRATTO DI INNESTO - SOTTOPASSAGGIO

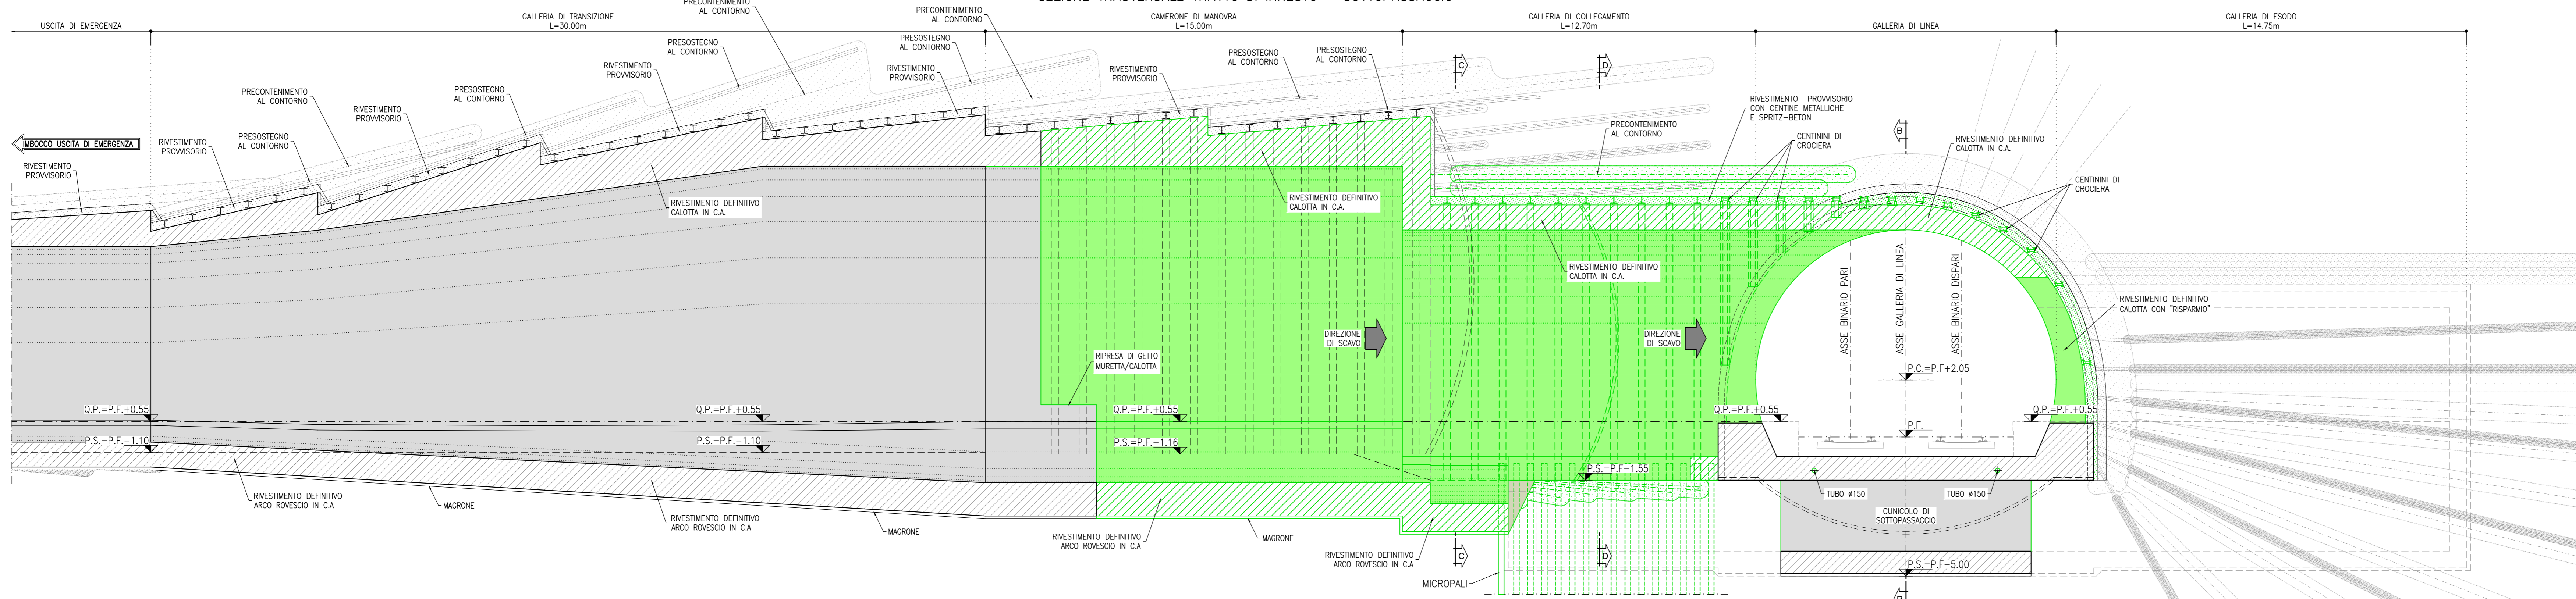


FASE 4

- INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO PER LO SCAVO DI AVANZAMENTO DELLA GALLERIA NATURALE DI COLLEGAMENTO E COMPLETAMENTO GETTO DEI RIVESTIMENTI DEFINITIVI DEL CAMERONE DI MANOVRA
- INSTALLAZIONE CENTININI DI CROCIERA
- SCAVO DI AVANZAMENTO IN TRAZIONALE DELLA GALLERIA NATURALE DI COLLEGAMENTO LATO BINARIO PARI
- REALIZZAZIONE MICROPALI AL CONTOURNO DEL FUTURO SOTTOPASSAGGIO
- NELLE ZONE TERMINALI DELLA GALLERIA DI COLLEGAMENTO, SCAVO DI RIBASSO PER ARCO ROVESCIO E GETTO RIVESTIMENTO DEFINITIVO
- REALIZZAZIONE MURETTE GALLERIA NATURALE DI COLLEGAMENTO COLLEGANDOLE ALLE MURETTE DELLA ZONA CENTRALE GIA REALIZZATE
- REALIZZAZIONE DEI RIVESTIMENTI DEFINITIVI DI CALOTTA NELLA ZONA DI INNESTO CON RISPARMIO VERSO LA FUTURA GALLERIA DI ESODO LATO BINARIO DISPARI

PIANTA

SCALA 1:100

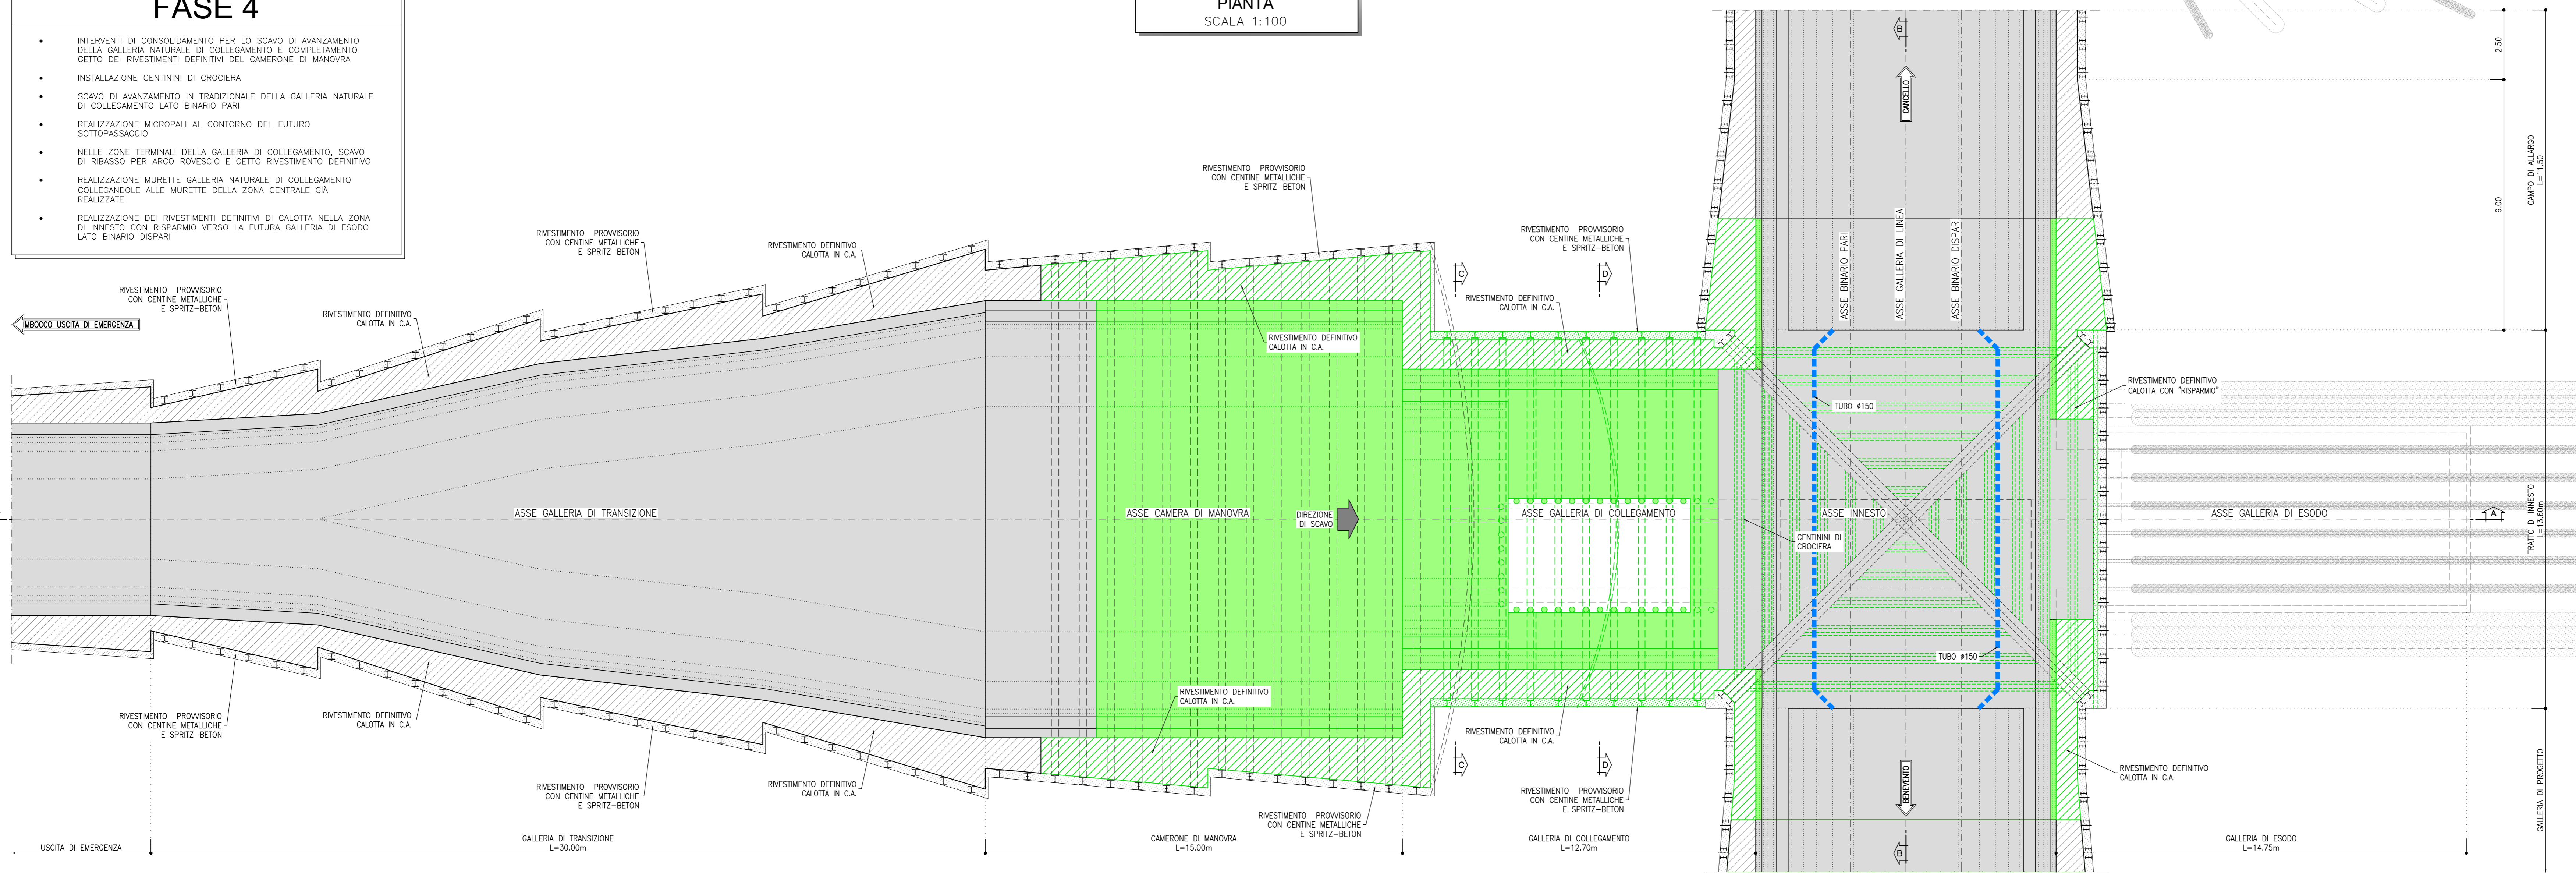

**LEGENDA**

- P.C. = PIANO DEI CENTRI
- P.F. = PIANO DEL FERRO
- Q.P. = QUOTA PROGETTO
- SCAVO
- OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE


**NOTE**

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI
- PER LE GEOMETRIE DEGLI SCAVI, DEI CONSOLIDAMENTI E DELLE CARPENTERIE SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIFICI

SEZIONE B-B

SCALA 1:100


PROFILO LONGITUDINALE GALLERIA DI LINEA

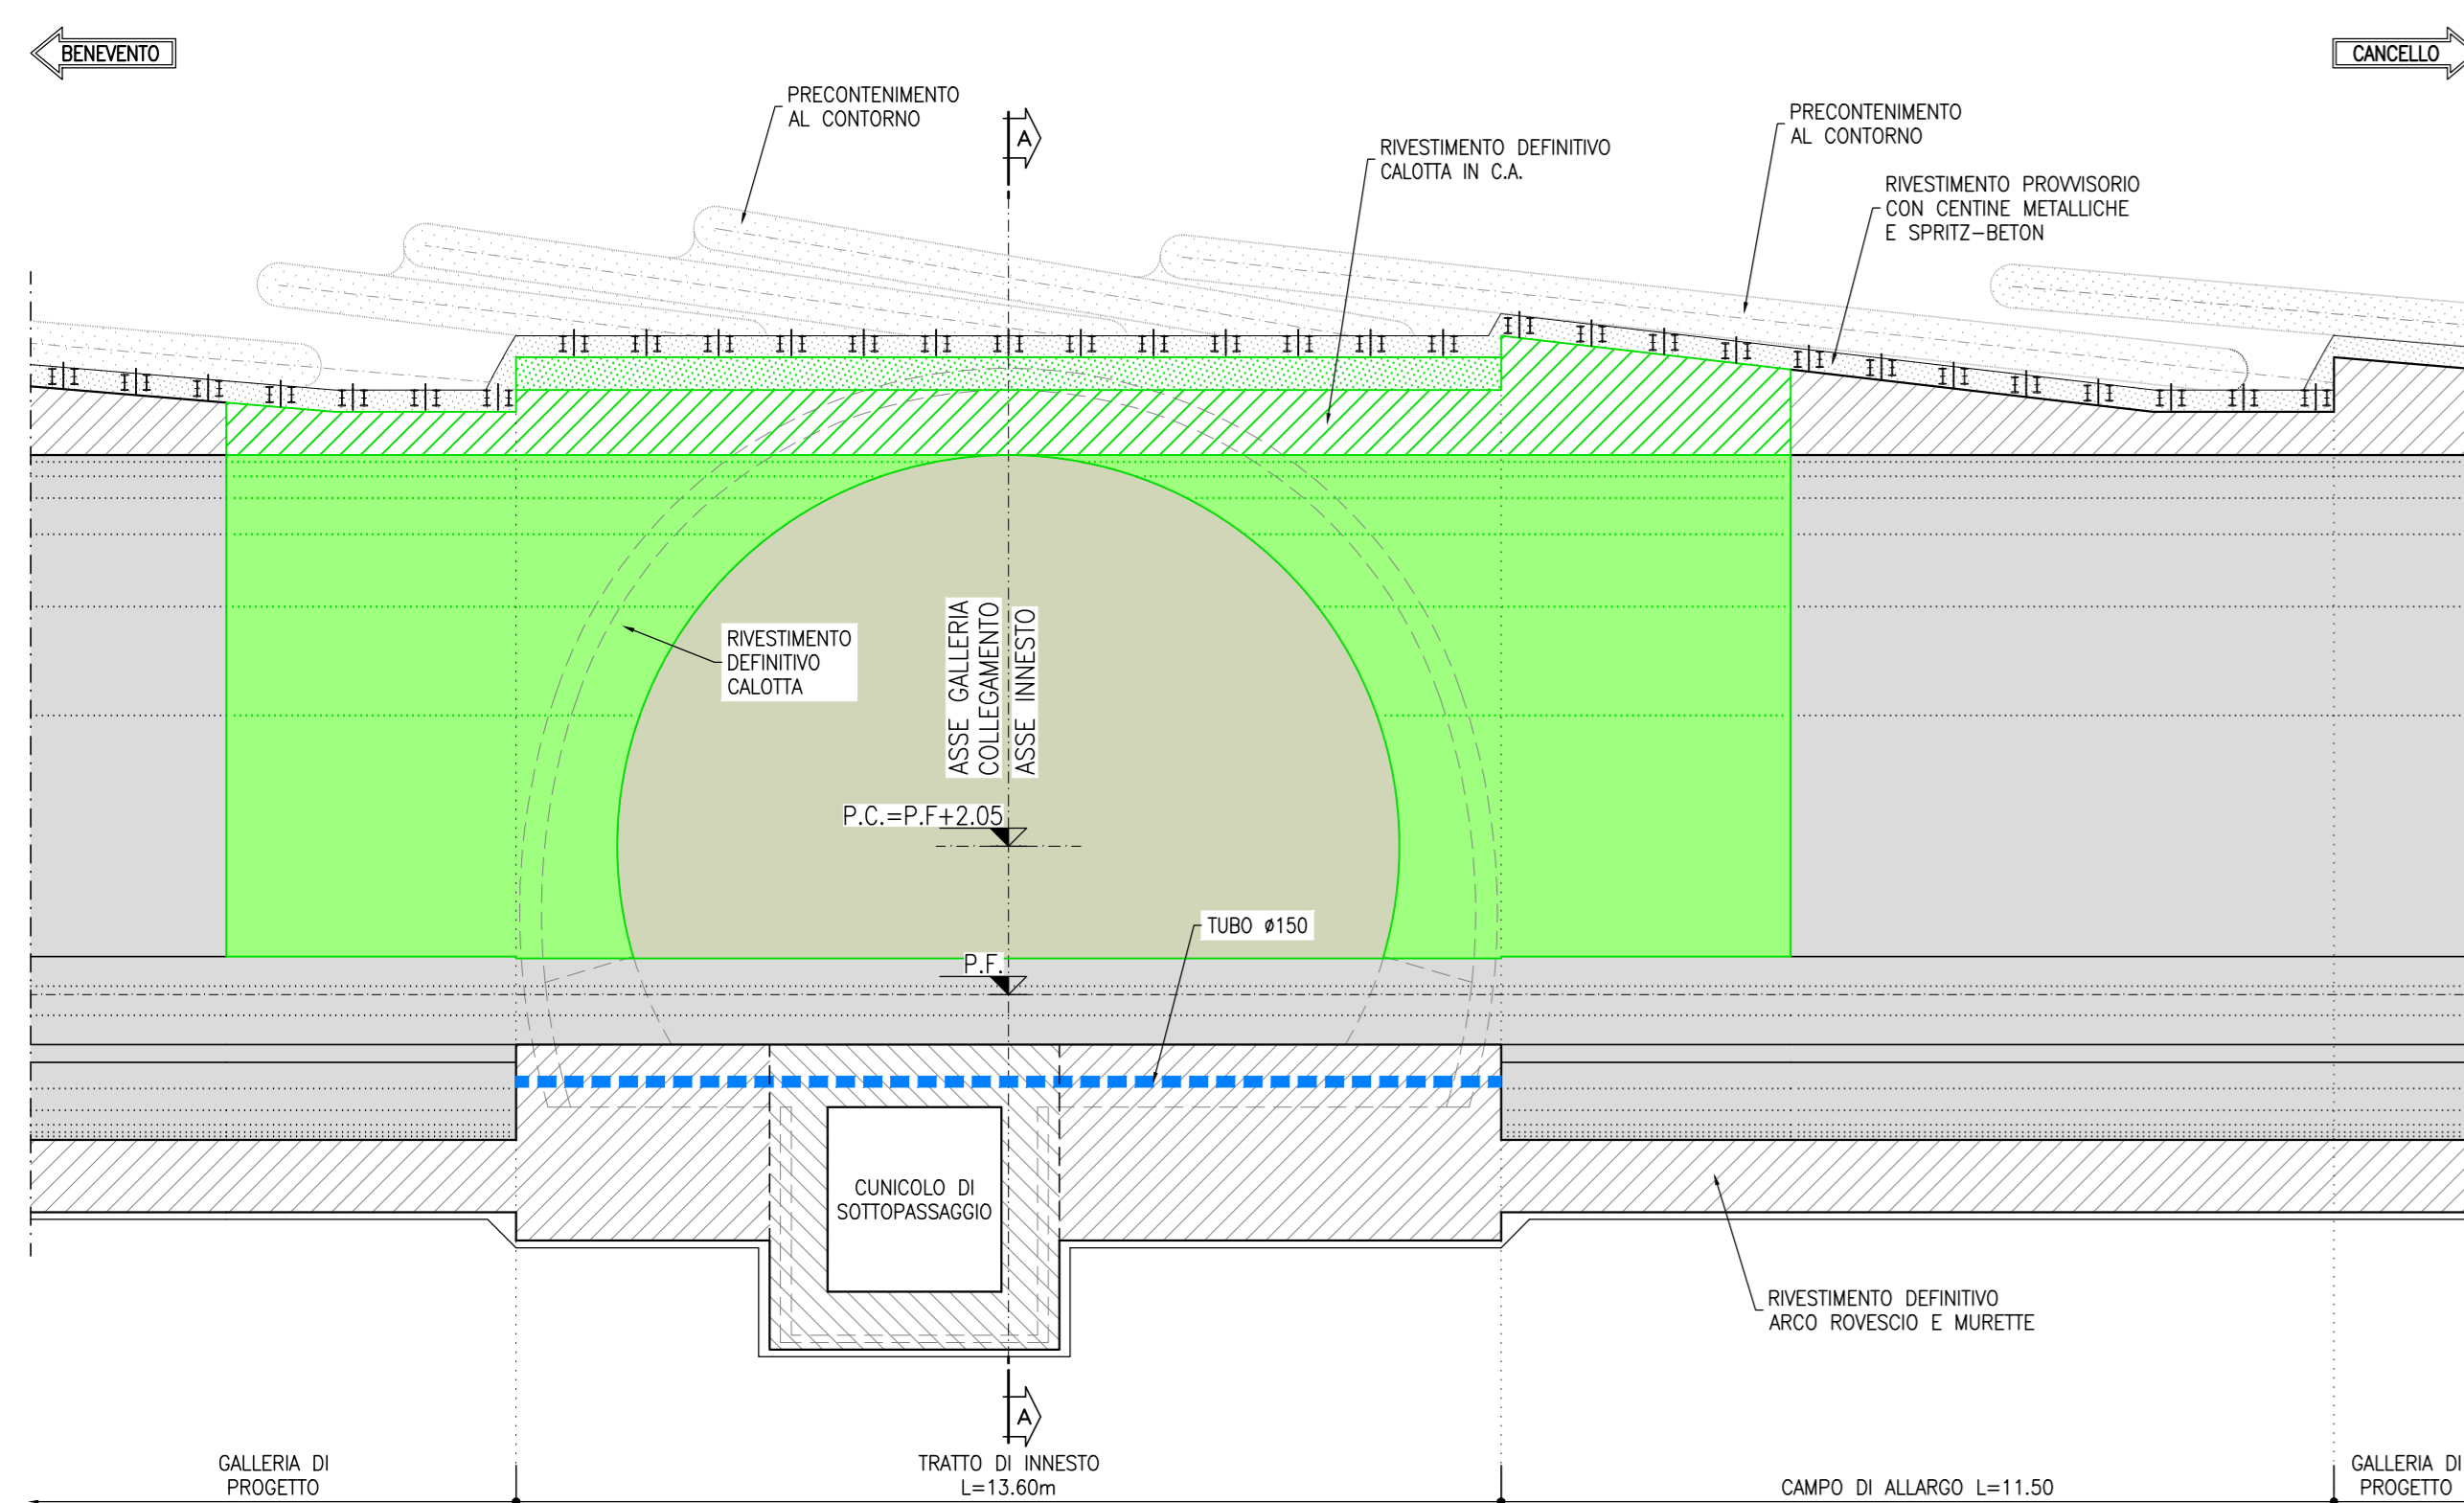

SEZIONE C-C

SCALA 1:100


SEZIONE TRASVERSALE GALLERIA DI COLLEGAMENTO - CARPENTERIA

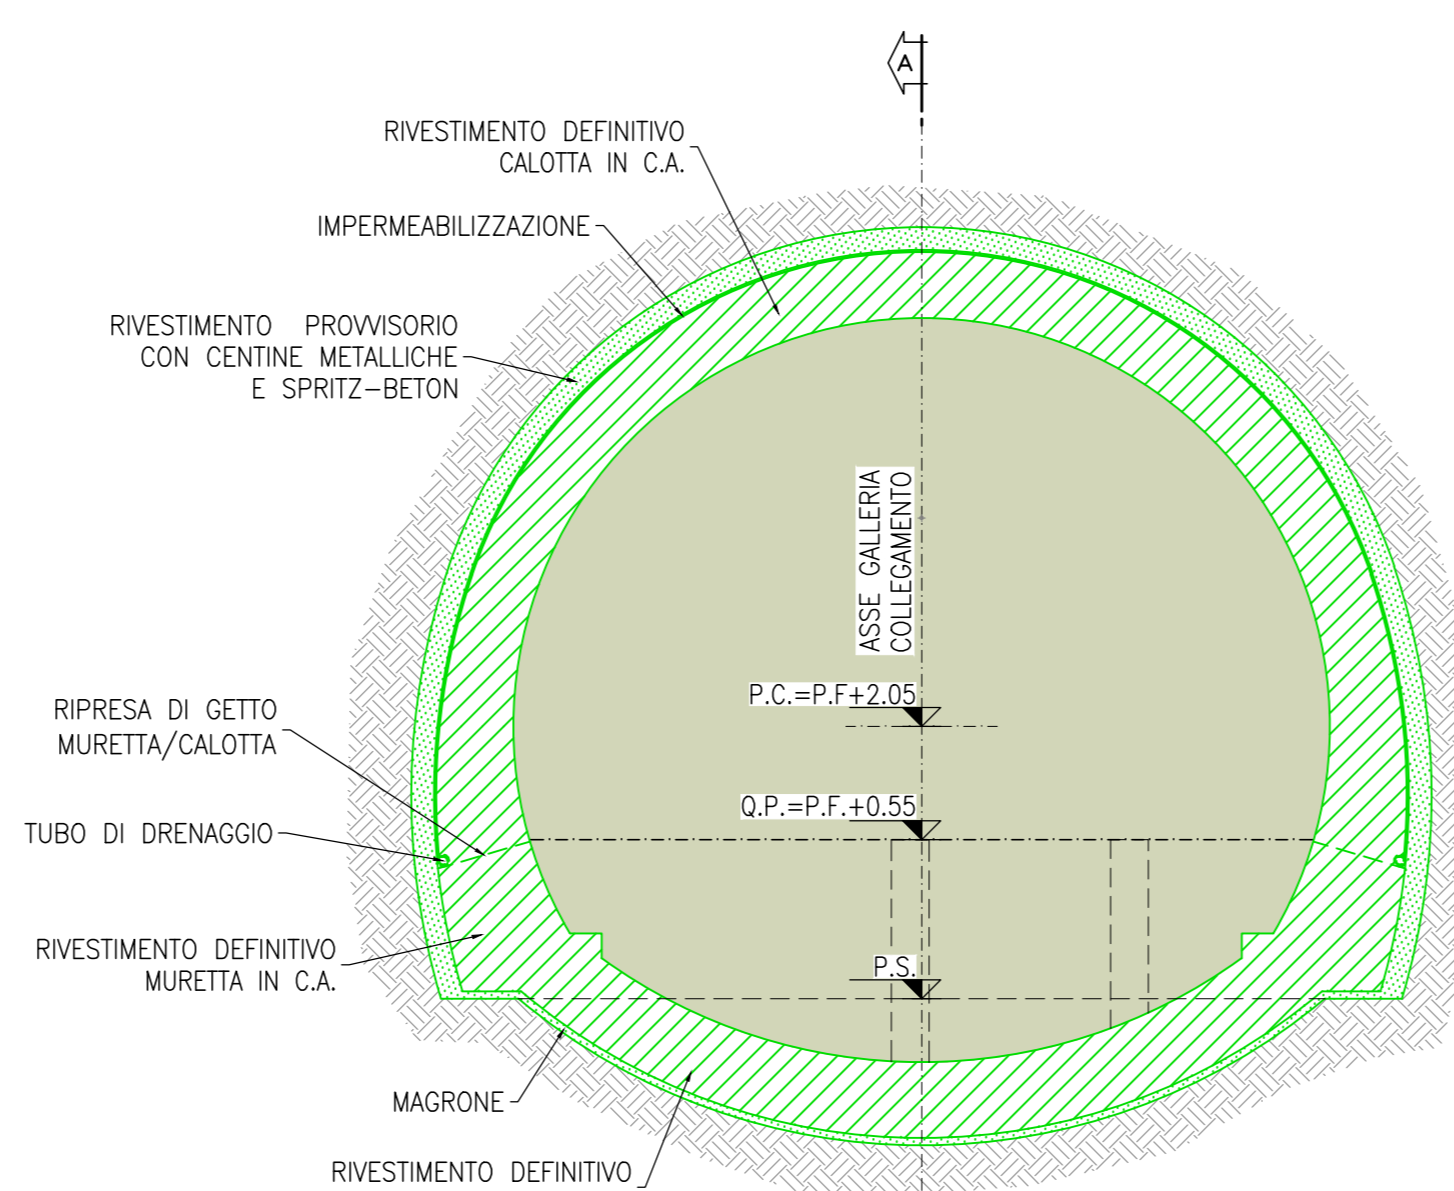

SEZIONE D-D

SCALA 1:100

SEZIONE TRASVERSALE GALLERIA DI COLLEGAMENTO - CARPENTERIA

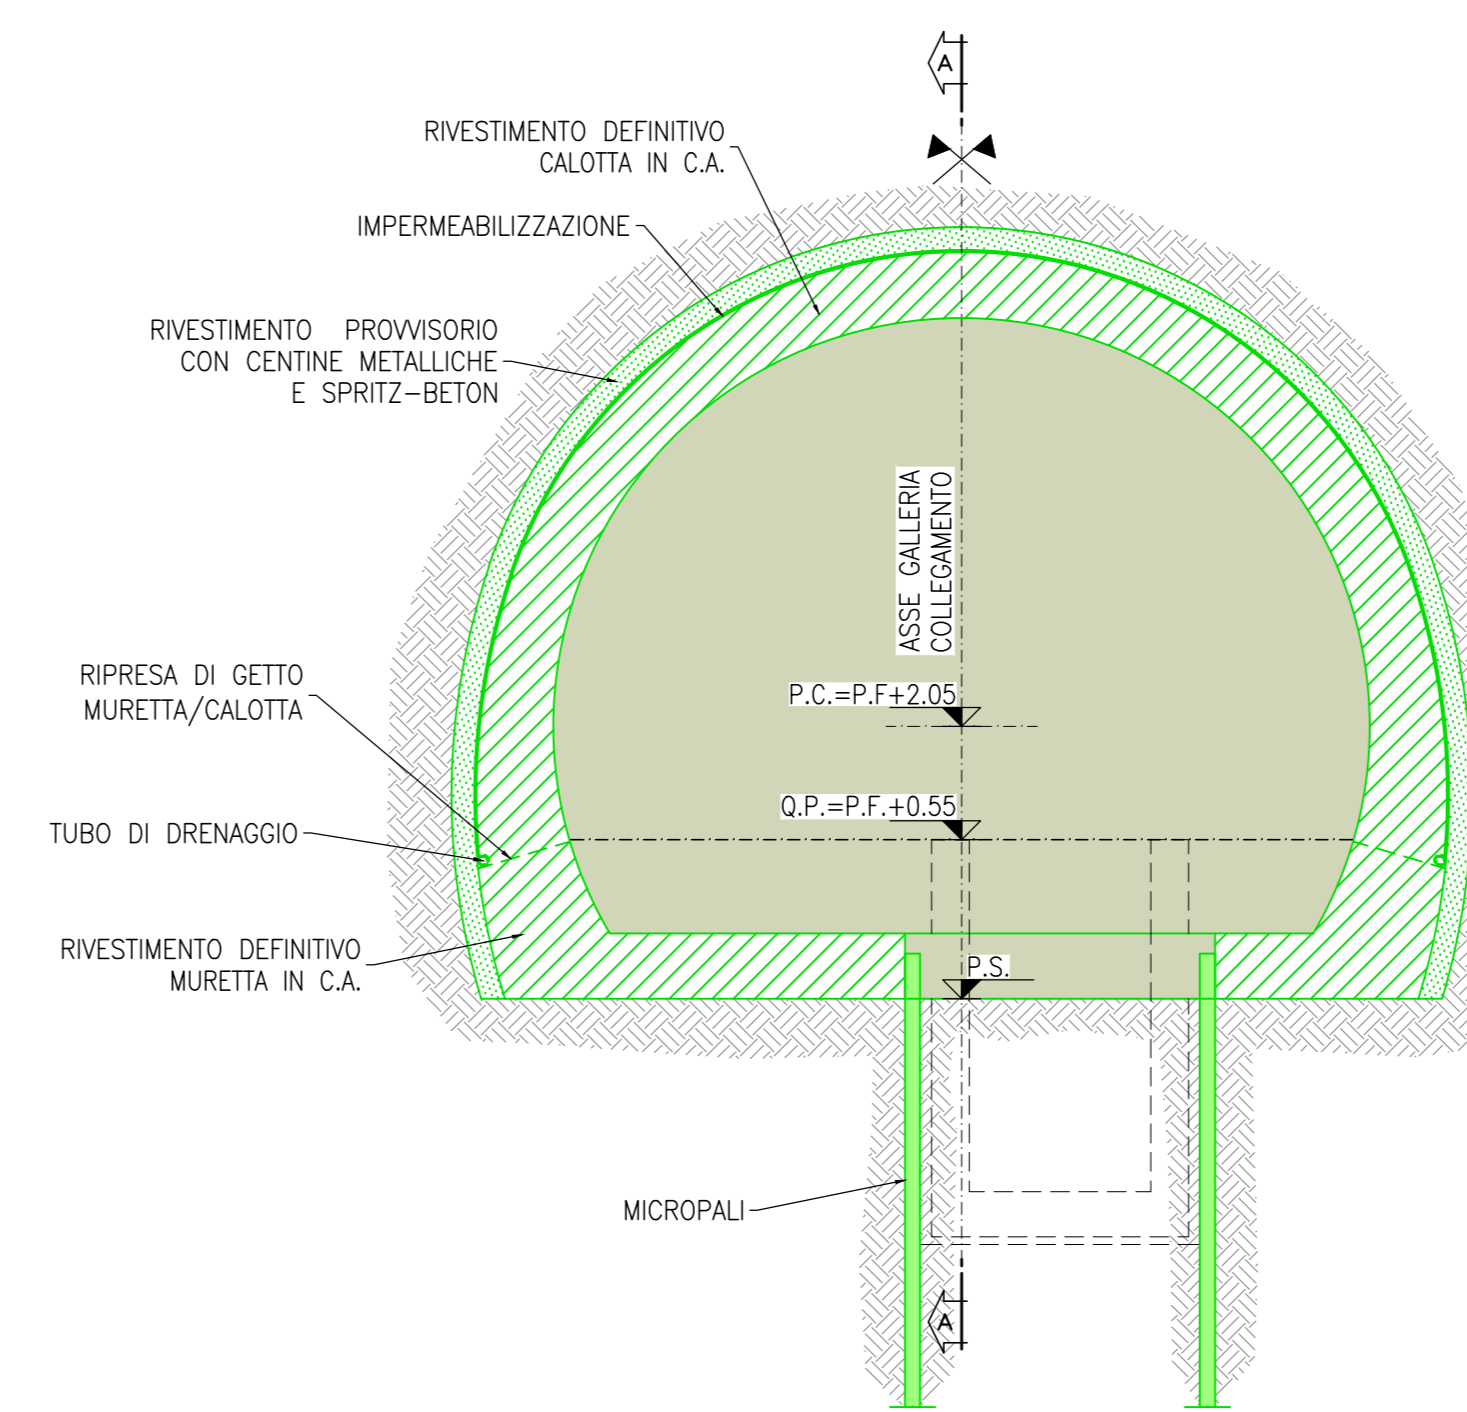

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.p.A. r.l.** Consorzio Edile Società Costruttrici e Ingegneria Liberate

PROGETTAZIONE: **Ghella** CONSULTING ITALIA, **ITINERA**, **SALCEF** TESTA ASSOCIATI, **COGET IMPIANTI**

MANDATARIA: **SYSTRA**, **SWS**, **SOTECNI**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO 2° SOTTOLOTTO TELESE - SAN LORENZO

DISEGNO

GALLERIA NATURALE

GN09 - GALLERIA SAN LORENZO - USCITA DI EMERGENZA pk 35+854 km

Innesto con la galleria di linea - Fasi esecutive Tav.3 di 5

APPALTATORE: **TELESE S.p.A. r.l.** SCALA: 1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	EMISSIONE	M. BENEVENTO	26/09/2021	L. TELESE	30/09/2021	M. TELESE	30/09/2021
B	REVISIONE A SEGUITO REV.	M. BENEVENTO	28/10/2021	L. TELESE	30/10/2021	M. TELESE	30/10/2021

File: IF2R.2.2.E.ZZ.AA.GN.09.0.0.003.B.dwg n. Elab.
