

FASE 1:

- delimitazione carreggiata S.P.106 esistente con segnaletica orizzontale e verticale, installazione new jersey con rete antipolvere tipo Netfix;
- realizzazione paratia di micropali lato sud-est della S.P.106.

Realizzazione opera di sostegno provvisoria

FASE 2:

- mantenimento in esercizio S.P.106 esistente;
- scavo di sbancamento fino a quota imposta dei pali di fondazione della porzione di manufatto lato sud-est;
- esecuzione pali di fondazione dell'intera platea;
- armatura e getto dell'intera platea di fondazione;
- armatura e getto della sola porzione di muro di elevazione che lambisce la S.P.106 con ferri di ripresa per il completamento nelle fasi successive;
- ritombamento dello scavo.

Realizzazione muro a ridosso SP106

FASE 3:

- mantenimento in esercizio S.P. 106 esistente;
- posa in opera muro di sostegno di contenimento per successiva deviazione stradale;
- esecuzione del rilevato e pacchetto stradale della deviazione temporanea;
- installazione barriere di sicurezza, rete antipolvere e segnaletica orizzontale e verticale.

Realizzazione deviazione provvisoria SP106

FASE 4:

- spostamento della viabilità locale dalla sede originale della S.P.106 alla nuova deviazione temporanea;
- esecuzione paratia di micropali lato cimitero;
- scavo di sbancamento fino a quota imposta dei pali di fondazione della porzione di manufatto lato nord-ovest;
- esecuzione pali di fondazione dell'intera platea;
- armatura e getto dell'intera platea di fondazione;
- armatura e getto dell'intera elevazione lato nord-ovest del manufatto;
- demolizione testa micropali paratia lato sud-est della S.P. 106;
- ritombamento dello scavo.

Realizzazione muro a ridosso cimitero

FASE 5:

- mantenimento della viabilità locale sulla deviazione temporanea;
- posa in opera travi prefabbricate impalcato come previste in P.D.;
- armatura e getto di completamento impalcato;
- finiture impalcato;
- ripristino pavimentazione S.P. 106.

Realizzazione impalcato

FASE 6:


- spostamento della viabilità locale sulla sede originale ripristinata della S.P.106;
- demolizione viabilità provvisoria e ripristino delle aree occupate provvisoriamente;
- completamento con armatura e getto dell'elevazione della porzione di manufatto lato sud-est;
- completamento con armatura e getto della soletta della porzione di manufatto lato sud-est;
- demolizione testa micropali paratia lato cimitero a nord-ovest;
- dismissione aree di cantiere.

Completamento lavorazione lato sud-est

Demolizione deviazione provvisoria

FASE 7:

- fase finale con ultimazione delle finiture e rimozione del cantiere.

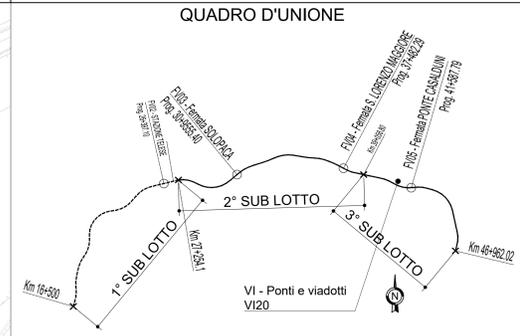

LEGENDA

- Lavorazione fase precedente
- Lavorazione fase attuale
- Demolizione

NOTA:

Per un dettaglio maggiore sulle fasi realizzative del manufatto a farfalla, si faccia riferimento ai seguenti elaborati:

- IF2R.3.2.E.ZZ.RH.VI.20.0.0.001.A: Relazione delle fasi costruttive
- IF2R.3.2.E.ZZ.BA.VI.20.0.0.001.A: Particolare fasizzazione

NOTE:

Per tabella materiali ed incidenza vedi elaborato:
 IF2R.3.2.E.ZZ.TT.VI.00.0.0.001 - Tabella Materiali ed incidenza

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **TELESE S.c.a.r.l.** Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE: **Ghella** **ITINERA** **SALCEF** **COGET IMPIANTI**

MANDATARIA: **SYSTRA** **SWS** **SOTECNI**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **Ing. V. CASANOVA**

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO

DISEGNO
PONTI E VIADOTTI
 V120
 Viadotto da km 40+983 al km 41+213: Viadotto Calore Torreuscu
 Fasi realizzative

APPALTATORE: **Ing. M. EMBIONE**

SCALA: **VARIE**

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Data
A	EMISIONE	D. Casanova	23/09/2021	G. Casanova	24/09/2021	A. Ricci	24/09/2021		
B	REVISIONE A SEGUITO REV.	D. Casanova	31/10/2021	G. Casanova	31/10/2021	A. Ricci	31/10/2021		
C	REVISIONE A SEGUITO REV.	D. Casanova	19/11/2021	G. Casanova	19/11/2021	A. Ricci	19/11/2021		

COMMESSA: **IF2R** LOTTO: **3** FASE: **2** ENTE: **E** TIPO DOC.: **Z** OPERA/DISCIPLINA: **AZ** PROG.: **V120** REV.: **00**

File: IF2R.3.2.E.ZZ.AZ.VI.20.0.0.002-C.dwg n. Elab.:
