


- ASSE DI PROGETTO
- FASE 0 (ATTIVITA' PROPEDEUTICHE)
- INSTALLAZIONE DEI CANTIERI
- CANTIERE BASE
- AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO
- DEPOSITO CUMULI ESISTENTI
- CANTIERE OPERATIVO
- AREA TECNICA
- VIABILITA' DI SERVIZIO SU STRADA ESISTENTE
- NUOVA VIABILITA' DI SERVIZIO
- NUOVA VIABILITA' DI SERVIZIO SU FUTURO SEDIME STRADALE
- DEVIAZIONE PROVVISORIA
- VIABILITA' CHIUSA
- ➔ ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE

FASE DI COSTRUZIONE

- TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI: INTERVENTO IN CORSO

FASE 2 - Realizzazione Opere Maggiori, svincoli e corpo stradale

Realizzazione rotonda Marsala Ospedale
 Realizzazione Galleria Artificiale
 Opere minori (tombini OM1-OM2)
 Realizzazione corpo stradale dal km 0 al km 1+650
 Sovrastrutture
 Opere di finitura, barriere e segnaletica
SVINCOLO MARSALA SUD - SV01
 Realizzazione corpo stradale da km 1+650 a km 2+166
 Sovrastrutture
 Opere di finitura, barriere e segnaletica
 Opere minori: vasca di prima pioggia V01
 (Chiusura al traffico VL02 con deviazione su viabilità alternativa)
 Realizzazione parziale VL02
 Realizzazione Cavalcavia CV02
 Realizzazione IN01
 Completamento VL02
 Apertura al traffico VL02
VIADOTTO SOSSIO (VI01)
 Opere minori (tombini da OM3 a OM11)
 Realizzazione corpo stradale dalla B viadotto Sossio a km 3+550
 Sovrastrutture
 Opere di finitura, barriere e segnaletica
 Impianti
 Opere minori: vasca di prima pioggia V02
 (deviazione provvisoria viabilità locale per realizzazione rilevati di approccio cavalcavia CV03)
 Realizzazione Cavalcavia CV03
 Realizzazione IN02
 Realizzazione Rotatoria
 (Apertura al traffico 03)
 (Traffico deviato sulla VL04 per realizzazione tratto in adeguamento)
 tratto in adeguamento dal km 3+550 al km 4.250
 Realizzazione corpo stradale dal km 4+250 a 5+450
 Sovrastrutture
 Opere di finitura, barriere e segnaletica
SVINCOLO TERRENOVE (SV02)
 (Interruzione traffico su IN04 - deviazione viabilità locale su viabilità alternativa)
 Realizzazione Cavalcavia CV04
 Realizzazione strada locale IN04
 (Apertura al traffico IN04)
 Opere minori (tombini OM12 a OM16)
 Opere minori: vasca di prima pioggia V04 e bacino di captazione B2
 Opere minori: vasca di prima pioggia V05 e bacino di captazione B3
 Realizzazione corpo stradale 5+550 ak km 8+800
 Sovrastrutture
 Opere di finitura, barriere e segnaletica
SVINCOLO PETROSINO (SV03)
 Opere minori (tombini da OM16 a OM44)
 Opere minori: vasca di prima pioggia V06 e bacino di captazione B4
 Realizzazione corpo stradale dal km. 8+800 al km 19+680.194
 Sovrastrutture
 Opere di finitura, barriere e segnaletica
 Impianti
 Opere minori: vasca di prima pioggia da V07 a V09 e bacino di captazione da B5 a B8

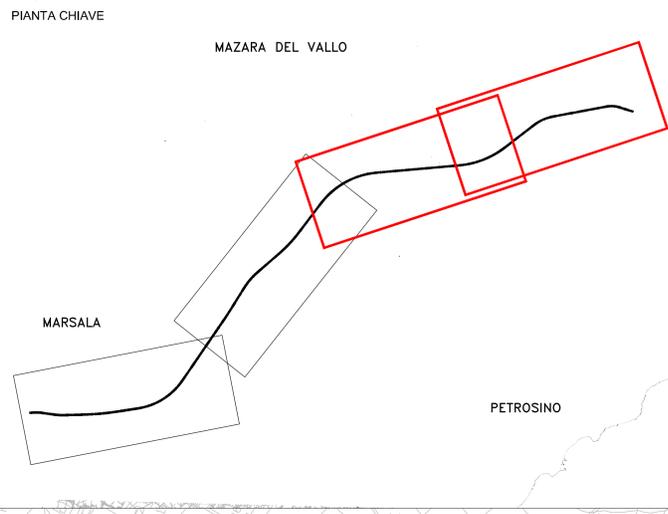

anas Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO TRAPANI - MAZARA DEL VALLO
VARIANTE ALLA S.S.115 "SUD OCCIDENTALE SICULA"
DALLO SVINCOLO "BIRG" SULLA A29/DIR AL COLLEGAMENTO ALLA S.S. 115 AL KM 48+000
1° STRALCIO FUNZIONALE MARSALA SUD - MAZARA DEL VALLO

PROGETTO DEFINITIVO COD. PAT57

PROGETTAZIONE: **ATI VIA - SERING - VDP - BRENG**

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Arch. Antonio Scattolonari Ordine Ing. di Trapani n. 1063	PROGETTISTA SIA e AMBIENTE Dott. Ing. Francesco Ventura Ordine Ing. Prov. Roma 14660 PROGETTISTA PUI Dott. Geol. Enrico Curcuruto Ordine Geo. Regione Sicilia 966
GEOLOGO: Dott. Flavio Caporuscio Ordine geologi del Lazio n. 1599	MANIPOLAZIONE: VIA INGEGNERIA ASSISTENZA: SERING INGEGNERIA
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Arch. Roberto Roggi	vdp BRENG S.p.A. S.p.A.

CANTIERIZZAZIONE
 Fasi di lavoro dell'opera - Fase 2 - Tav. 2/2

CODICE PROGETTO	LV. PROJ. ANNO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
DPPA0757	022	TOCCAOCCANPE03_A		1:500
D		CODICE ELAB.		
C		T00CA00CANPE04	A	
B				
A	EMISSIONE	Genese 2022	D. Cordani	D. Cordani
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO
