


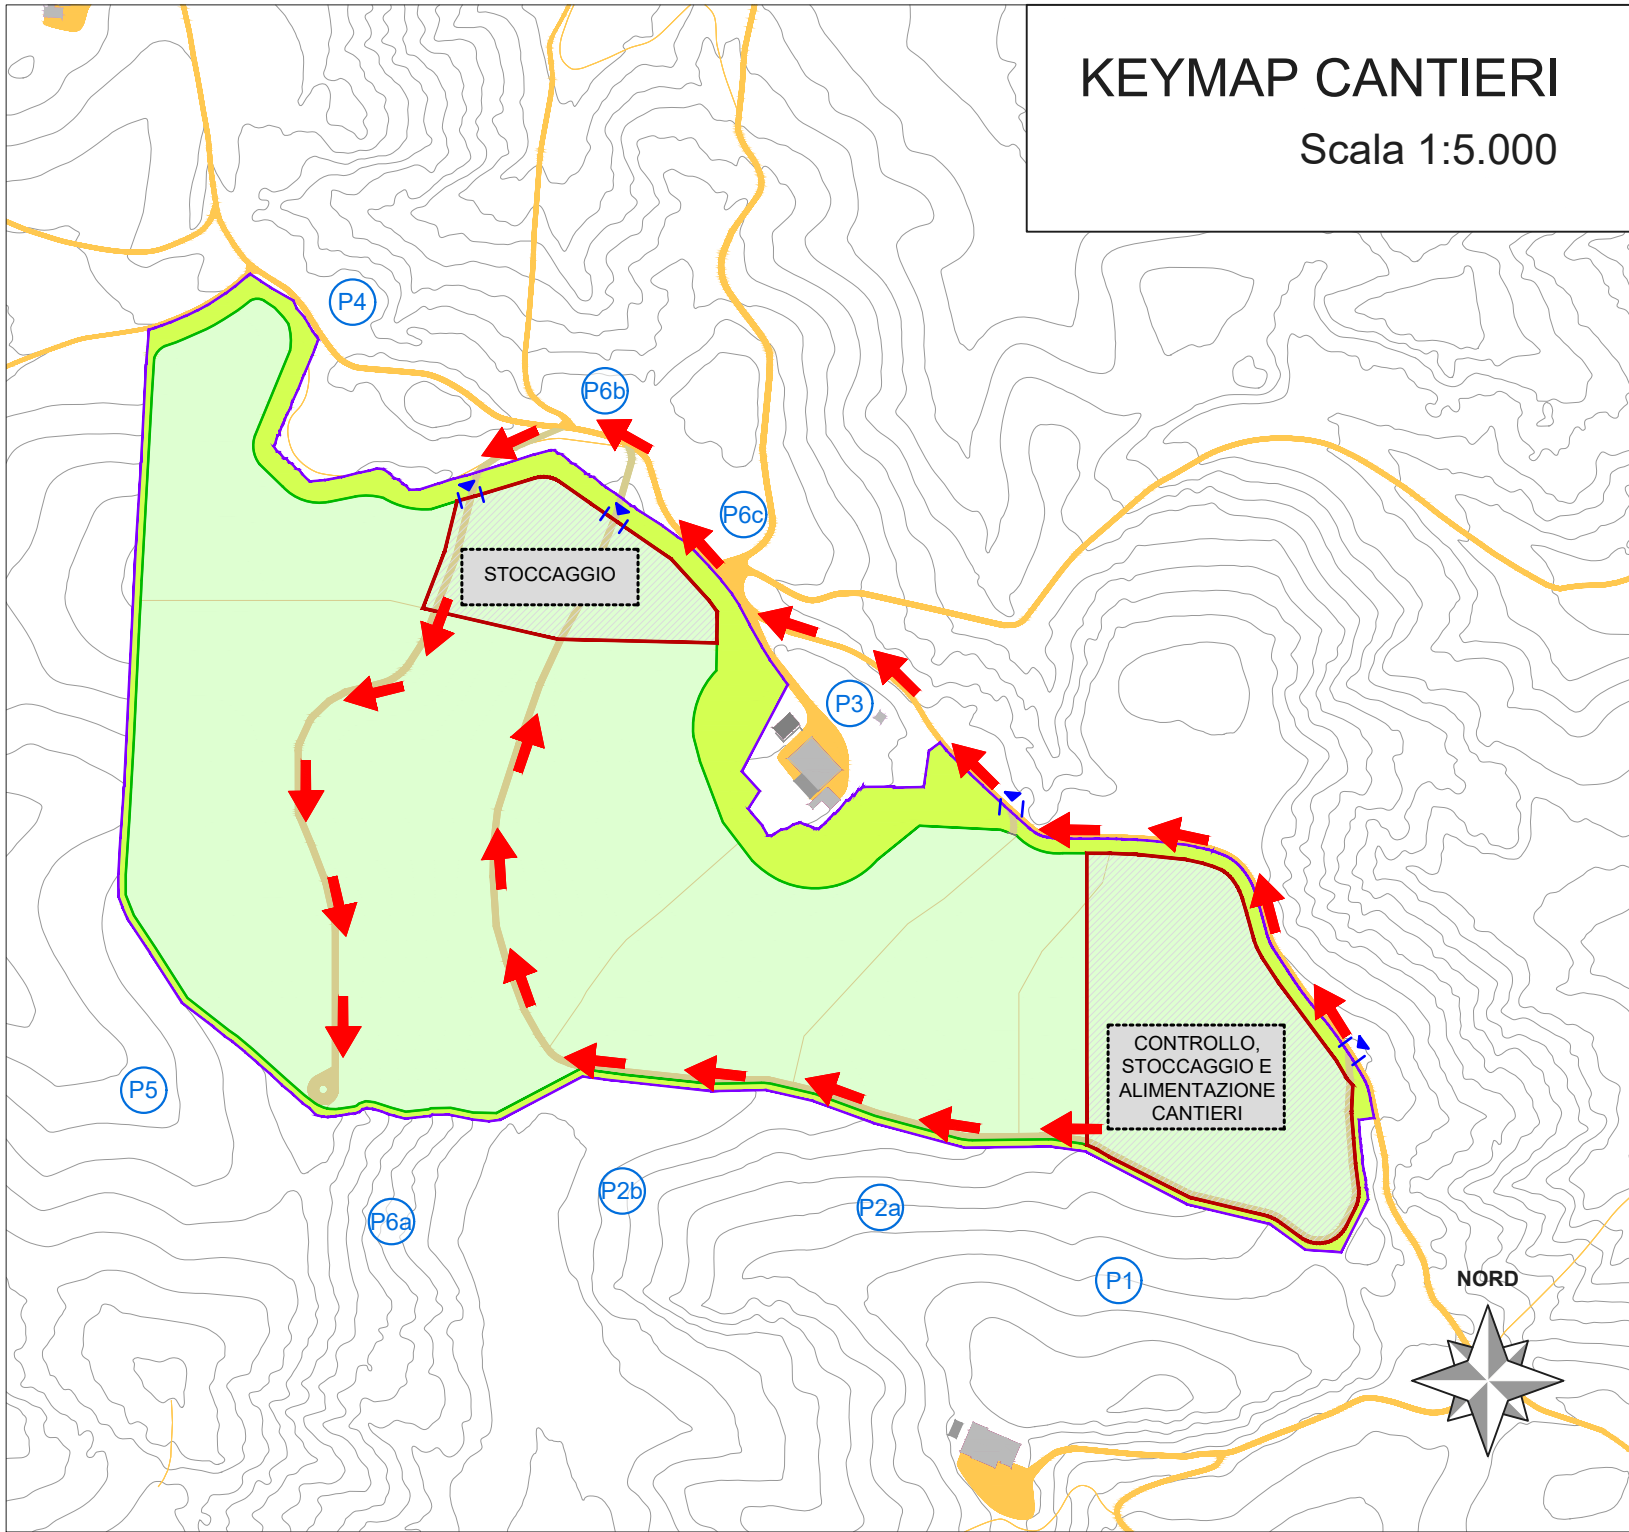

DESCRIZIONE ATTIVITA' DI CANTIERE

Fase 1 di 3

Si prevede l'utilizzo delle aree interne al perimetro per il deposito dei materiali e il posizionamento delle baracche di cantiere. Tali aree saranno delimitate da recinzione temporanea, in rete metallica, opportunamente segnalate e regolamentate, e saranno gestite e operate sotto la supervisione della direzione dei lavori.

L'accesso ai siti avverrà utilizzando l'esistente viabilità locale, che non necessita di aggiustamenti o allargamenti e risulta adeguata al transito dei mezzi di cantiere. Ad installazione ultimata, il terreno verrà ripristinato, ove necessario, allo stato naturale.

I primi apprestamenti saranno installati nelle zone che risultano più accessibili e praticabili rispetto all'orografia del sito. Dopo aver predisposto le recinzioni di cantiere lungo i perimetri, si procederà al tracciamento delle viabilità dei cantieri e alla predisposizione delle strutture temporanee che ospiteranno gli uffici di direzione cantiere, uffici tecnici, uffici ricevimenti merci, gli spogliatoi, i servizi igienici, le mense e le infermerie.


I mezzi di trasporto merci provenienti dalla strada interpodereale proveniente da est entreranno dagli accessi più vicini ai siti di stoccaggio.

Dopo aver superato i controlli di sicurezza ed effettuata la registrazione dei documenti di trasporto, verrà organizzato lo scarico dei materiali e la movimentazione che sarà effettuata tramite mezzi controbilanciati e transpallet elettrici.

I siti di stoccaggio dei materiali saranno due, ubicati nelle aree che hanno minori pendenze e sono più accessibili dall'esterno in modo da garantire l'approvvigionamento dei sottocantieri che permetteranno la realizzazione in parallelo delle opere.

Le prime forniture riguarderanno i materiali per la realizzazione delle recinzioni perimetrali e della viabilità interna che dovrà essere realizzata per permettere la movimentazione interna dei mezzi di cantiere.

In questa fase si procederà allo stoccaggio ed alla distribuzione nei sottocantieri delle strutture ed in particolare dei pali di fondazione in acciaio zincato che saranno infissi tramite macchine a battimento. I bilici con i moduli fotovoltaici saranno ricevuti in cantiere solo dopo aver completato il montaggio delle strutture di supporto.

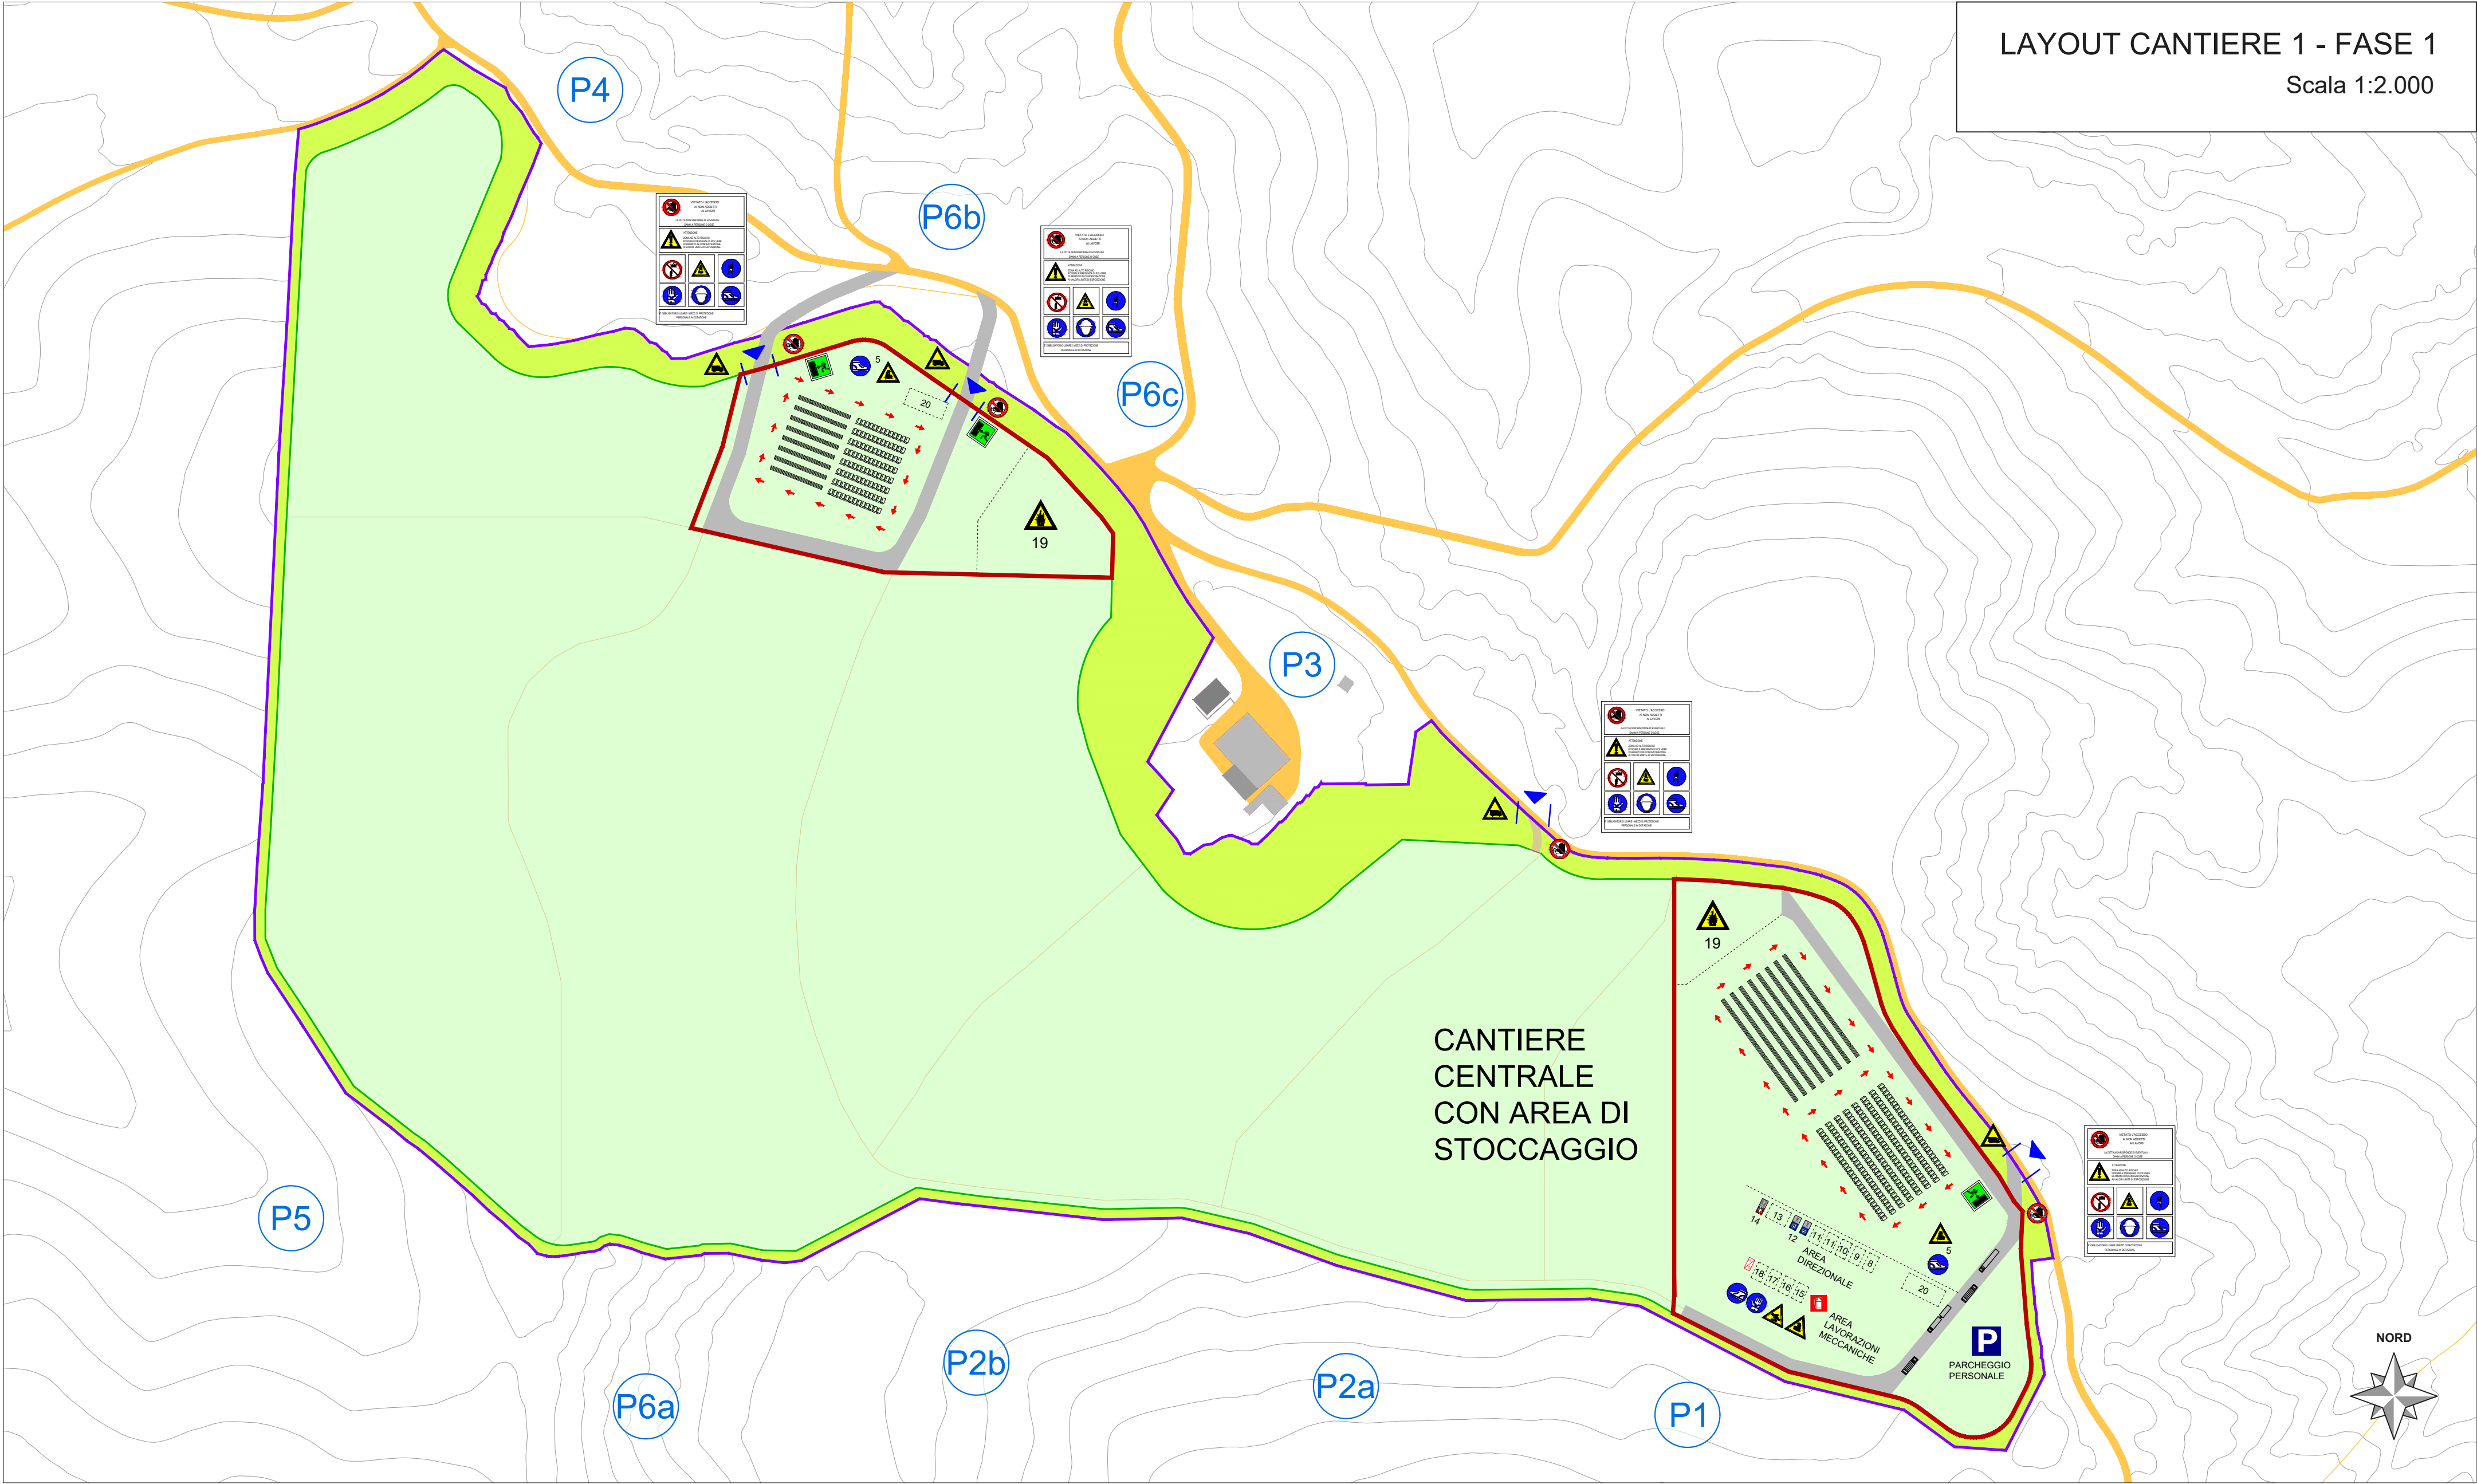

LEGENDA AREE FUNZIONALI DI CANTIERE

Sistema infrastrutturale

- 1 accesso carrabile
- 2 accesso pedonale
- 3 viabilità di cantiere
- 4 parcheggio personale
- 5 area di sosta per scarico merci
- 6 confine dell'impianto
- 7 recinzione di cantiere

Aree direzionali

- 8 ufficio direzione di cantiere / ufficio tecnico
- 9 ufficio ricevimenti merci/bolle/fatture
- 10 ufficio Direzione Lavori
- 11 spogliatoi
- 12 servizi igienici - wc chimico
- 13 mensa
- 14 infermeria

Area lavorazione meccaniche

- 15 area stoccaggio minuteria
 - 16 area taglio e saldatura
 - 17 area test elettrici
- Aree deposito**
- 18 magazzino/ufficio pezzi di ricambio
 - 19 deposito rifiuti
 - 20 deposito carrelli elevatori

LEGENDA SEGNALETICA

Cartelli di organizzazione



Ufficio
Mensa
Spogliatoi
Infermeria
Parcheggio su strada privata


Cartelli antincendio




Cartelli di salvataggio



Cartelli di divieto

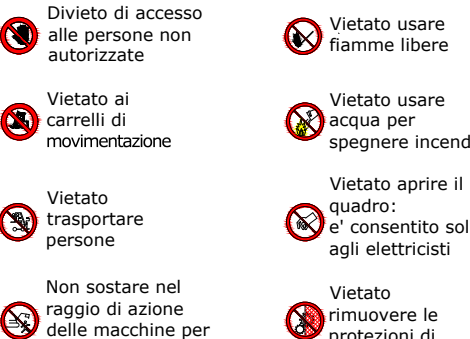


Impianto Elettrico di Cantiere

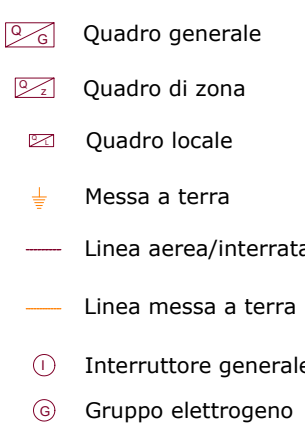

Cartelli di prescrizione



Cartelli di avvertimento



REGIONE
BASILICATA

COMUNE DI CRACO (MT)

Progettazione della Centrale Solare "Calanchi solari " da 19.987 kWp



Proponente: **conCom**
renewable energy

ConCom Solar Italia 02 S.r.l.
Via Gerardo Dottori 85 CAP 06132 PERUGIA (PG)

Titolo: Layout cantiere 1

Progettazione:



N° Elaborato: 53

Cod: PT_11

Scala: 1:5.000
1:2.000

Tipo di progetto:

- ☐ RILIEVO
- ☐ PRELIMINARE
- ☒ DEFINITIVO
- ☐ ESECUTIVO

Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Progettista:
Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase
Arch. Alessandro Visalli

Collaboratori:
Agr. Rosa Verde
Urb. Patrizia Ruggiero
Urb. Daniela Marrone

Progettazione elettrica e civile

Progettista:
Ing. Rolando Roberto
Ing. Marco Balzano

Collaboratori:
Ing. Simone Bongain
Ing. Giselle Roberto

Consulenza geologica:
Geol. Gaetano Casetta
Geol. Gaetano Casetta

Consulenza architettonica
Archeol. Claudia Concetta Costa

Rev.	descrizione	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
		Novembre 2021	A1	Rolando Roberto	Giselle Roberto	Rolando Roberto
