



**PIANTA CHIAVE DI DETTAGLIO**

**LEGENDA**

- CONDOTTA ALTO CALORE DN 600
- CONDOTTA ALTO CALORE DN 600
- CONDOTTA PARTITORE Z.M. DN 500
- AREA LOGISTICA DI SUPPORTO INDIVIDUATA
- CONFINE AREA LOGISTICA DI SUPPORTO
- NUOVO SERBATOIO AREA PIP
- LAYOUT CANTIERIZZAZIONE TIPOLOGICO

**N.B. LE OPERE IRRIGUE SONO ESCLUSE DAL PRESENTE STRALCIO PROGETTUALE**

**LEGENDA OPERE IN PROGETTO**


- Galleria di Derivazione
- Condotta di alimentazione dell'acquedotto Campano, condotta irrigua, nuova condotta Curti-Benevento
- Condotte a servizio del Sistema Alto Fortore
- Condotte a servizio del Sistema Alto Calore

**PIANTA CHIAVE GENERALE**

AREA LOGISTICA DI SUPPORTO 5 LOCALITA' CAMPOLATTARO

LAGO DI CAMPOLATTARO

AREA IMPIANTI E SERBATOIO

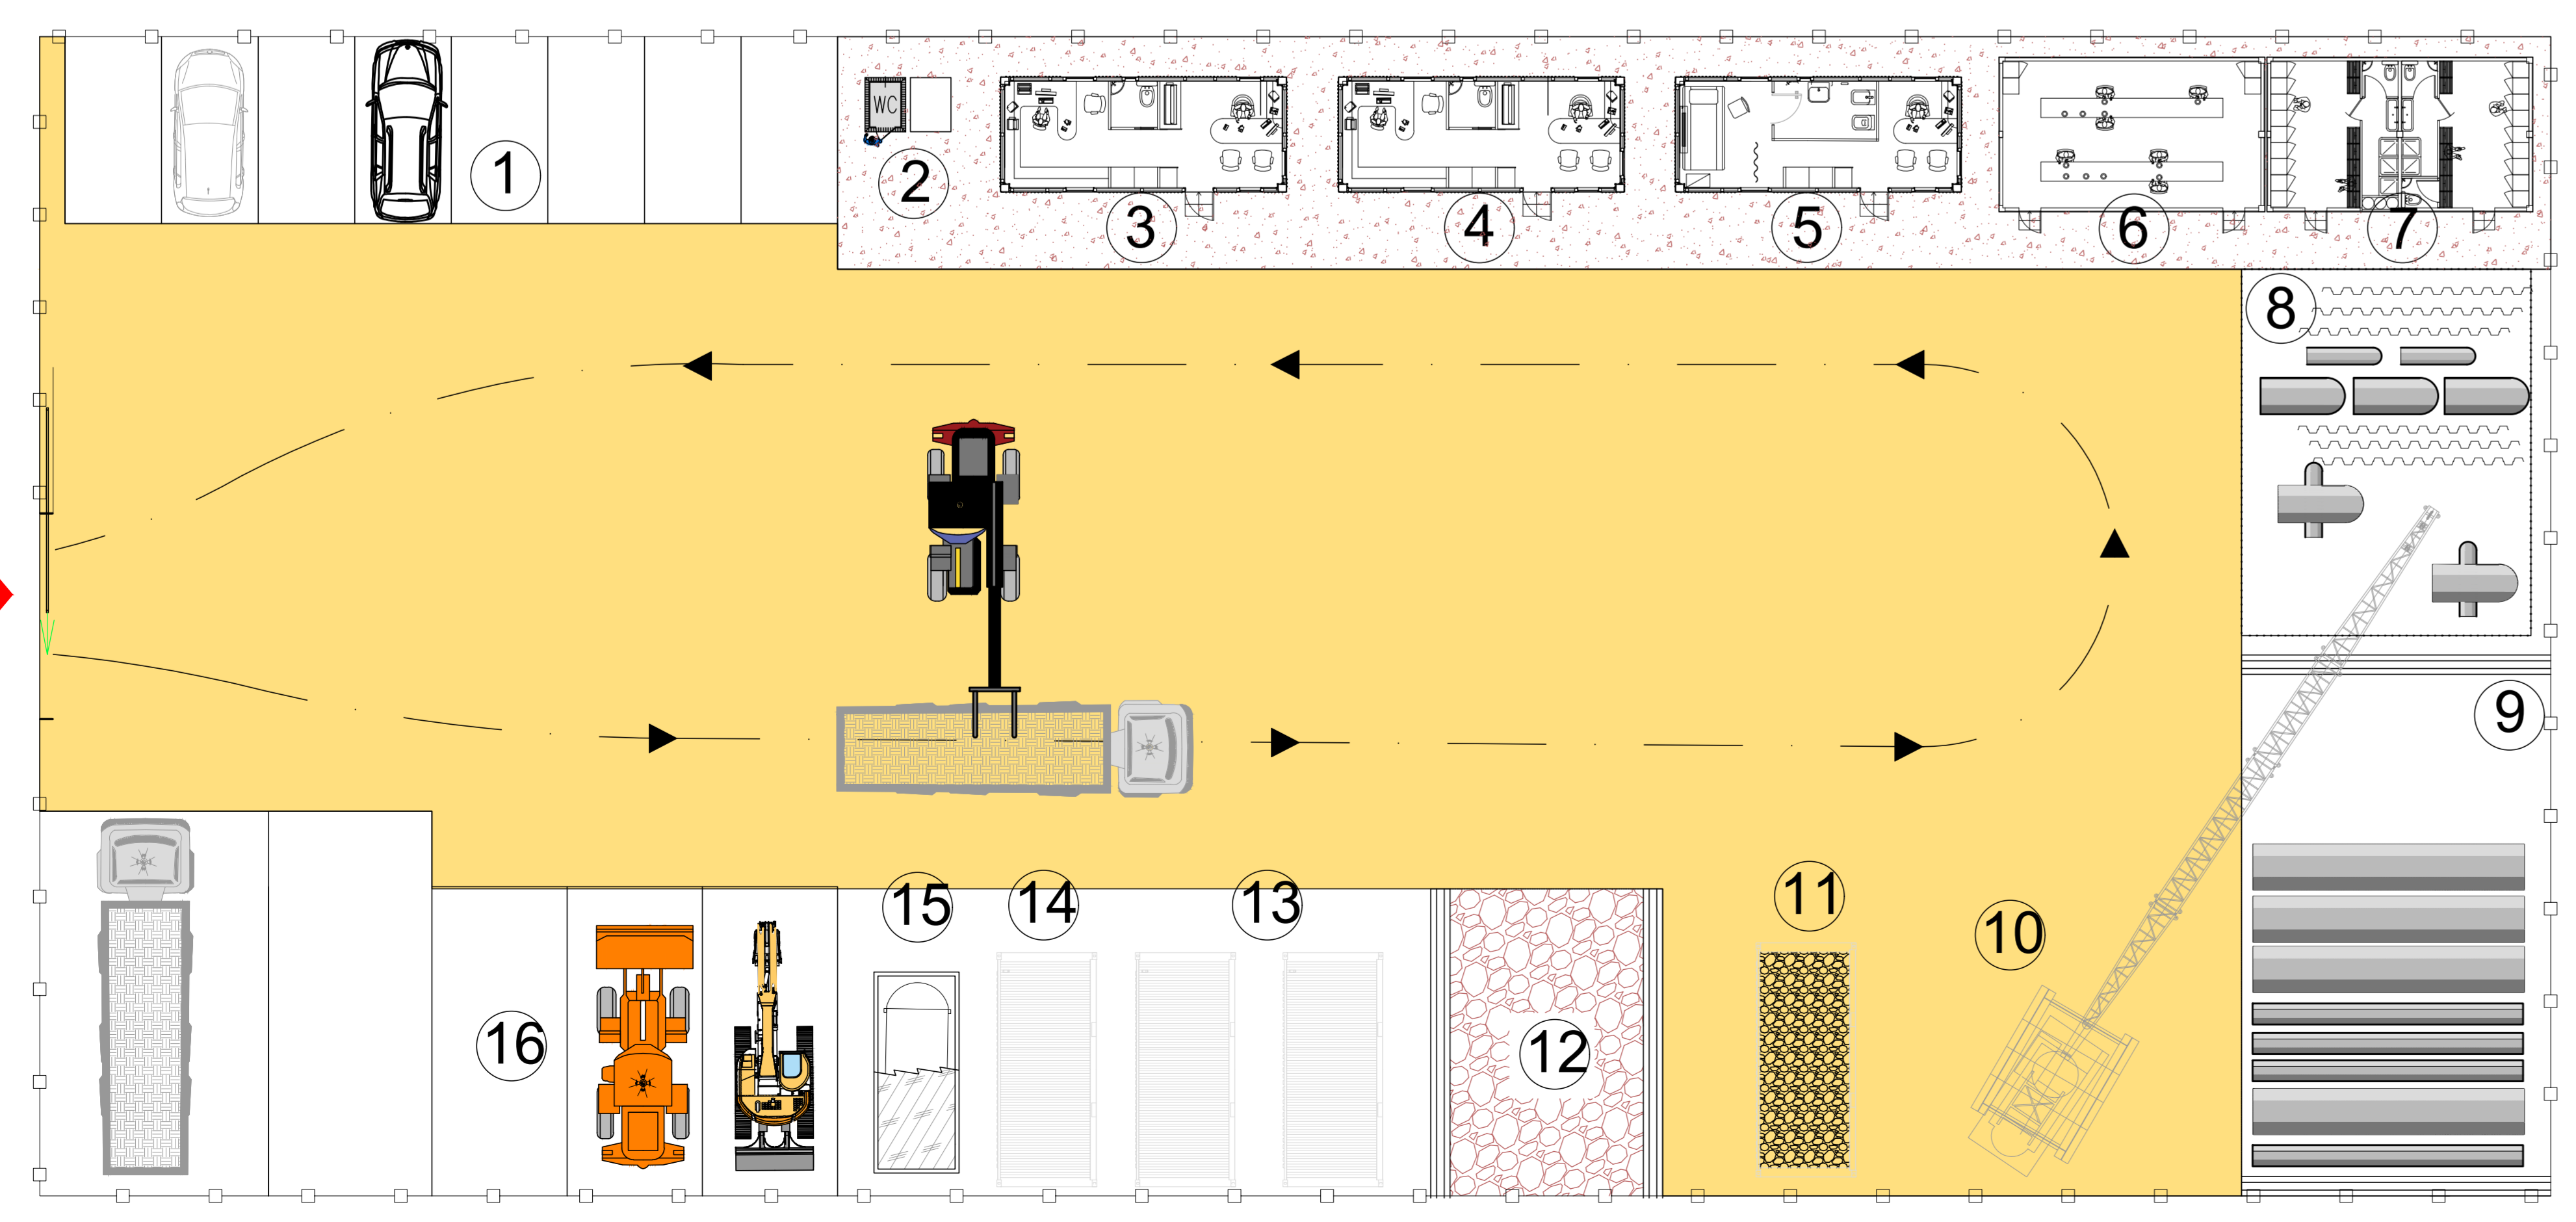

**DOTAZIONI MINIME AREA LOGISTICA DI SUPPORTO ALL'AREA OPERATIVA min 2000 mq**

- ① AREA PARCHEGGIO AUTO
- ② N° 2 WC CHIMICI ( 1 ogni 10 utilizzatori)
- ③ ELEMENTO PREFABBRICATO UFFICIO DL/CSE 15 mq (7,5 mq/addetto stima max 2 addetti)
- ④ ELEMENTO PREFABBRICATO UFFICIO I.A. 15 mq (7,5 mq/addetto stima max 2 addetti)
- ⑤ ELEMENTO PREFABBRICATO INFERMERIA 18 mq
- ⑥ ELEMENTO PREFABBRICATO SPOGLIATOIO 30 mq (1,5 mq/addetto stima max 20 addetti)
- ⑦ ELEMENTO PREFABBRICATO REFETTORIO 28 mq (1,4 mq/addetto stima max 20 addetti)
- ⑧ AREA DI STOCCAGGIO FORNITURE
- ⑨ AREA DI DEPOSITO CONDOTTE (l'area è delimitata con new jersey)
- ⑩ AREA MEZZI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI (GRU, CARRELLI ELEVATORI, Etc...)
- ⑪ SCARRABILE PER STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI NON PERICOLOSI
- ⑫ PIAZZOLA STOCCAGGIO TEMPORANEO RIFIUTI NON PERICOLOSI (l'area è delimitata con new jersey)
- ⑬ N° 2 CONTAINER PER DEPOSITO BOMBOLE GAS COMPRESSE 30 mq
- ⑭ N° 1 BOX IN LAMIERA PER DEPOSITO ATTREZZATURE E MATERIALI 30 mq
- ⑮ N° 1 SERBATOIO METALLICO ESTERNO PER CARBURANTE
- ⑯ AREA DI RICOVERO MEZZI DI CANTIERE

**REGIONE CAMPANIA**  
Acqua Campania S.p.A.

UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA**  
*Stralcio Allegato IV D.L. 31.05.2021 n.77 - L. di conversione 21.07.2021 n.108*

Responsabile Unico del Procedimento  
Dirigente Ciclo Integrato delle Acque della G.R. della Campania  
Ing. Rosario Manzi

Il Concessionario  
**Acqua Campania S.p.A.**  
Direttore Generale  
Area Tecnica  
Ing. Giuseppe Maria SALVA

I Progettisti  
Coordinatore Tecnico della Integrazione delle Prestazioni Specialistiche

Revisore	Data	Descrizione	D.D. Marsobranco	M.M. Martano	F. Rossi
TTITOLO:	CANTIERIZZAZIONE		Redatto	Controllato	Approvato
PLANIMETRIA AREA LOGISTICA 5			VIANINI LAVORI S.p.A.		
Allegato CA.02.07			FINALCA ingegneria srl		
Revisione:			Scala: varie		
