


Fasizzazione realizzazione corpi d'opera				
	PONTE EST	BANCHINE	PONTE OVEST	AREE ESTERNE
Sottofasi operative FASE 0 Macrofasa di riferimento: - Macrofase 0 - Macrofase 1 - Macrofase 2 - Macrofase 3	Monitoraggio OBI e BOB Allestimento aree di cantiere	Allestimento aree di cantiere Demolizione magazzini FA.02- FA.03	Allestimento aree di cantiere Demolizione edificio POLFER	Allestimento aree di cantiere lato est e ovest oltre indagini OBI e BOB Demolizioni/rimozioni per allestimento aree cantiere
Sottofasi operative FASE 1 Macrofasa di riferimento: - Macrofase 3 - Macrofase 4	Strutture elevaz. in c.a. 1° e 2° livello	Fondazioni pensiline	Fondazioni profonde	Scavo e realizzazione vasca di laminazione ponte ovest
Sottofasi operative FASE 2 Macrofasa di riferimento: - Macrofase 3 - Macrofase 4	Carpenteria metallica 1° e 2° livello	Realizz. muro tagliafuoco in c.a. fronte sud (fondaz. ed elevazione)	Solai di copertura, chiusure verticali, predis. impianti blocco di accesso	Scavo e realizzazione vasca di laminazione ponte est
Sottofasi operative FASE 3 Macrofasa di riferimento: - Macrofase 2 - Macrofase 3	Demolizione edificio ACEI	Monitoraggio OBI e bonifica bellica	Carpenteria metall. fino al 2° livello	Carpenteria metall. fino al 2° livello
Sottofasi operative FASE 4 Macrofasa di riferimento: - Macrofase 3	Chiusure verticali, finiture impi.mecanici	Realizzazione pensilina fronte sud	Solai di impalcato e copertura	Disallestim. cantiere e rilascio aree blocco accesso ovest
Sottofasi operative FASE 5 Macrofasa di riferimento: - Macrofase 3 - Macrofase 4	Realizzazione strutture in elevazione e impalcato tronco EST	Sistemazioni esterne opere a verde, arredo urbano	Sistemazioni esterne opere a verde, elettrico, sollevamento	Eliminazione vetrate per pensilina su FV, Piazza Marconi
Indicazione durata complessiva stimata delle MACROFASI di lavoro: durata stimata - Macrofasa 0 (Allestimento/smontaggio cantiere) => >90 gg durata stimata - Macrofasa 1 (Attività produttive) => >30 gg durata stimata - Macrofasa 2 (Demolizioni/rimozioni edifici) => 180 gg durata stimata - Macrofasa 3 (Realizzazione corpi d'opera) => 540 gg durata stimata - Macrofasa 4 (Sistemazioni aree esterne) => 130 gg				

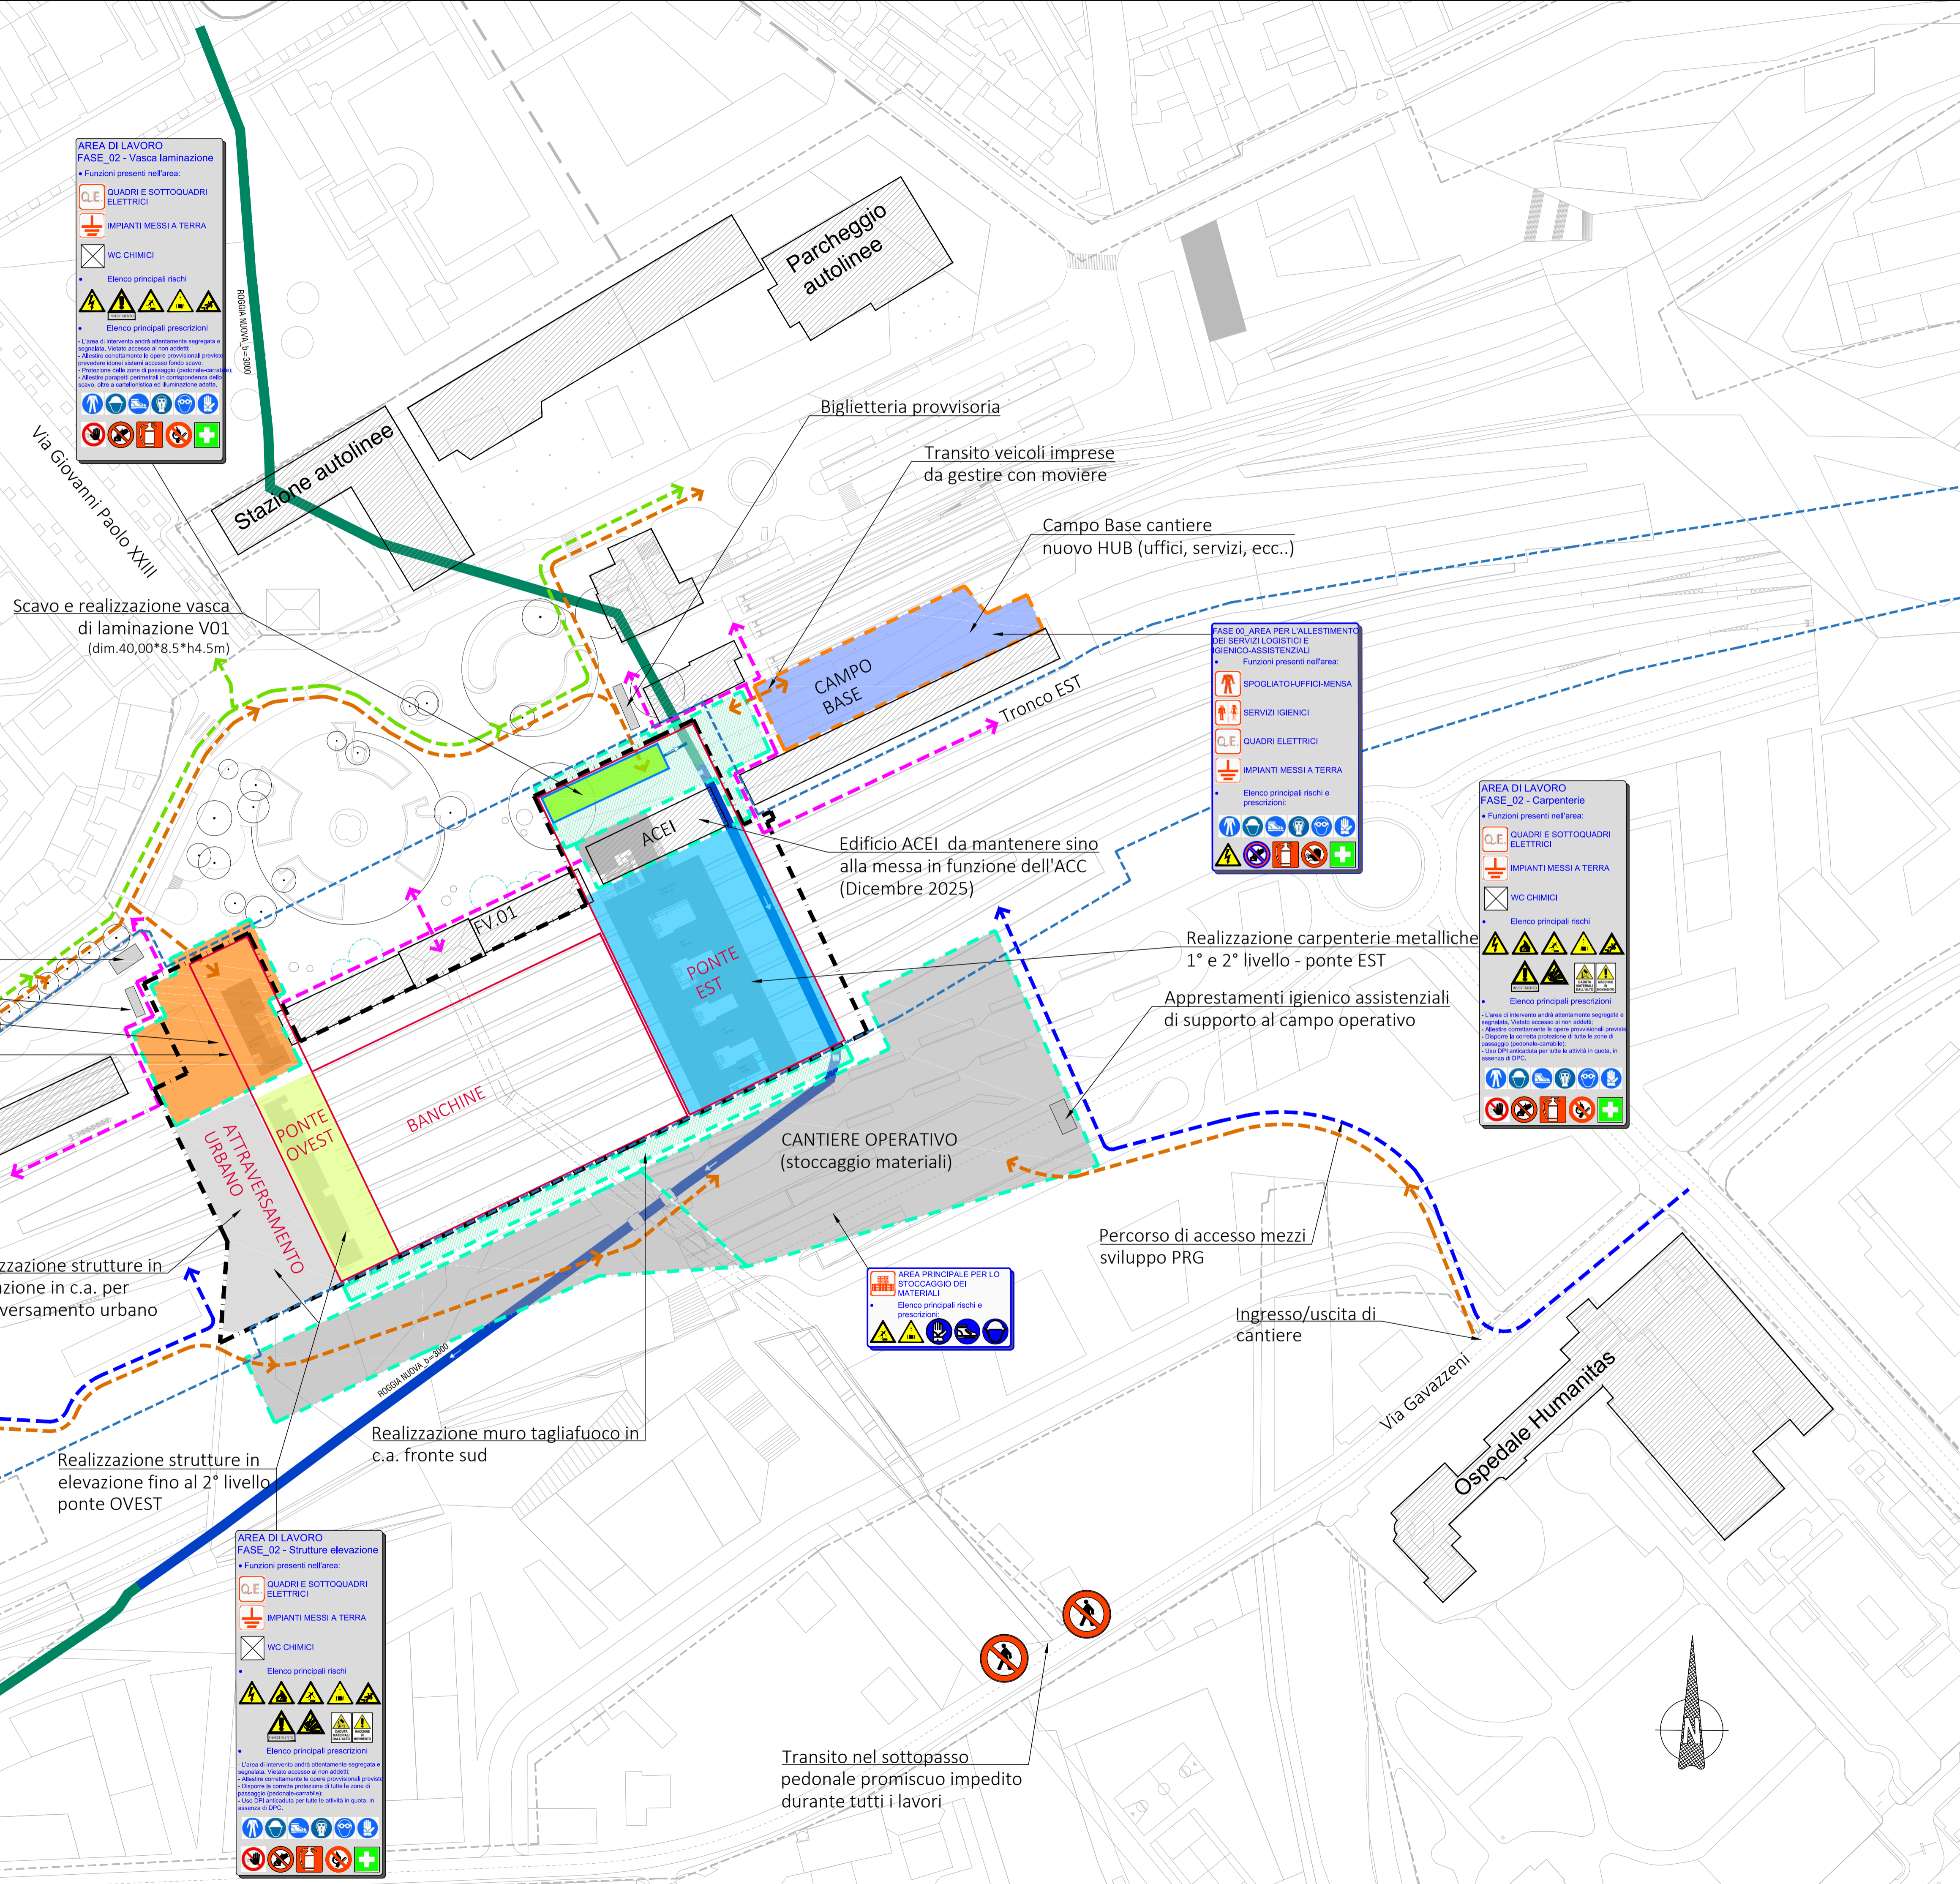

DEFINIZIONE AREE DI CANTIERE OPERATIVE FASE 2

LEGENDA

- Perimetro di proprietà RFI
- Percorso di accesso mezzi sviluppo PRG
- Perimetro ambito di intervento RFI
- Ingombro corpi d'opera
- Percorsi provvisori utenti stazione
- Percorsi mezzi di cantiere
- Viabilità ordinaria
- Demolizione edifici esistenti
- Area logistica di cantiere (campo base)
- Area operativa di cantiere (demolizioni e corpo d'opera)
- Area operativa di cantiere parzializzata in funzione delle fasi

FASE 2 - (CARPENTERIA METALLICA PONTE EST)

- Realizzazione della struttura in acciaio per corpi d'opera: 1° e 2° livello - ponte EST;
- Scavo e realizzazione vasca di laminazione V01;
- Realizzazione della struttura in elevazione in c.a. (setti e pilastri) per corpi d'opera: fino al 2° livello ponte OVEST;
- Realizzazione della struttura in elevazione del blocco di accesso ponte OVEST;
- Realizzazione strutture in elevazione in c.a. per attraversamento urbano e opere di realizzazione muro tagliafuoco in c.a. fronte sud;

N.B.: Ipotesi di realizzazione delle fondazioni per corpi d'opera e in parallelo all'elevazione delle strutture del corpo EST

COMMITTENTE
RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA

DIREZIONE STAZIONI - INGEGNERIA E INVESTIMENTI STAZIONI

PROGETTAZIONE
MANDATARIA
NET ENGINEERING
NET Engineering S.r.l.

MANDANTE (se presente)
Alpina
Alpina S.p.A.

vdp
VdP S.r.l.

STUDIO CATALANO srl
Studio Catalano S.r.l.

SOGGETTO TECNICO
DIREZIONE STAZIONI - INGEGNERIA STAZIONI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
STAZIONE DI BERGAMO
Riqualficazione e rifunionalizzazione del complesso di stazione

SICUREZZA

Planimetria Fase 2 SCALA 1:1000

PROGETTO	ANNO	SOTTOPROG.	LIVELLO	O.PRM. DISCIPL.	TIPO E.LB.	F. FUNZ.	PROGRESSIV.	REV.
326222	2022	S01	PF	BGSC	PL	SA	E03	A

Rev	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione finale	A. Palombarini	12/09/22	U. Lugli	12/09/22	A. Palombarini	12/09/22	S. Borelli	12/09/22

POSIZIONE ARCHIVIO

LINEA	SEDE TECNICA	NOME DOC.	NUMERAZIONE
L627	L00632		
