



FASE ESECUTIVA 2

- Preparazione area
- Realizzazione delle opere provvisorie, scavi e sbancamenti.
- Realizzazione dei pali di fondazione e plinti.
- Realizzazione delle strutture di elevazione (pile e spalle).

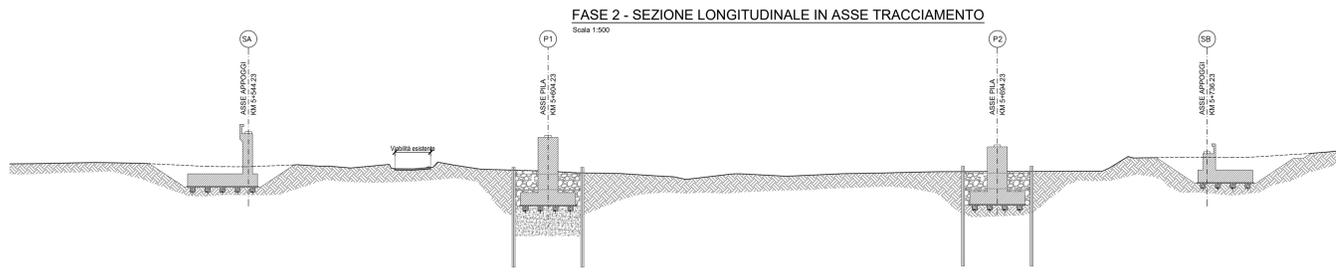


FASE ESECUTIVA 3

- Assemblaggio a pié d'opera delle campate laterali (circa 75,0/60,0m).
- Sollevarlo mediante autogrù e posizionamento su appoggi provvisori.

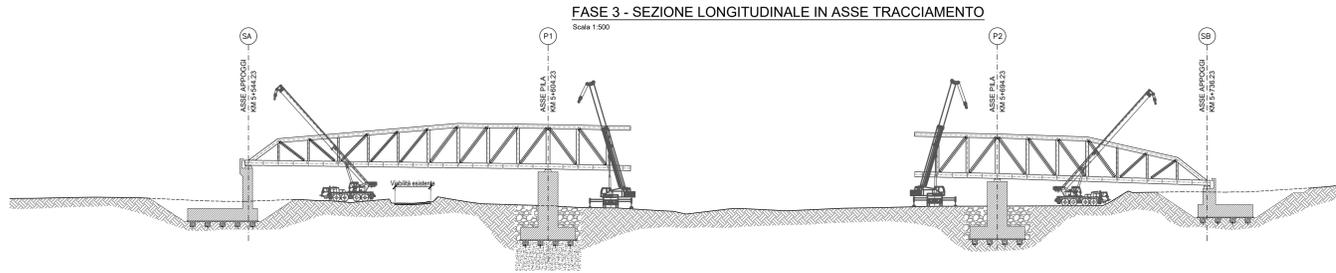


FASE ESECUTIVA 4

- Assemblaggio a pié d'opera della parte restante.
- Costruzione di pile provvisorie.
- Sollevarlo campata centrale e posizionamento su pile provvisorie.
- Completamento con giunzioni di continuità e inserimento dei diagonali mancanti.
- Posizionamento su appoggi definitivi.

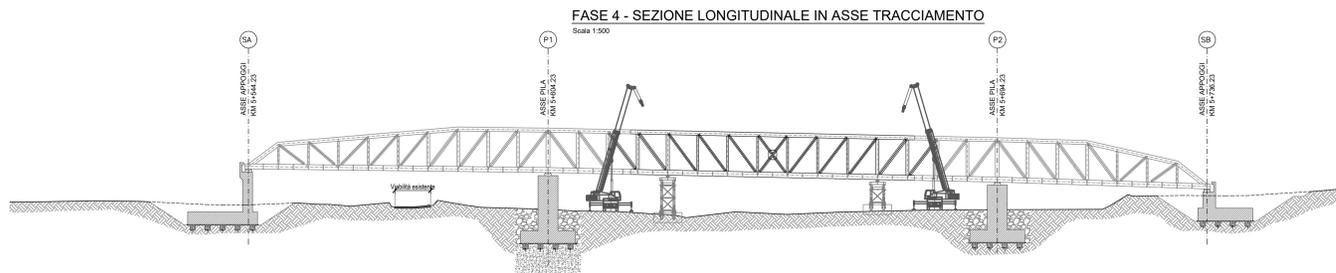


CONTROMONTA ESPRESSA IN CM




FASE ESECUTIVA 5

- Rimozione pile provvisorie.
- Posa delle predalles.
- Getto della soletta e dei cordoli.

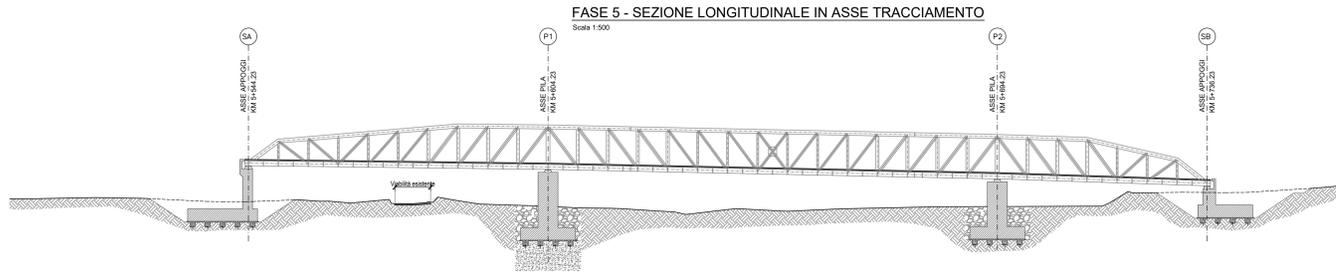

FASE ESECUTIVA 6

Realizzazione arredi, pavimentazione completamente rilevati: opera finita.

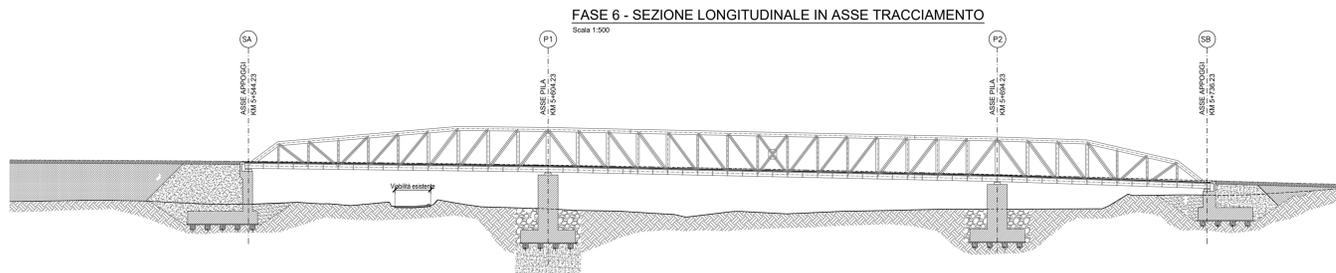

S.S. 106 "JONICA"
Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (Svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050

PROGETTO DEFINITIVO		COD. C2311
IL PROGETTISTA È RESPONSABILE DELL'ADESIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Francesco M. LA CAMERA		
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Francesco M. LA CAMERA		
IL SECCO Dott. Geol. Firenze PENNINO Ordine Geol. Lombardi N. 1575		
L'ARCHITETTO: Dott.ssa Grazia SAVINO Elettos MIBACT n. 3856 - architetto di 1° fascia al sensi del D.M. 24/4/2019		
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Antonello PIRROTTA		
GRUPPO DI PROGETTAZIONE ST.E.S. s.r.l. Structures and Transport Engineering Direttore Tecnico Ing. E. Moroni Ordine Ing. Roma N. 10020		Direttore Tecnico Ing. G. Casarri Ordine Ing. Milano N. 26927
ROKSOIL S.p.A. Direttore Tecnico Ing. G. Grimaldi Ordine Ing. Roma N. 17703		E.D.I.N. s.r.l. Società di Ingegneria Direttore Tecnico Ing. G. Grimaldi Ordine Ing. Roma N. 17703
Prof. Arch. F. KARRER		

VIADOTTI Viadotto Gerace VI01 Fasi costruttive e varo degli impalcati - Carr. Sud		
CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE
PROGETTO	LUV. PROG. ANNO	SCALA:
ELAB.	ELAB.	
C	EMMISSIONE PER PROCEDURA VASSIVA	08/06/2022 DEL VECCHIO GRIMALDI LA CAMERA
B	EMMISSIONE A SEGUITO DI RIESAME INTERMEDIO	Luglio 2022 DEL VECCHIO GRIMALDI LA CAMERA
A	PRIMA EMISSIONE	Marzo 2022 DEL VECCHIO GRIMALDI LA CAMERA
REV.	DESCRIZIONE	DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO
