




FASE REALIZZATIVA 1/8:  
 • ESECUZIONE PRE-SCAVO  
 • REALIZZAZIONE PARATE DI PALI COMPENETRATI CSP E TRAVE DI CORONAMENTO

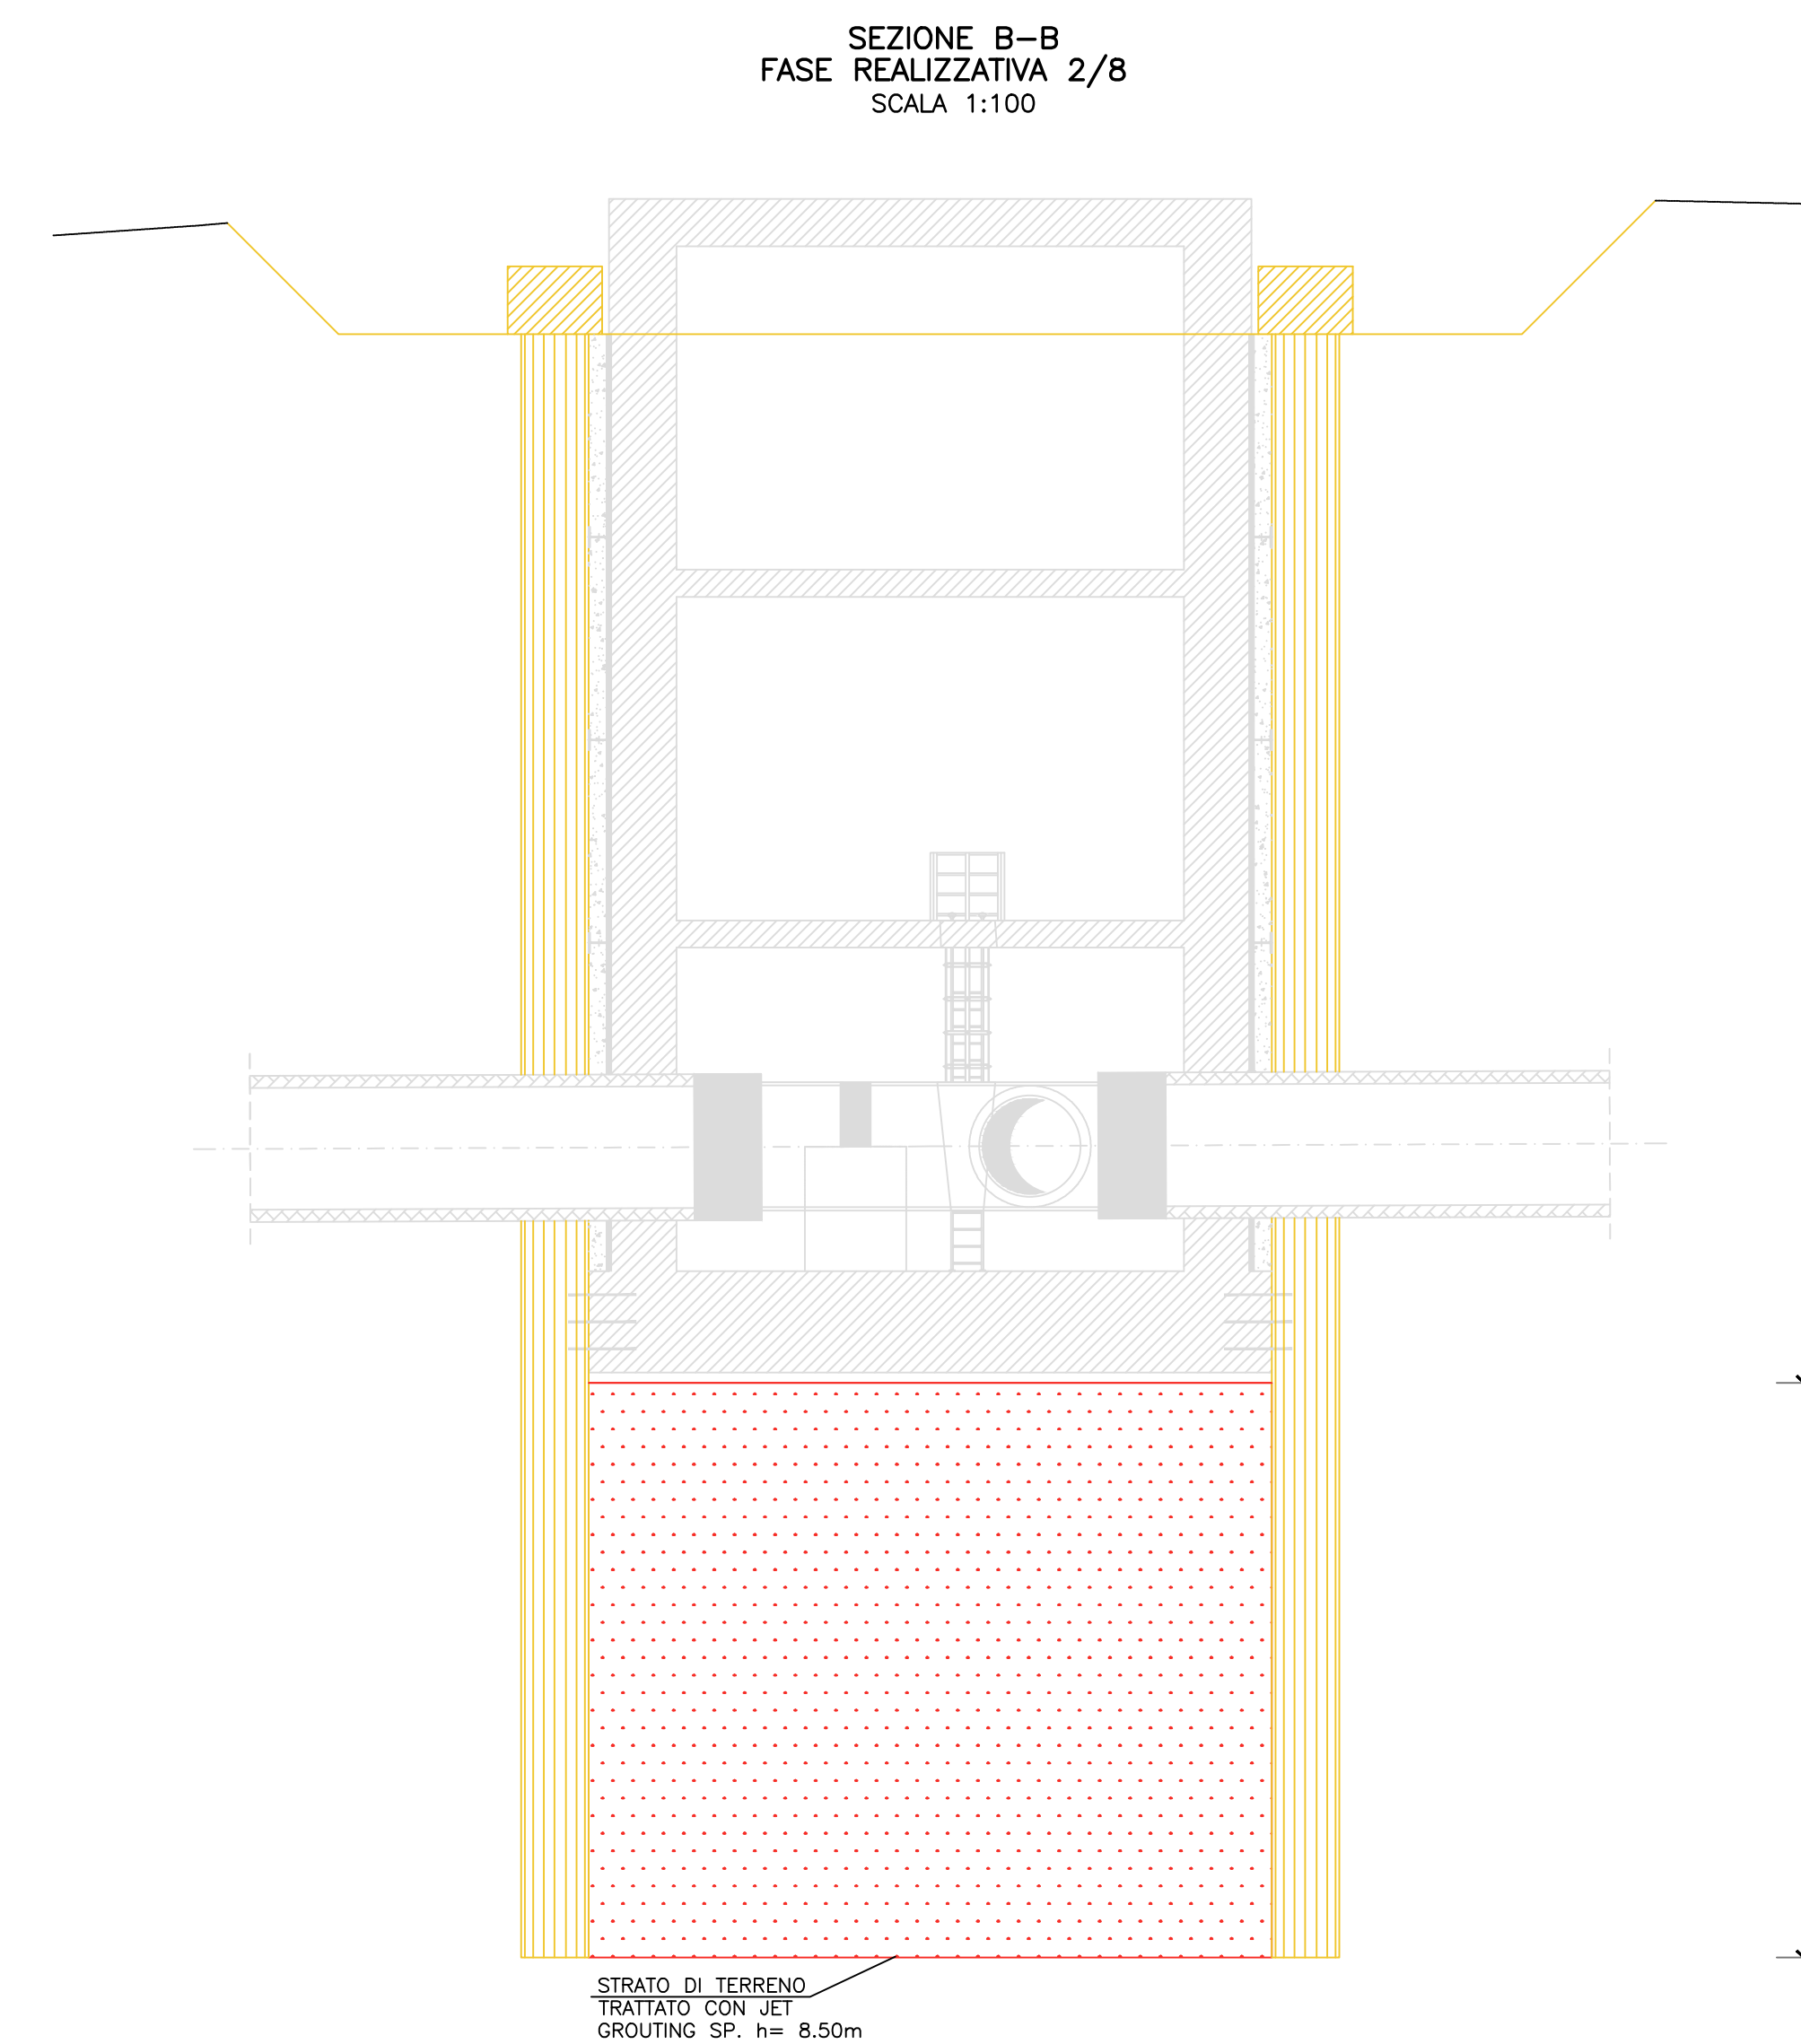

FASE REALIZZATIVA 2/8:  
 • TRATTAMENTO DELLO STRATO DI TERRENO CON JET GROUTING SP. h= 6,50m

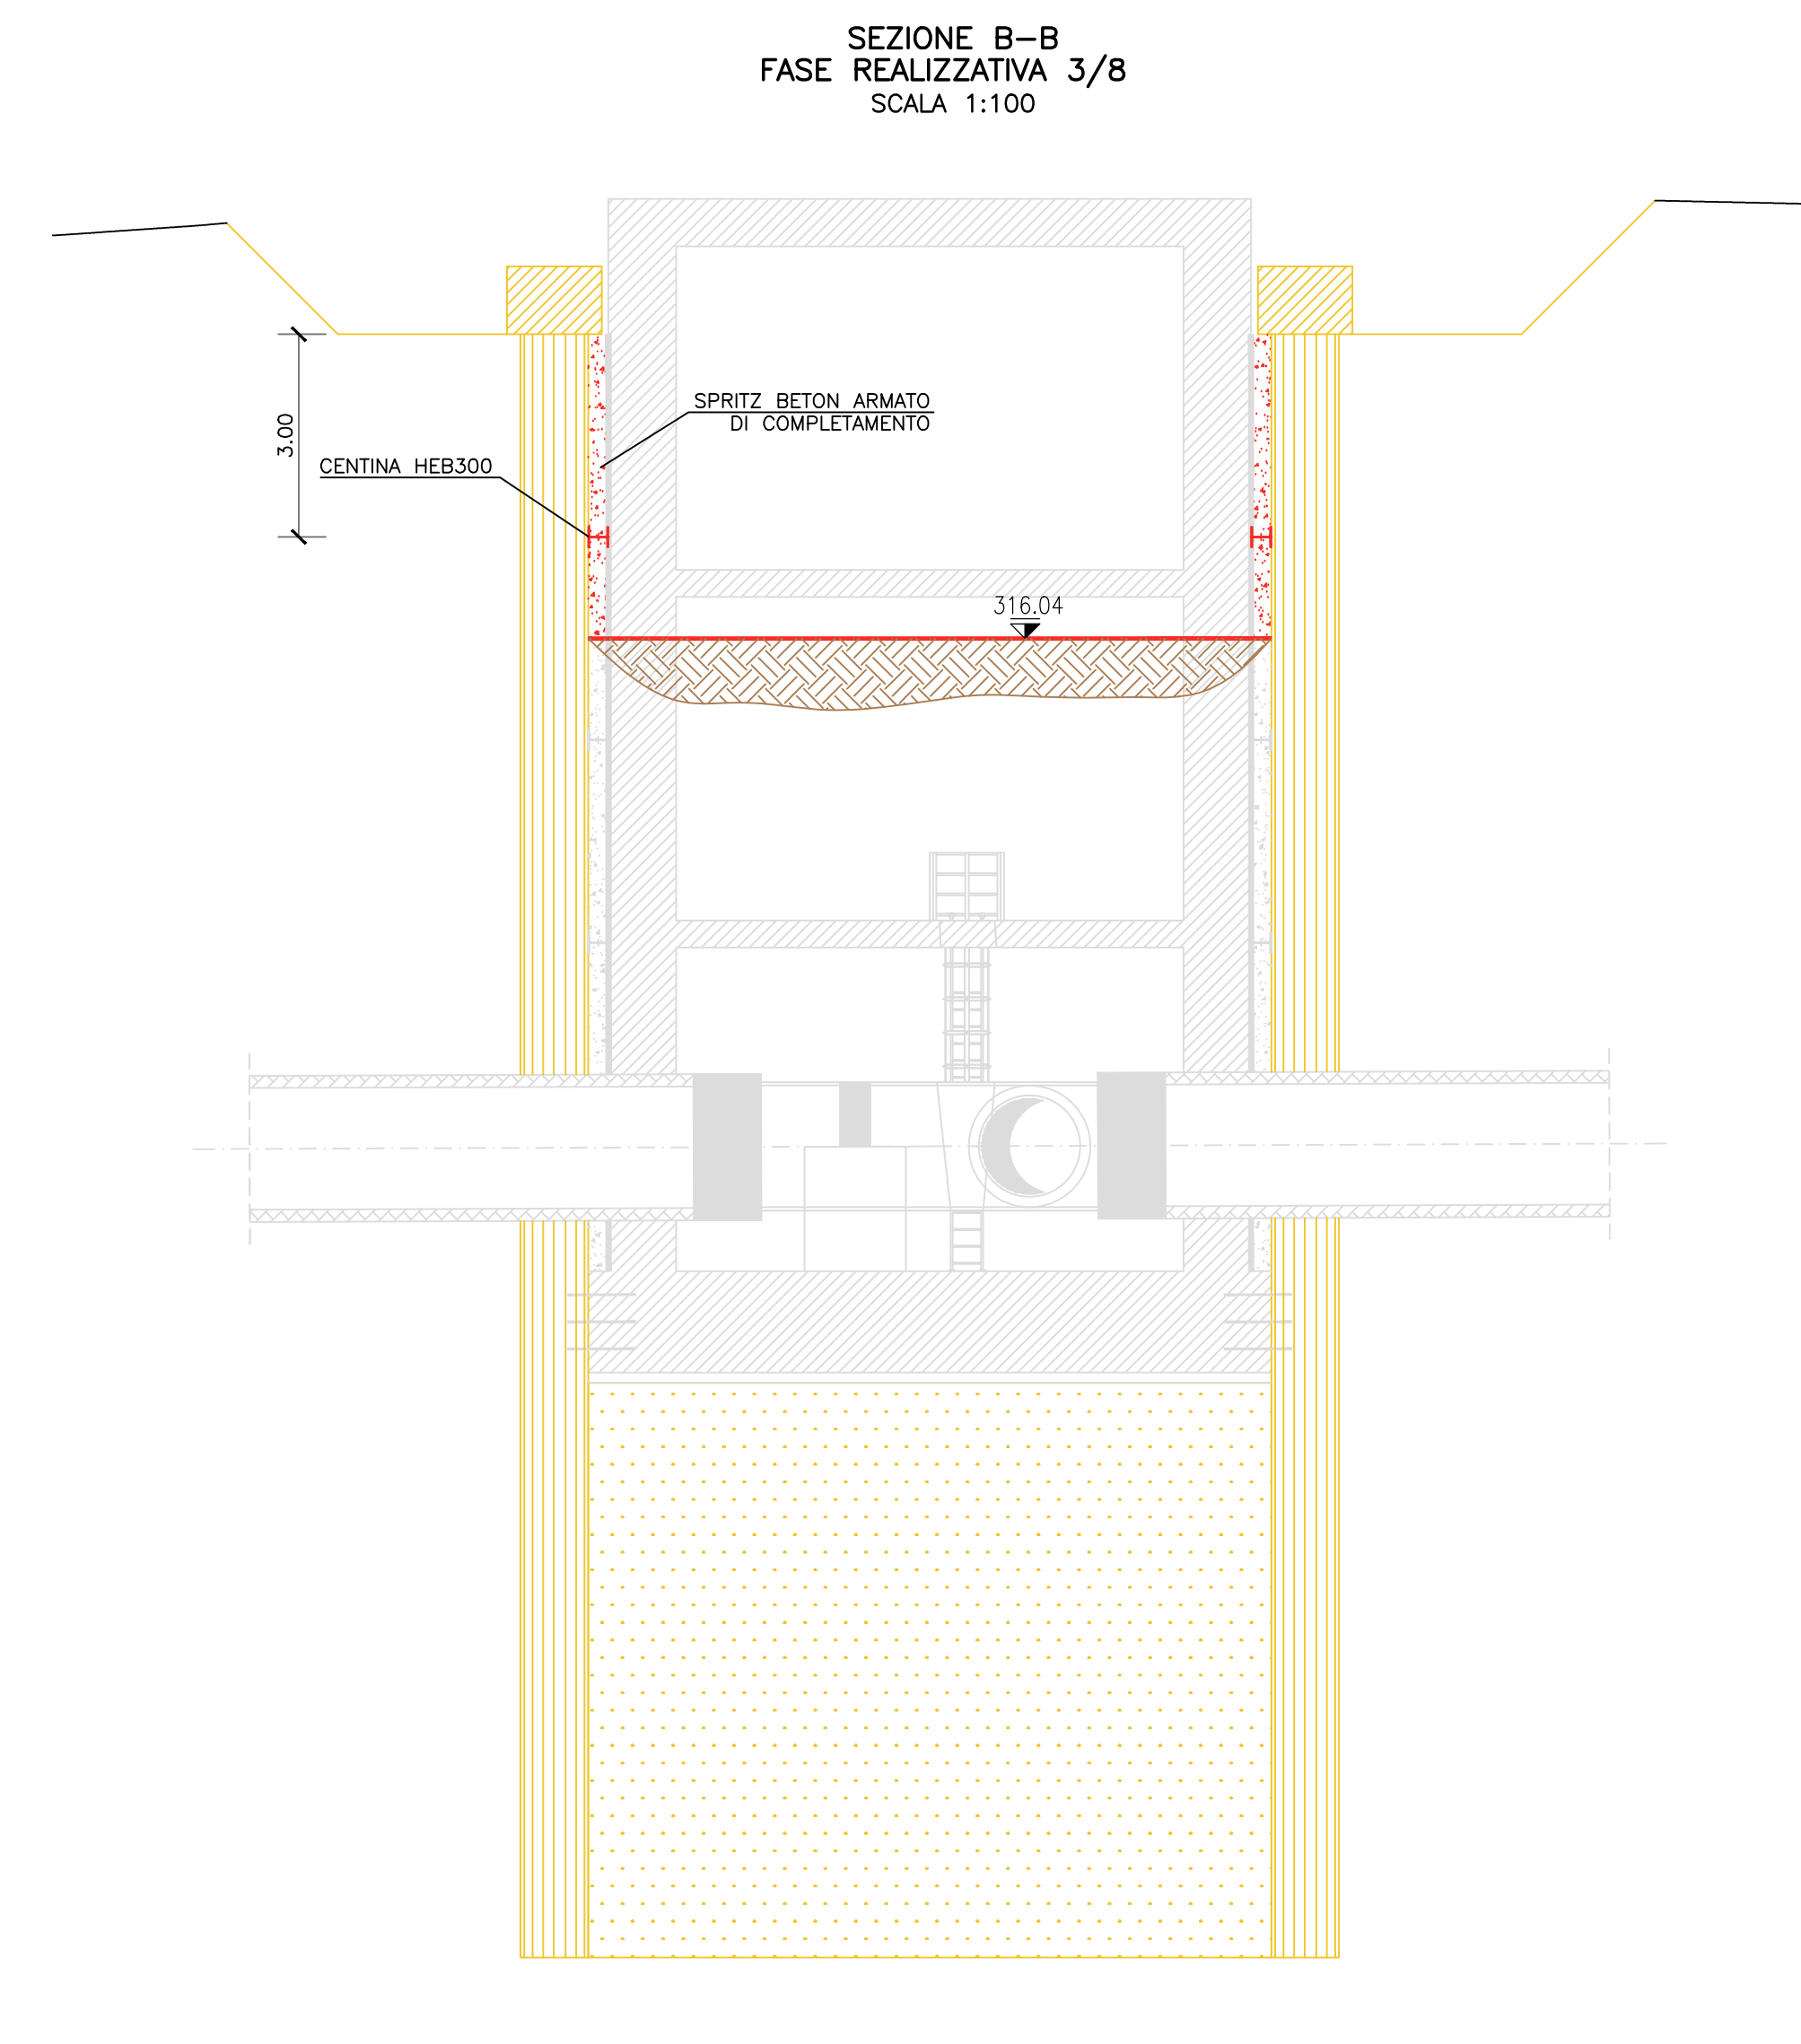


FASE REALIZZATIVA 3/8:  
 • ESECUZIONE PER FASI DELLO SCAVO E POSA IN OPERA DI CENTRI METALLICHE (HEB 300) A PANTONAMENTO DELLA PARATA SCAVO FINO A QUOTA 316,04  
 • REALIZZAZIONE SPRITZ BETON ARMATO FINO A QUOTA 316,04

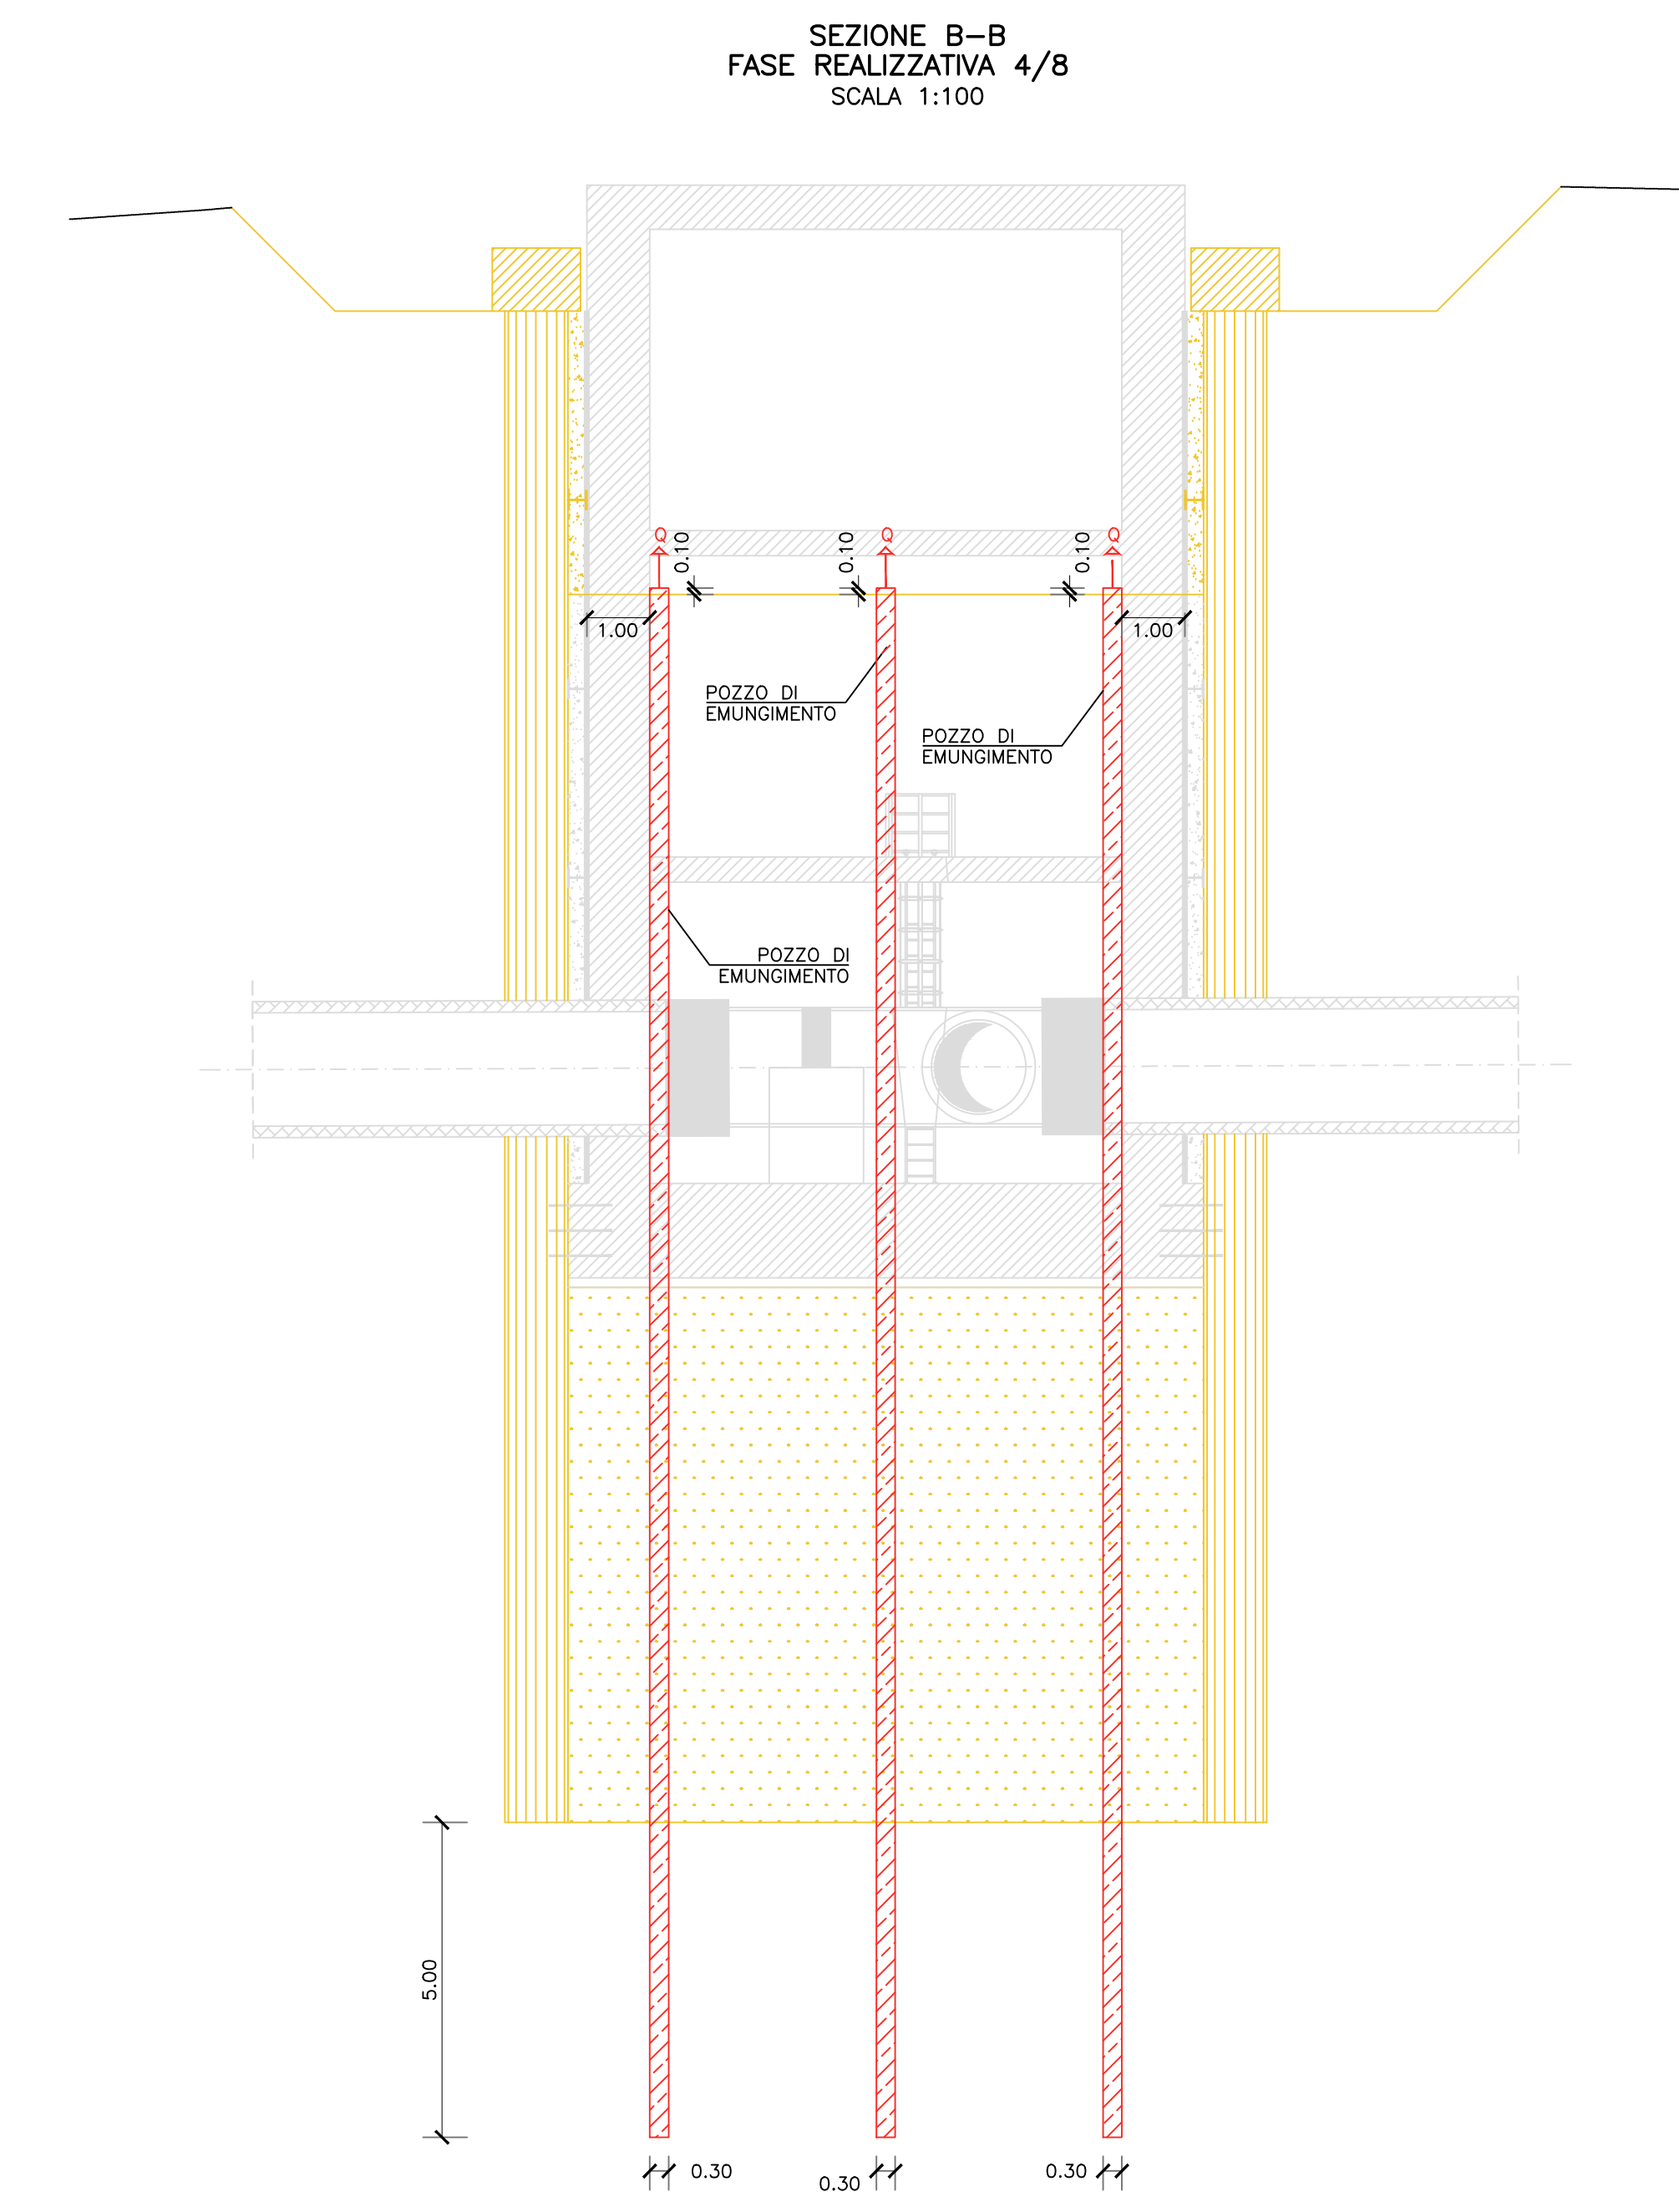


FASE REALIZZATIVA 4/8:  
 • REALIZZAZIONE DI N. 5 POZZI DI EMUNGIMENTO PER IL CONTROLLO DELLE PRESSIONI INTERSTIZIALI AL BASE DELLO SPESORE DI TERRENO TRATTATO.  
 • INSTALLAZIONE DI PIEZOMETRI DI CONTROLLO DELLE PRESSIONI INTERSTIZIALI.

FASE REALIZZATIVA 4/8  
 DISTRIBUZIONE IN PIANTA DEI  
 POZZI DI EMUNGIMENTO E DEI  
 PIEZOMETRI DI CONTROLLO  
 SCALA 1:100

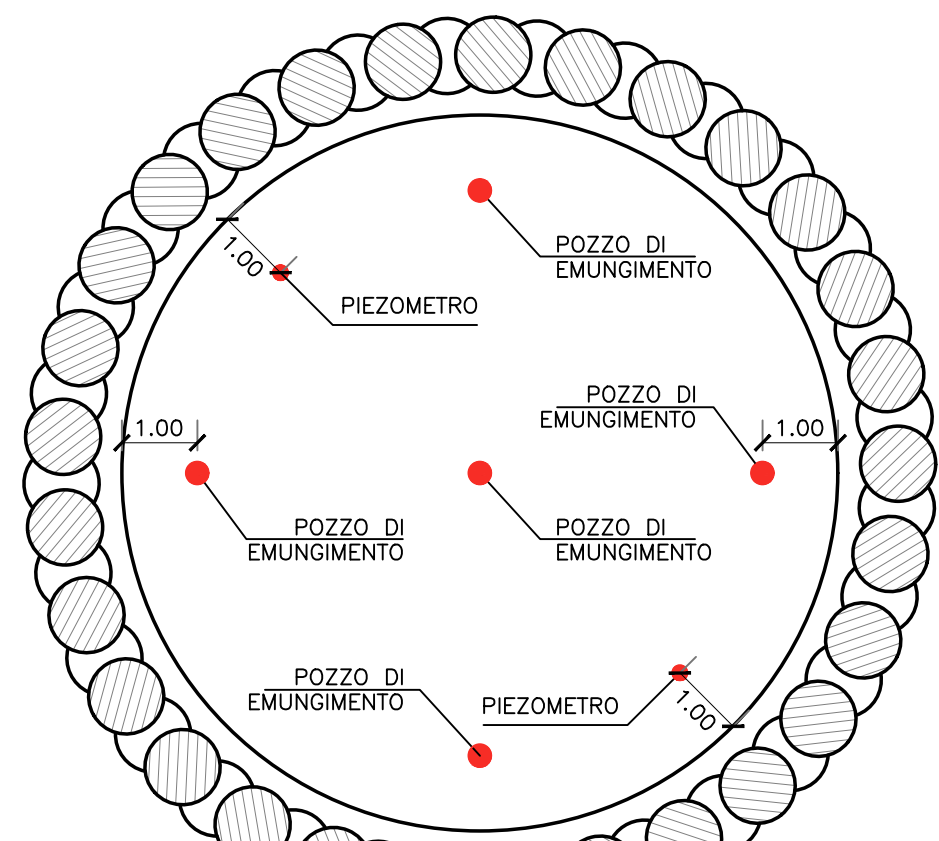


PARTICOLARE  
 POZZI DI EMUNGIMENTO

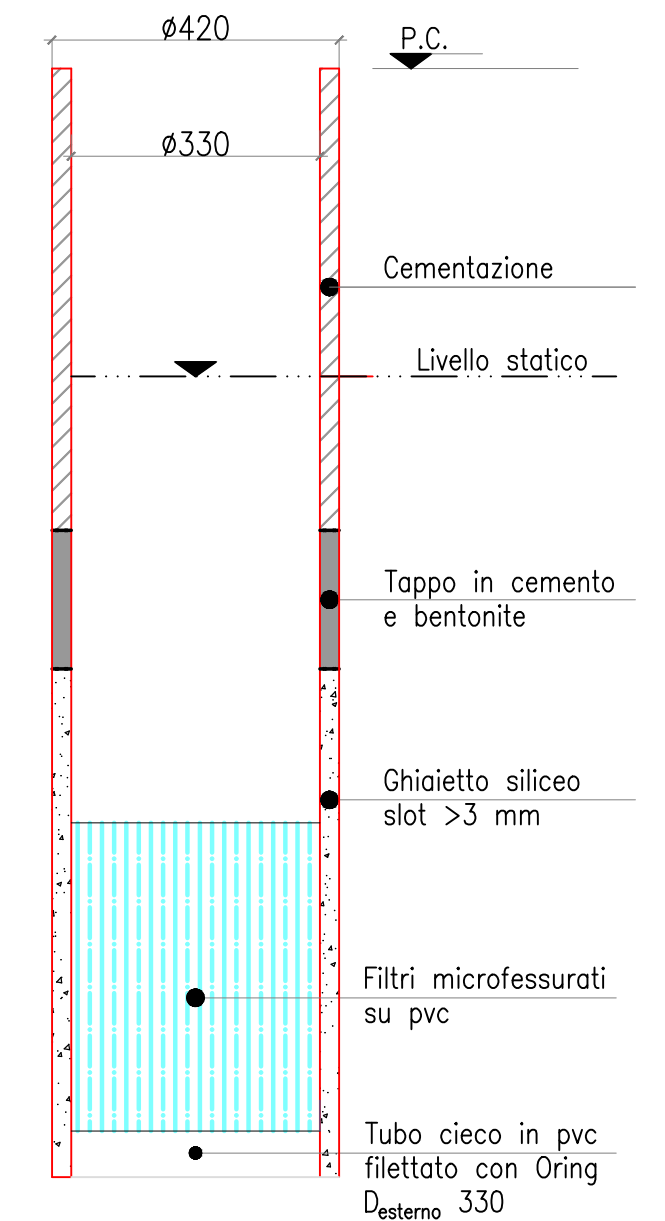


POZZO  
 DI EMUNGIMENTO


LEGENDA  
 ■ Elementi da realizzare nella fase in oggetto  
 ■ Elementi realizzati nelle fasi precedenti  
 ■ Elementi da realizzare nelle fasi future

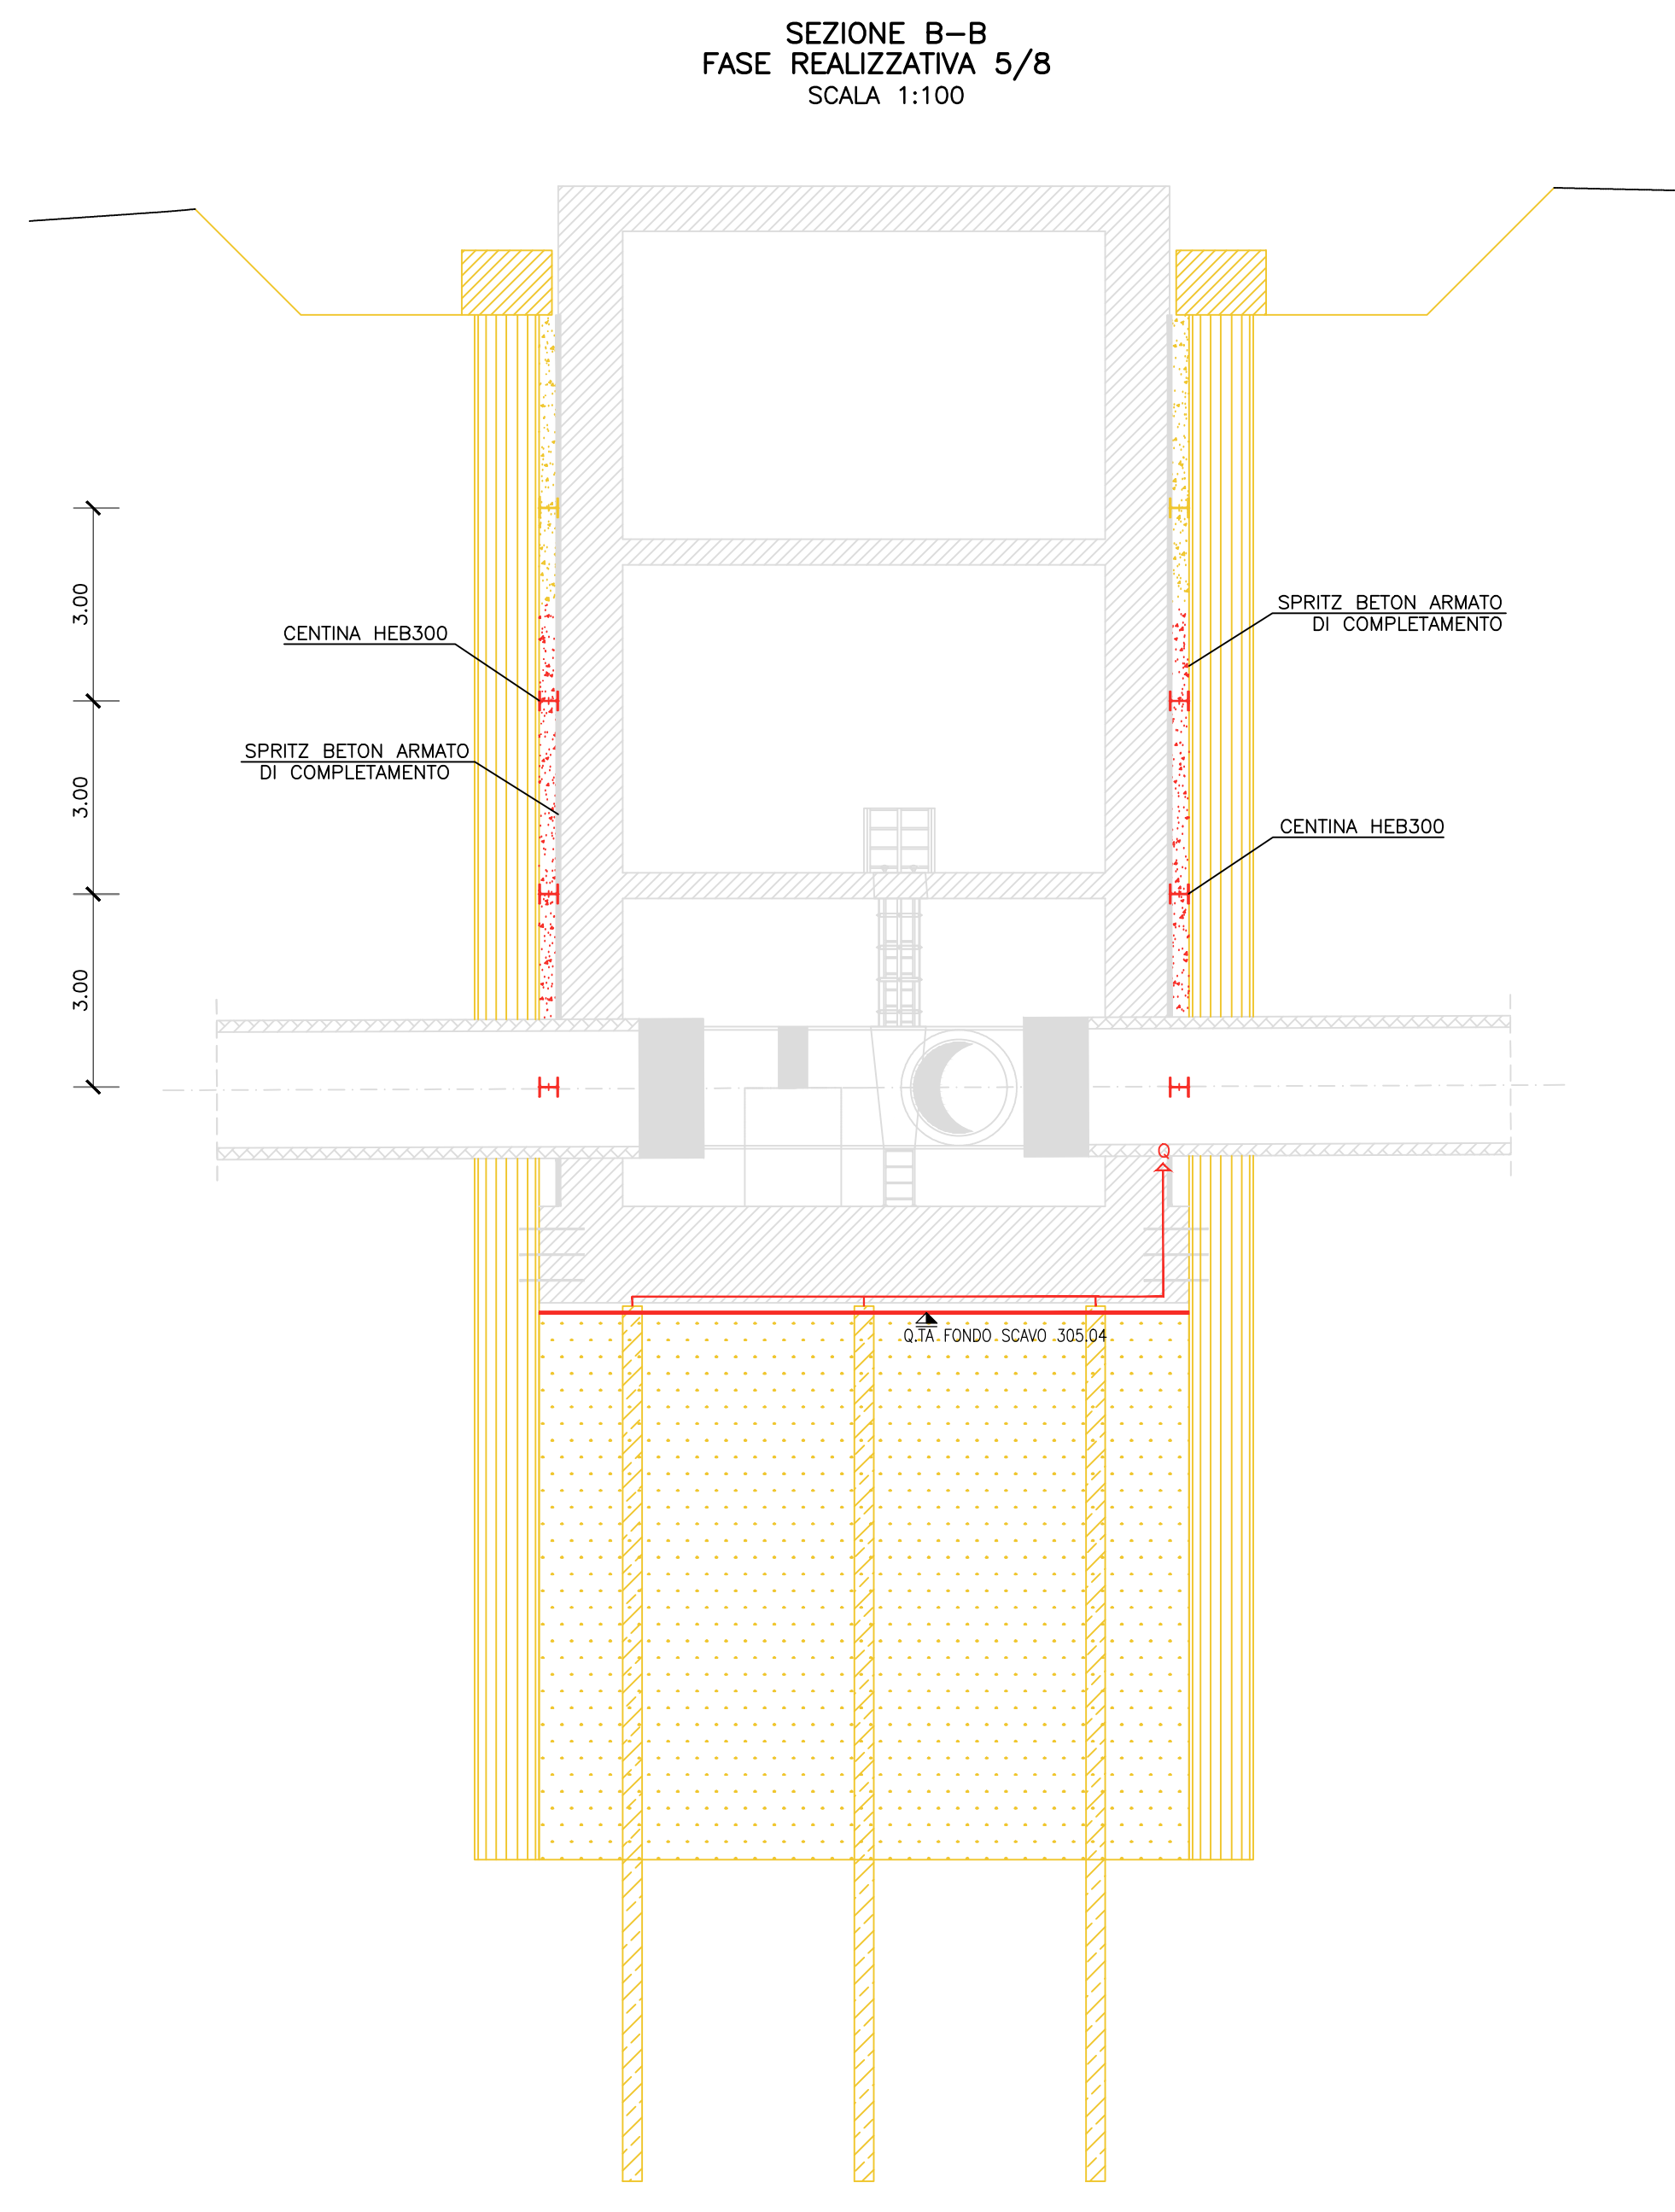


FASE REALIZZATIVA 5/8:  
 • A VALLE DELL'ESTRO POSITIVO DEI CONTROLLI APPROFONDIMENTO FINO A FONDI SCAVO PER FASI, CON POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI HEB 300 AD INTERASSE 3,00m. CONTROLLO DI EVENTUALI FILTRAZIONI A FONDO SCAVO.

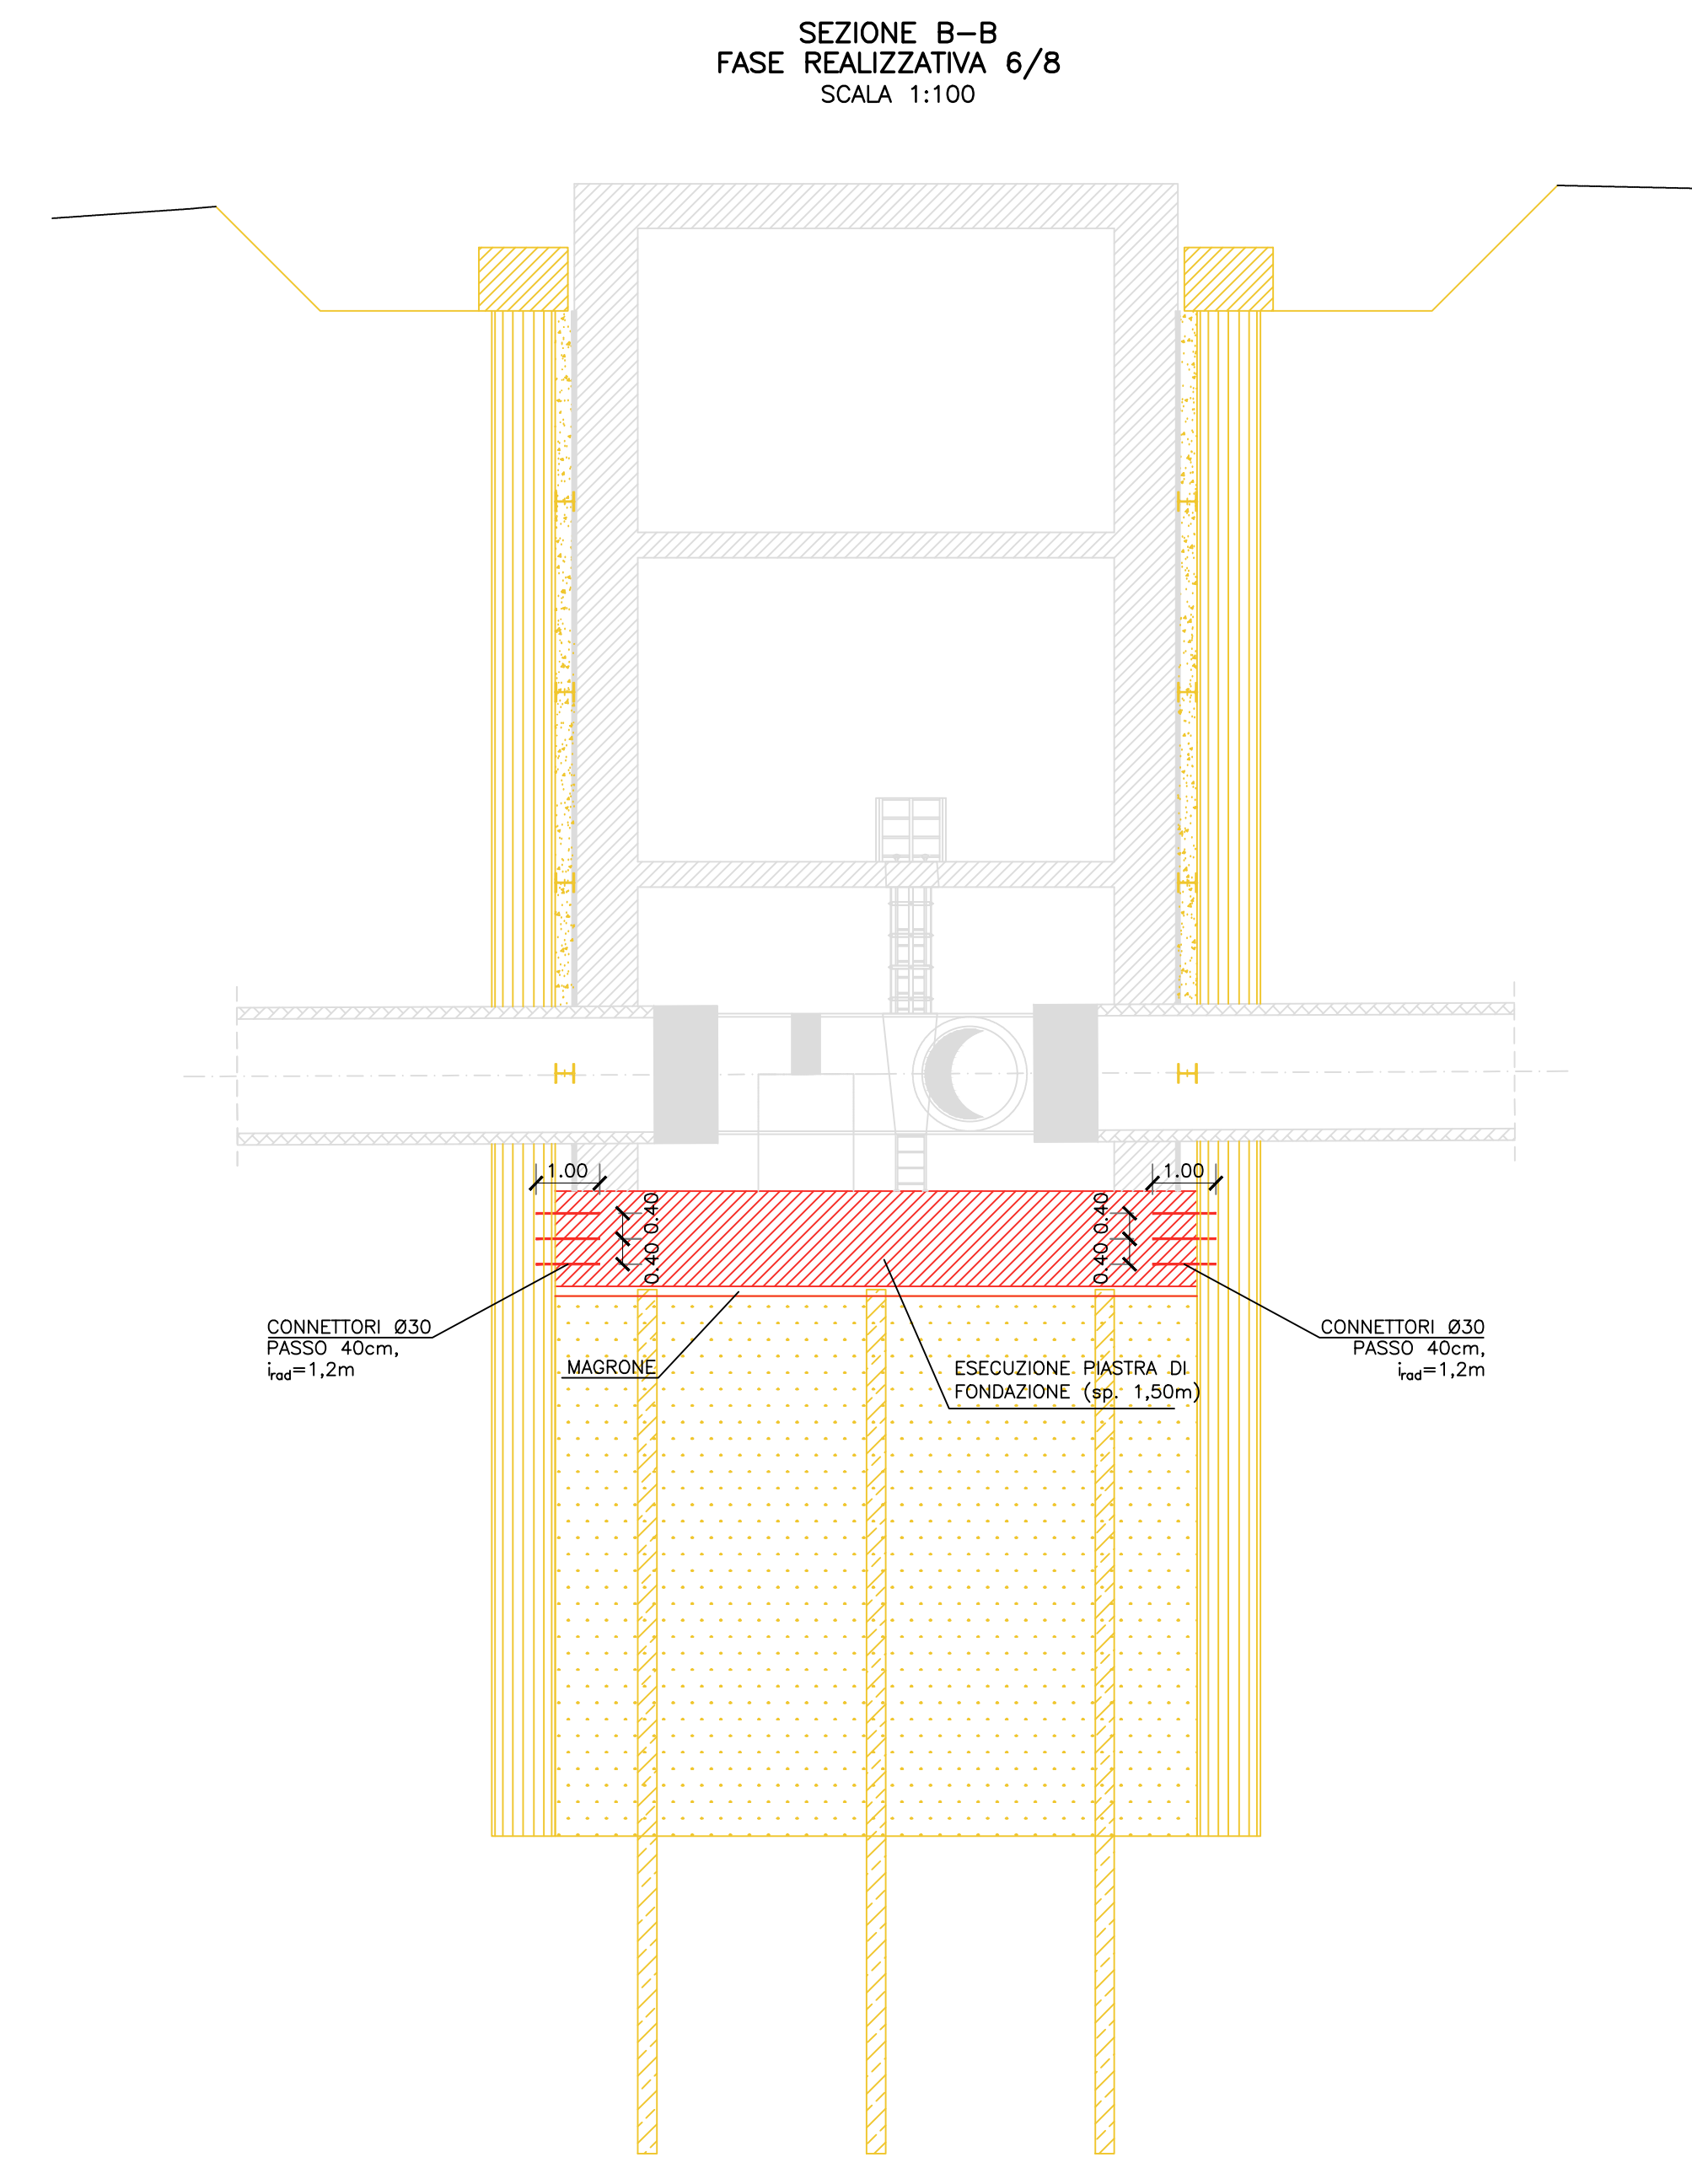

FASE REALIZZATIVA 6/8:  
 • REALIZZAZIONE MACCHINE DI PULIZIA (sp. 15cm), CASERATURA E ARMATURA DELLA PIASTRA DI FONDAZIONE E REALIZZAZIONE CORRETTORI A TAGLIO TRA PALI E STRUTTURA.  
 • GETTO DELLA PIASTRA DI FONDAZIONE (sp. 1,20m).  
 • MATURAZIONE CLS E RIDUZIONE, OGNERO ANNULLAMENTO DELL'ASSOTTIMENTO IN DIPENDENZA DEI VALORI STIMATI DEL FATTORE DI SICUREZZA A GALLEGGIAMENTO.

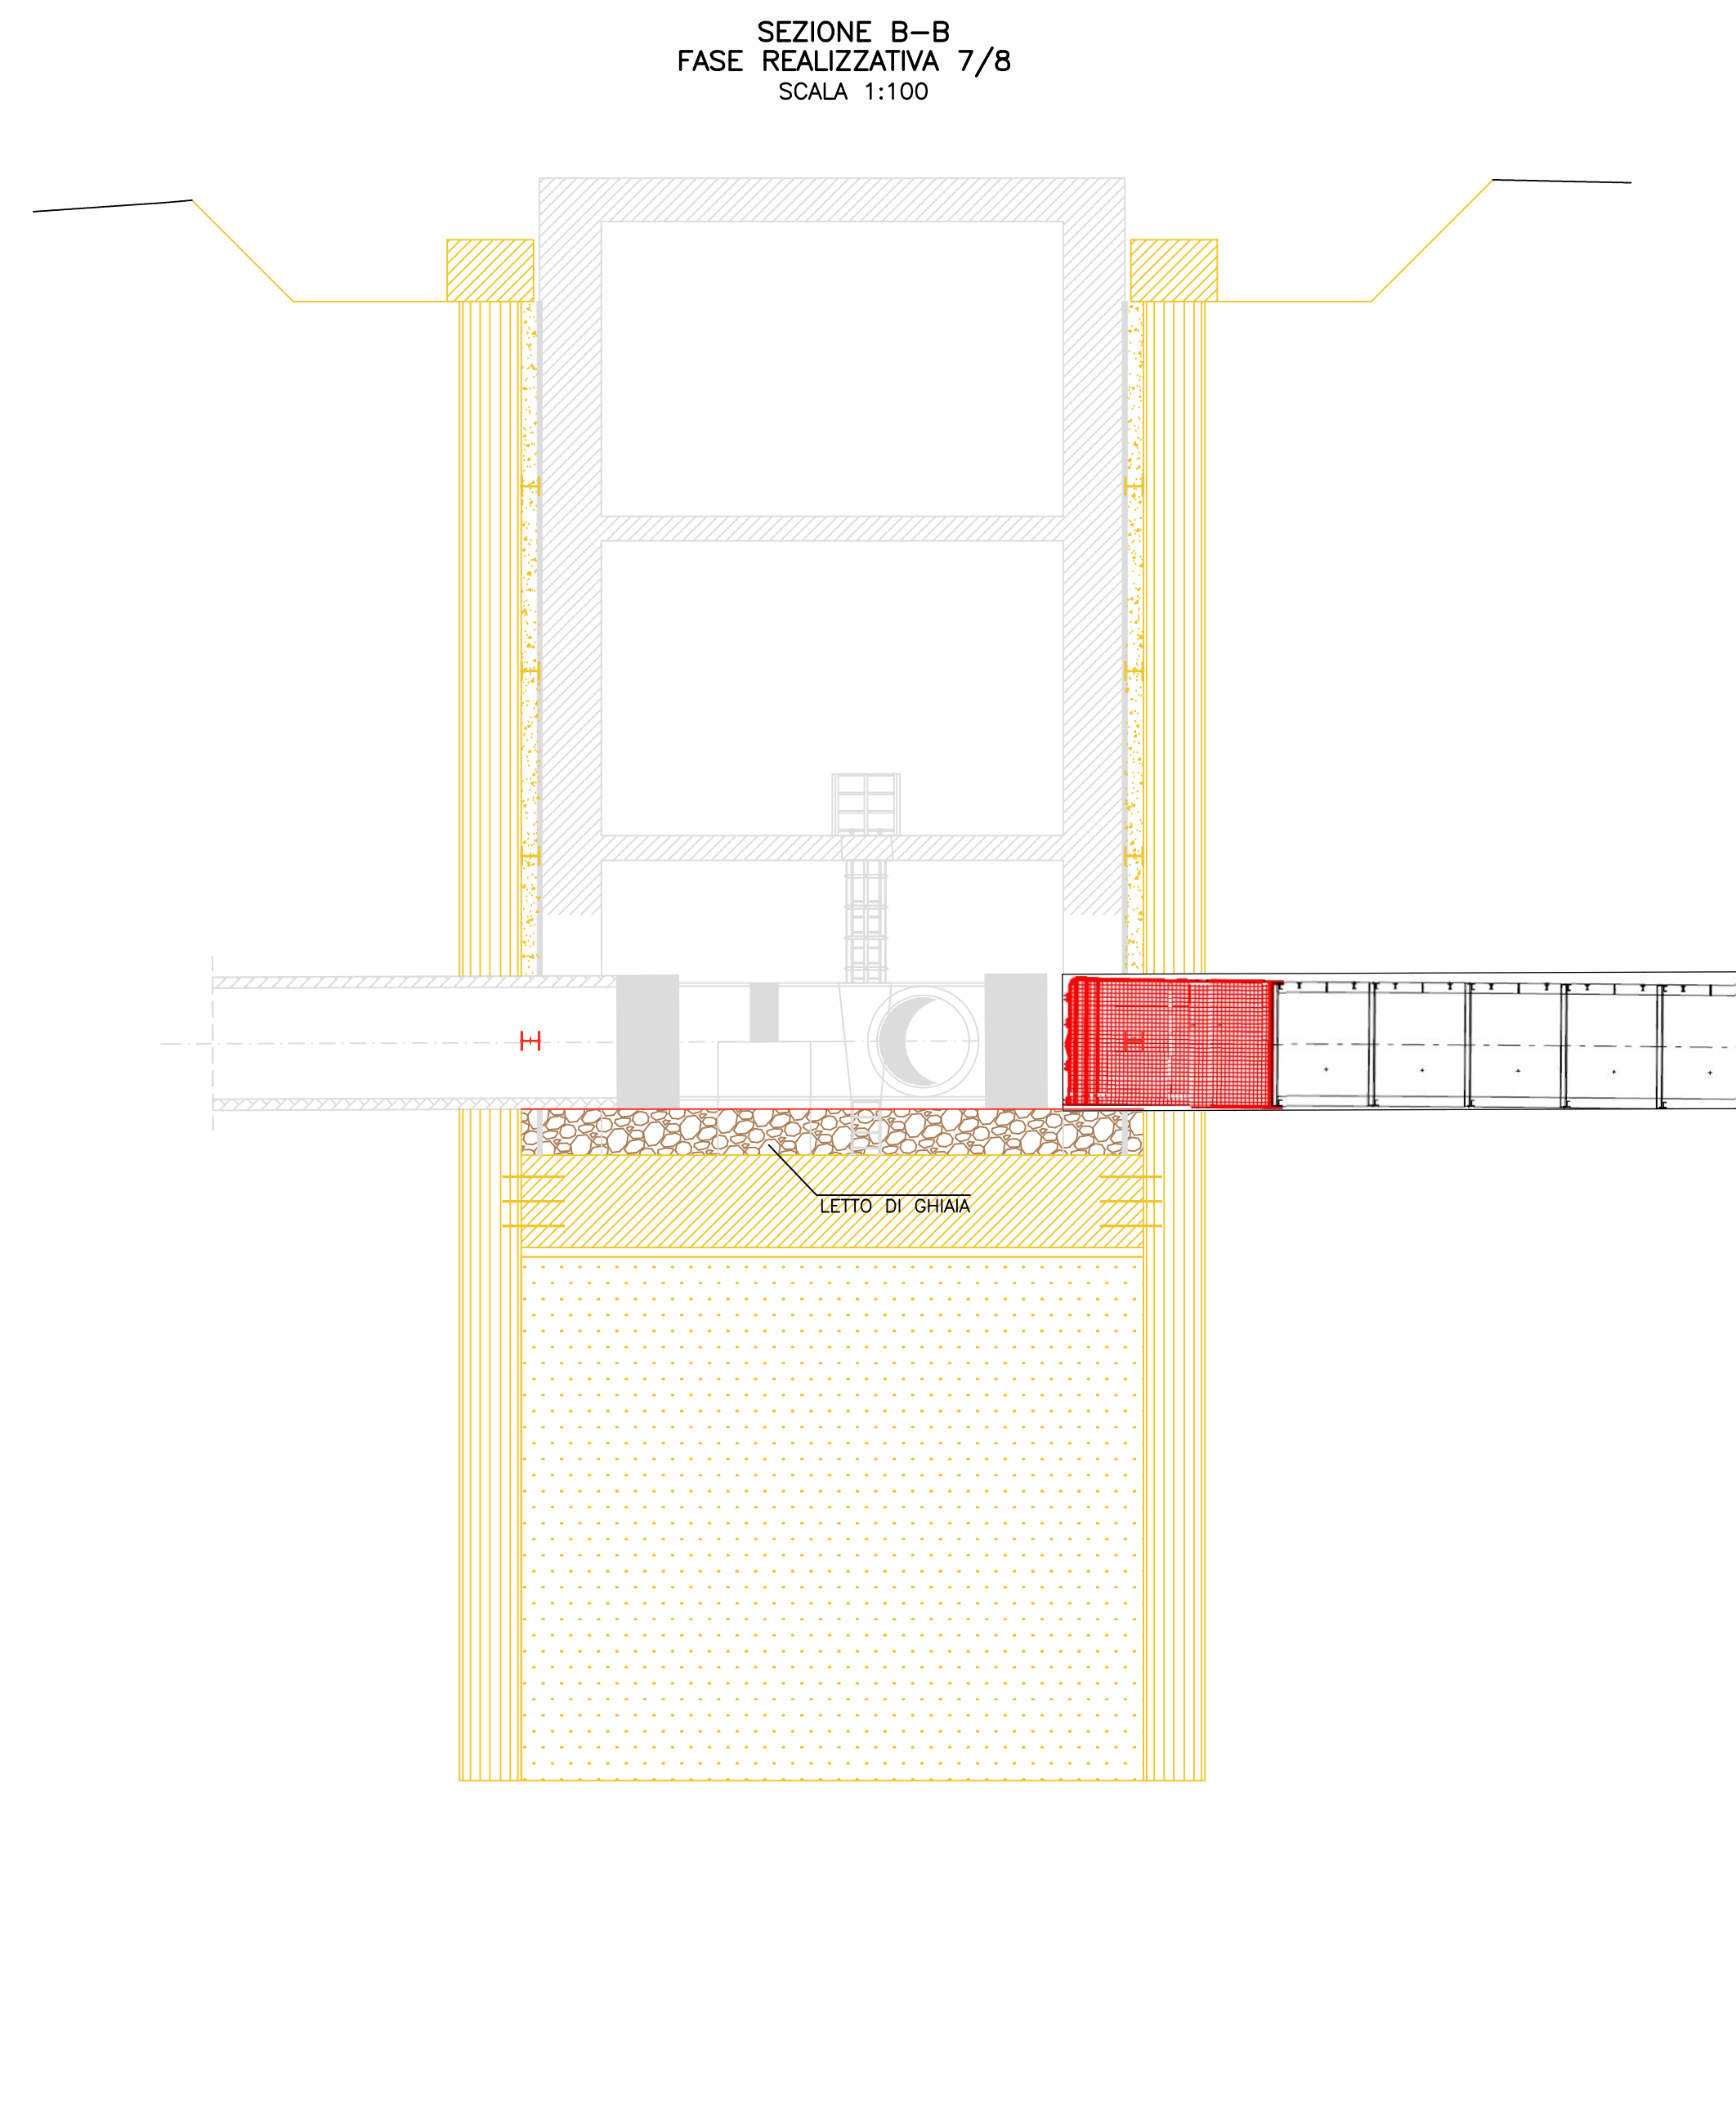

FASE REALIZZATIVA 7/8:  
 • RIMOZIONE CENTRE CHE INTERFERISCONO CON IL MICROTUNNELING  
 • REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO CON LETTO DI GHIAIA (DA RIMOVERE A VALLE DELLA LAVORAZIONE) PER ARRIVO DELLA MACCHINA.  
 • ARRIVO MICROTUNNELING DAL PZ1 E SUCCESSIVAMENTE DAL PZ2.

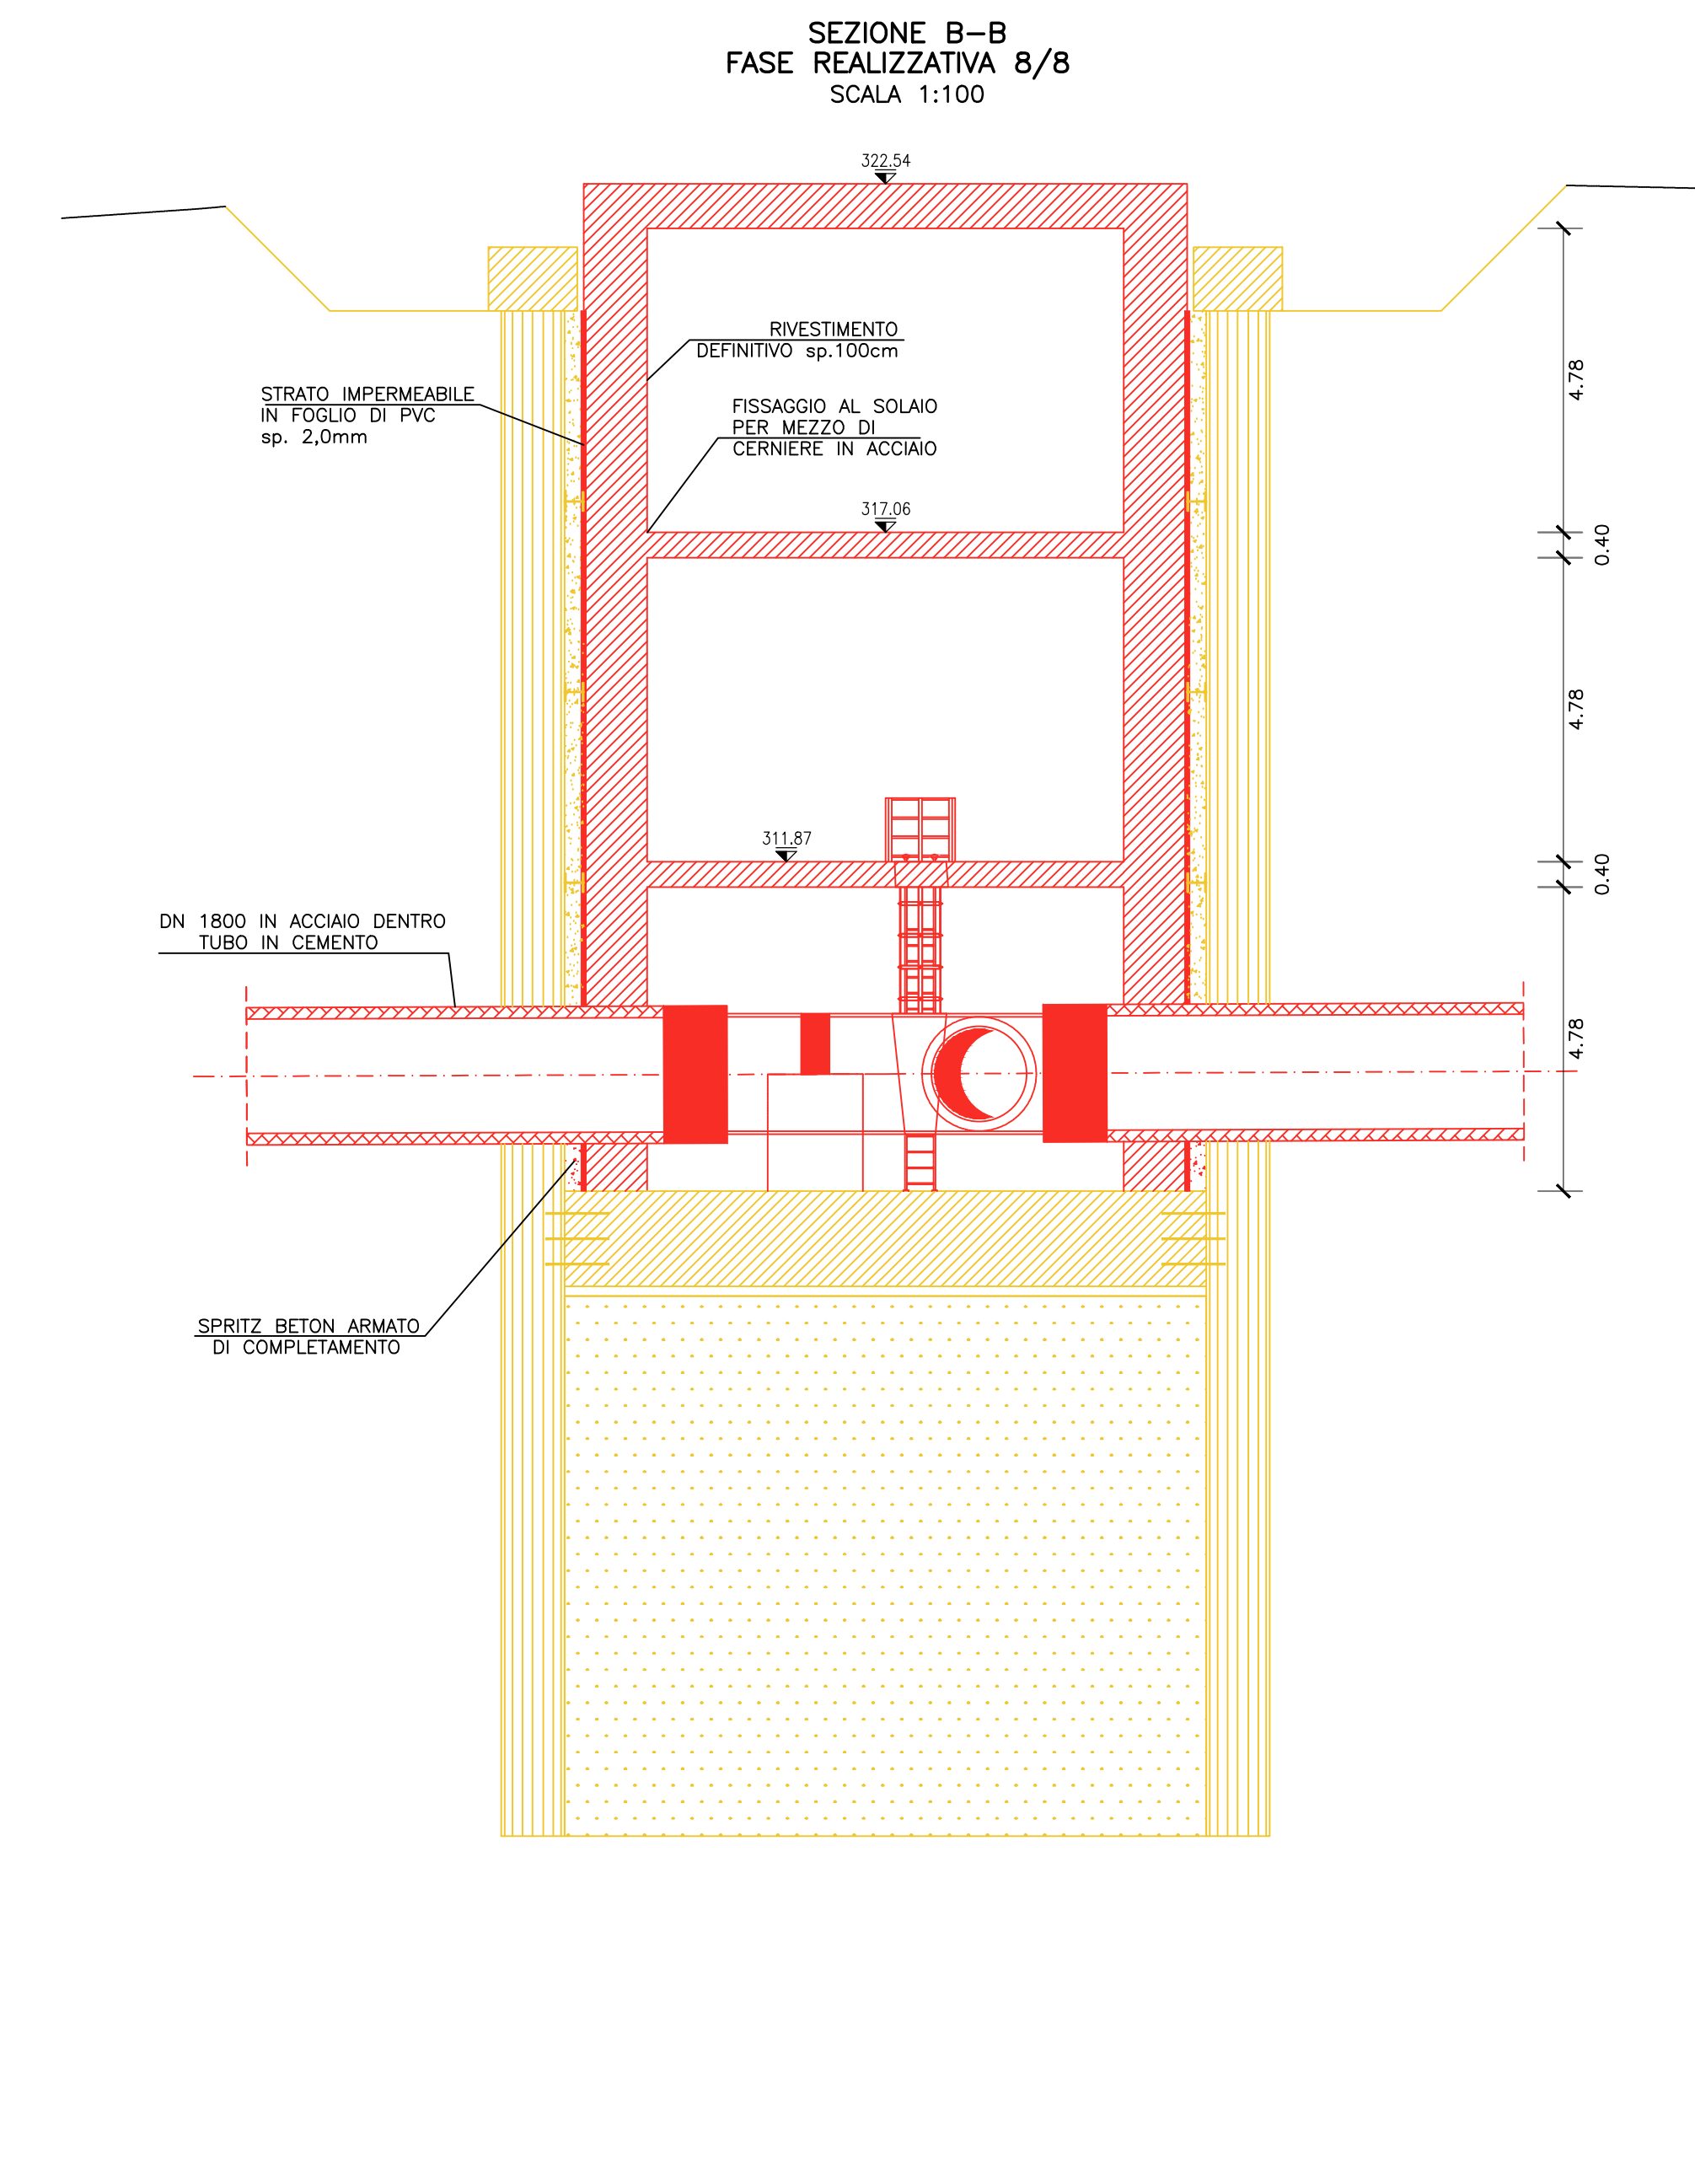

FASE REALIZZATIVA 8/8:  
 • REALIZZAZIONE SPRITZ BETON ARMATO FINO A QUOTA 306,69.  
 • POSA STRATO IMPERMEABILE IN FOGLIO DI PVC SP. 2,0MM  
 • REALIZZAZIONE PER FASI DELLA STRUTTURA DEFINITIVA IN ALTEZZA RIVESTIMENTO DEFINITIVO sp. 1,20m SOLAIO INTERMEDIO (sp. 40 cm).  
 • POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI E DELLE APPARECCHIATURE.  
 • CHIUSURA ASOLE DI ACCESSO CON CHIUSI A TENUTA STAGNA.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
 MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA  
 ACQUEDOTTISTICO DEL PESCHIERA PER  
 L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  
 DI ROMA CAPITALE E DELL'AREA METROPOLITANA  
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. PAB MASSIMO SESSA  
 SUB COMMISSARIO ING.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Ing. PhD Alessio Della Site  
**SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
 Dott. Avv. Mirko Genelli  
 Sig.ra Claudia Iacovi  
 Ing. Barbara Puga

CONSULENTE  
 Ing. Biagio Ermano

ELABORATO  
**A250PDS D090 0**  
**COD. ATQ2 AAM10118**

DATA: OTTOBRE 2022 SCALA: VARIE

AGG. N. DATA NOTE FIRMA

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6

Sottoprogetto  
**NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO - I LOTTO**  
 DAL MANUFATTO ORIGINE AL SIFONE CERASO  
 (con il finanziamento dall'Unione europea - Next Generation EU)

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

POZZO 2 TR4  
 FASI DI ESECUZIONE

TEAM DI PROGETTAZIONE  
 CAPO PROGETTO: Ing. Paolo Pasini  
 COLLABORATORI: Ing. Matteo Bonardi, Ing. Emiliano Altomasi, Ing. Francesco Giorgi, Ing. Roberto Bini, Ing. Claudio Lancia, Ing. Riccardo Venuto, Ing. Paolo Pasini, Ing. Roberto Bini, Ing. Claudio Lancia, Ing. Riccardo Venuto, Ing. Paolo Pasini, Ing. Roberto Bini, Ing. Claudio Lancia, Ing. Riccardo Venuto.
