


LEGENDA SICUREZZA

Simbolo	Descrizione
	PONTEGGIO A SERVIZIO DEL POZZO PER ENTRATA/USCITA ORDINARIA
	PARAPETTO SUL PERIMETRO SOMMITALE DEL POZZO PER MITIGAZIONE RISCHIO CADUTA IN PROFONDITÀ
	ACCESSO AL PONTEGGIO CON ANDATOIA

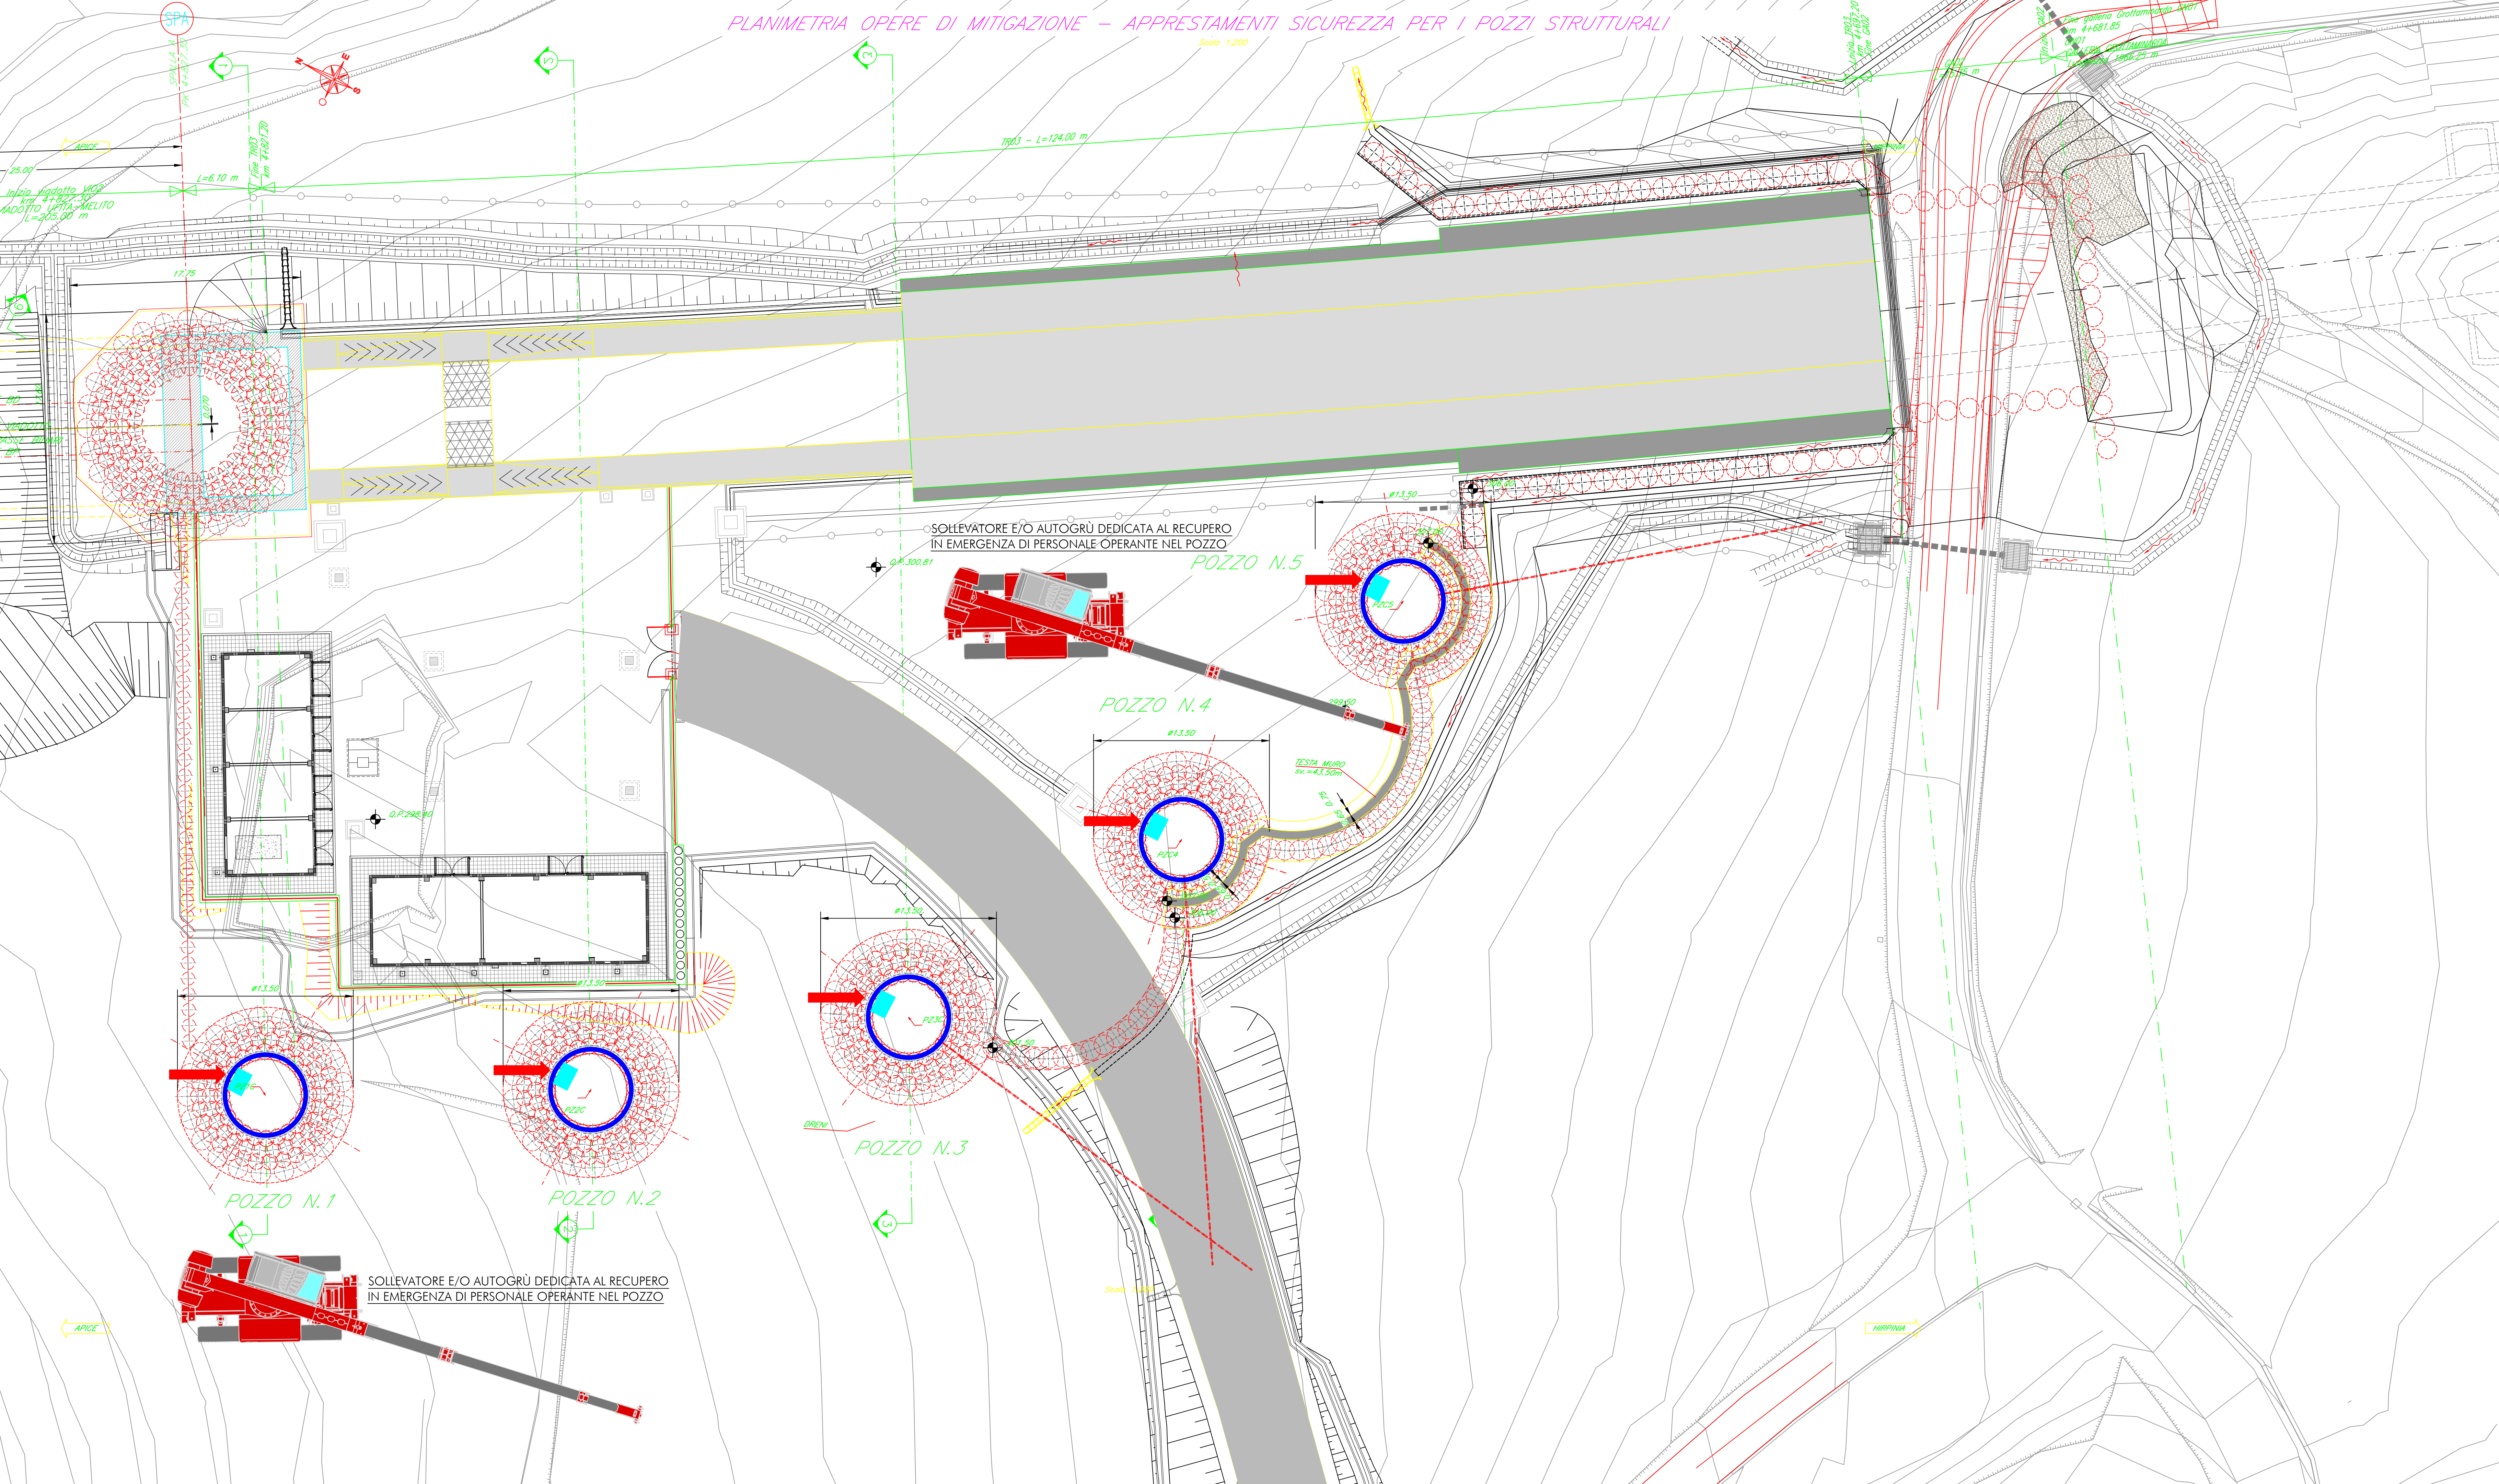

MISURE DI COORDINAMENTO SICUREZZA

RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI DURANTE L'ESECUZIONE DEI POZZI:

- PROCEDERE ALLA MISURAZIONE DEL CONTENUTO DI OSSIGENO DURANTE LE FASI DI SCAVO MEDIANTE STRUMENTO MANUALE
- PREVEDERE ILLUMINAZIONE ORDINARIA ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON BATTERIA A TAMPONE
- ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA: 1 CORPO ILLUMINANTE OGNI 5.00 m DI PROFONDITÀ
- PREVEDERE LA PRESENZA DI SOLLEVATORE TELESCOPICO E/O AUTOGRÙ PER IL RECUPERO IN EMERGENZA INTERNO POZZO
- DURANTE LE ATTIVITÀ INTERNO POZZO PREVEDERE UN ADDETTO PREPOSTO A PIANO CAMPAGNA IN COLLEGAMENTO VISIVO E COMUNICATIVO RADIO-TRASMETTENTE CON IL PERSONALE INTERNO

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE: SOCI:

PROGETTAZIONE: MANDANTI:

**PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA**  
**I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA**  
**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**  
**INQUADRAMENTO GENERALE**  
 "Variante 21 - Opere di mitigazione movimenti franosi tra la PK 4+095 e PK 5+090"  
 Presidi Fissi per la Sicurezza durante l'esecuzione dei Pozzi Strutturali

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA	R.D.L.
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Minerva 21/05/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casarà	 Ing. A. Palmombi Ing. N. Baravani	Responsabile dei lavori Ing. S. Esuli

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA
IF28	01	V	ZZ	PU	SZ0000	212	B	1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Revisione a seguito richiesta	A. Palmombi	21/05/22	A. Casarà	21/05/22	A. Casarà	21/05/22	Ing. S. Esuli
B	Revisione a seguito richiesta	A. Palmombi	21/05/22	A. Casarà	21/05/22	A. Casarà	21/05/22	
