



SEZIONE A-A
SCALA 1:50

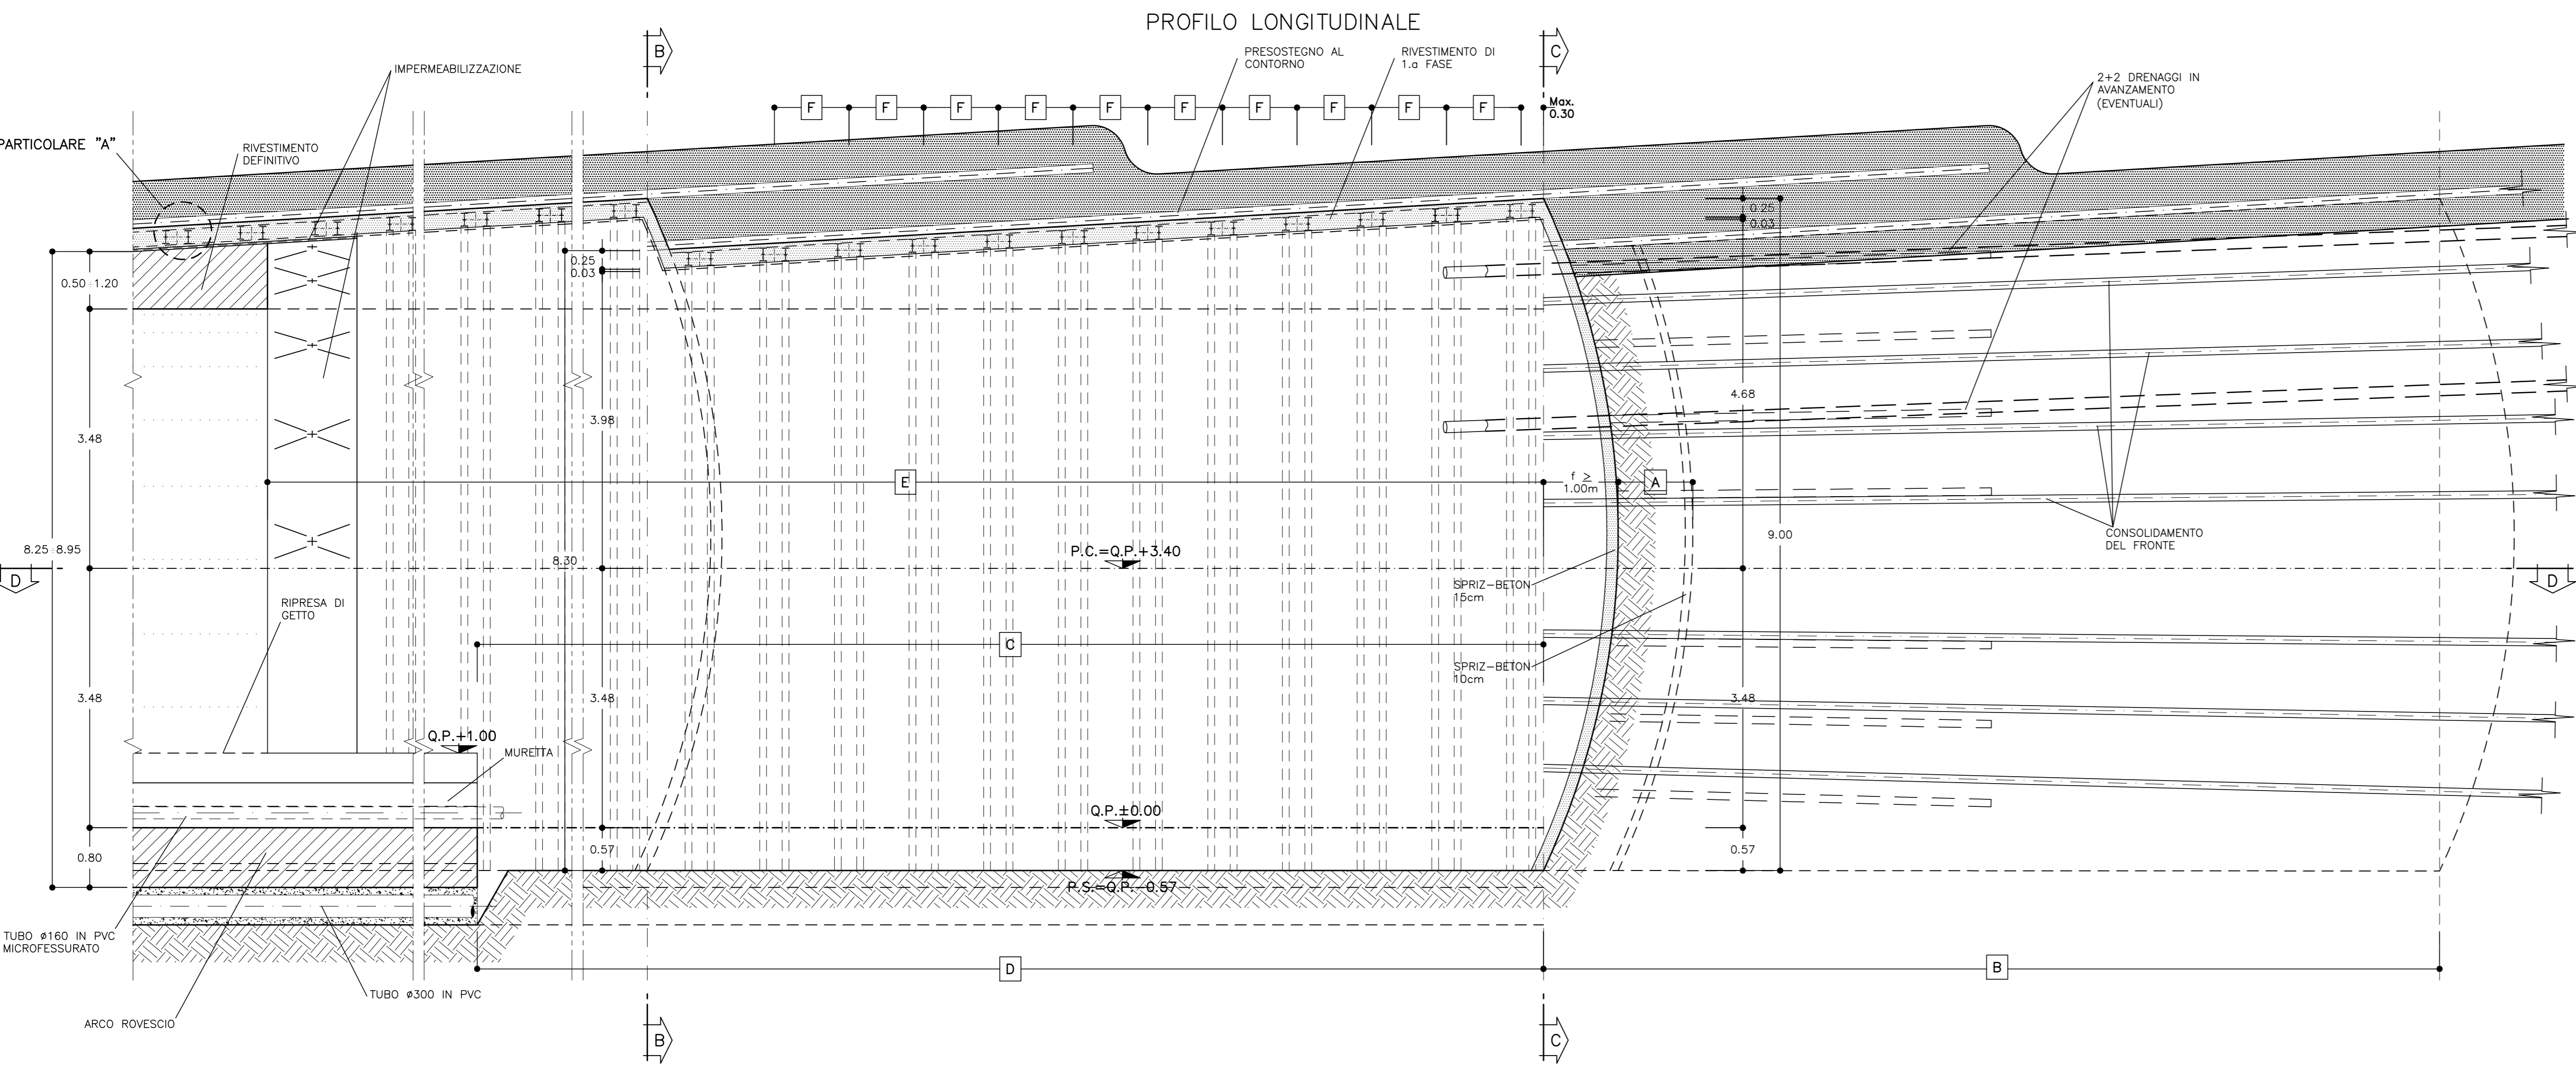

SEZIONE B-B
SCALA 1:50

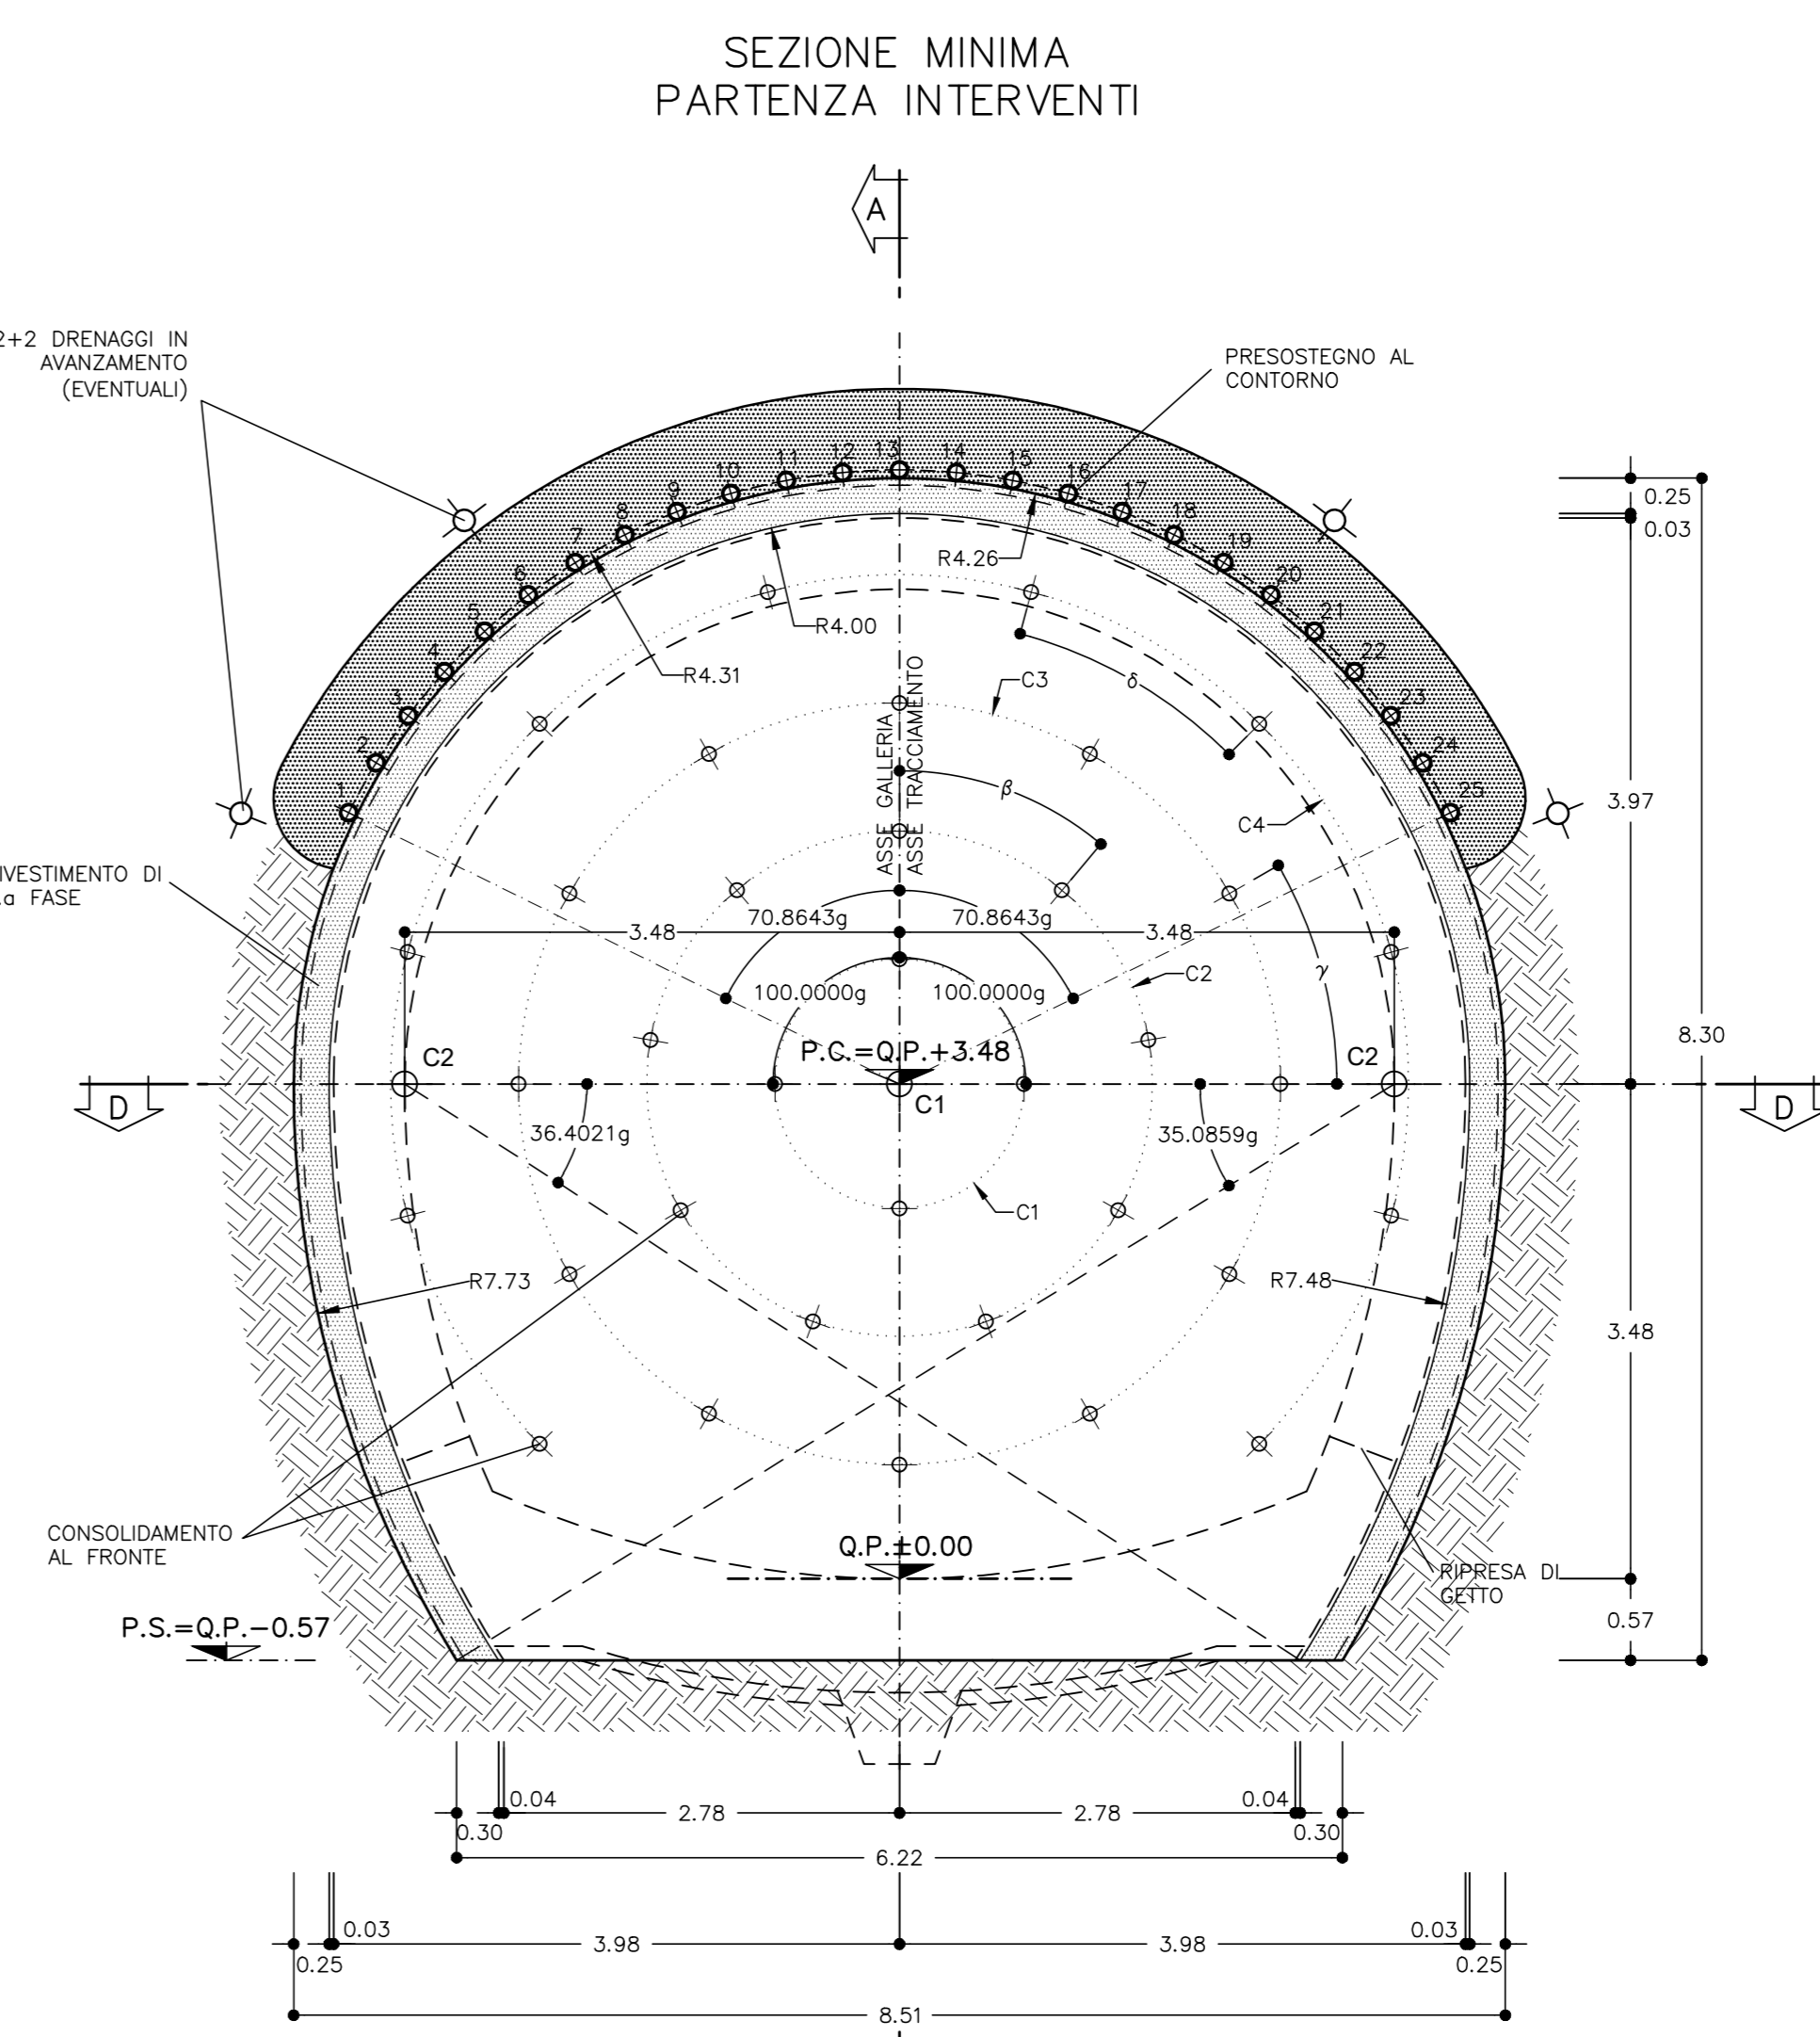

NOTA
PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI FARE RIFERIMENTO ALL'ELABORATO:
Tabella delle caratteristiche dei materiali - cod. PE-GAL-000-GE-010-DC.


- FASI ESECUTIVE**
- FASE 1: ESECUZIONE DEI CONSOLIDAMENTI DEL FRONTE**
- SAGOMATURA DEL FRONTE A FORMA CONCAVA
- MESSA IN OPERA DI UN PRIMO STRATO DI SPRITZ-BETON FIBROFORZATO AL FRONTE
- ESECUZIONE PRECONSOLIDAMENTO AL FRONTE SECONDO LA GEOMETRIA DI PROGETTO CON LE SEGUENTI MODALITA':
A) PERFORAZIONE ESEGUITA A SECCO Ø2100mm
B) INSERIMENTO DEL TUBO IN VIR
C) CEMENTAZIONE DEL TUBO IN VIR OGNI 5-10 FORI (IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'AMMASSO)
- FASE 2: ESECUZIONE DEL PRESOSTEGNO AL CONTORNO DEL CAVO**
- ESECUZIONE DEL PRESOSTEGNO AL CONTORNO SECONDO LA GEOMETRIA DI PROGETTO CON TUBI IN ACCIAIO VALVOLATI E INIZIATI CON LE SEGUENTI MODALITA':
A) PERFORAZIONE ESEGUITA A SECCO Ø >=150mm
B) INSERIMENTO DEL TUBO IN ACCIAIO VALVOLATO
C) FORMAZIONE DELLA "QUAINA" AL CONTORNO DELL'ELEMENTO VALVOLATO, OGNI 5-10 FORI E IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'AMMASSO
D) INIEZIONE IN PRESSIONE. VALVOLA PER VALVOLA.
- FASE 3: ESECUZIONE DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUALI)**
- FASE 4: ESECUZIONE SCAVO**
- LO SFONDO POTRA' AVERE LUNGHEZZA MASSIMA PARI A 1,20m COMPRESO IL DISAGGIO, ESEGUENDO LO SCAVO A PIENA SEZIONE E SAGOMATURA DEL FRONTE A FORMA CONCAVA.
- PRIMA DI PORRE IN OPERA GLI INTERVENTI DI PRIMA FASE, ANDRA' ESEGUITO UN ACCURATO DISAGGIO MECCANICO DI TUTTI I BLOCCHI INTRALTI AL FRONTE E AL CONTORNO.
- FASE 5: POSA IN OPERA DELLE CENTINE E DELLO SPRITZ-BETON**
- POSA IN OPERA DI CENTINE CHE DOVRANNO ESSERE COLLEGATE ALLE ALTRE CON APPOSITE CATENE. REALIZZAZIONE DI UN SECONDO STRATO DI SPRITZ-BETON FIBROFORZATO NELLA TRATTA APPENA SCAVATA E DISAGGIATA.
- MESSA IN OPERA DI UNO STRATO DI SPRITZ-BETON FIBROFORZATO AL FRONTE A FINE CAMPO.
- FASE 6: GETTO DI MURETTE E ARCO ROVESCIO**
- MESSA IN OPERA DI UNO STRATO DI SPRITZ-BETON DI REGOLAZIONE AL CONTORNO.
- POSA IN OPERA DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DEL TUBO MICROFORZURATO A TERGO DELLE MURETTE.
- IL GETTO DELLE MURETTE E DELL'ARCO ROVESCIO (PREVA POSA DEL TUBO DI DRENAGGIO MICROFORZURATO SOTTO ARCO ROVESCIO) AD UNA DISTANZA MAX 19 DAL FRONTE E DOVRA' COMUNQUE ESSERE REGOLATO IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO.
- FASE 7: IMPERMEABILIZZAZIONE IN CALOTTA**
- LA POSA IN OPERA DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE SARA' ESEGUITA PRIMA DEL GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO.
- IL GETTO DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO SARA' ESEGUITO AD UNA DISTANZA MAX 48 DAL FRONTE E DOVRA' COMUNQUE ESSERE REGOLATO IN FUNZIONE DEL COMPORTAMENTO DEFORMATIVO DEL CAVO.

LEGENDA

- P.C. = PIANO DEI CENTRI
- Q.P. = QUOTA DI PROGETTO
- P.S. = PIANO DI SCAVO

SPRITZ-BETON AL CONTORNO sp=20cm (5+20+3)	PRE SPRITZ-BETON sp=5cm FIBROFORZATO CON FIBRE METALLICHE + SPRITZ-BETON DI COMPLETAMENTO sp=20cm FIBROFORZATO CON FIBRE METALLICHE + SPRITZ-BETON DI REGOLAZIONE sp=3cm, ADDITTIVATO CON FIBRE POLIMERICHE
SPRITZ-BETON AL FRONTE	EVENTUALE SPRITZ-BETON sp=10cm FIBROFORZATO CON FIBRE METALLICHE AD OGNI SINGOLO SFONDO
	SPRITZ-BETON sp=15cm FIBROFORZATO CON FIBRE METALLICHE A FINE CAMPO
CENTINE	ZIPE 180 PASSO 100cm
PRESOSTEGNO AL CONTORNO	N.25 TUBI METALLICI VALVOLATI (1 vlv/m) #114.3/10 p. 40 cm L=18.00m SOVRAPP. POSIZIONE 6.00m
CONSOLIDAMENTI AL FRONTE	N.35 TUBI IN VIR CEMENTATI L=18.00m SOVRAPP. POSIZIONE 6.00m
DRENAGGI (EVENTUALI)	N2+2, L=24.00m, sovr.=12.00m

PARTICOLARE "A"
SCALA 1:10

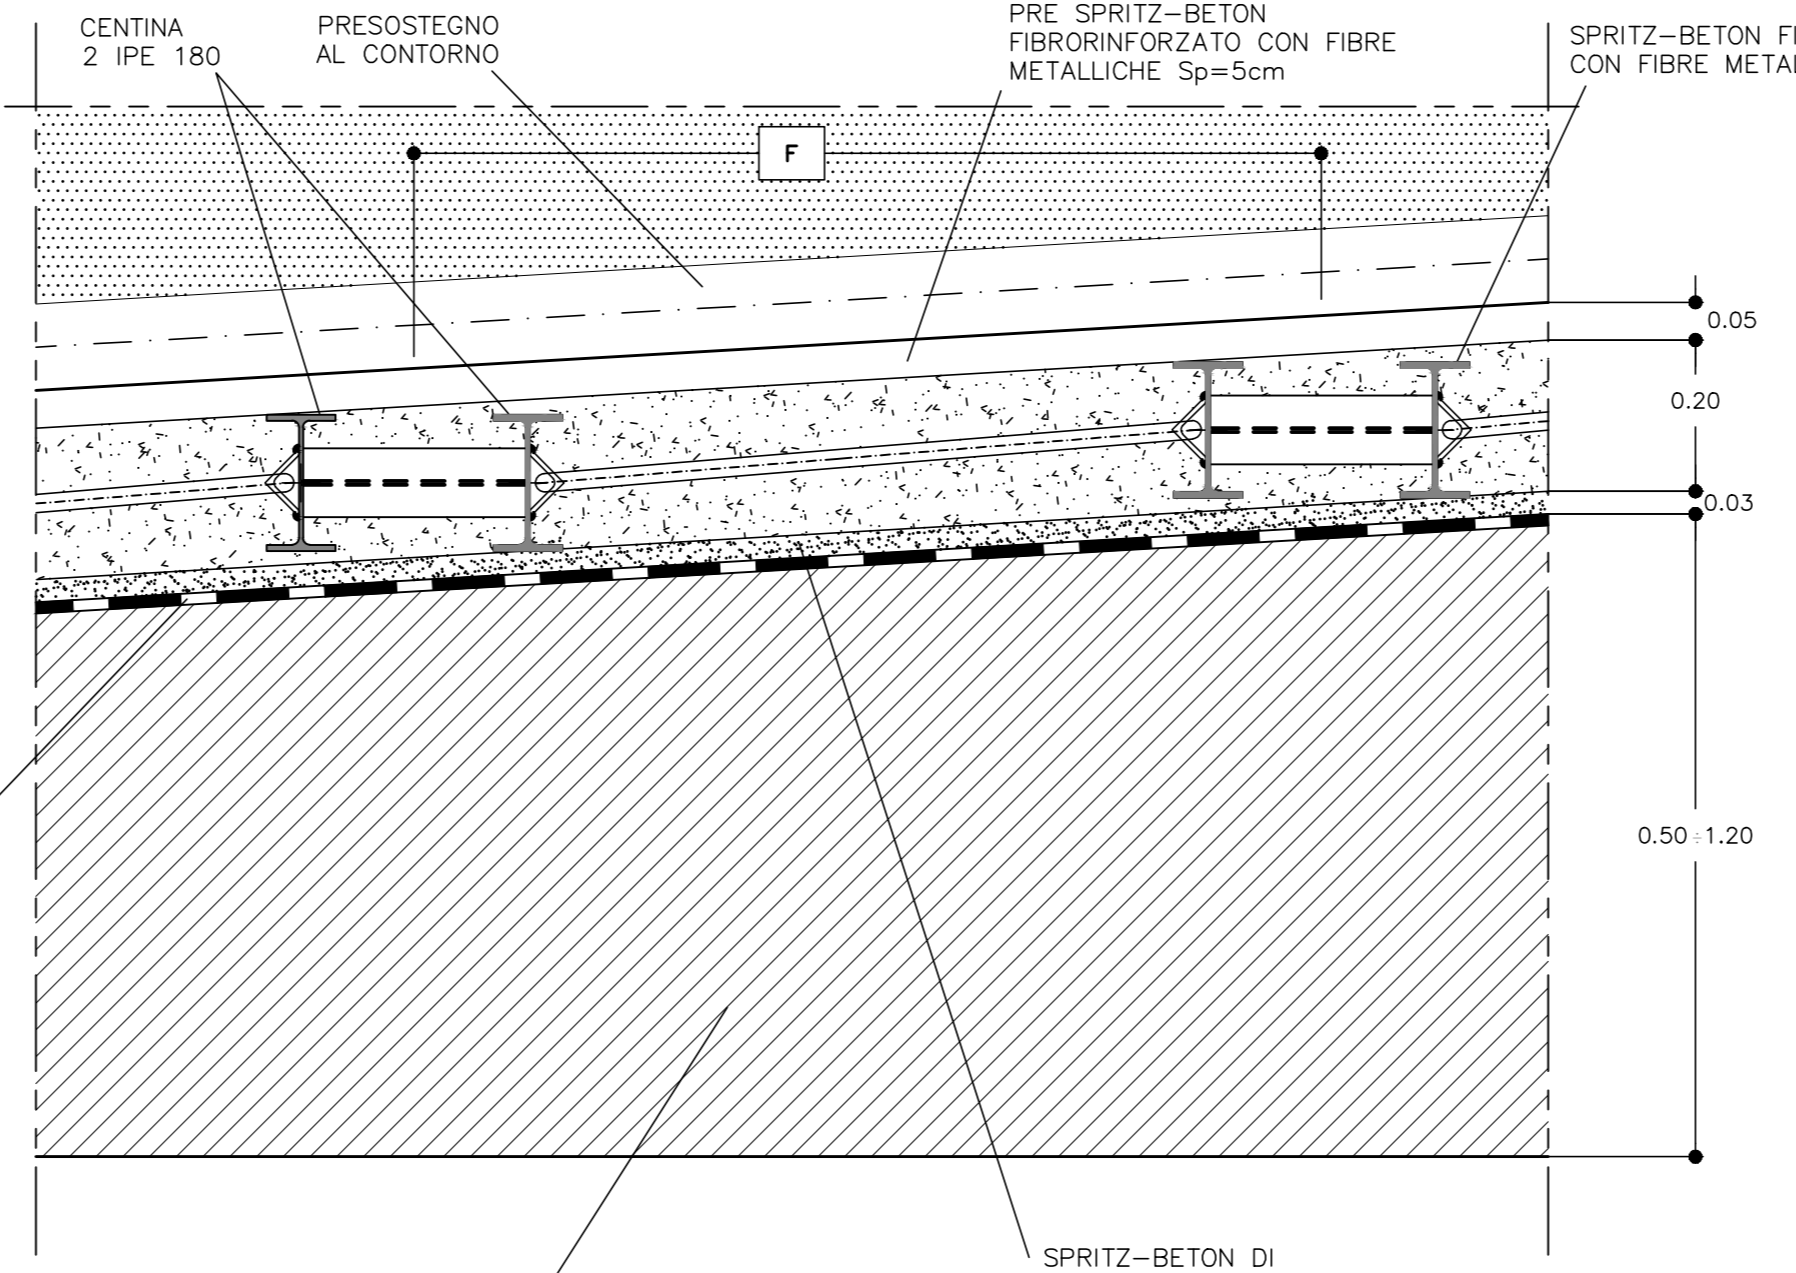

DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'
Scavo in galleria a sezione corrente	m3/m	67,93
Scavo arco rovescio	m3/m	1,24
Spritz-beton al contorno	m2/m	11,31
5cm - con fibre		22,87
20cm - con fibre		22,50
5cm		22,15
Eventuale spritz-beton al fronte su ogni sfondo - con fibre (10cm)	m2/m	6,79
Spritz-beton al fronte a fine campo - con fibre (15cm)	m2/m	10,19
Fibre metalliche (incidenza=50kg/mc)	kg/m	
Centine (ZIPE 180, passo=1m, peso=18,8kg/m)	m/m	22,38
sviluppo		
Drenaggi in avanzamento (2+2, L=24m, passo=12m)	m/m	8

GEOMETRIA CONSOLIDAMENTI AL FRONTE

CIRC.	RAGGIO (m)	NUMERO VIR	LUNGHEZZA (m)	SOVRAPP.	INCL. RADIALE	ANGOLO
1	0,88	4	18,00	6,00	0,85%	α=100,0000g
2	1,78	9	18,00	6,00	1,73%	β=44,4444g
3	2,68	12	18,00	6,00	2,61%	γ=33,3333g
4	3,58	10	18,00	6,00	3,49%	δ=33,3333g δ/2=16,6667g

TRATTAMENTI N°35, L=18,00m, sovr.min.=6,00m

GEOMETRIA PRESOSTEGNO AL CONTORNO CON TUBI METALLICI


RAGGIO (m)	NUMERO	PASSO	LUNGHEZZA (m)	SOVRAPP.	INCL. RADIALE
4,31	25	0,40m	18,00	6,00	5,83%

TRATTAMENTI N°25, L=18,00m, sovr.min.=6,00m


PARAMETRI DI INIEZIONE (DA TARARSI IN CORSO D'OPERA)

PORTATA (l/min)	PRESSIONE (bar)	VOLUME (l/valvola)	PRESSIONE RESIDUA (bar)
10-20	≤ 15-20	50-70	≥ 5

SEZIONE C-C
SCALA 1:50

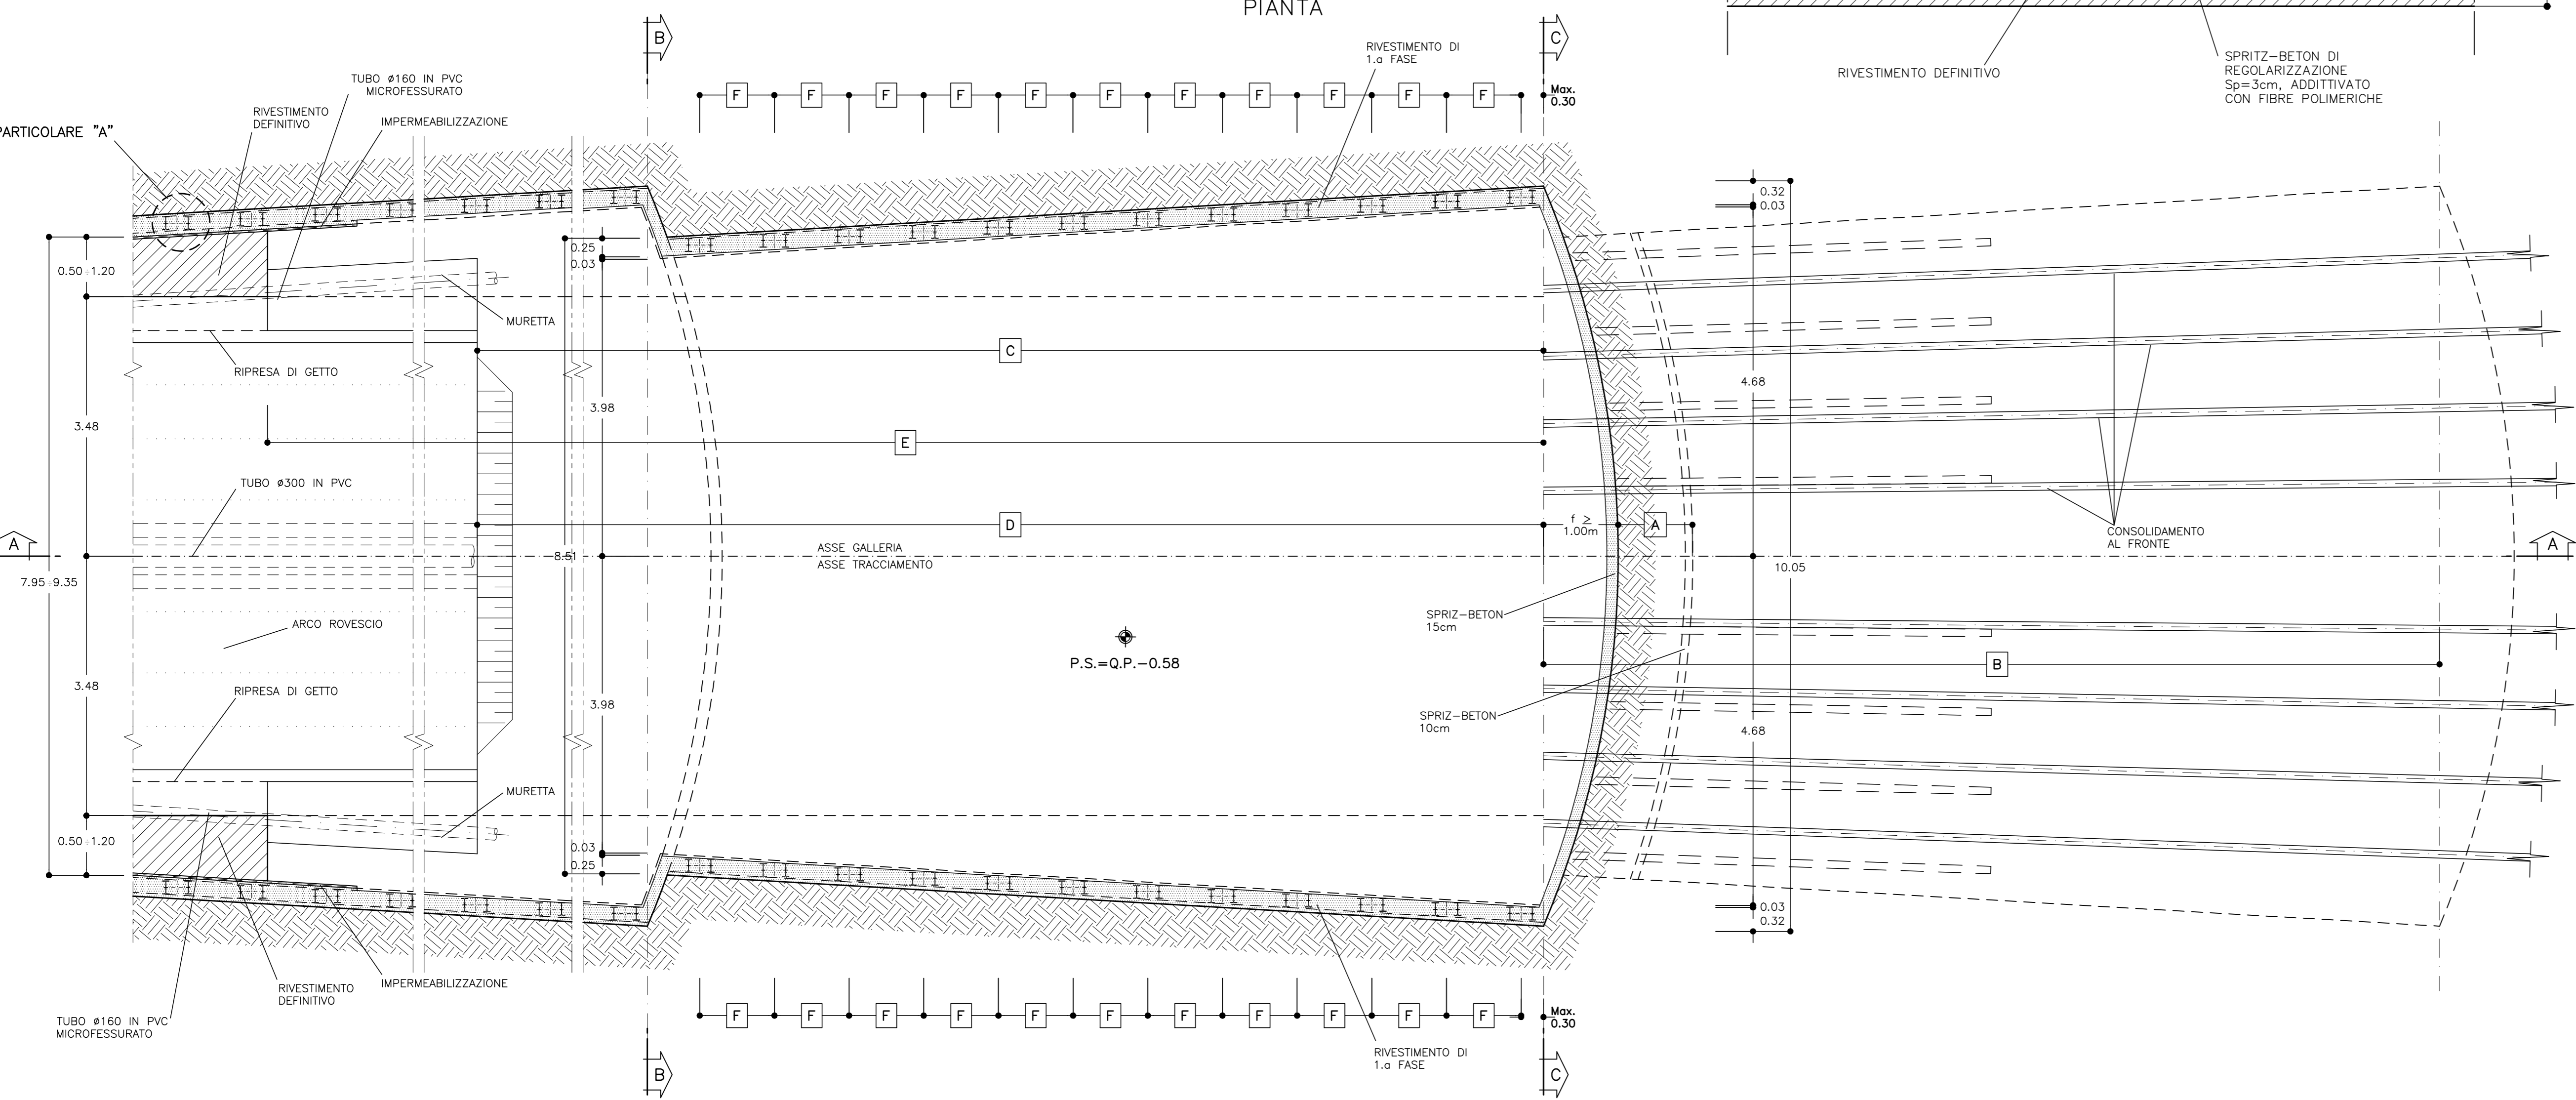

SEZIONE C-C
SCALA 1:50

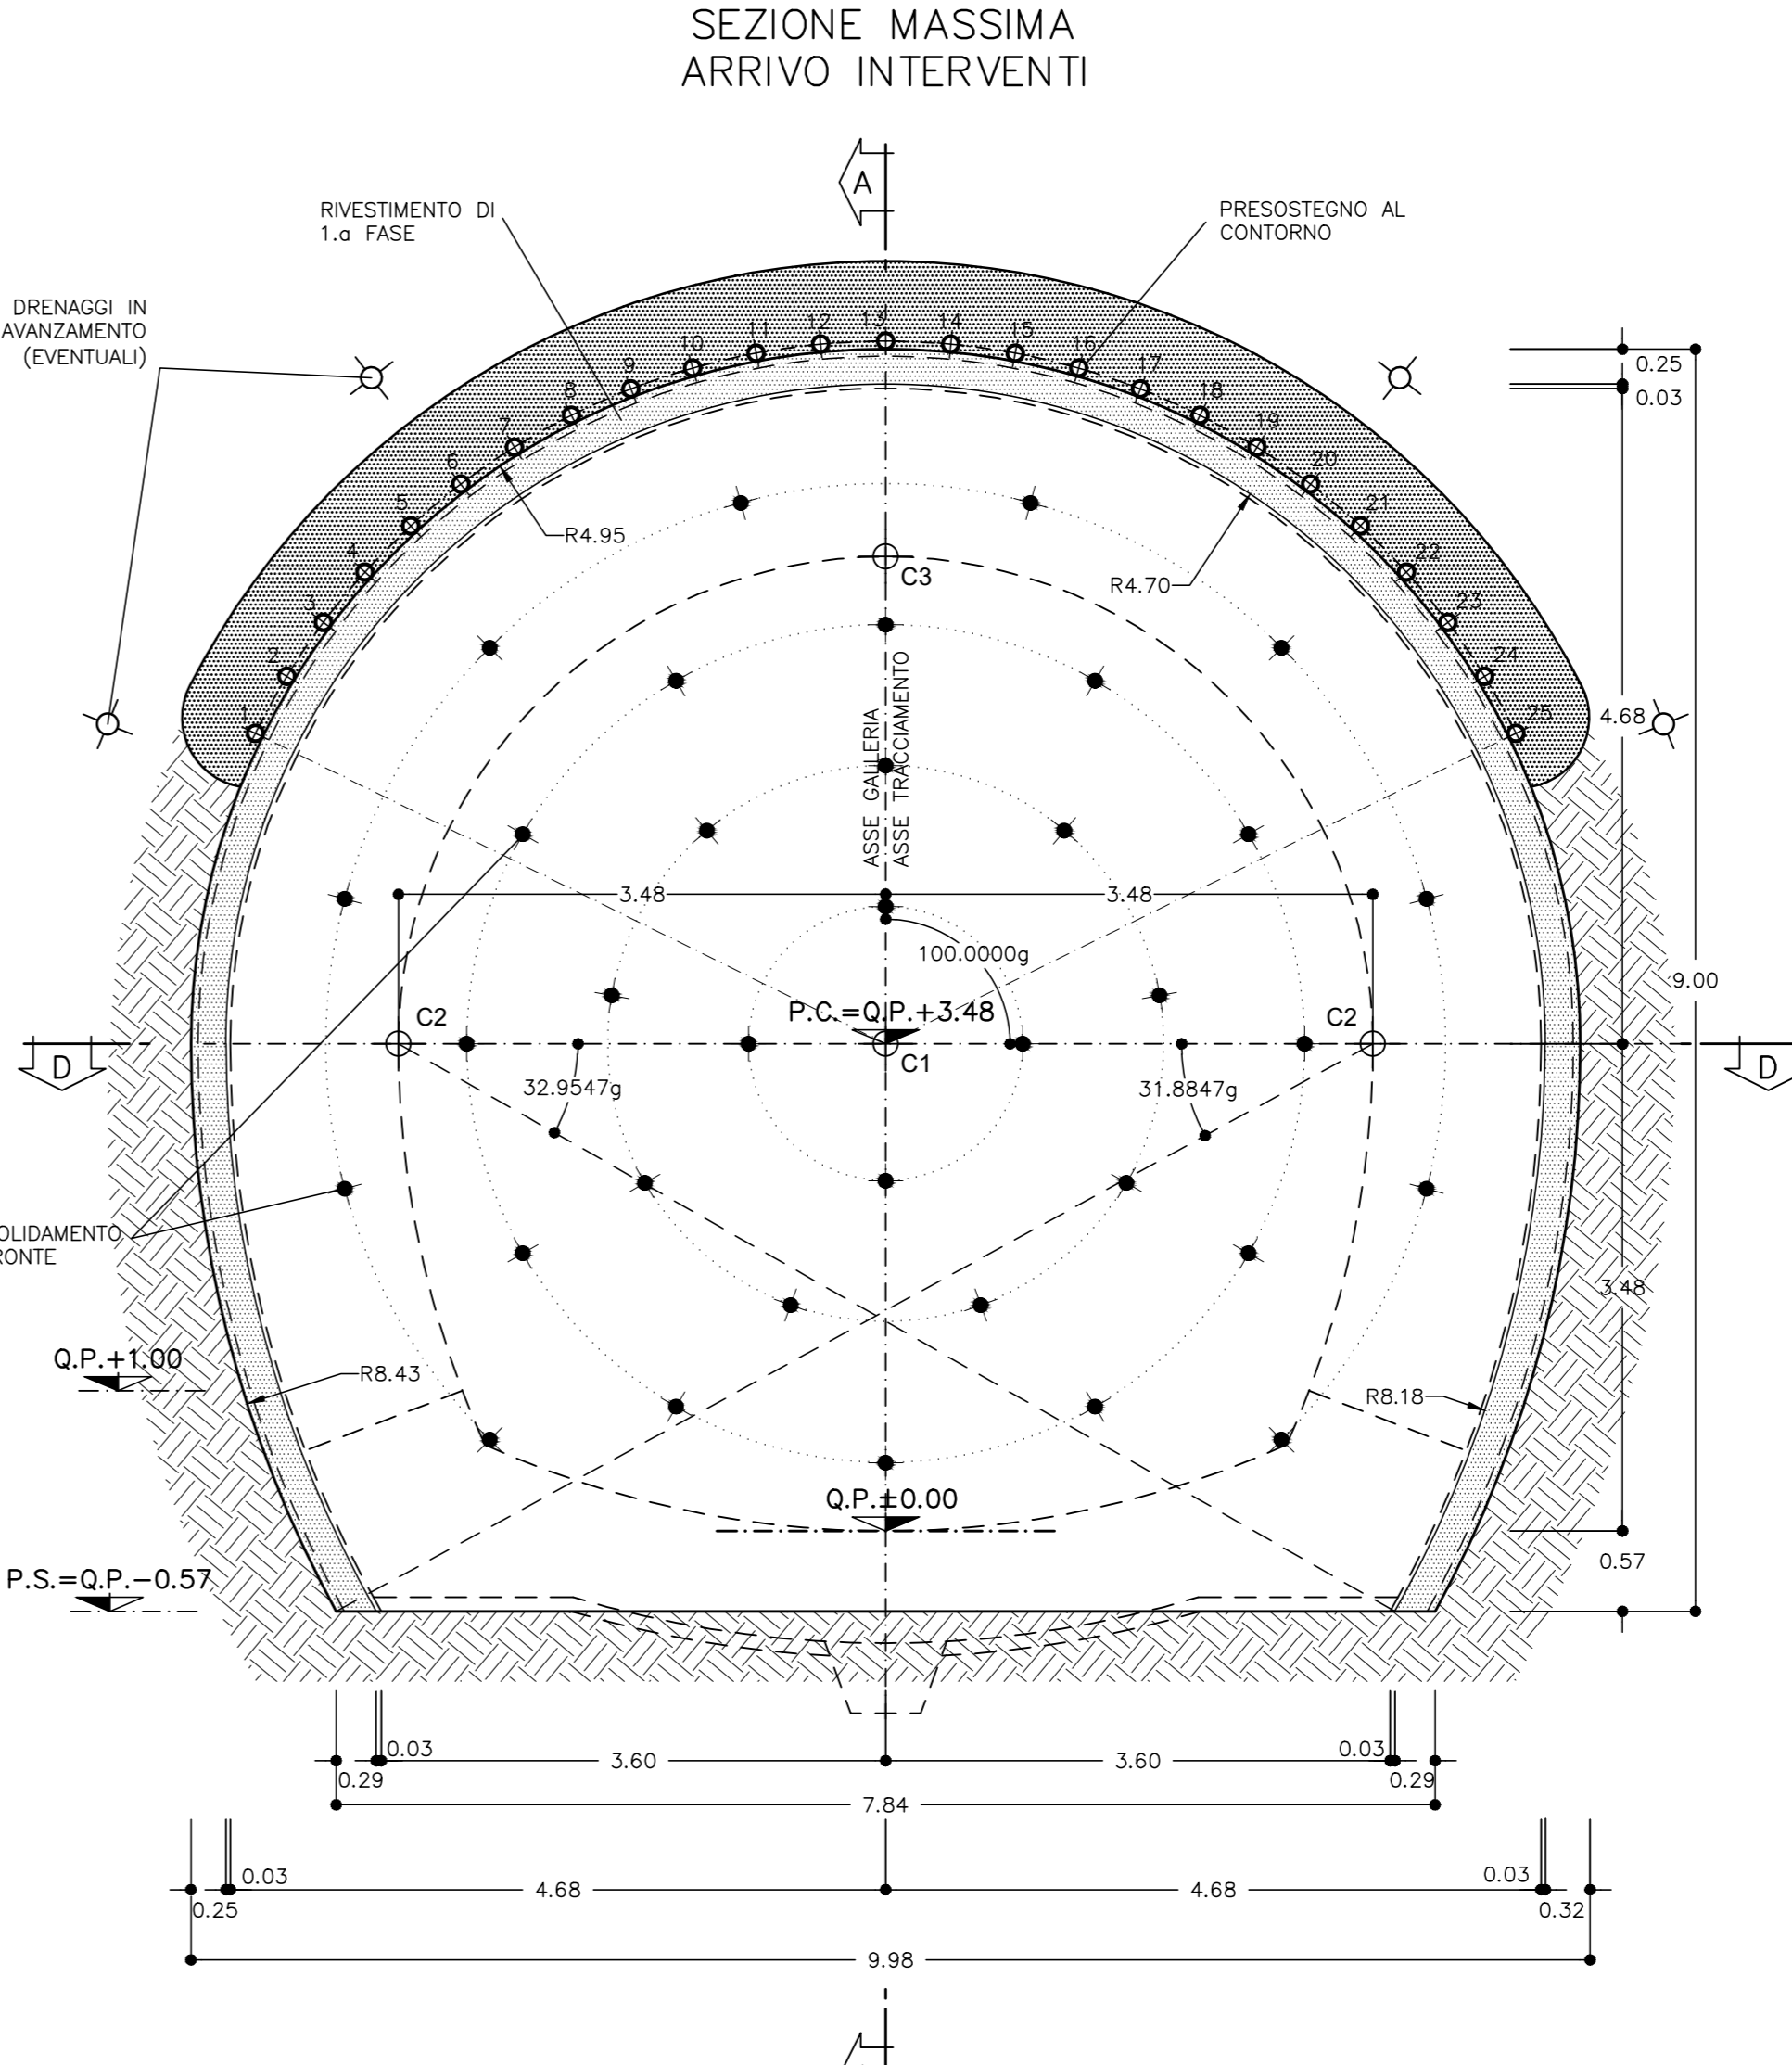

NOTA
- IL REALE SPESORE DELLO PRE SPRITZ-BETON FIBROFORZATO DI PROTEZIONE AL FRONTE ED AL CONTORNO SARA' VALUTATO IN DETTAGLIO DAL PREPOSTO AL FRONTE IN FUNZIONE DEL CONTESTO GEOMECCANICO LOCALE.

AIPO
Agenzia Interregionale per il fiume Po

Regione Lombardia

NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO

PROGETTO ESECUTIVO

GALLERIA GALLERIA NATURALE - SCAVI E CONSOLIDAMENTI
Sezione tipo B2VP - Scavi e consolidamenti

Fase	Arbitro	Opera	Argomento	Progressivo	Tipo elaborato	Revisione
PE	GAL	CLN	SC	017	ST	A

Redatto: A. Grella
Coordinato: M. Ghidoli
Approvato: P. Galvanin

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ing. M. Vergani

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI PROVAUTICHE ALTRA S.p.A.
Ing. Paolo Eite

PROGETTAZIONE STRUTTURALE ALTRA S.p.A.
Ing. Paolo Galvanin

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	18/10/2022	Prima emissione	AGI	HGI	PGA
