




Fase 16: demolizione della corsia nord della deviazione provvisoria; scavo e realizzazione della seconda parte della protesi lato monte
Scala 1:100

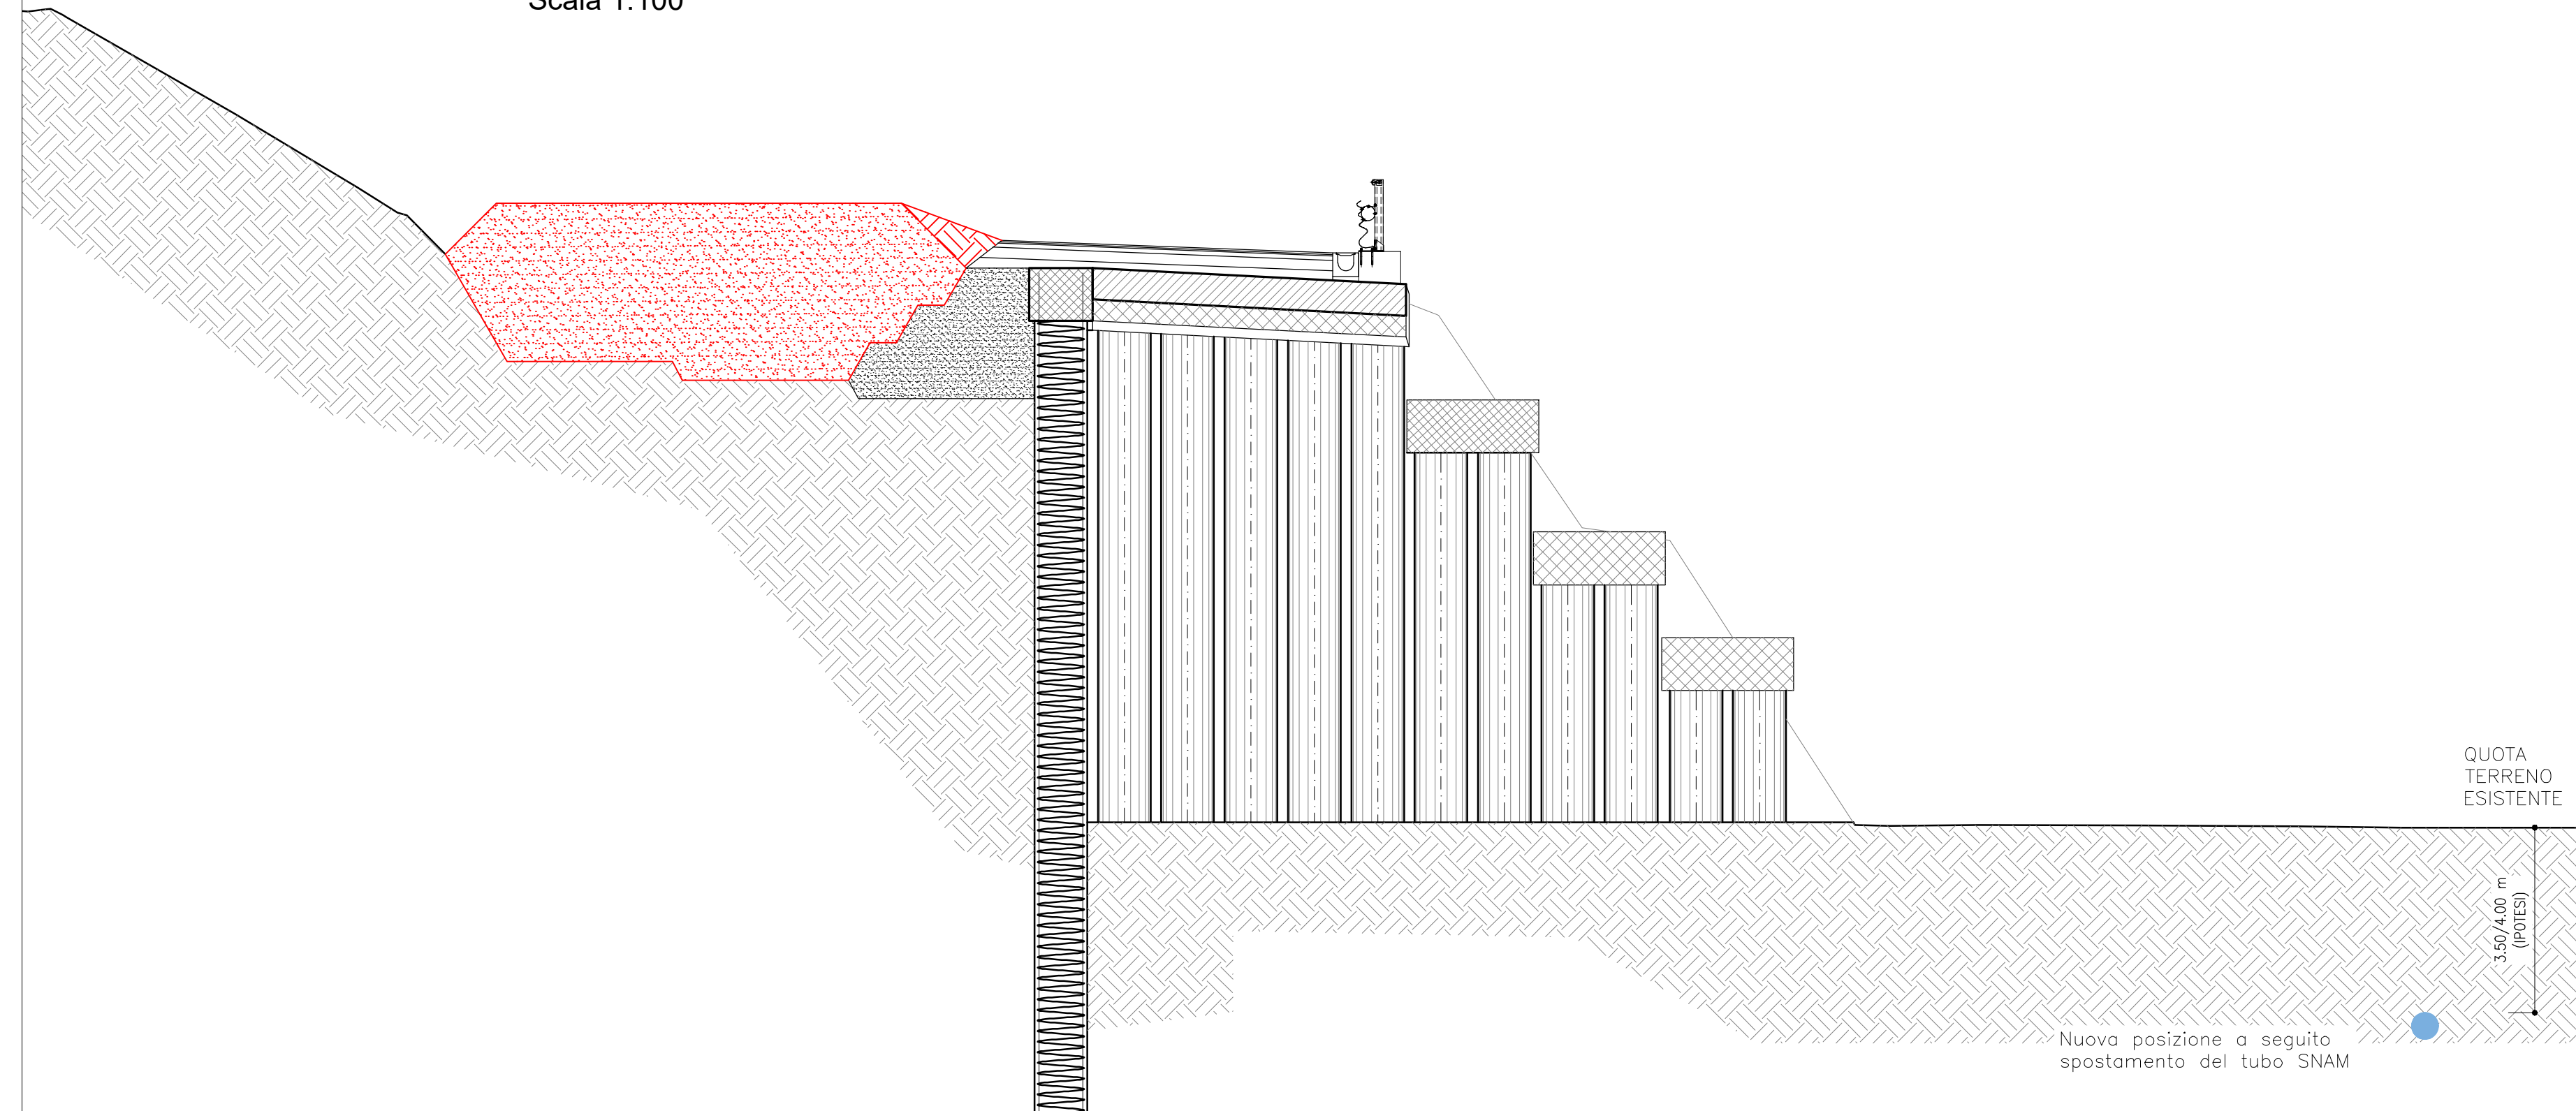


Fase 19: Realizzazione dima
Scala 1:100

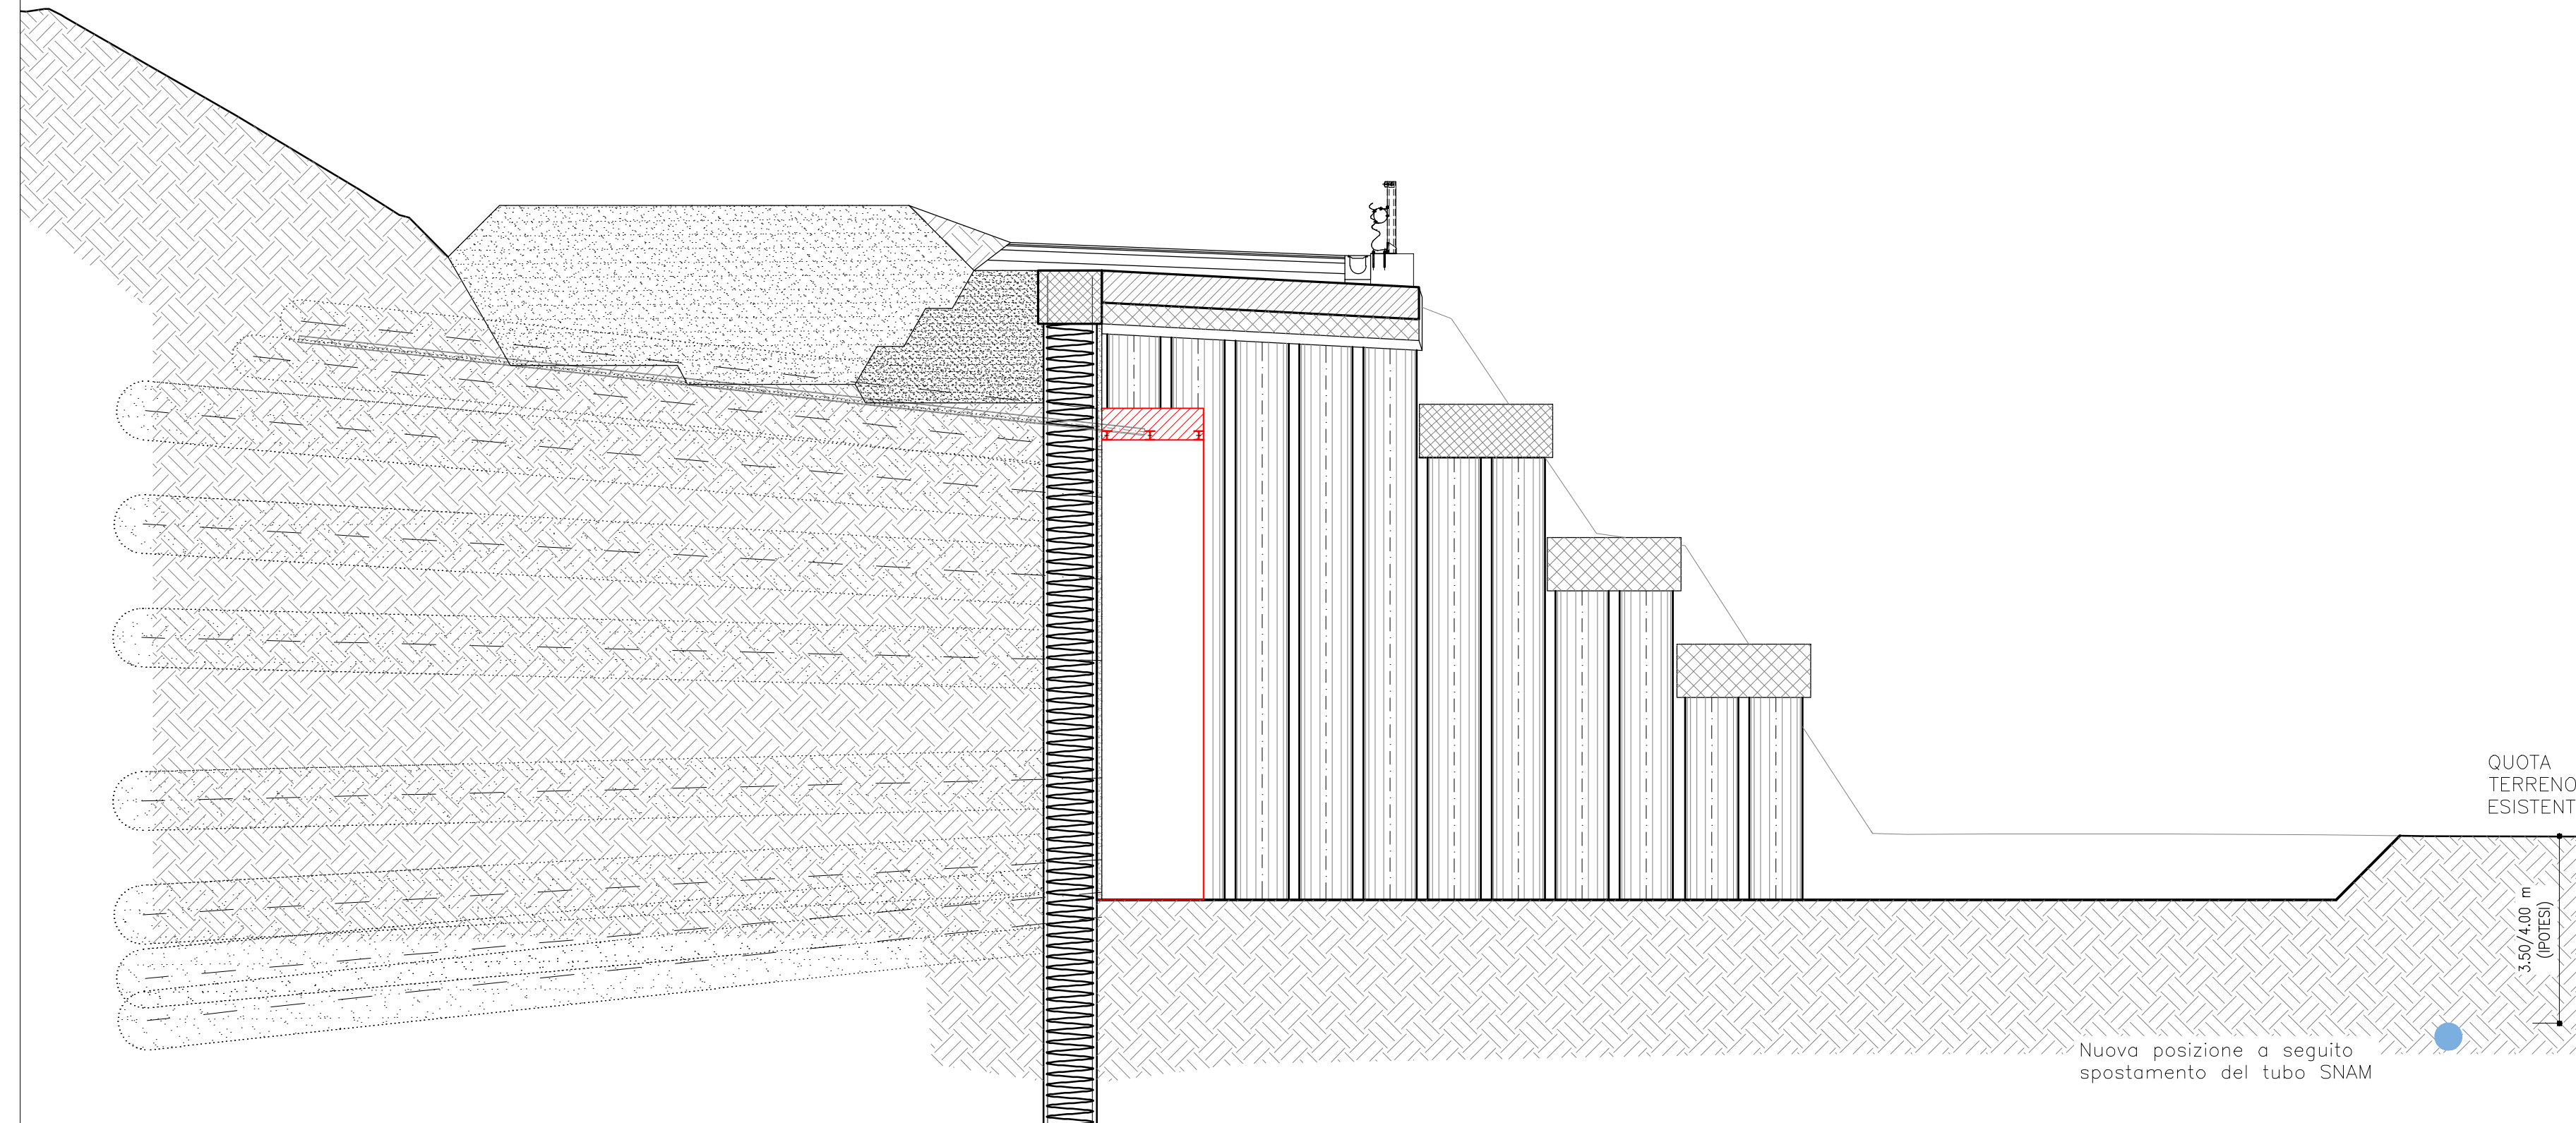


Fase 23: Realizzazione di becco di flauto e galleria artificiale; riempimento con materiale alleggerito tra soletta e galleria artificiale
Scala 1:100

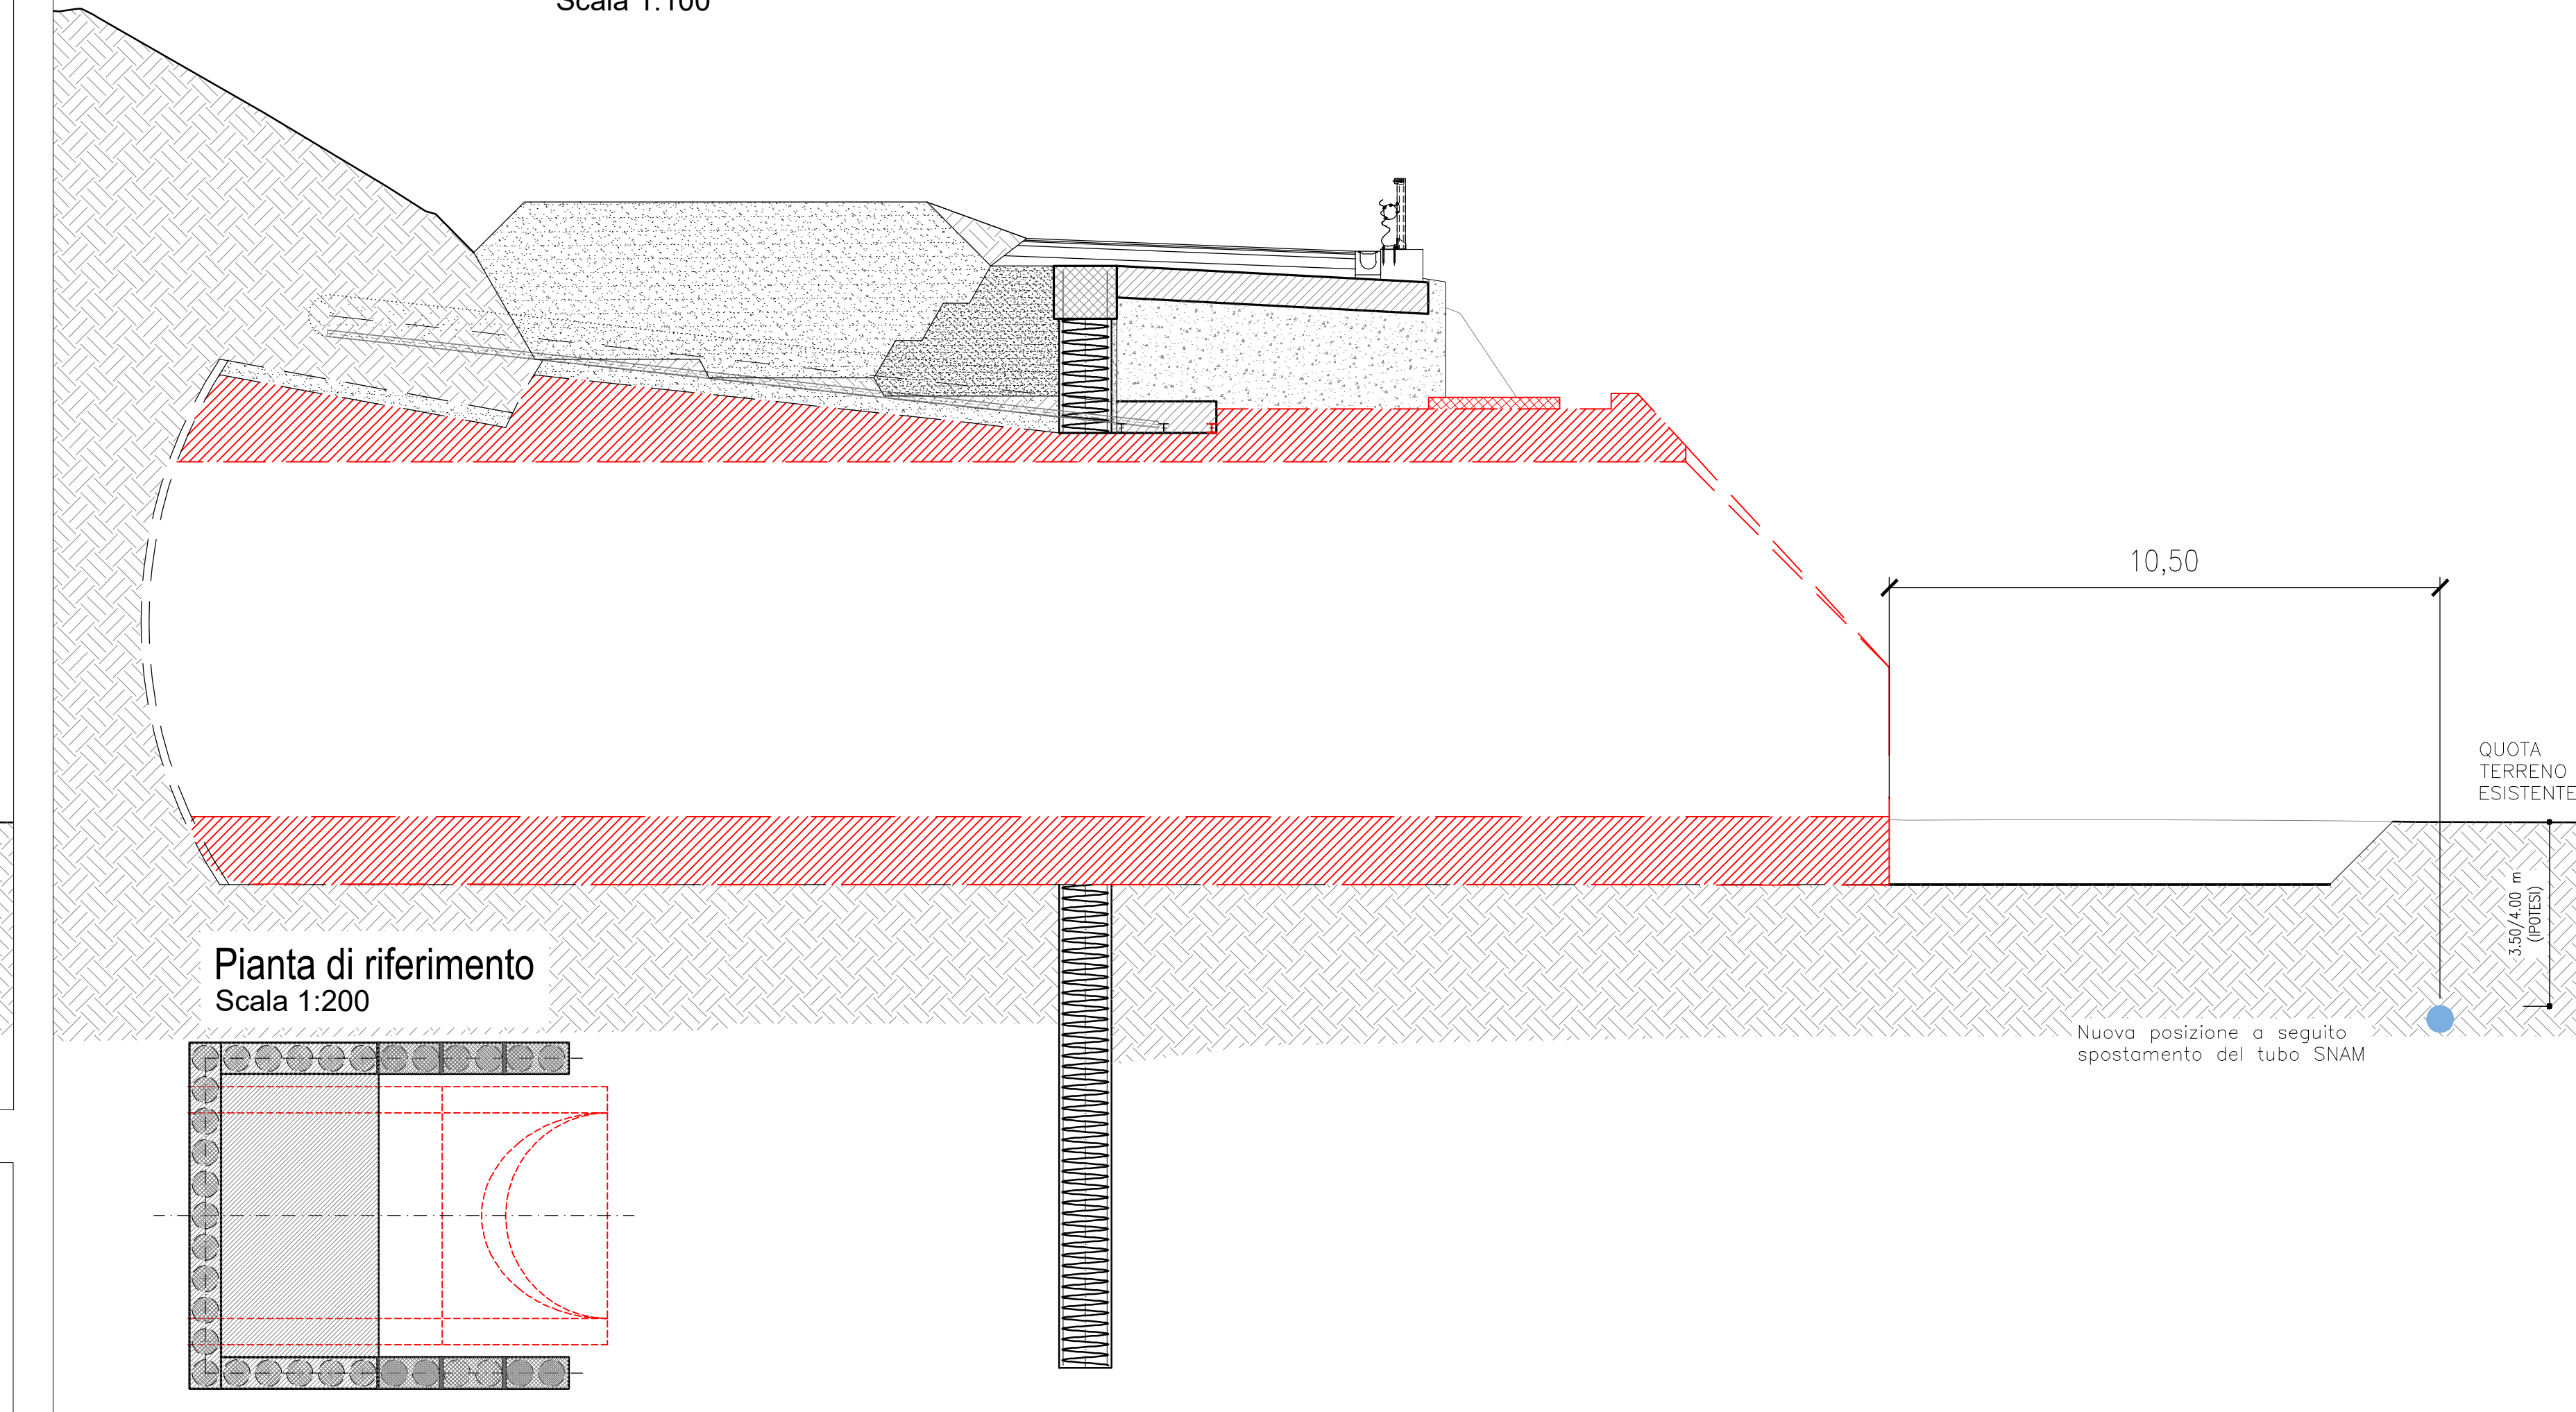


Fase 17: Applicazione di spritz-beton armato al fronte della paratia e realizzazione dei trattamenti in Jet Grouting al fronte e contorno
Scala 1:100

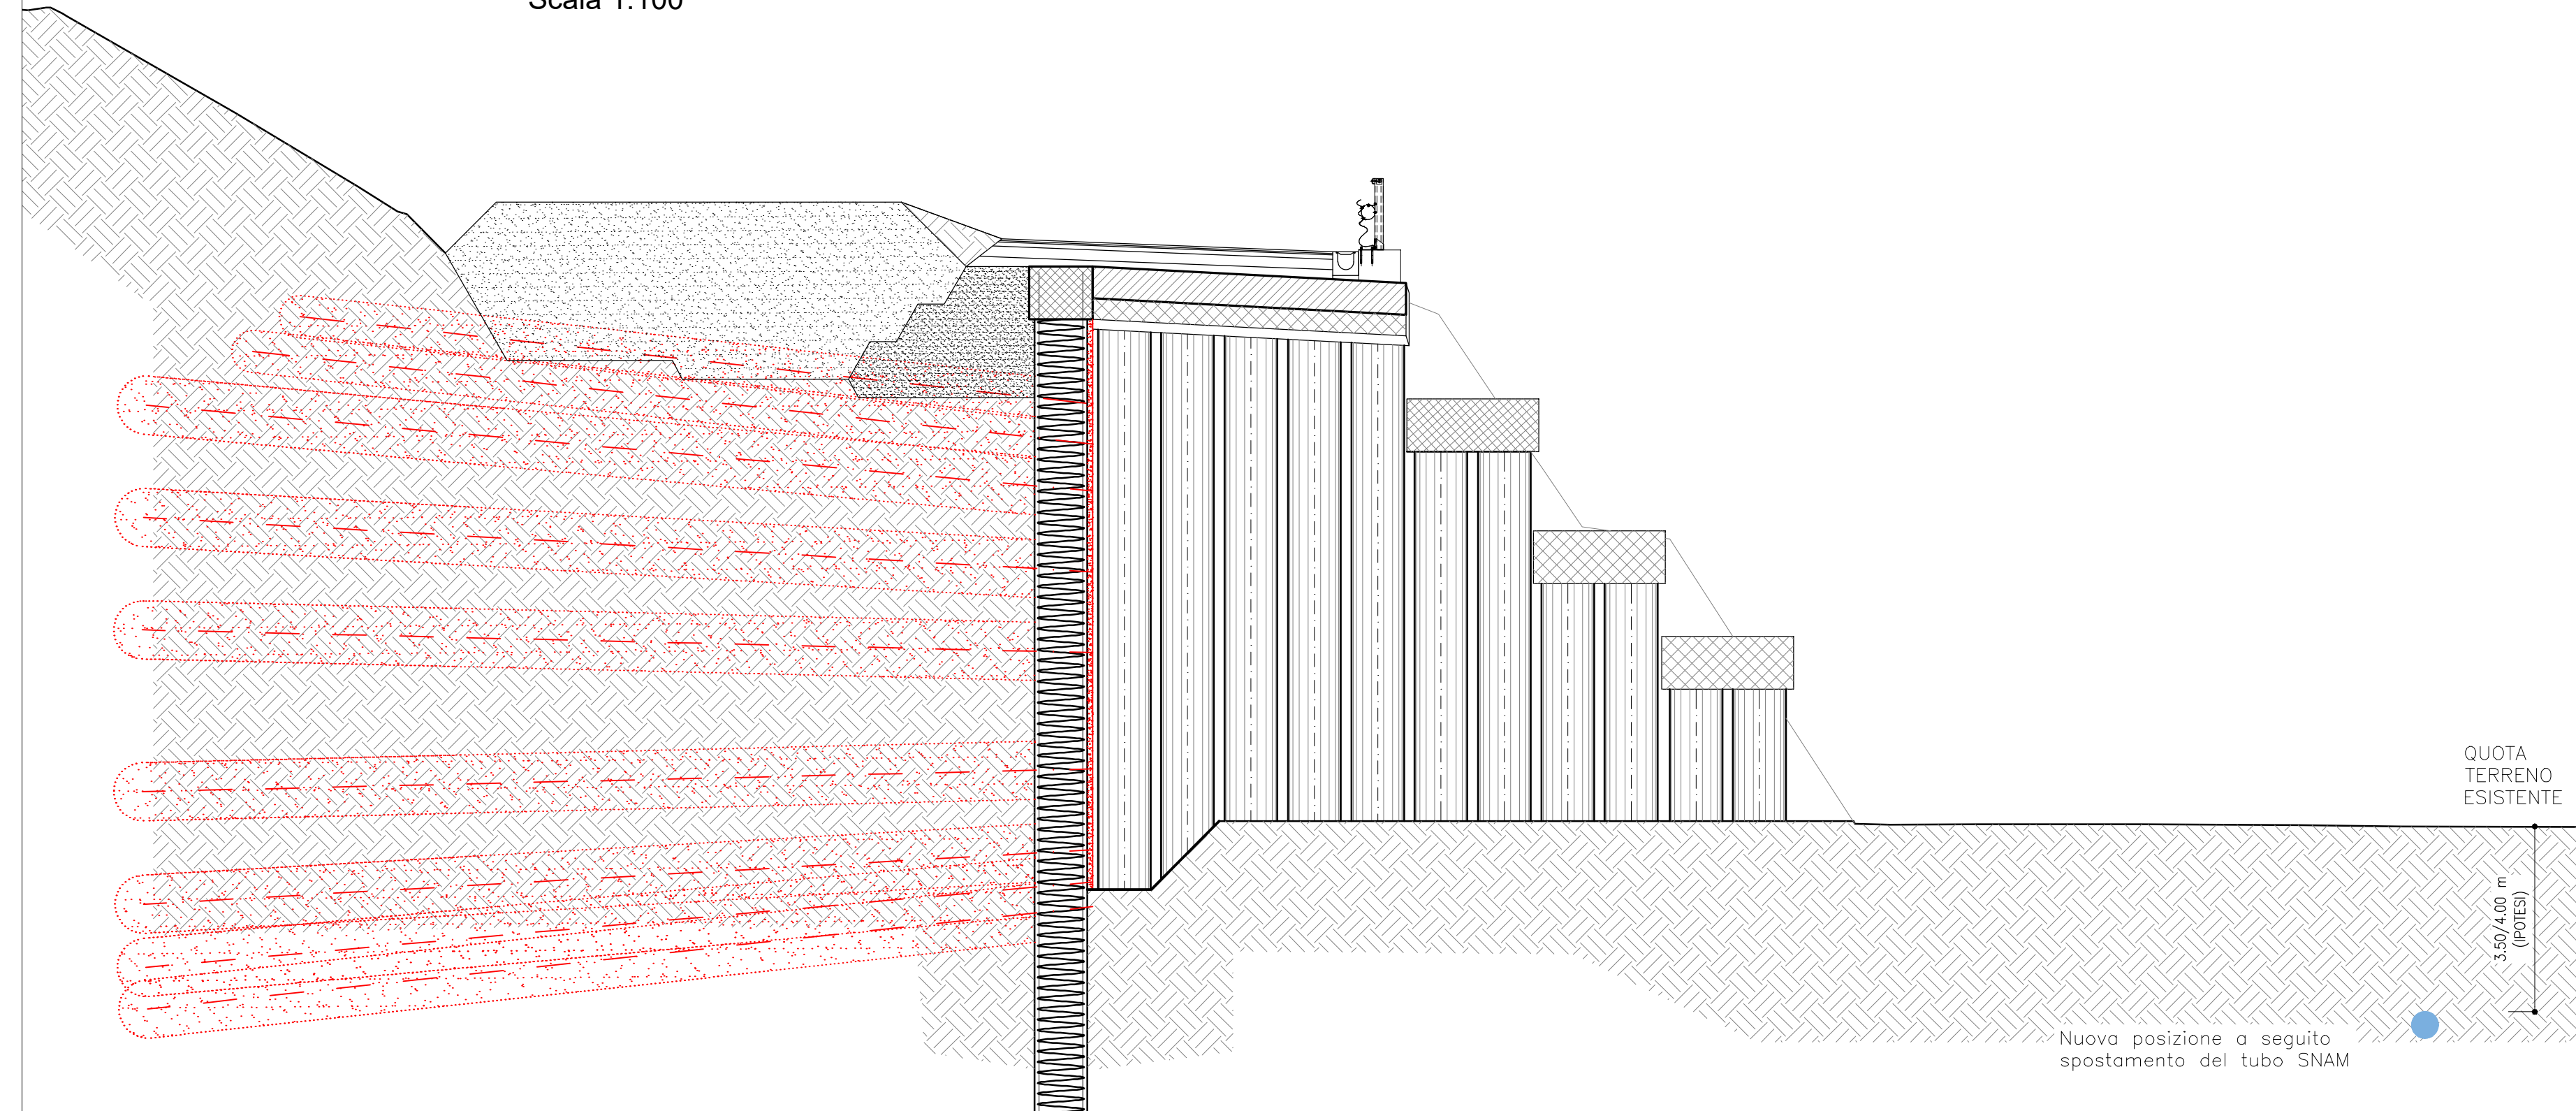


Fase 21: Scavo del primo conco e parziale getto dell'arco rovescio (le fasi costruttive del conco di attacco sono dettagliate negli elaborati specifici)
Scala 1:100

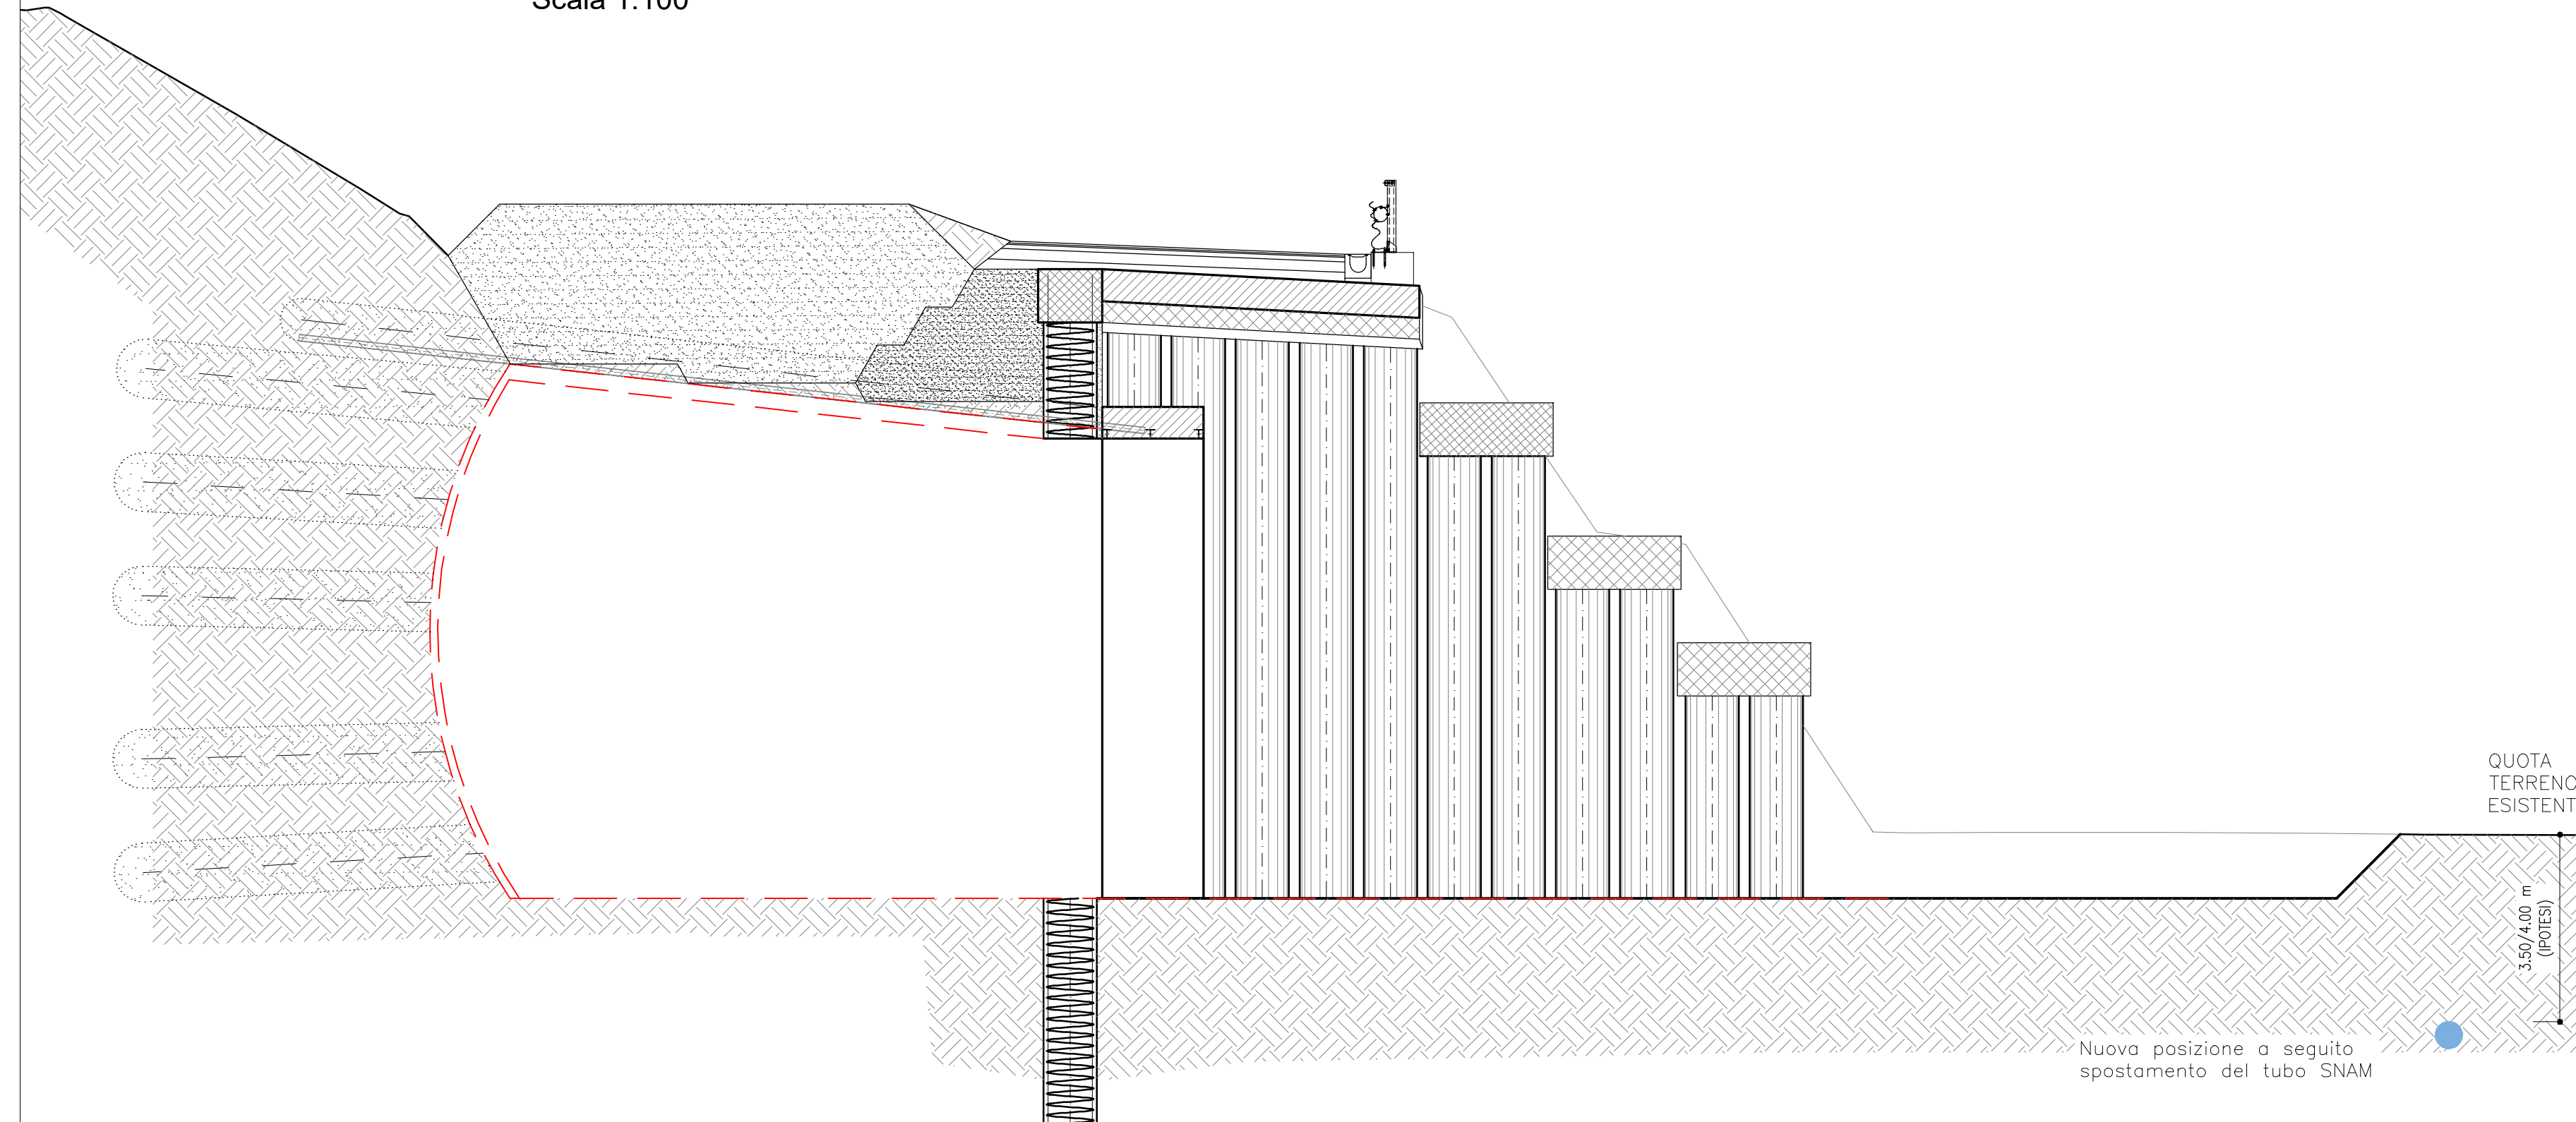


Fase 24: Demolizione protesi con ripristino dello stato dei luoghi a monte della SP 242 e sistemazione definitiva delle opere di imbocco
Scala 1:100

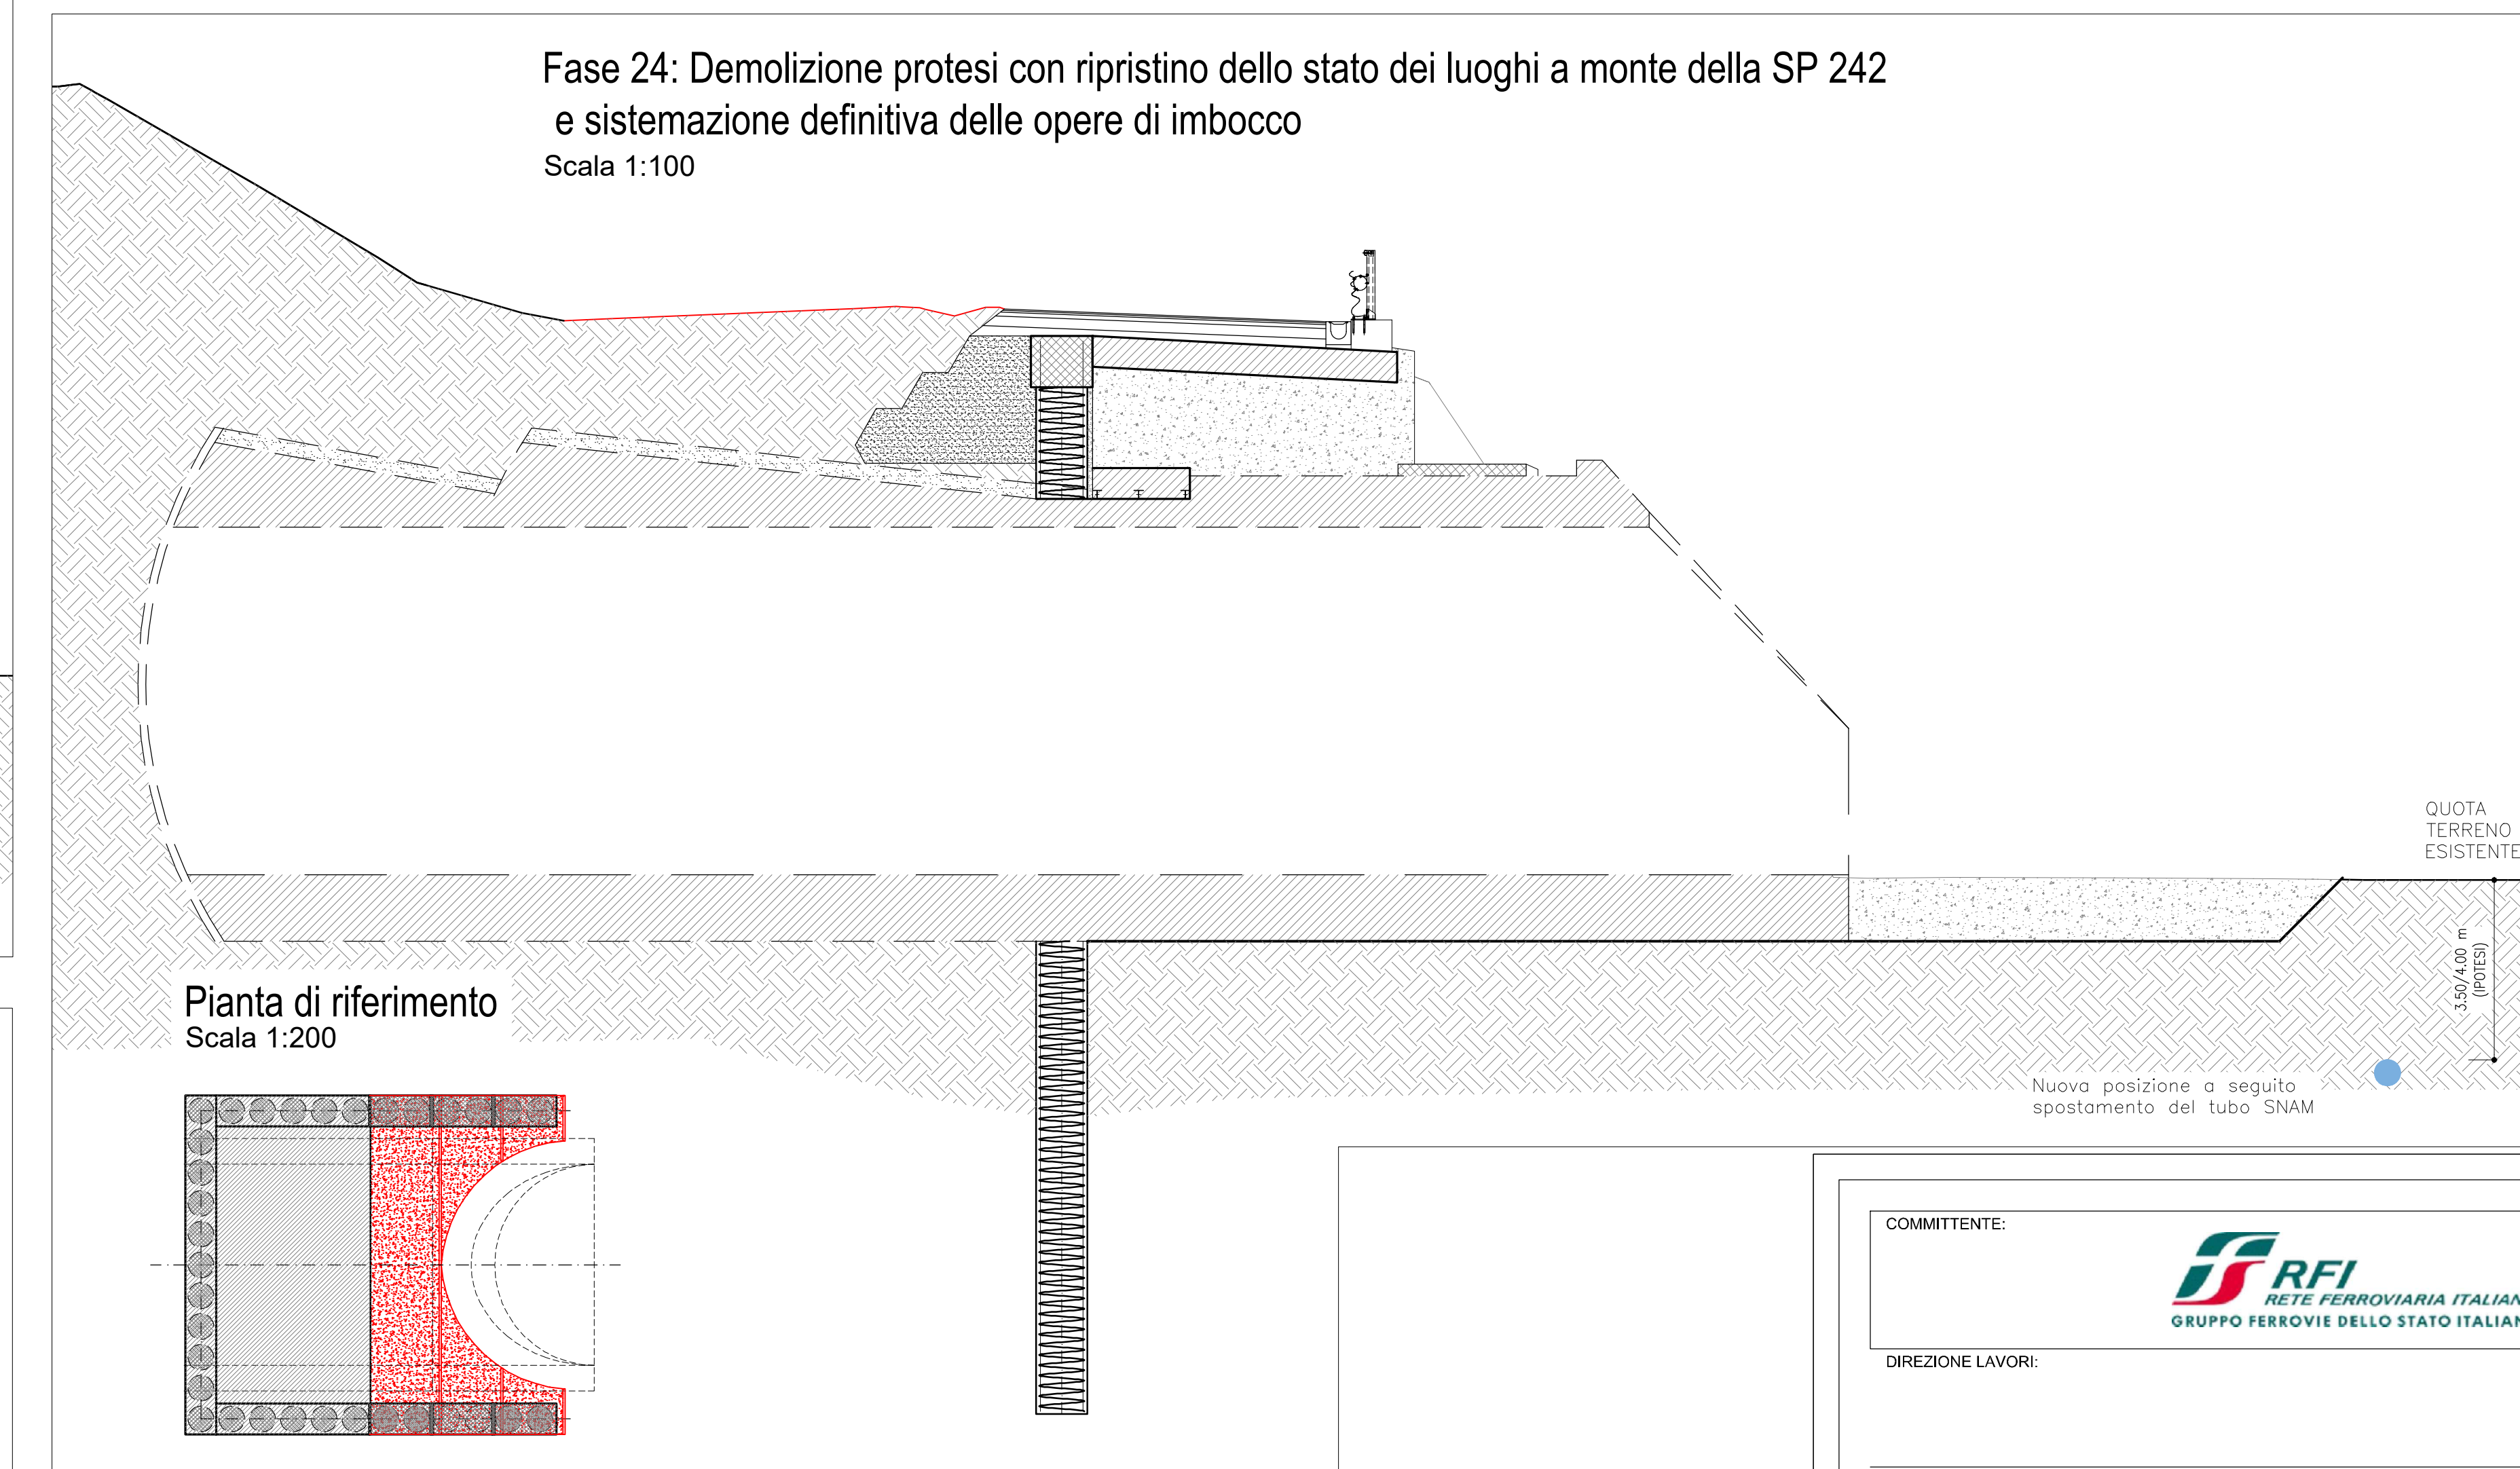

Fase 18: Realizzazione infilaggi metallici al fronte della galleria e abbassamento del fondo scavo alla quota di scavo della galleria
Scala 1:100

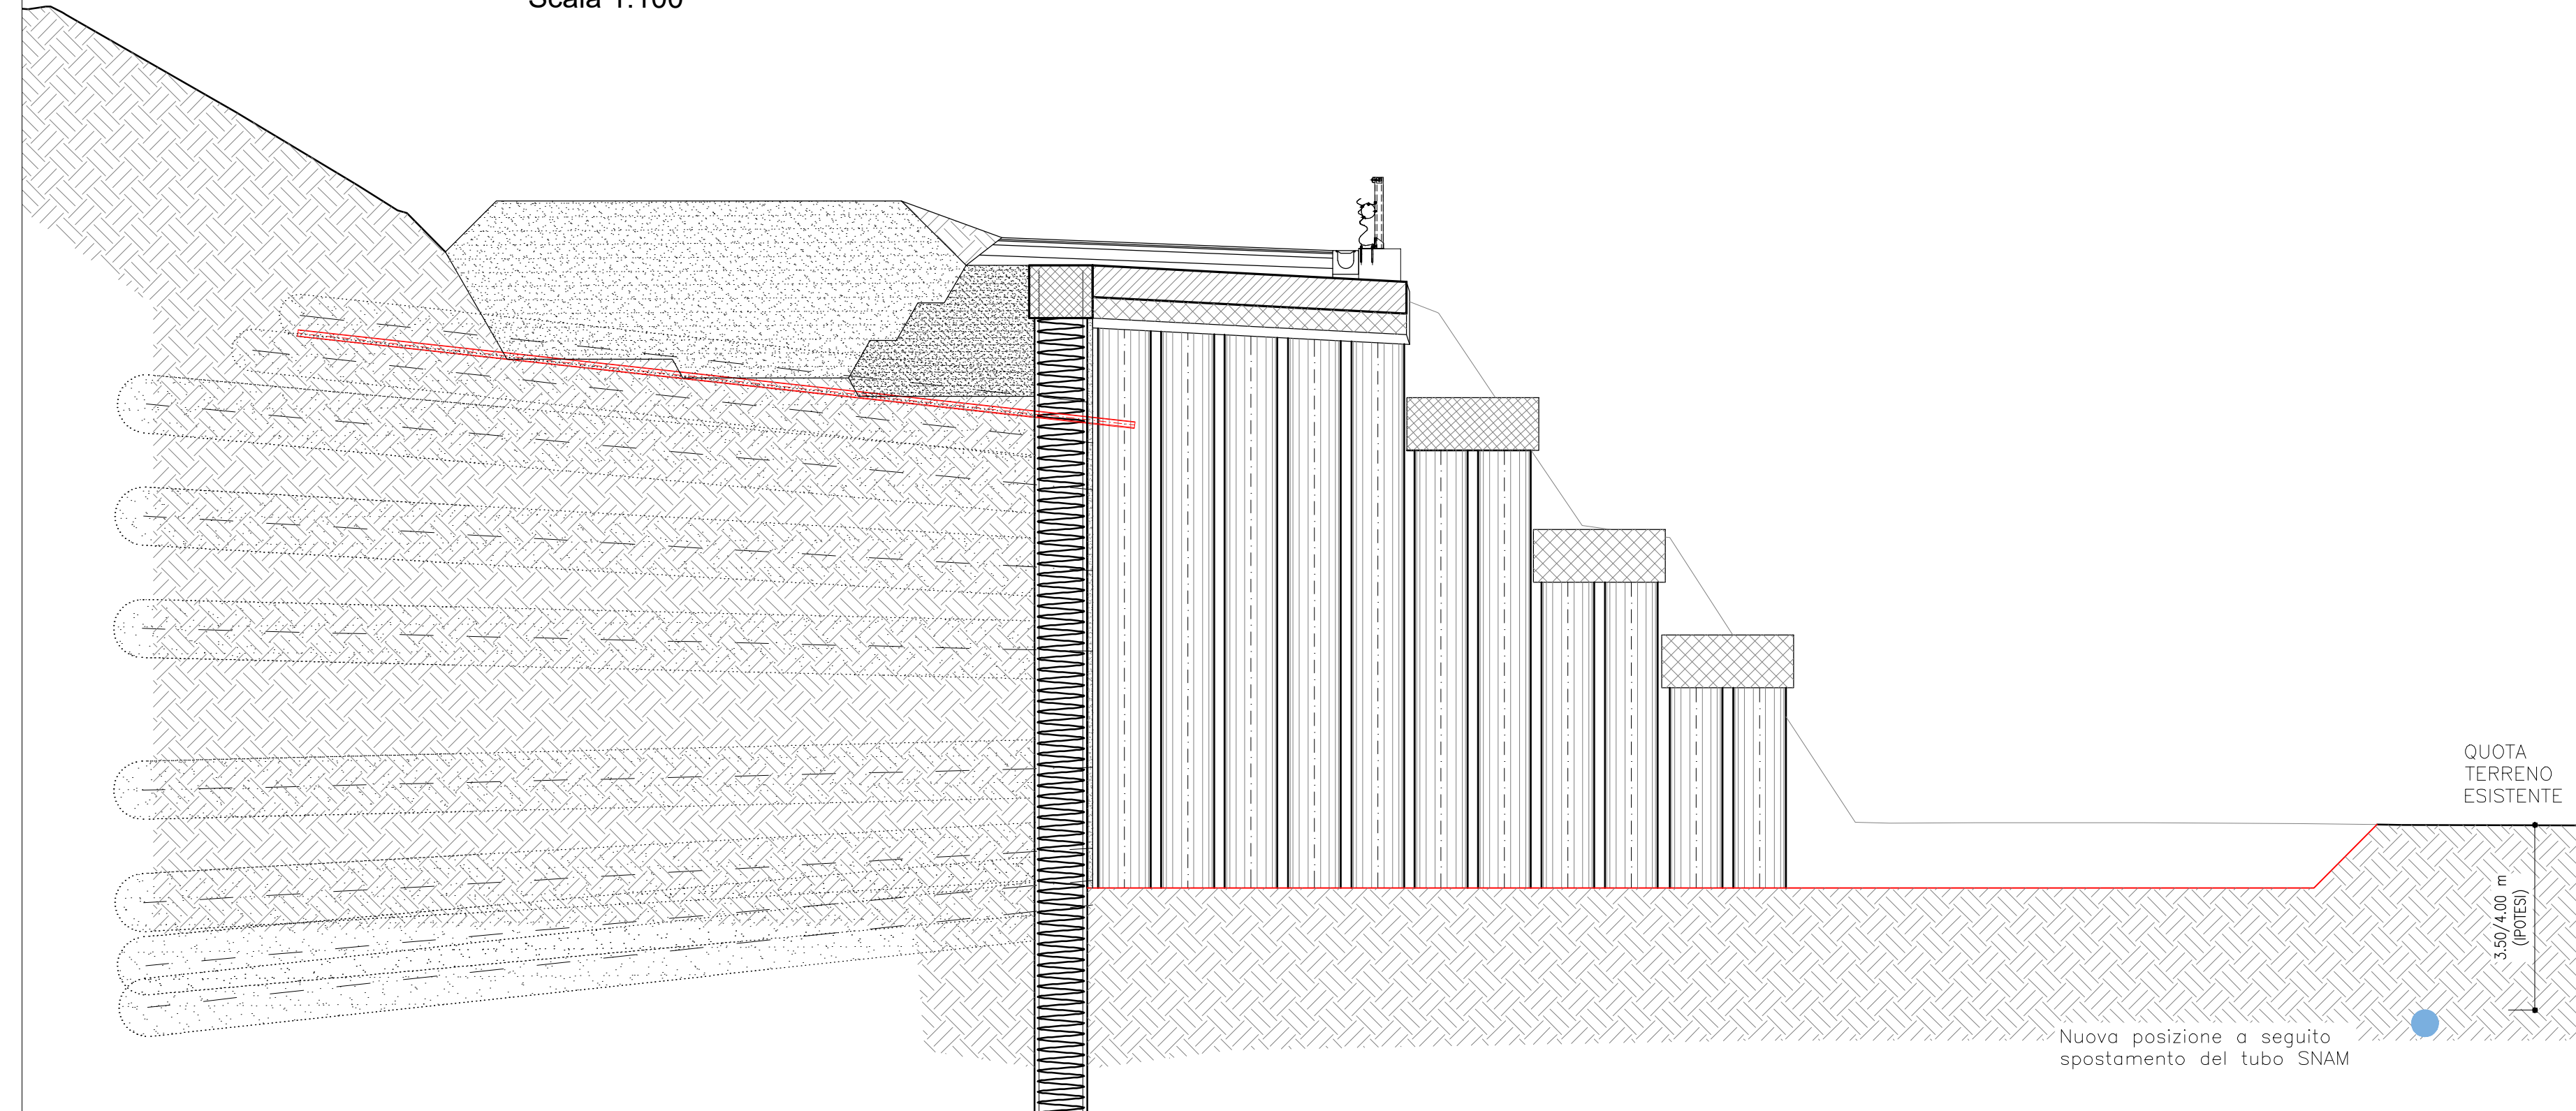

Fase 22: Realizzazione del rivestimento definitivo della sezione di attacco, scavo e rivestimento dei conchi successivi (come da tavole specifiche)
Scala 1:100

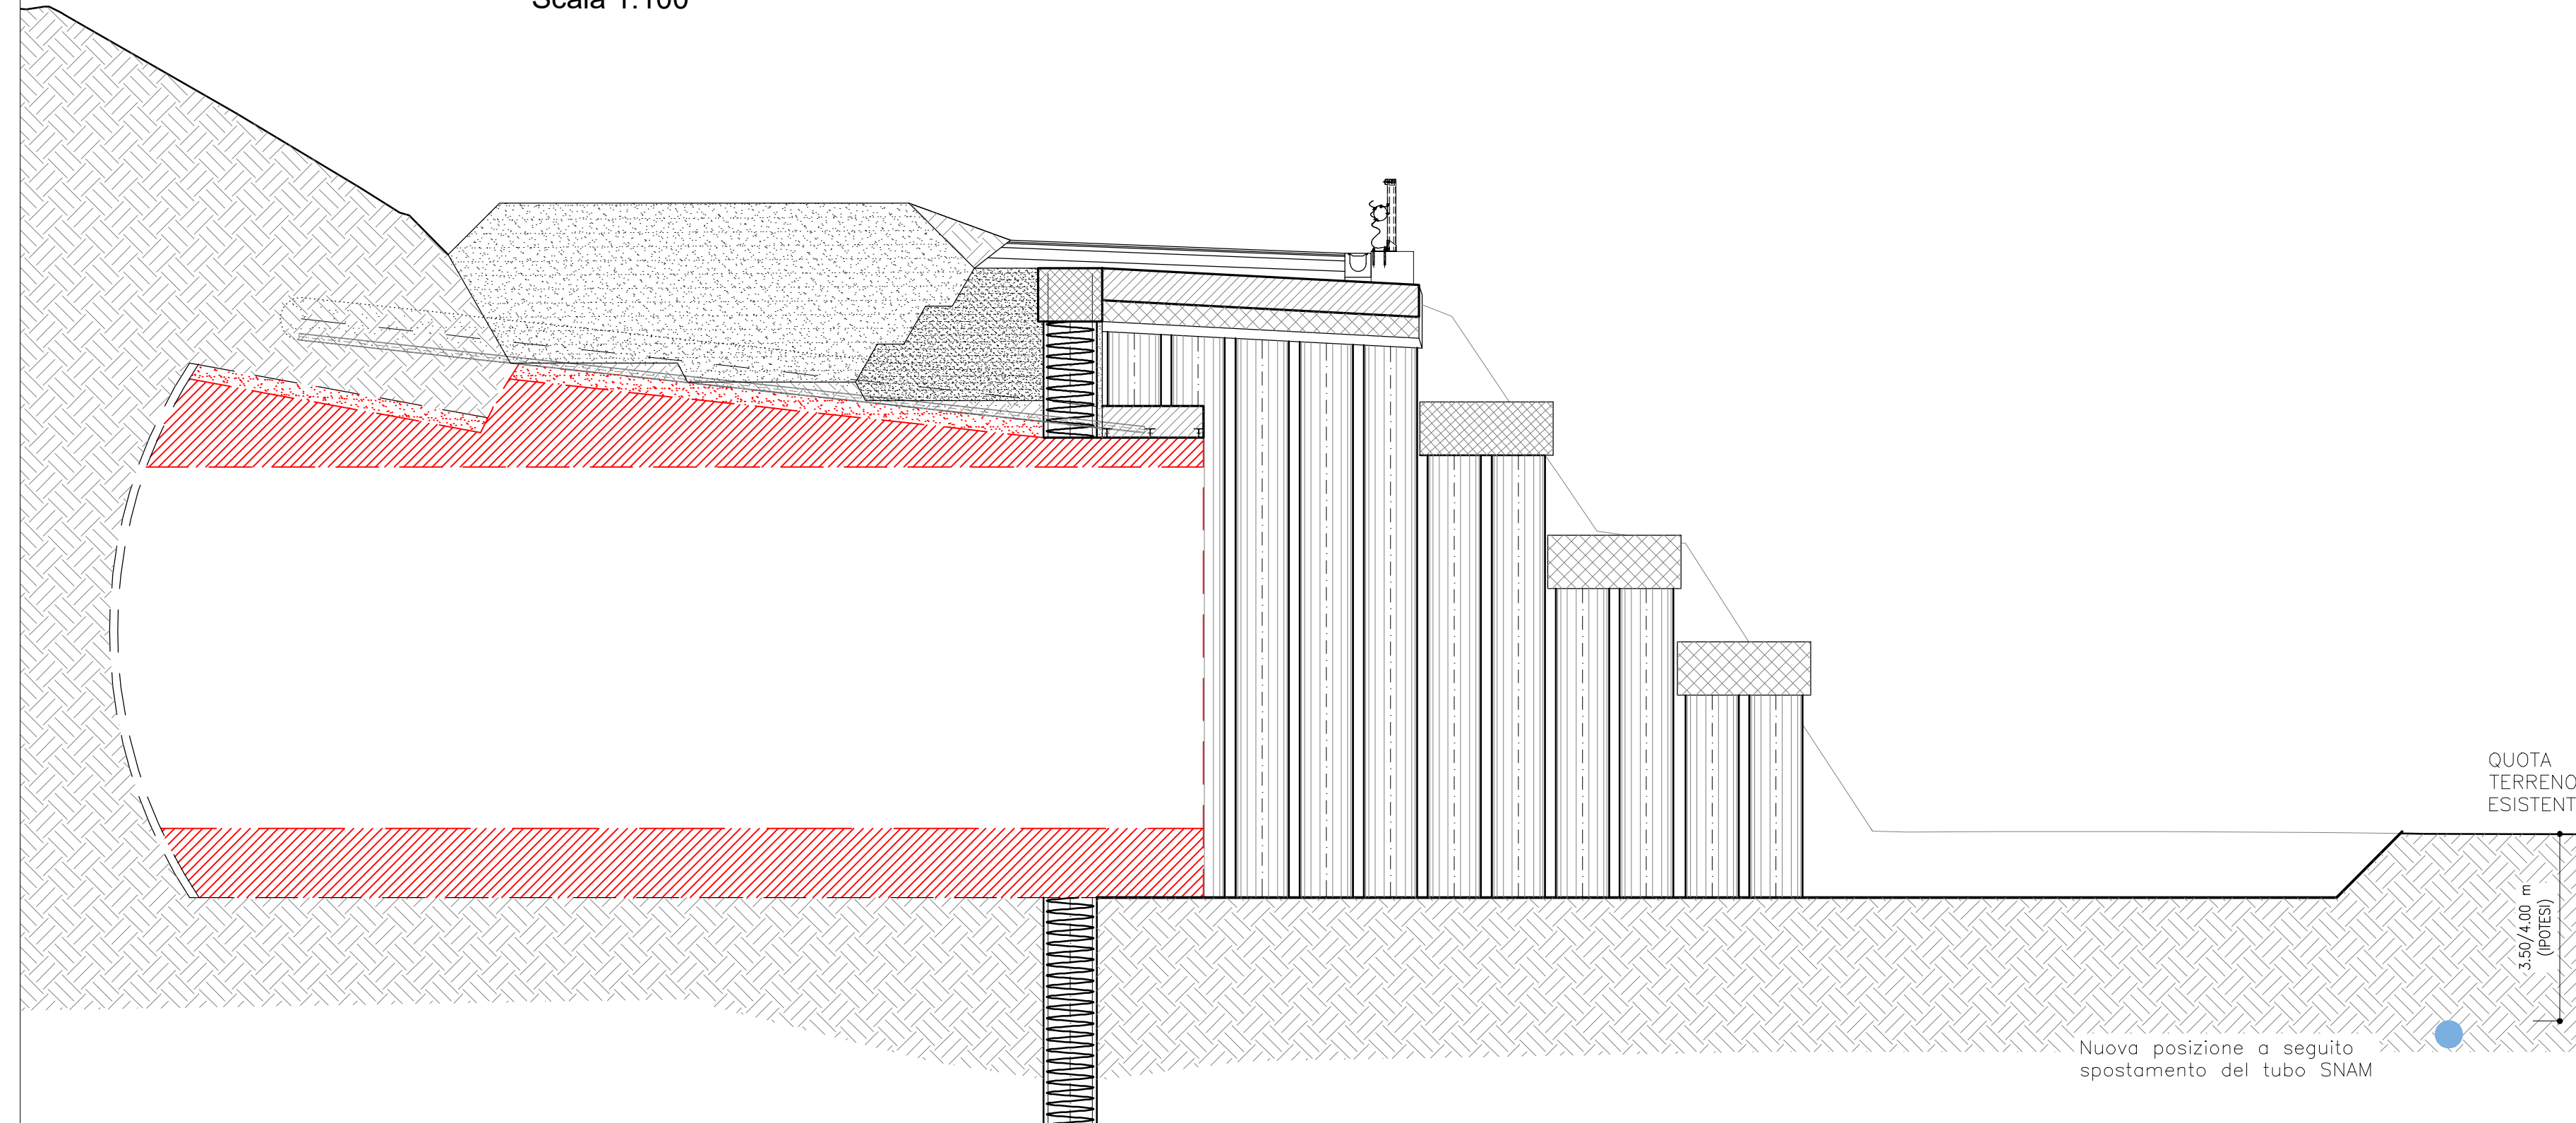

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **WSP** CONSORZIO DOLMITI

PROGETTAZIONE: **SWS** MANUTENZIONE

MANDANTI: **PINI**, **GDP GEOMIN**, **SIS**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: **GIORGIO PINI**

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"

DISEGNO: **08 - GALLERIE**
M-FINESTRA FUNES E GALLERIA DI SFOLLAMENTO
Imbocco Finestra Funes
Fasi esecutive Tav. 3/3

APPALTATORE: **WSP**

SCALA: 1:100

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Date
A	Emissione	M. Sestini	19/10/2021	A. Sestini	19/10/2021	Giuseppe	20/10/2021	
B	Revisione e integrazione del file di progetto	M. Sestini	20/10/2021	A. Sestini	21/10/2021	Giuseppe	22/10/2021	
C	Revisione e integrazione del file di progetto	M. Sestini	21/10/2021	A. Sestini	21/10/2021	Giuseppe	22/10/2021	
D	Revisione e integrazione del file di progetto	M. Sestini	21/10/2021	A. Sestini	21/10/2021	Giuseppe	22/10/2021	

File: IBQU1AEZPPGA060000SD.dwg
