



**CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE D'APULIA**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO RURALE DELLA MURGIA - SCHEMA SUD -



PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:

Responsabile del Procedimento:

ARKE'
Ingegneria s.r.l.
Via Imperatore Traiano n.4 - 70126 Bari

Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7288

Dott. Ing. Giovanni VITONE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.3313

Dott. Ing. Gioacchino ANGARANO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.5970

Dott. Ing. Luigi FANELLI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7428

Dott. Ing. Stefano FRANCAVILLA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.4927

Dott. Ing. Marta BARILE

Codice

Elaborato

C08.4

PSC - Cronoprogramma della sicurezza

4	GIUGNO - 2022	Emesso per Riscontro Verifica	SCALA	
3	GENNAIO - 2022	Emesso per PUA		
0	MAGGIO - 2019	Emesso per Progetto Esecutivo	019 - ARM - PSCC	Pdf
REV	DATA	NOTE	COD.ELABORATO	

ALLEGATO "A"

**Comune di Massafra, Crispiano, Martina
Franca, Noci, Mottola, Gioia del Colle**
Provincia di BA-TA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO
RURALE DELLA MURGIA- SCHEMA SUD

COMMITTENTE: Consorzio di bonifica Terre d'Apulia.

CANTIERE: -, Massafra, Crispiano, Martina Franca, Noci, Mottola, Gioia del Colle (BA-TA)

Bari, 31/01/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Angarano Gioacchino)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Barile Marta)

Ingegnere Angarano Gioacchino

Via Imperatore Traiano 4
70126 Bari (Ba)
Tel.: 0802022423 - Fax: -
E-Mail: g.angarano@arkeingegneria.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Preparazione delle aree di cantiere				
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	4
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	2	2
Apprestamenti del cantiere				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2
Impianti di servizio del cantiere				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	3	3
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	4	6
Rimozione asfalto e scavo				
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	245	356
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	245	356
Scavo a sezione ristretta	1	E	245	354
Rinterri e rinfianchi				
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	245	354
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	245	354
Posa condotte ed apparecchiature				
Posa di condotta idrica in materie plastiche	1	E	245	354
Posa di condotta idrica in ghisa	1	E	353	509
Posa di condotta idrica tramite tecnica no dig	1	E	10	12
	1	E	10	12
	1	E	9	15
	1	E	10	12
	1	E	10	12
	1	E	10	15
	1	E	10	12
	1	E	10	15
	1	E	10	14
	1	E	10	14
	1	E	10	12
	1	E	13	20
Posa di organi di intercettazione e regolazione	1	E	245	354
Pozzetti di scarico e sfiato	1	E	244	353
Realizzazione di muro a secco	1	E	31	43
Formazione di fondazione stradale	1	E	347	501
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	344	498
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	22	30
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA


I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

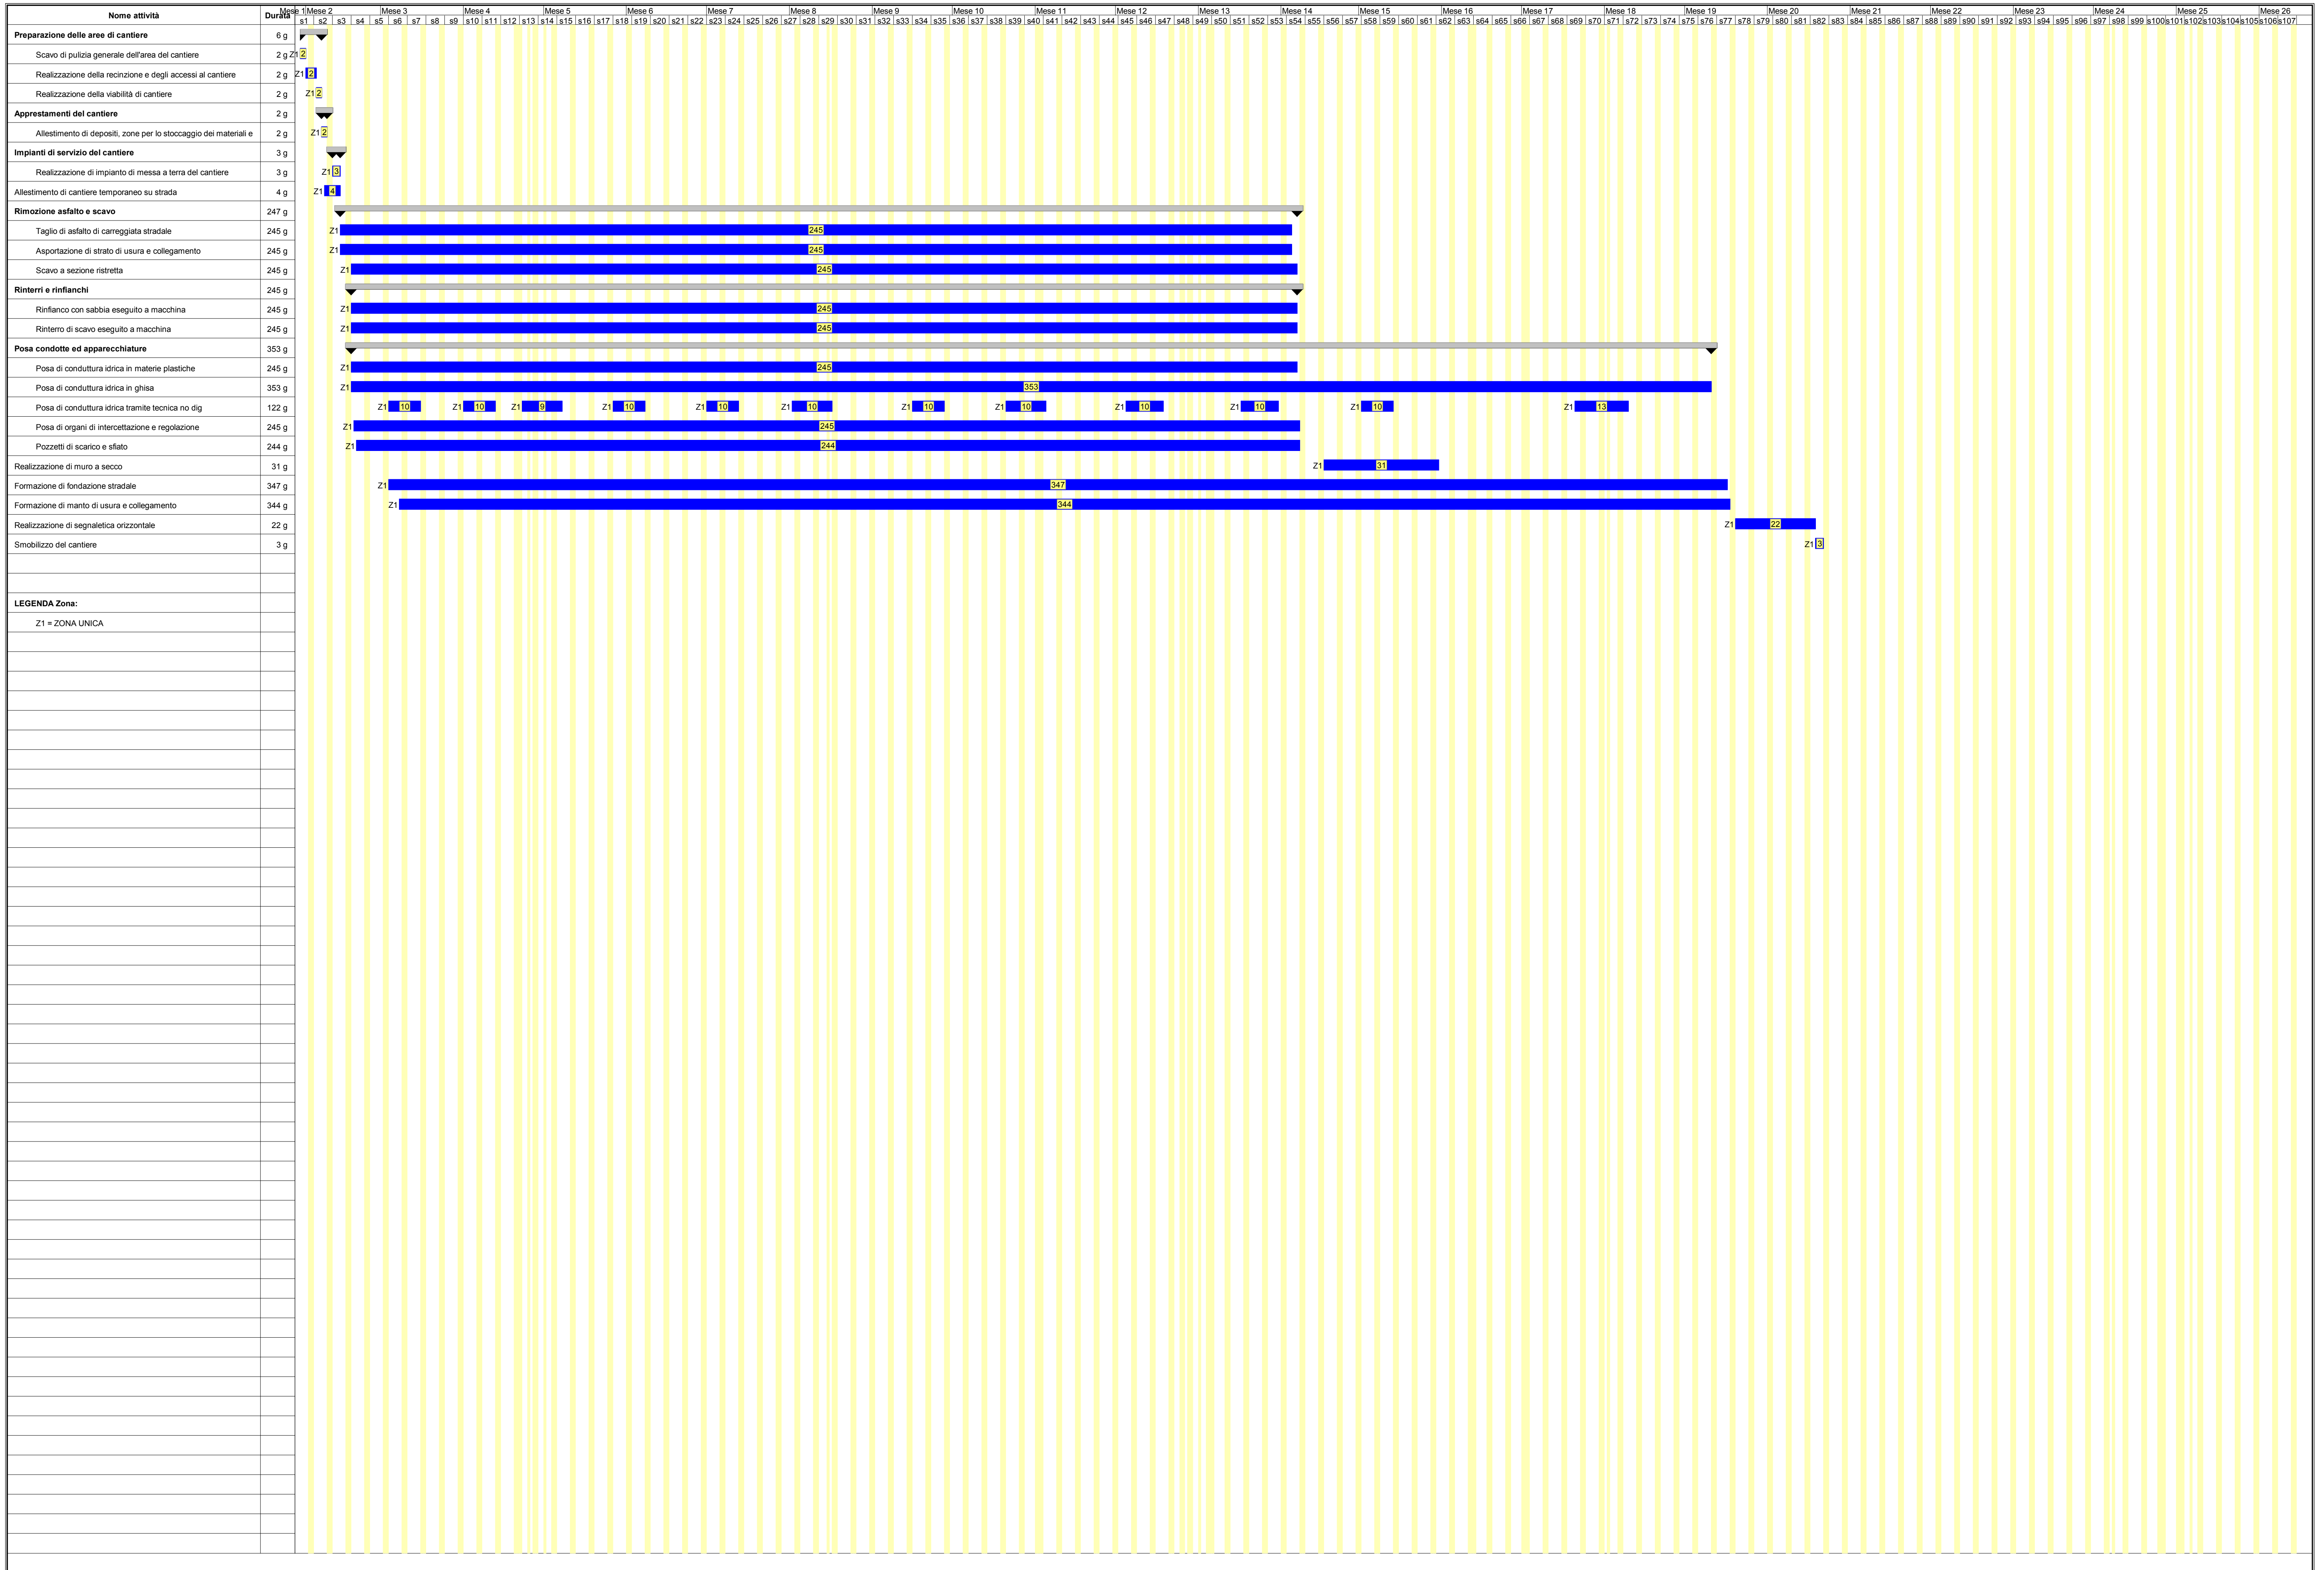

LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA
