

COMUNE DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

PROGETTO:

LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI

PROGETTO ESECUTIVO



TAV. N°

L

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA

DATA

AGGIOR.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

ING.AGOSTINO SICA

Comune di AGROPOLI

Provincia di SALERNO

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

AGROPOLI, 08/03/2021

Il Tecnico
(UTC-ING.AGOSTINO SICA)

Comune di AGROPOLI

Provincia di SALERNO

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **365** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 124'755,47 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 139'256,81 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Prezzo Chiuso

L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei lavori:

- anno 1 - **Importo** euro 1'497'065,68;
- anno 2 - **Importo** euro 0,00;

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

AGROPOLI, 08/03/2021

Il Tecnico
(UTC-ING.AGOSTINO SICA)

Comune di AGROPOLI

Provincia di SALERNO

Cronoprogramma di PROGETTO


OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI


COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE


AGROPOLI, 08/03/2021


Il Tecnico
(UTC-ING.AGOSTINO SICA)


ID	Nome attività	Durata	Importo	Aprile 2021															Maggio 2021																	
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
1	INSTALLAZIONE CANTIERE	5 g	0,00	[Barre blu e gialle]															[Barre gialle]																	
2	LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI	247 g	1'051'559,70	[Barre gialle]															[Barre blu e gialle]																	
3	TRASPORTO E ONERI DI DISCARICA	247 g	395'505,97	[Barre gialle]															[Barre blu e gialle]																	
4	SICUREZZA	255 g	50'000,00	[Barre blu e gialle]															[Barre gialle]																	
5	SMOBILIZZO CANTIERE	3 g	0,00	[Barre gialle]															[Barre gialle]																	

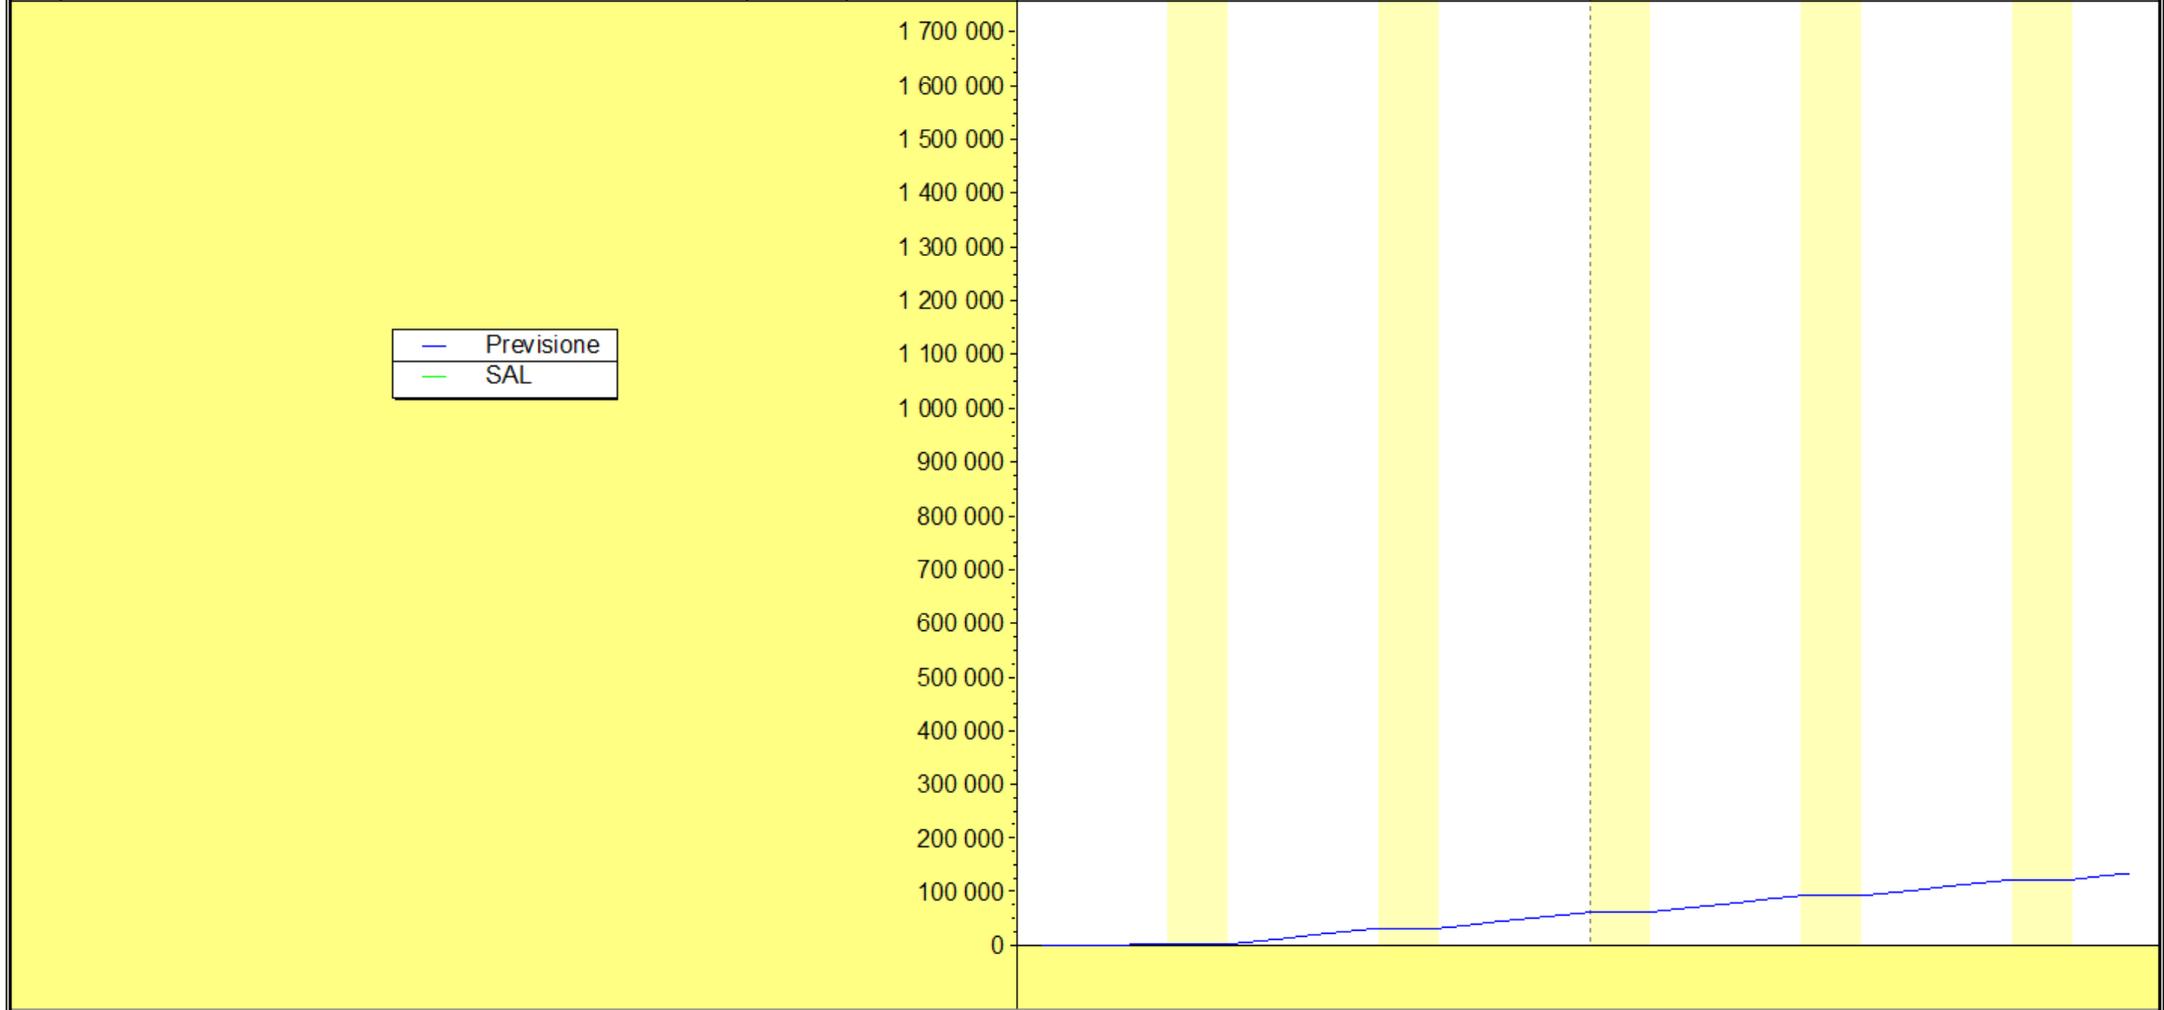


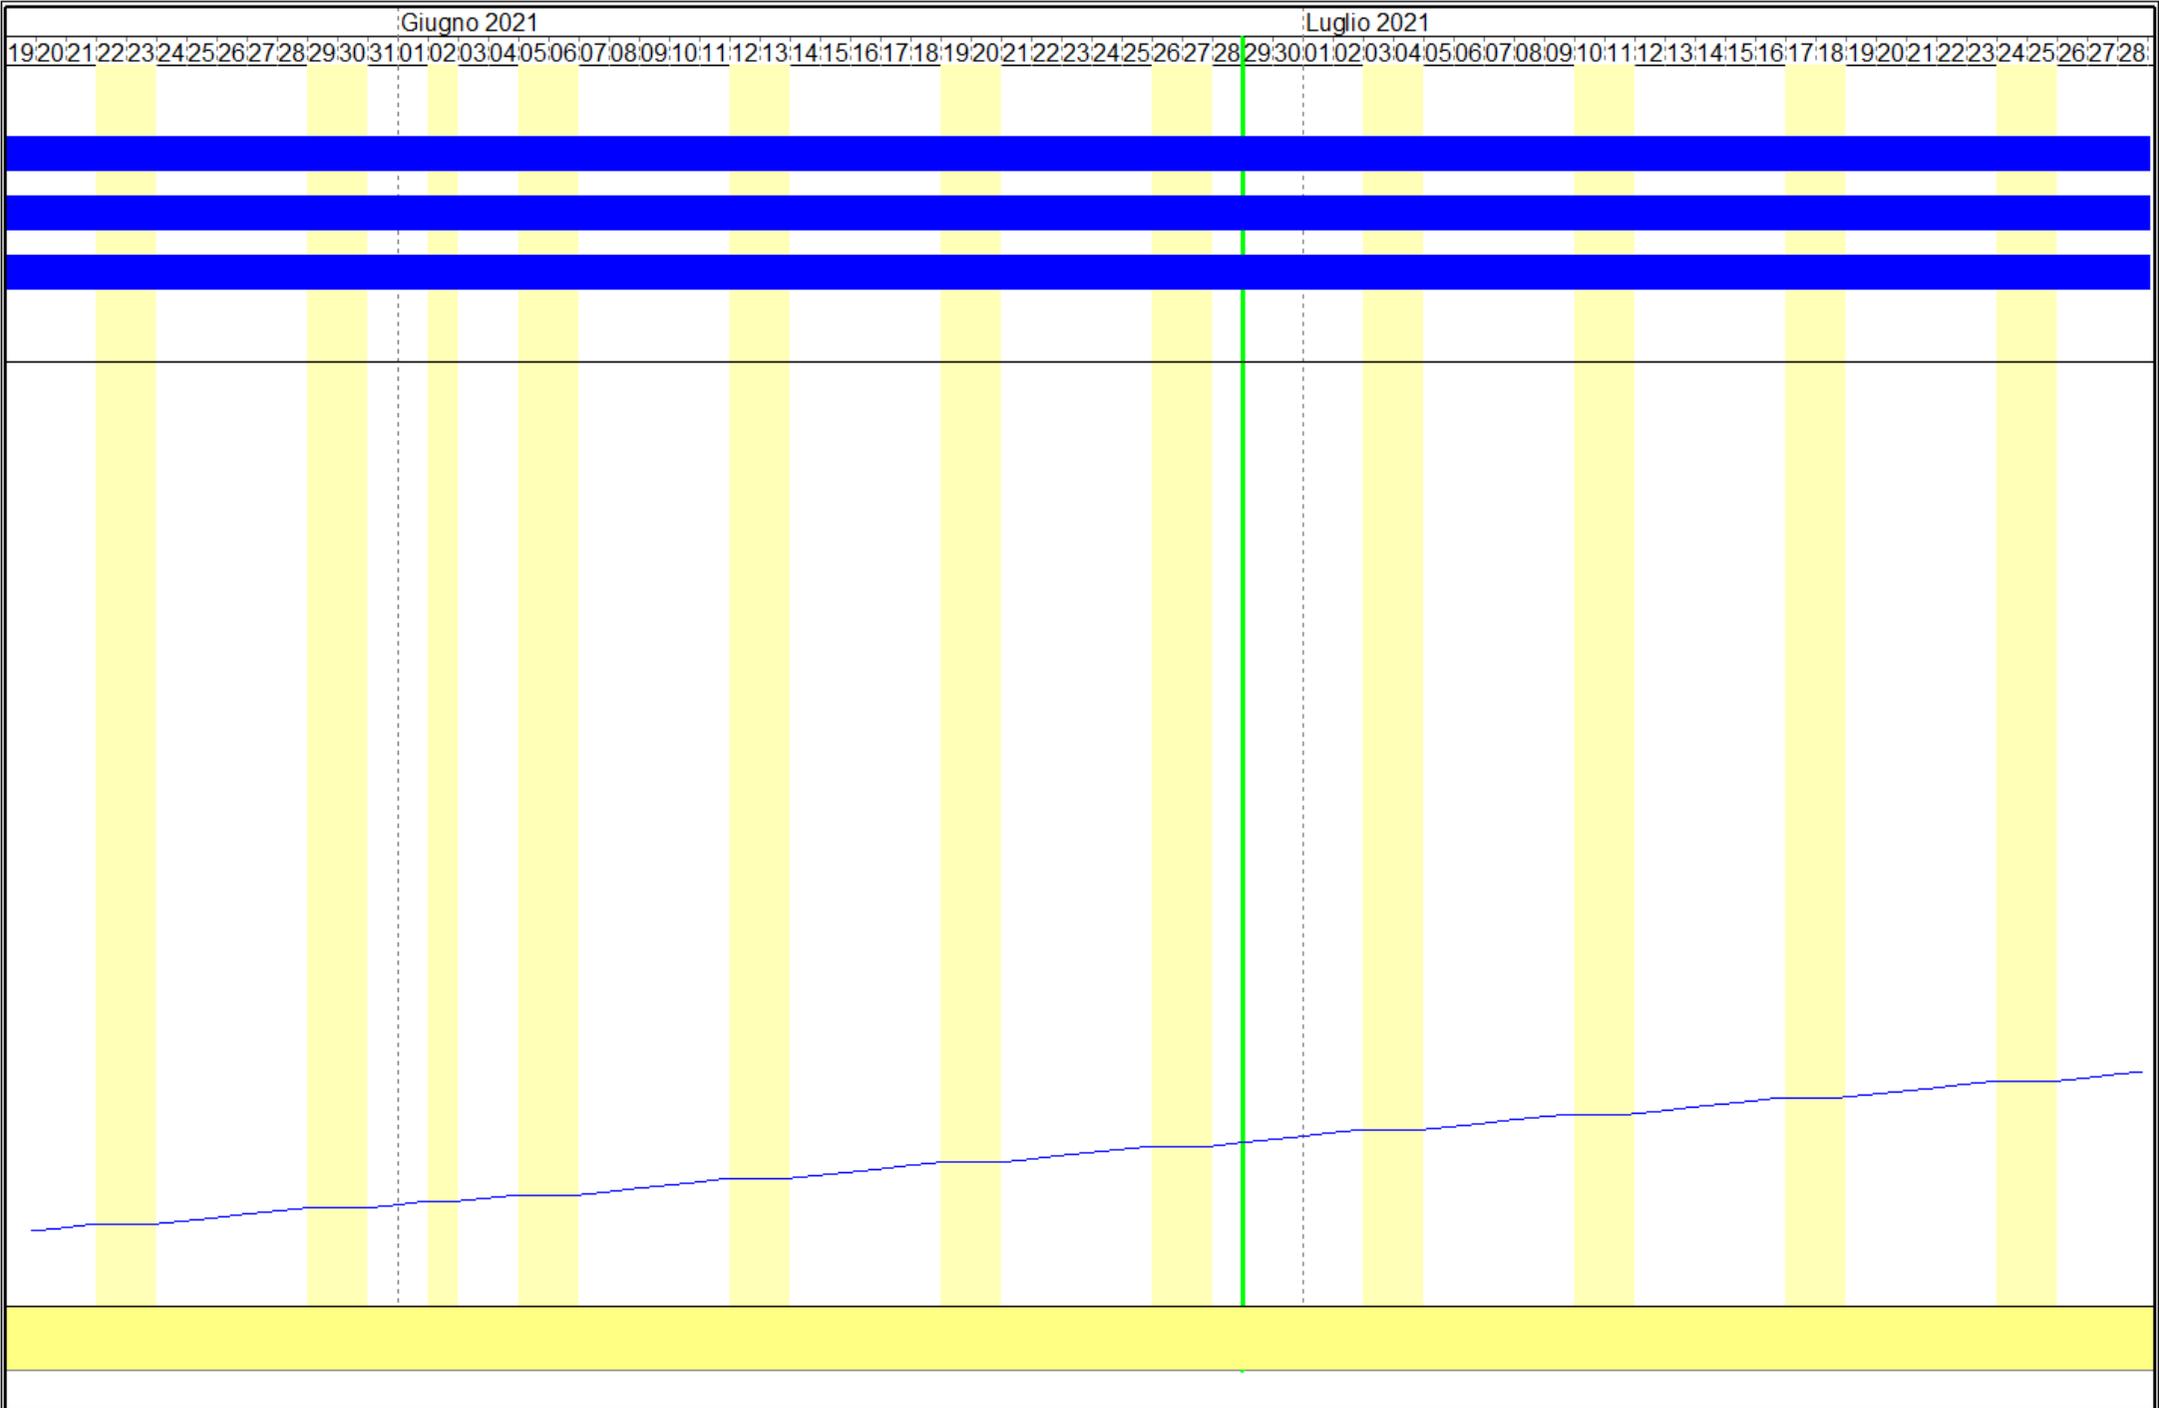

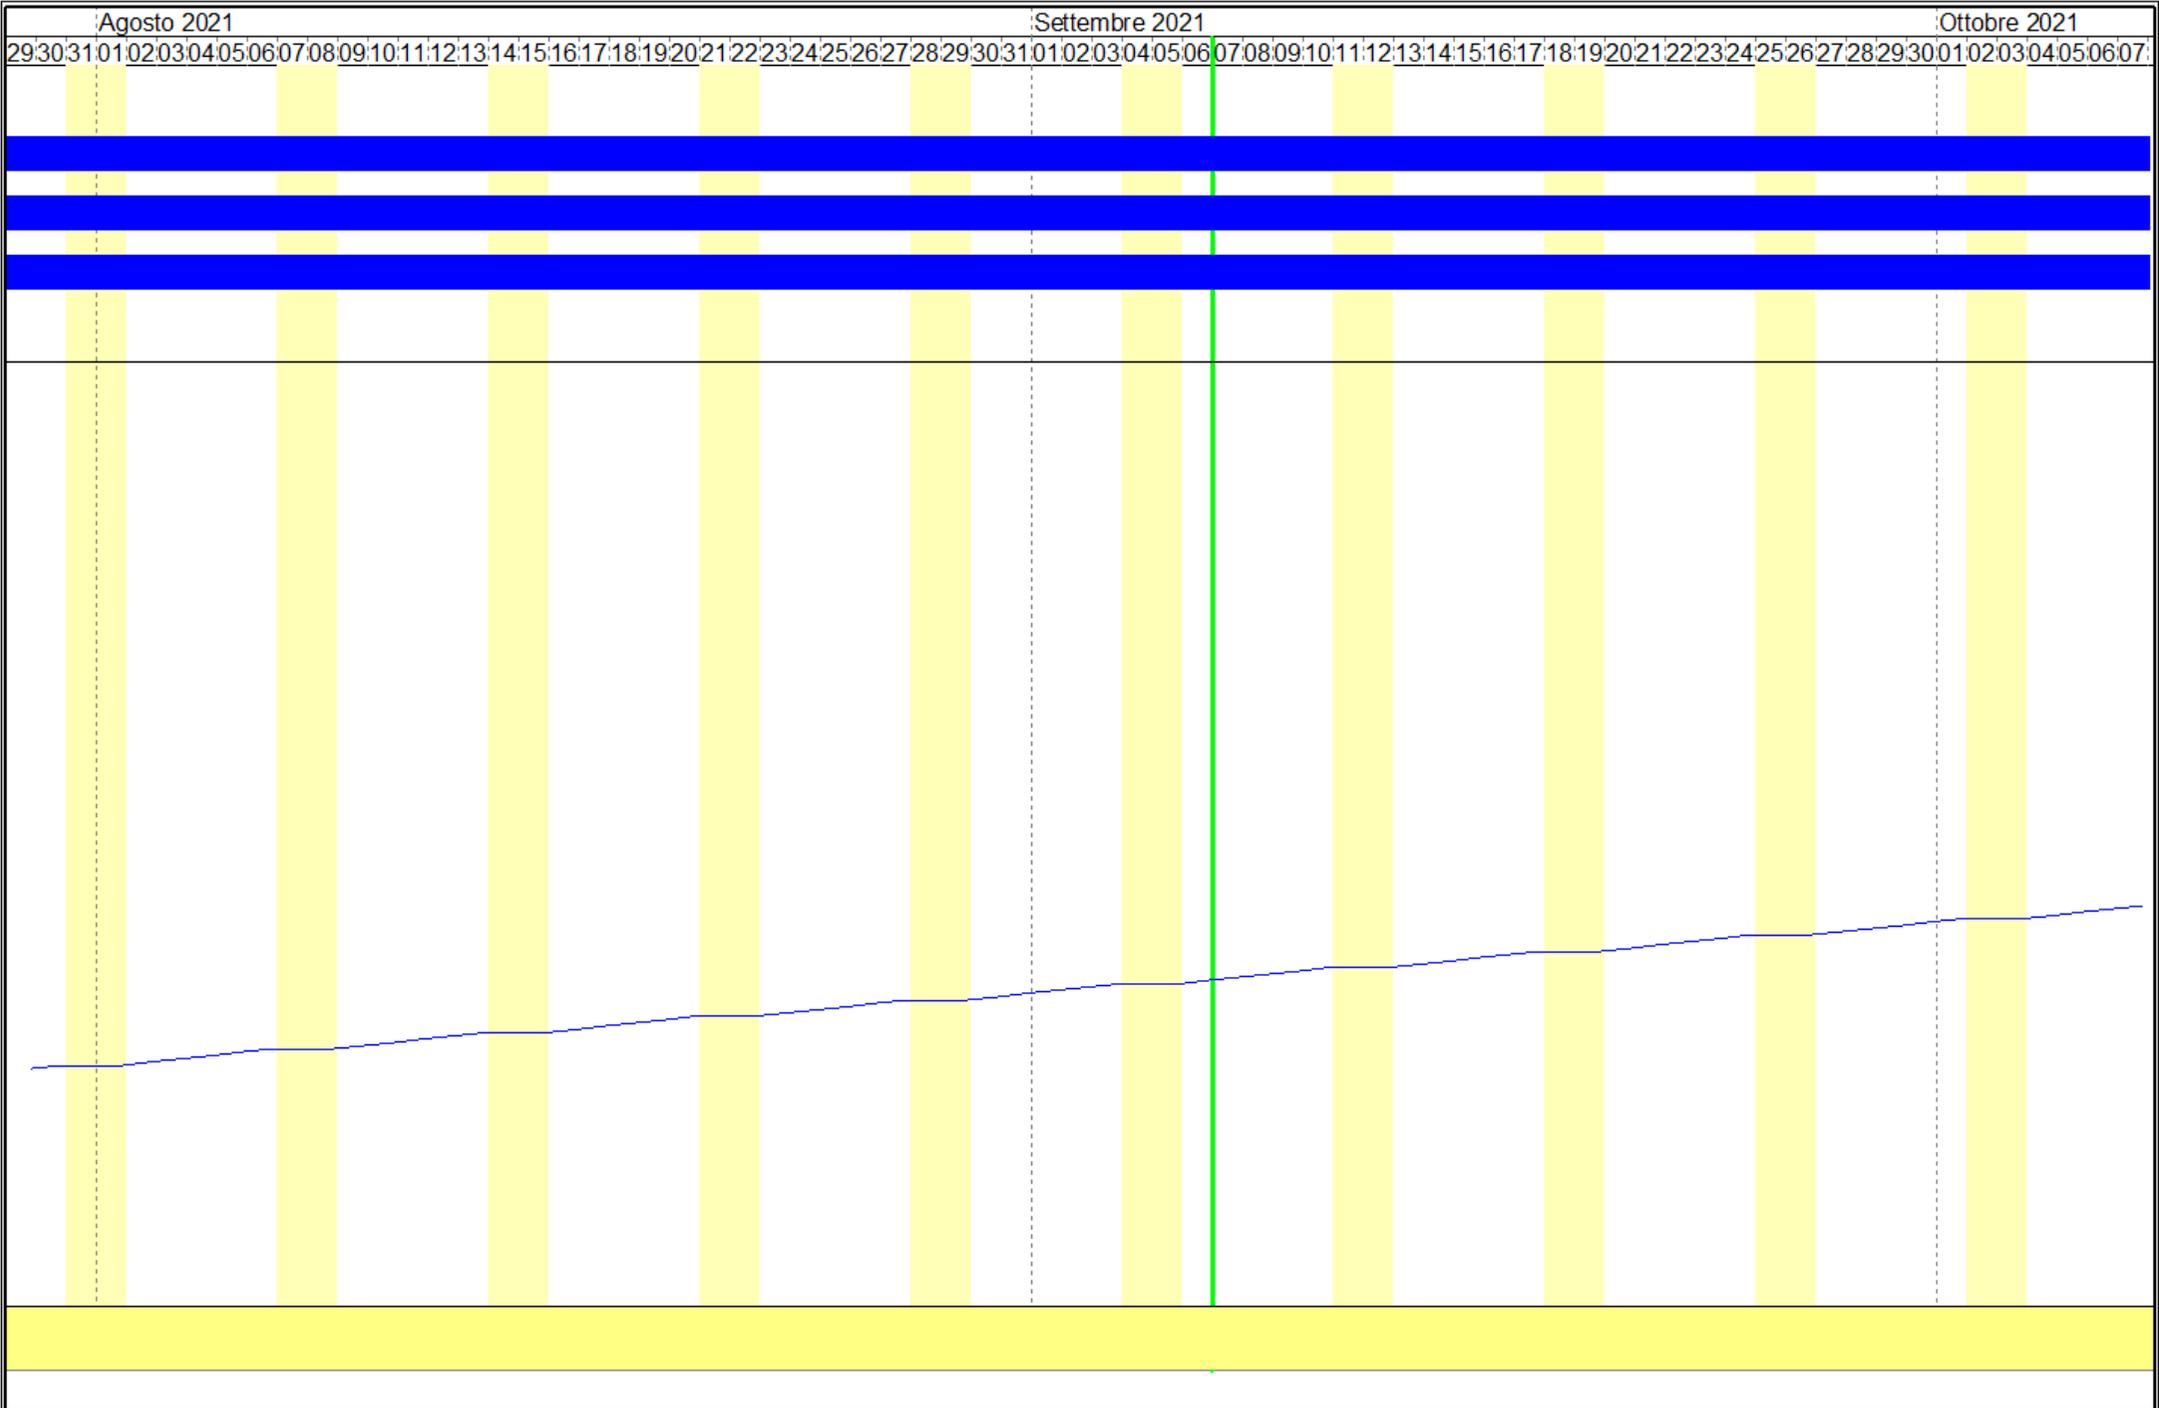

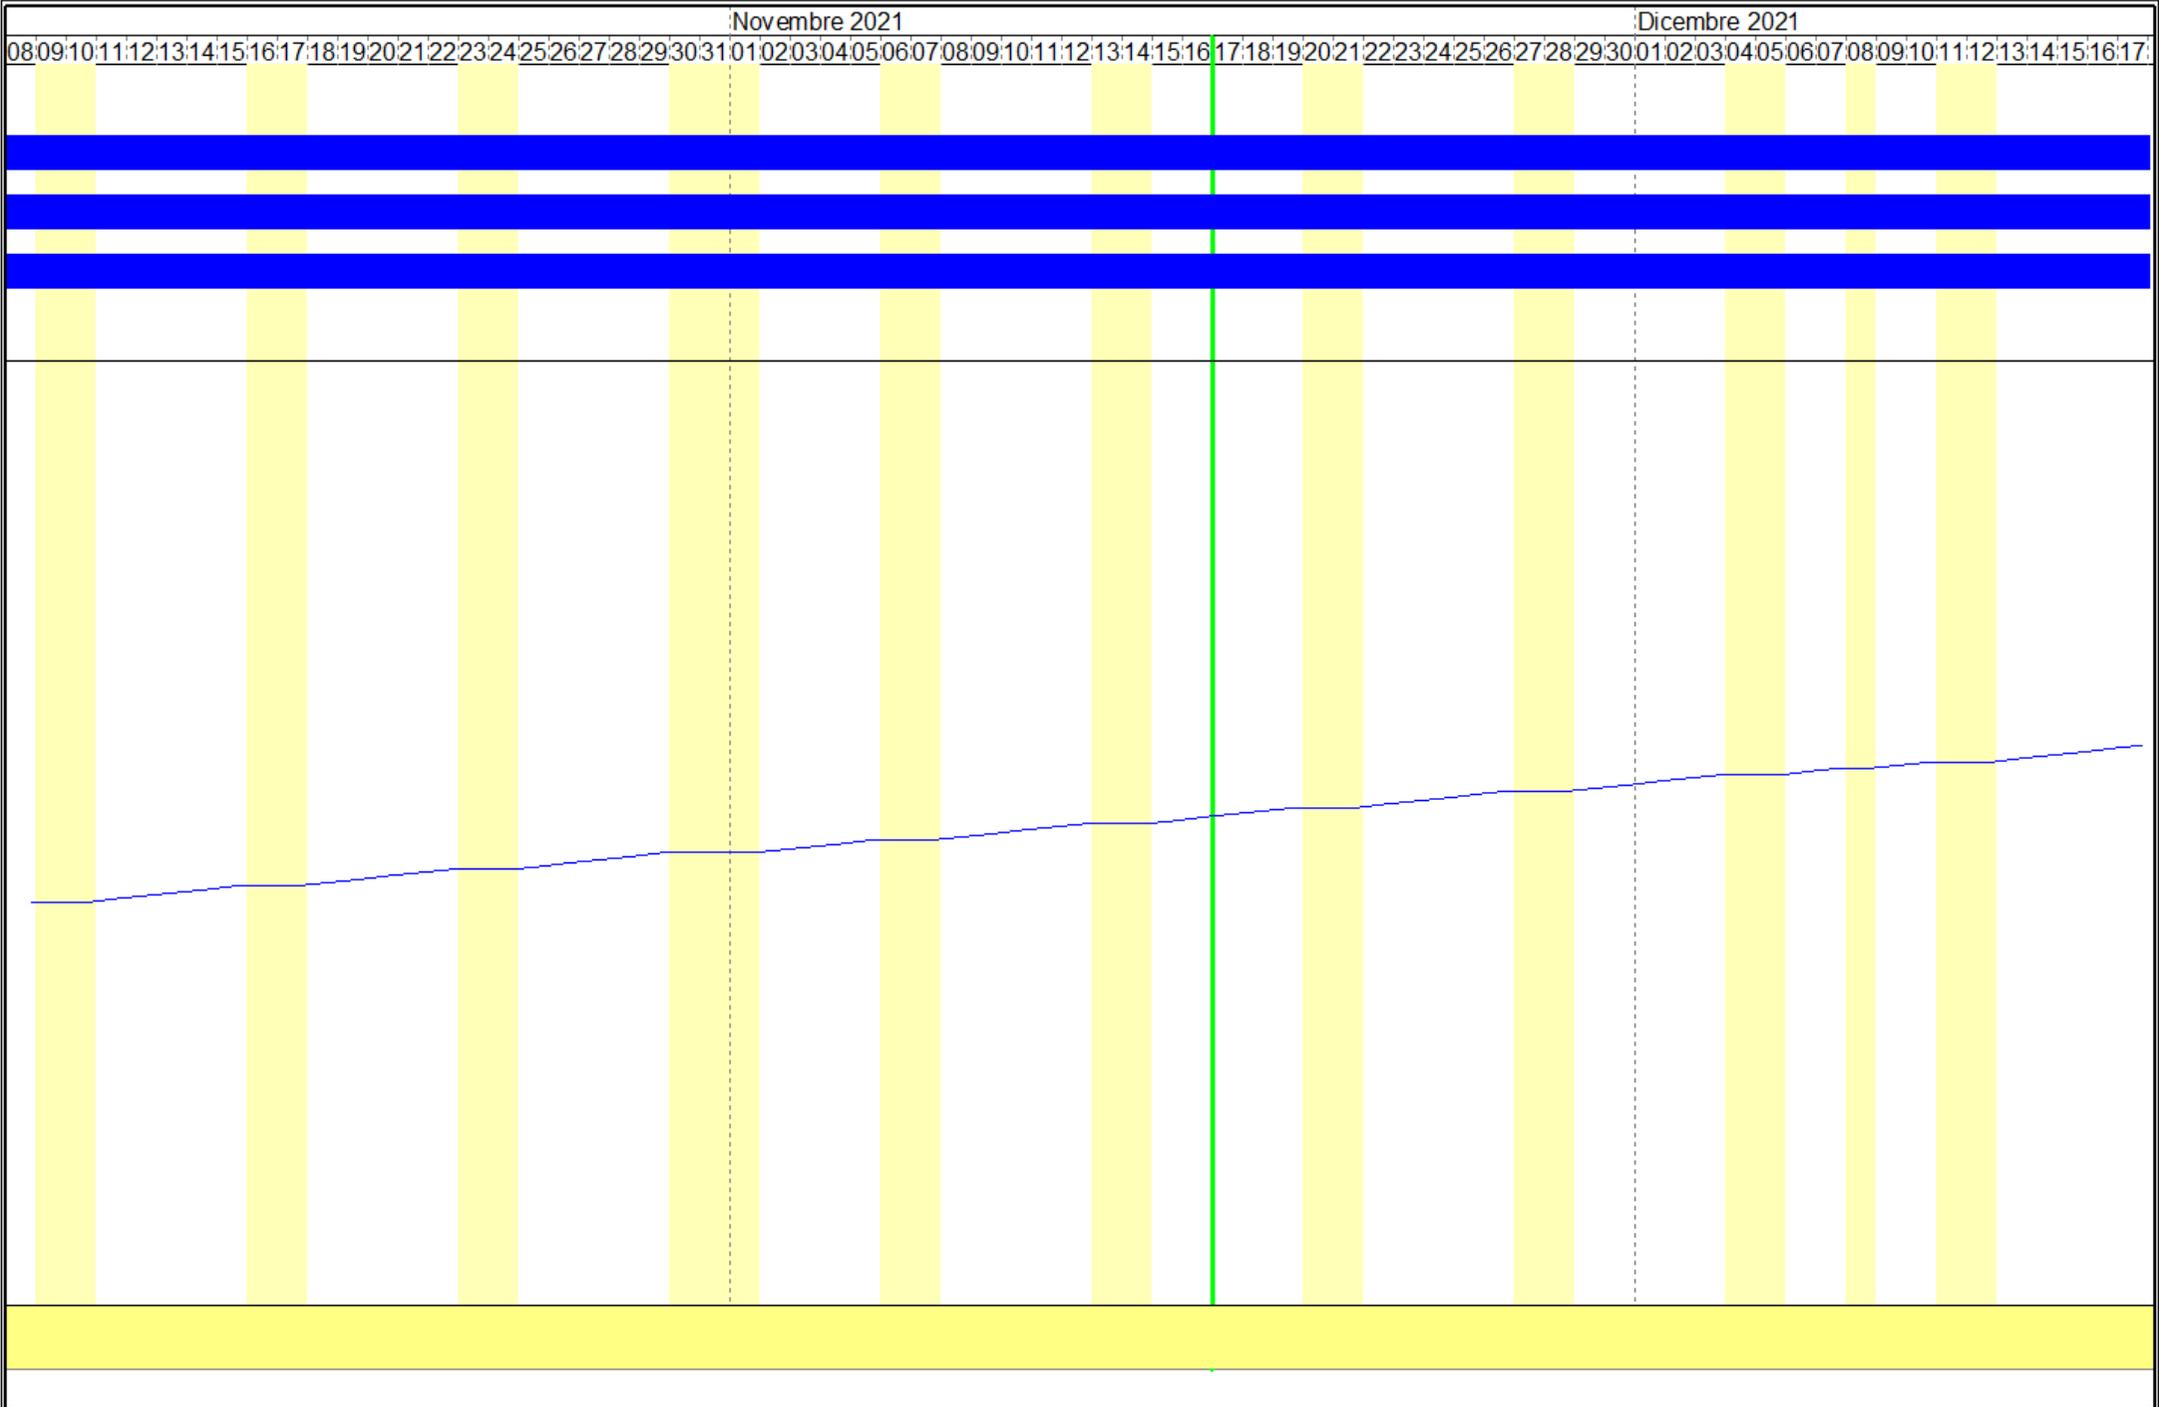

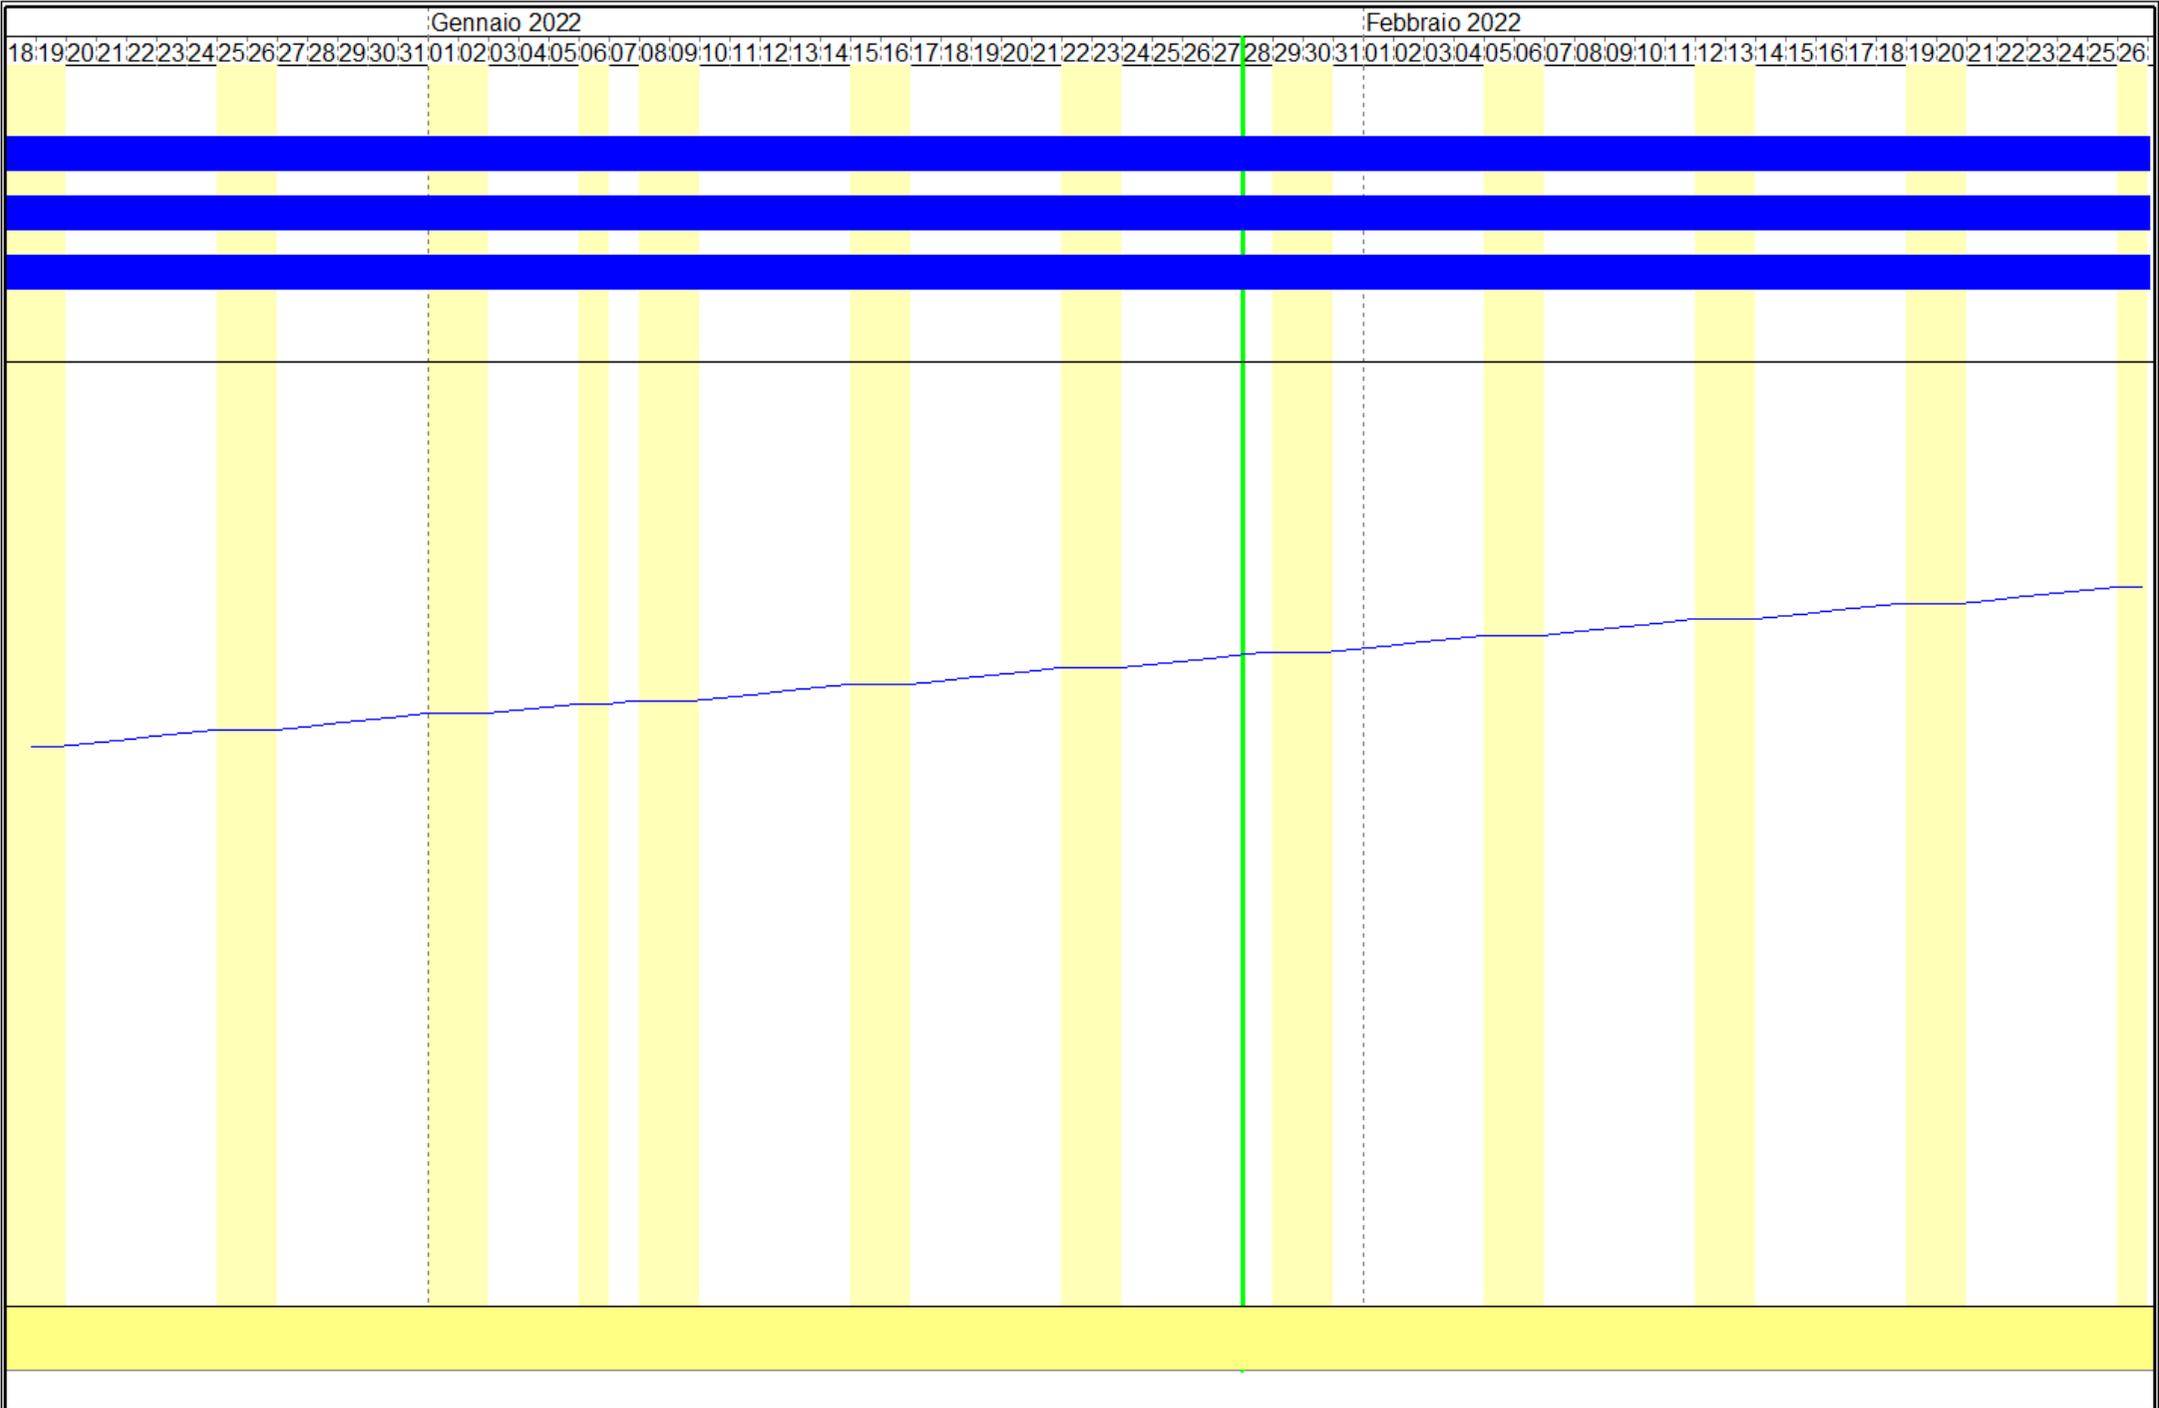

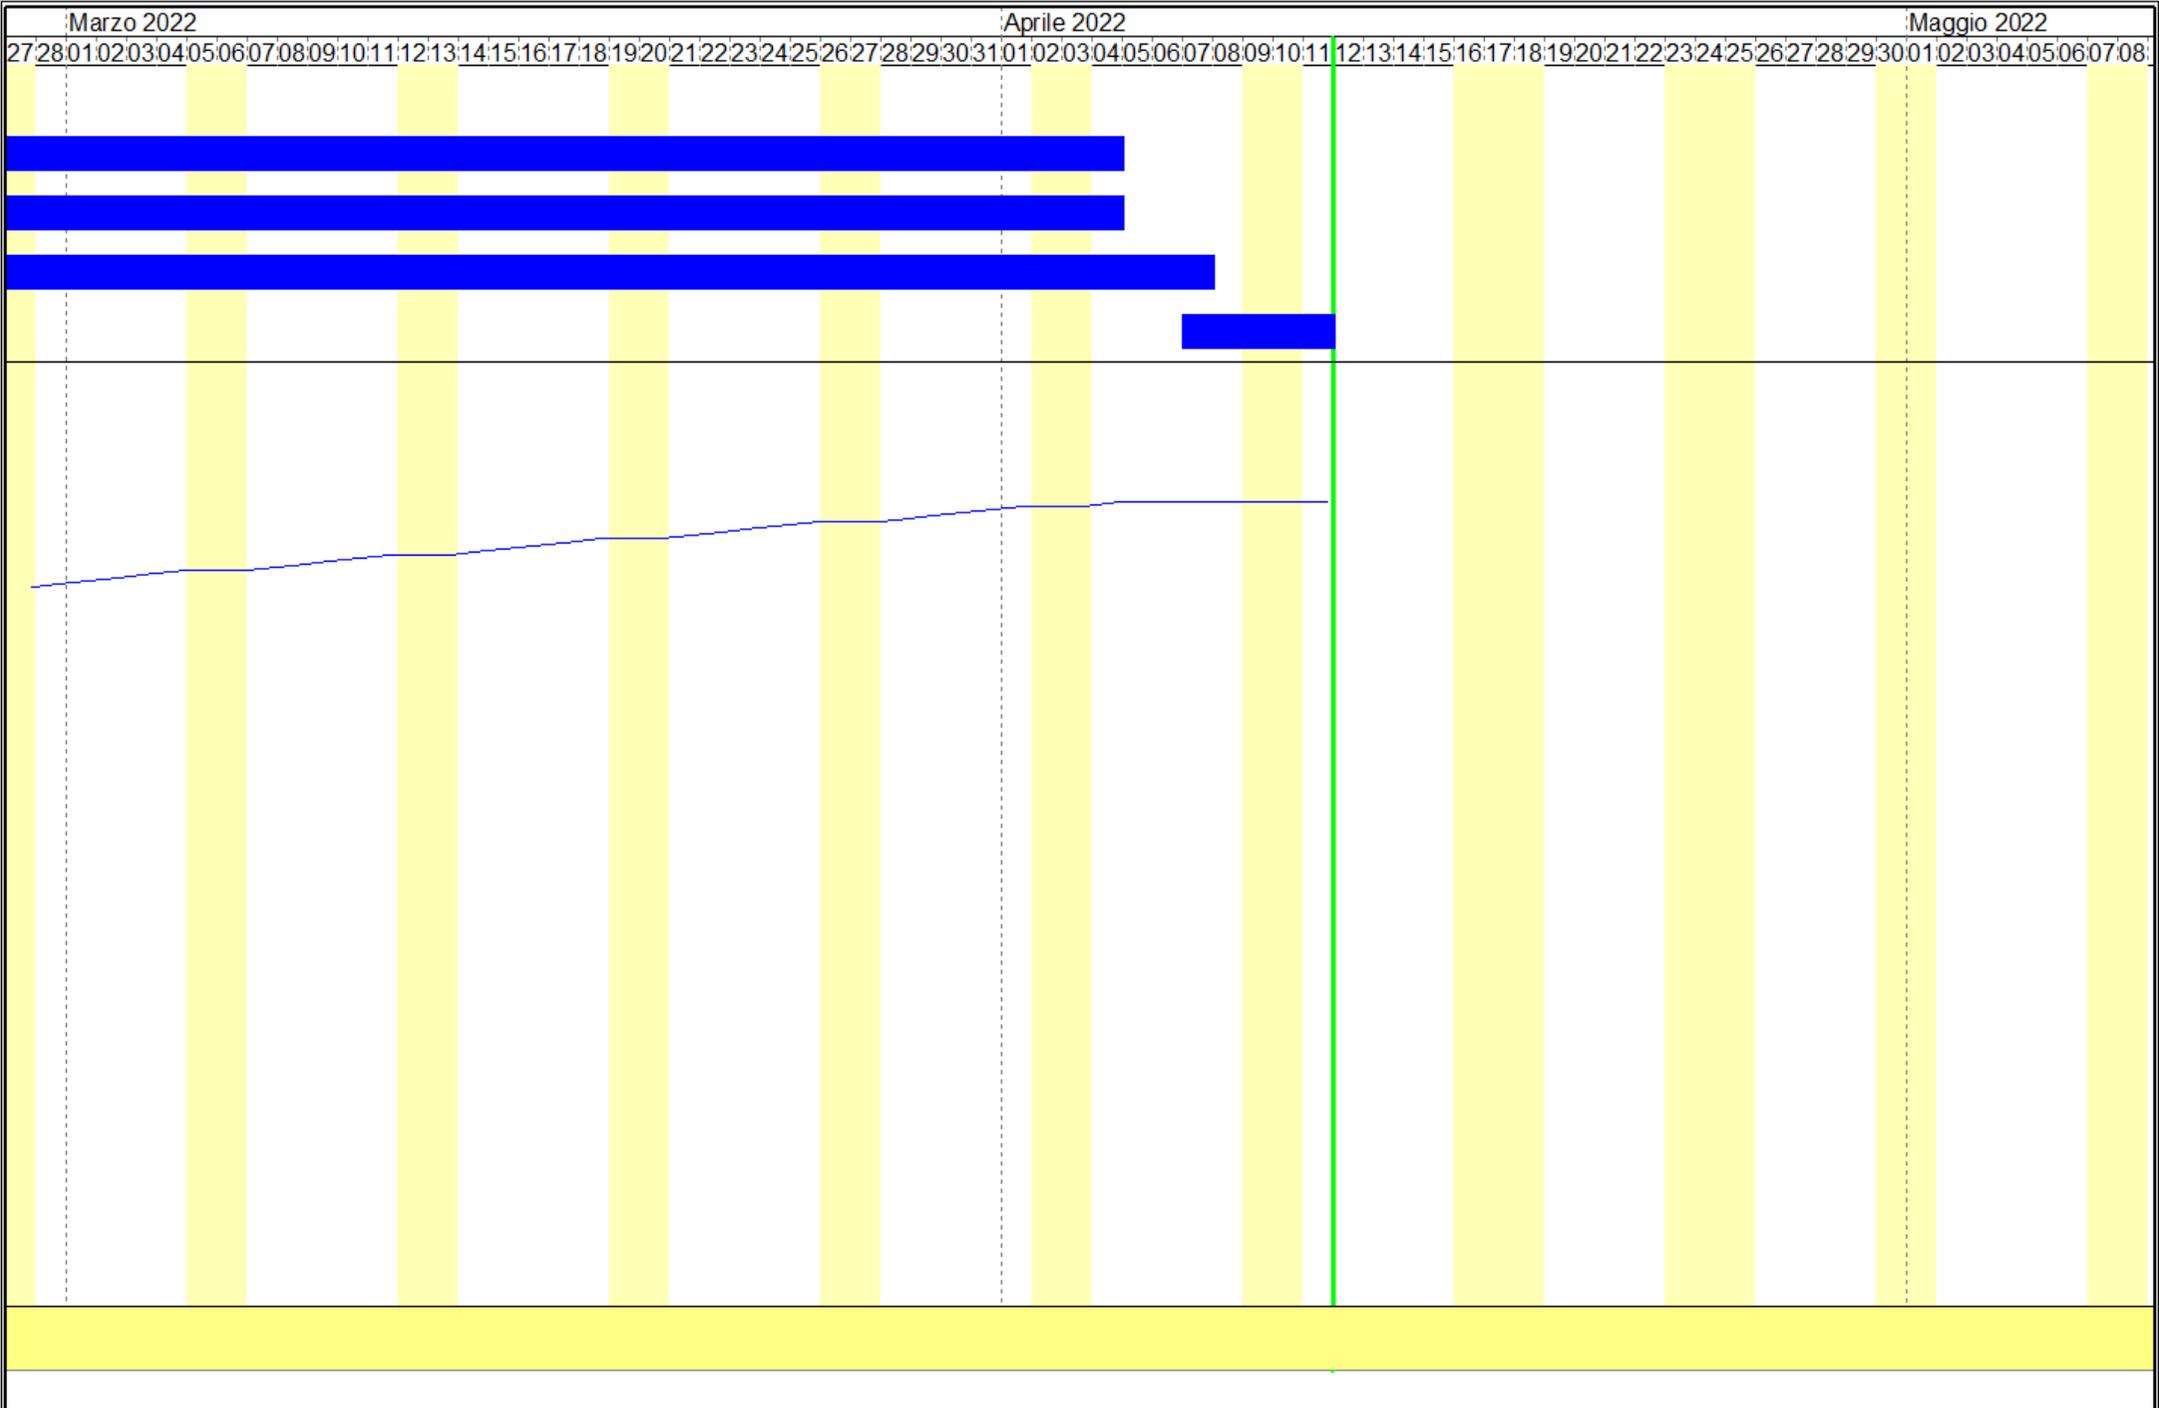

Comune di AGROPOLI

Provincia di SALERNO

Tabella Attività

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

AGROPOLI, 08/03/2021

Il Tecnico
(UTC-ING.AGOSTINO SICA)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
INSTALLAZIONE CANTIERE	0,00	0,000	12/04/2021	16/04/2021	5	5
LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI	1'051'559,70	70,241	19/04/2021	04/04/2022	247	351
TRASPORTO E ONERI DI DISCARICA	395'505,97	26,419	19/04/2021	04/04/2022	247	351
SICUREZZA	50'000,00	3,340	12/04/2021	07/04/2022	255	361
SMOBILIZZO CANTIERE	0,00	0,000	07/04/2022	11/04/2022	3	5
AGROPOLI, 08/03/2021						
Tecnico UTC-ING.AGOSTINO SICA						

Comune di AGROPOLI

Provincia di SALERNO

Tabella Date e Importi

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

AGROPOLI, 08/03/2021

Il Tecnico
(UTC-ING.AGOSTINO SICA)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
12/04/2021	196,08	196,08	0,013
13/04/2021	196,08	392,16	0,026
14/04/2021	196,08	588,24	0,039
15/04/2021	196,08	784,31	0,052
16/04/2021	196,08	980,39	0,065
19/04/2021	6'054,64	7'035,04	0,470
20/04/2021	6'054,64	13'089,68	0,874
21/04/2021	6'054,64	19'144,32	1,279
22/04/2021	6'054,64	25'198,97	1,683
23/04/2021	6'054,64	31'253,61	2,088
26/04/2021	6'054,64	37'308,26	2,492
27/04/2021	6'054,64	43'362,90	2,897
28/04/2021	6'054,64	49'417,54	3,301
29/04/2021	6'054,64	55'472,19	3,705
30/04/2021	6'054,64	61'526,83	4,110
03/05/2021	6'054,64	67'581,48	4,514
04/05/2021	6'054,64	73'636,12	4,919
05/05/2021	6'054,64	79'690,76	5,323
06/05/2021	6'054,64	85'745,41	5,728
07/05/2021	6'054,64	91'800,05	6,132
10/05/2021	6'054,64	97'854,69	6,536
11/05/2021	6'054,64	103'909,34	6,941
12/05/2021	6'054,64	109'963,98	7,345
13/05/2021	6'054,64	116'018,63	7,750
14/05/2021	6'054,64	122'073,27	8,154
17/05/2021	6'054,64	128'127,91	8,559
18/05/2021	6'054,64	134'182,56	8,963
19/05/2021	6'054,64	140'237,20	9,367
20/05/2021	6'054,64	146'291,85	9,772
21/05/2021	6'054,64	152'346,49	10,176
24/05/2021	6'054,64	158'401,13	10,581
25/05/2021	6'054,64	164'455,78	10,985
26/05/2021	6'054,64	170'510,42	11,390
27/05/2021	6'054,64	176'565,07	11,794
28/05/2021	6'054,64	182'619,71	12,199
31/05/2021	6'054,64	188'674,35	12,603
01/06/2021	6'054,64	194'729,00	13,007
03/06/2021	6'054,64	200'783,64	13,412
04/06/2021	6'054,64	206'838,28	13,816
07/06/2021	6'054,64	212'892,93	14,221
08/06/2021	6'054,64	218'947,57	14,625

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
09/06/2021	6'054,64	225'002,22	15,030
10/06/2021	6'054,64	231'056,86	15,434
11/06/2021	6'054,64	237'111,50	15,838
14/06/2021	6'054,64	243'166,15	16,243
15/06/2021	6'054,64	249'220,79	16,647
16/06/2021	6'054,64	255'275,44	17,052
17/06/2021	6'054,64	261'330,08	17,456
18/06/2021	6'054,64	267'384,72	17,861
21/06/2021	6'054,64	273'439,37	18,265
22/06/2021	6'054,64	279'494,01	18,669
23/06/2021	6'054,64	285'548,66	19,074
24/06/2021	6'054,64	291'603,30	19,478
25/06/2021	6'054,64	297'657,94	19,883
28/06/2021	6'054,64	303'712,59	20,287
29/06/2021	6'054,64	309'767,23	20,692
30/06/2021	6'054,64	315'821,87	21,096
01/07/2021	6'054,64	321'876,52	21,500
02/07/2021	6'054,64	327'931,16	21,905
05/07/2021	6'054,64	333'985,81	22,309
06/07/2021	6'054,64	340'040,45	22,714
07/07/2021	6'054,64	346'095,09	23,118
08/07/2021	6'054,64	352'149,74	23,523
09/07/2021	6'054,64	358'204,38	23,927
12/07/2021	6'054,64	364'259,03	24,332
13/07/2021	6'054,64	370'313,67	24,736
14/07/2021	6'054,64	376'368,31	25,140
15/07/2021	6'054,64	382'422,96	25,545
16/07/2021	6'054,64	388'477,60	25,949
19/07/2021	6'054,64	394'532,25	26,354
20/07/2021	6'054,64	400'586,89	26,758
21/07/2021	6'054,64	406'641,53	27,163
22/07/2021	6'054,64	412'696,18	27,567
23/07/2021	6'054,64	418'750,82	27,971
26/07/2021	6'054,64	424'805,46	28,376
27/07/2021	6'054,64	430'860,11	28,780
28/07/2021	6'054,64	436'914,75	29,185
29/07/2021	6'054,64	442'969,40	29,589
30/07/2021	6'054,64	449'024,04	29,994
02/08/2021	6'054,64	455'078,68	30,398
03/08/2021	6'054,64	461'133,33	30,802
04/08/2021	6'054,64	467'187,97	31,207

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
05/08/2021	6'054,64	473'242,62	31,611
06/08/2021	6'054,64	479'297,26	32,016
09/08/2021	6'054,64	485'351,90	32,420
10/08/2021	6'054,64	491'406,55	32,825
11/08/2021	6'054,64	497'461,19	33,229
12/08/2021	6'054,64	503'515,84	33,634
13/08/2021	6'054,64	509'570,48	34,038
16/08/2021	6'054,64	515'625,12	34,442
17/08/2021	6'054,64	521'679,77	34,847
18/08/2021	6'054,64	527'734,41	35,251
19/08/2021	6'054,64	533'789,06	35,656
20/08/2021	6'054,64	539'843,70	36,060
23/08/2021	6'054,64	545'898,34	36,465
24/08/2021	6'054,64	551'952,99	36,869
25/08/2021	6'054,64	558'007,63	37,273
26/08/2021	6'054,64	564'062,27	37,678
27/08/2021	6'054,64	570'116,92	38,082
30/08/2021	6'054,64	576'171,56	38,487
31/08/2021	6'054,64	582'226,21	38,891
01/09/2021	6'054,64	588'280,85	39,296
02/09/2021	6'054,64	594'335,49	39,700
03/09/2021	6'054,64	600'390,14	40,104
06/09/2021	6'054,64	606'444,78	40,509
07/09/2021	6'054,64	612'499,43	40,913
08/09/2021	6'054,64	618'554,07	41,318
09/09/2021	6'054,64	624'608,71	41,722
10/09/2021	6'054,64	630'663,36	42,127
13/09/2021	6'054,64	636'718,00	42,531
14/09/2021	6'054,64	642'772,65	42,936
15/09/2021	6'054,64	648'827,29	43,340
16/09/2021	6'054,64	654'881,93	43,744
17/09/2021	6'054,64	660'936,58	44,149
20/09/2021	6'054,64	666'991,22	44,553
21/09/2021	6'054,64	673'045,86	44,958
22/09/2021	6'054,64	679'100,51	45,362
23/09/2021	6'054,64	685'155,15	45,767
24/09/2021	6'054,64	691'209,80	46,171
27/09/2021	6'054,64	697'264,44	46,575
28/09/2021	6'054,64	703'319,08	46,980
29/09/2021	6'054,64	709'373,73	47,384
30/09/2021	6'054,64	715'428,37	47,789


DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
01/10/2021	6'054,64	721'483,02	48,193
04/10/2021	6'054,64	727'537,66	48,598
05/10/2021	6'054,64	733'592,30	49,002
06/10/2021	6'054,64	739'646,95	49,406
07/10/2021	6'054,64	745'701,59	49,811
08/10/2021	6'054,64	751'756,24	50,215
11/10/2021	6'054,64	757'810,88	50,620
12/10/2021	6'054,64	763'865,52	51,024
13/10/2021	6'054,64	769'920,17	51,429
14/10/2021	6'054,64	775'974,81	51,833
15/10/2021	6'054,64	782'029,45	52,237
18/10/2021	6'054,64	788'084,10	52,642
19/10/2021	6'054,64	794'138,74	53,046
20/10/2021	6'054,64	800'193,39	53,451
21/10/2021	6'054,64	806'248,03	53,855
22/10/2021	6'054,64	812'302,67	54,260
25/10/2021	6'054,64	818'357,32	54,664
26/10/2021	6'054,64	824'411,96	55,069
27/10/2021	6'054,64	830'466,61	55,473
28/10/2021	6'054,64	836'521,25	55,877
29/10/2021	6'054,64	842'575,89	56,282
02/11/2021	6'054,64	848'630,54	56,686
03/11/2021	6'054,64	854'685,18	57,091
04/11/2021	6'054,64	860'739,83	57,495
05/11/2021	6'054,64	866'794,47	57,900
08/11/2021	6'054,64	872'849,11	58,304
09/11/2021	6'054,64	878'903,76	58,708
10/11/2021	6'054,64	884'958,40	59,113
11/11/2021	6'054,64	891'013,05	59,517
12/11/2021	6'054,64	897'067,69	59,922
15/11/2021	6'054,64	903'122,33	60,326
16/11/2021	6'054,64	909'176,98	60,731
17/11/2021	6'054,64	915'231,62	61,135
18/11/2021	6'054,64	921'286,26	61,539
19/11/2021	6'054,64	927'340,91	61,944
22/11/2021	6'054,64	933'395,55	62,348
23/11/2021	6'054,64	939'450,20	62,753
24/11/2021	6'054,64	945'504,84	63,157
25/11/2021	6'054,64	951'559,48	63,562
26/11/2021	6'054,64	957'614,13	63,966
29/11/2021	6'054,64	963'668,77	64,371

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
30/11/2021	6'054,64	969'723,42	64,775
01/12/2021	6'054,64	975'778,06	65,179
02/12/2021	6'054,64	981'832,70	65,584
03/12/2021	6'054,64	987'887,35	65,988
06/12/2021	6'054,64	993'941,99	66,393
07/12/2021	6'054,64	999'996,64	66,797
09/12/2021	6'054,64	1'006'051,28	67,202
10/12/2021	6'054,64	1'012'105,92	67,606
13/12/2021	6'054,64	1'018'160,57	68,010
14/12/2021	6'054,64	1'024'215,21	68,415
15/12/2021	6'054,64	1'030'269,85	68,819
16/12/2021	6'054,64	1'036'324,50	69,224
17/12/2021	6'054,64	1'042'379,14	69,628
20/12/2021	6'054,64	1'048'433,79	70,033
21/12/2021	6'054,64	1'054'488,43	70,437
22/12/2021	6'054,64	1'060'543,07	70,841
23/12/2021	6'054,64	1'066'597,72	71,246
24/12/2021	6'054,64	1'072'652,36	71,650
27/12/2021	6'054,64	1'078'707,01	72,055
28/12/2021	6'054,64	1'084'761,65	72,459
29/12/2021	6'054,64	1'090'816,29	72,864
30/12/2021	6'054,64	1'096'870,94	73,268
31/12/2021	6'054,64	1'102'925,58	73,672
03/01/2022	6'054,64	1'108'980,23	74,077
04/01/2022	6'054,64	1'115'034,87	74,481
05/01/2022	6'054,64	1'121'089,51	74,886
07/01/2022	6'054,64	1'127'144,16	75,290
10/01/2022	6'054,64	1'133'198,80	75,695
11/01/2022	6'054,64	1'139'253,44	76,099
12/01/2022	6'054,64	1'145'308,09	76,504
13/01/2022	6'054,64	1'151'362,73	76,908
14/01/2022	6'054,64	1'157'417,38	77,312
17/01/2022	6'054,64	1'163'472,02	77,717
18/01/2022	6'054,64	1'169'526,66	78,121
19/01/2022	6'054,64	1'175'581,31	78,526
20/01/2022	6'054,64	1'181'635,95	78,930
21/01/2022	6'054,64	1'187'690,60	79,335
24/01/2022	6'054,64	1'193'745,24	79,739
25/01/2022	6'054,64	1'199'799,88	80,143
26/01/2022	6'054,64	1'205'854,53	80,548
27/01/2022	6'054,64	1'211'909,17	80,952

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
28/01/2022	6'054,64	1'217'963,82	81,357
31/01/2022	6'054,64	1'224'018,46	81,761
01/02/2022	6'054,64	1'230'073,10	82,166
02/02/2022	6'054,64	1'236'127,75	82,570
03/02/2022	6'054,64	1'242'182,39	82,974
04/02/2022	6'054,64	1'248'237,03	83,379
07/02/2022	6'054,64	1'254'291,68	83,783
08/02/2022	6'054,64	1'260'346,32	84,188
09/02/2022	6'054,64	1'266'400,97	84,592
10/02/2022	6'054,64	1'272'455,61	84,997
11/02/2022	6'054,64	1'278'510,25	85,401
14/02/2022	6'054,64	1'284'564,90	85,806
15/02/2022	6'054,64	1'290'619,54	86,210
16/02/2022	6'054,64	1'296'674,19	86,614
17/02/2022	6'054,64	1'302'728,83	87,019
18/02/2022	6'054,64	1'308'783,47	87,423
21/02/2022	6'054,64	1'314'838,12	87,828
22/02/2022	6'054,64	1'320'892,76	88,232
23/02/2022	6'054,64	1'326'947,41	88,637
24/02/2022	6'054,64	1'333'002,05	89,041
25/02/2022	6'054,64	1'339'056,69	89,445
28/02/2022	6'054,64	1'345'111,34	89,850
01/03/2022	6'054,64	1'351'165,98	90,254
02/03/2022	6'054,64	1'357'220,63	90,659
03/03/2022	6'054,64	1'363'275,27	91,063
04/03/2022	6'054,64	1'369'329,91	91,468
07/03/2022	6'054,64	1'375'384,56	91,872
08/03/2022	6'054,64	1'381'439,20	92,276
09/03/2022	6'054,64	1'387'493,84	92,681
10/03/2022	6'054,64	1'393'548,49	93,085
11/03/2022	6'054,64	1'399'603,13	93,490
14/03/2022	6'054,64	1'405'657,78	93,894
15/03/2022	6'054,64	1'411'712,42	94,299
16/03/2022	6'054,64	1'417'767,06	94,703
17/03/2022	6'054,64	1'423'821,71	95,107
18/03/2022	6'054,64	1'429'876,35	95,512
21/03/2022	6'054,64	1'435'931,00	95,916
22/03/2022	6'054,64	1'441'985,64	96,321
23/03/2022	6'054,64	1'448'040,28	96,725
24/03/2022	6'054,64	1'454'094,93	97,130
25/03/2022	6'054,64	1'460'149,57	97,534

DESCRIZIONE	VALORE
Tipologia Documento Comune Provincia Oggetto Committente Tecnico Impresa Luogo Data Importo per l'emissione dei SAL	Cronoprogramma di progettazione Comune di AGROPOLI Provincia di SALERNO LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI AMMINISTRAZIONE COMUNALE UTC-ING.AGOSTINO SICA AGROPOLI 08/03/2021 300'000,00

DESCRIZIONE	Mesi												Media																										
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic																											
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82,50																									
<p>GRAFICO</p> <p>Favorevole</p> <table border="1"> <tr><th>Mese</th><td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td></tr> <tr><th>Valore</th><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>45</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>45</td></tr> </table>														Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Valore	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45
Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic																											
Valore	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45																											
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65,00																										
<p>GRAFICO</p> <p>Normale</p> <table border="1"> <tr><th>Mese</th><td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td></tr> <tr><th>Valore</th><td>15</td><td>15</td><td>75</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>45</td><td>90</td><td>90</td><td>75</td><td>15</td></tr> </table>														Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Valore	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15
Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic																											
Valore	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15																											
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58,75																										
<p>GRAFICO</p> <p>Sfavorevole</p> <table border="1"> <tr><th>Mese</th><td>Gen</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mag</td><td>Giu</td><td>Lug</td><td>Ago</td><td>Set</td><td>Ott</td><td>Nov</td><td>Dic</td></tr> <tr><th>Valore</th><td>15</td><td>15</td><td>45</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td><td>45</td><td>90</td><td>75</td><td>45</td><td>15</td></tr> </table>														Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Valore	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15
Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic																											
Valore	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15																											

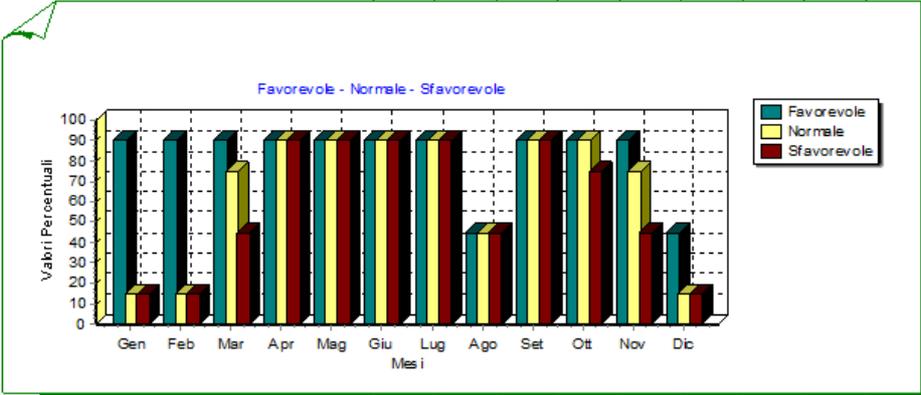DESCRIZIONE	Mesi												Media																																																															
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic																																																																
 <table border="1"> <caption>Favorevole - Normale - Sfavorevole</caption> <thead> <tr> <th>Mese</th> <th>Favorevole (%)</th> <th>Normale (%)</th> <th>Sfavorevole (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Gen</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>Feb</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>90</td><td>75</td><td>45</td></tr> <tr><td>Apr</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>Mag</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>Giu</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>Lug</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td></tr> <tr><td>Set</td><td>90</td><td>90</td><td>90</td></tr> <tr><td>Ott</td><td>90</td><td>90</td><td>75</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>90</td><td>75</td><td>45</td></tr> <tr><td>Dic</td><td>45</td><td>15</td><td>15</td></tr> </tbody> </table>													Mese	Favorevole (%)	Normale (%)	Sfavorevole (%)	Gen	90	15	15	Feb	90	15	15	Mar	90	75	45	Apr	90	90	90	Mag	90	90	90	Giu	90	90	90	Lug	90	90	90	Ago	45	45	45	Set	90	90	90	Ott	90	90	75	Nov	90	75	45	Dic	45	15	15												
Mese	Favorevole (%)	Normale (%)	Sfavorevole (%)																																																																									
Gen	90	15	15																																																																									
Feb	90	15	15																																																																									
Mar	90	75	45																																																																									
Apr	90	90	90																																																																									
Mag	90	90	90																																																																									
Giu	90	90	90																																																																									
Lug	90	90	90																																																																									
Ago	45	45	45																																																																									
Set	90	90	90																																																																									
Ott	90	90	75																																																																									
Nov	90	75	45																																																																									
Dic	45	15	15																																																																									
