




COMUNE DI ORISTANO

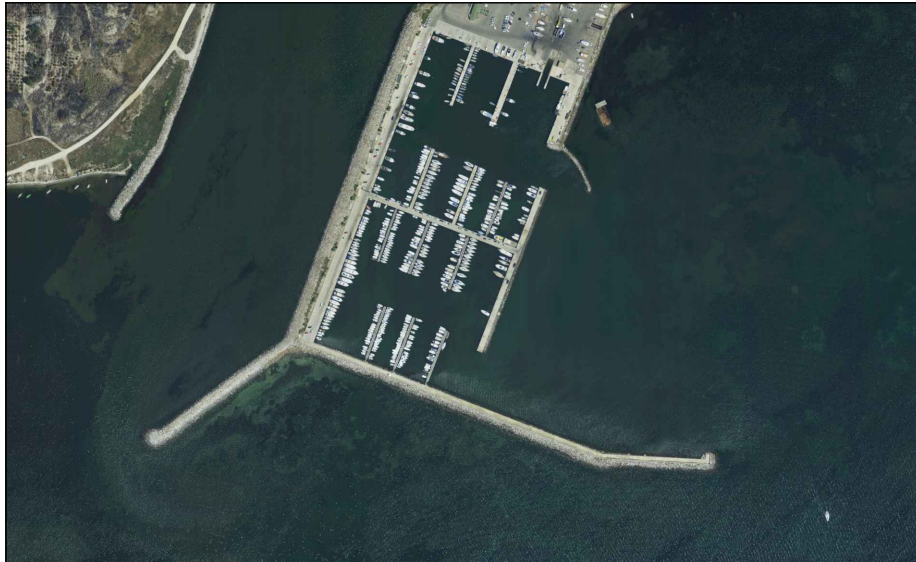

PROGETTO DI RIPRISTINO DEL TIRANTE D'ACQUA NEL PORTO DI TORREGRANDE (OR)

PROGETTO DEFINITIVO

TAVOLA:

G

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

INT: REF.: 13-010

REV. NO		
00	09.02.2021	
01	24.01.2022	REVISIONE
02	11.05.2023	REVISIONE
03		

PREP.: EA CH.: AR APPR.: FR

Il presente progetto, o parte di esso, non può essere riprodotto in alcuna forma, in alcun modo e per nessuno scopo, senza autorizzazione. Ogni infrazione sarà perseguita a termini di legge.

PROGETTISTA:



Viale Trieste, 65/i - 09123 Cagliari - Italy
Tel. +39 070 6848202 - Fax +39 070 6404743
www.martech.it e-mail: info@martech.it

Responsabile tecnico:
Dott. Ing. ANDREA RITOSSA



COMMITTENTE:

COMUNE DI ORISTANO

Nome attività	Durata	Trimestre 1		Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 5	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
Allestimento cantiere														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Z1												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	3 g	Z1												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e s	3 g	Z1												
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g	Z1												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per c	1 g	Z1												
Allestimento impianto di trattamento/colmata	16 g													
Scavo di sbancamento	5 g	Z1												
Movimentazione terre	15 g	Z1												
Impermeabilizzazione di superfici e pareti di scavo con teli (g)	5 g		Z1											
Installazione tubazioni/ macchinari per impianto di trattament	11 g		Z1											
Lavori marittimi	319 g													
Dragaggio con Motopontone	249 g													
Posa di corpi morti e pontili galleggianti	70 g										Z2			
Trasporto a scarica fanghi di dragaggio trattati	246 g										Z2			
Smobilizzo cantiere/impianto/colmata	76 g													
Scavo di sbancamento	15 g										Z1			
Movimentazione terre	15 g										Z1			
Rimozione di tubazioni/ macchinari per impianto di trattamen	10 g										Z1			
Pulizia generale dell'area di cantiere	4 g												Z1	
Smobilizzo del cantiere	6 g												Z1	
LEGENDA Zona:														
Z1 = ZONA A TERRA														
Z2 = ZONA A MARE														
