


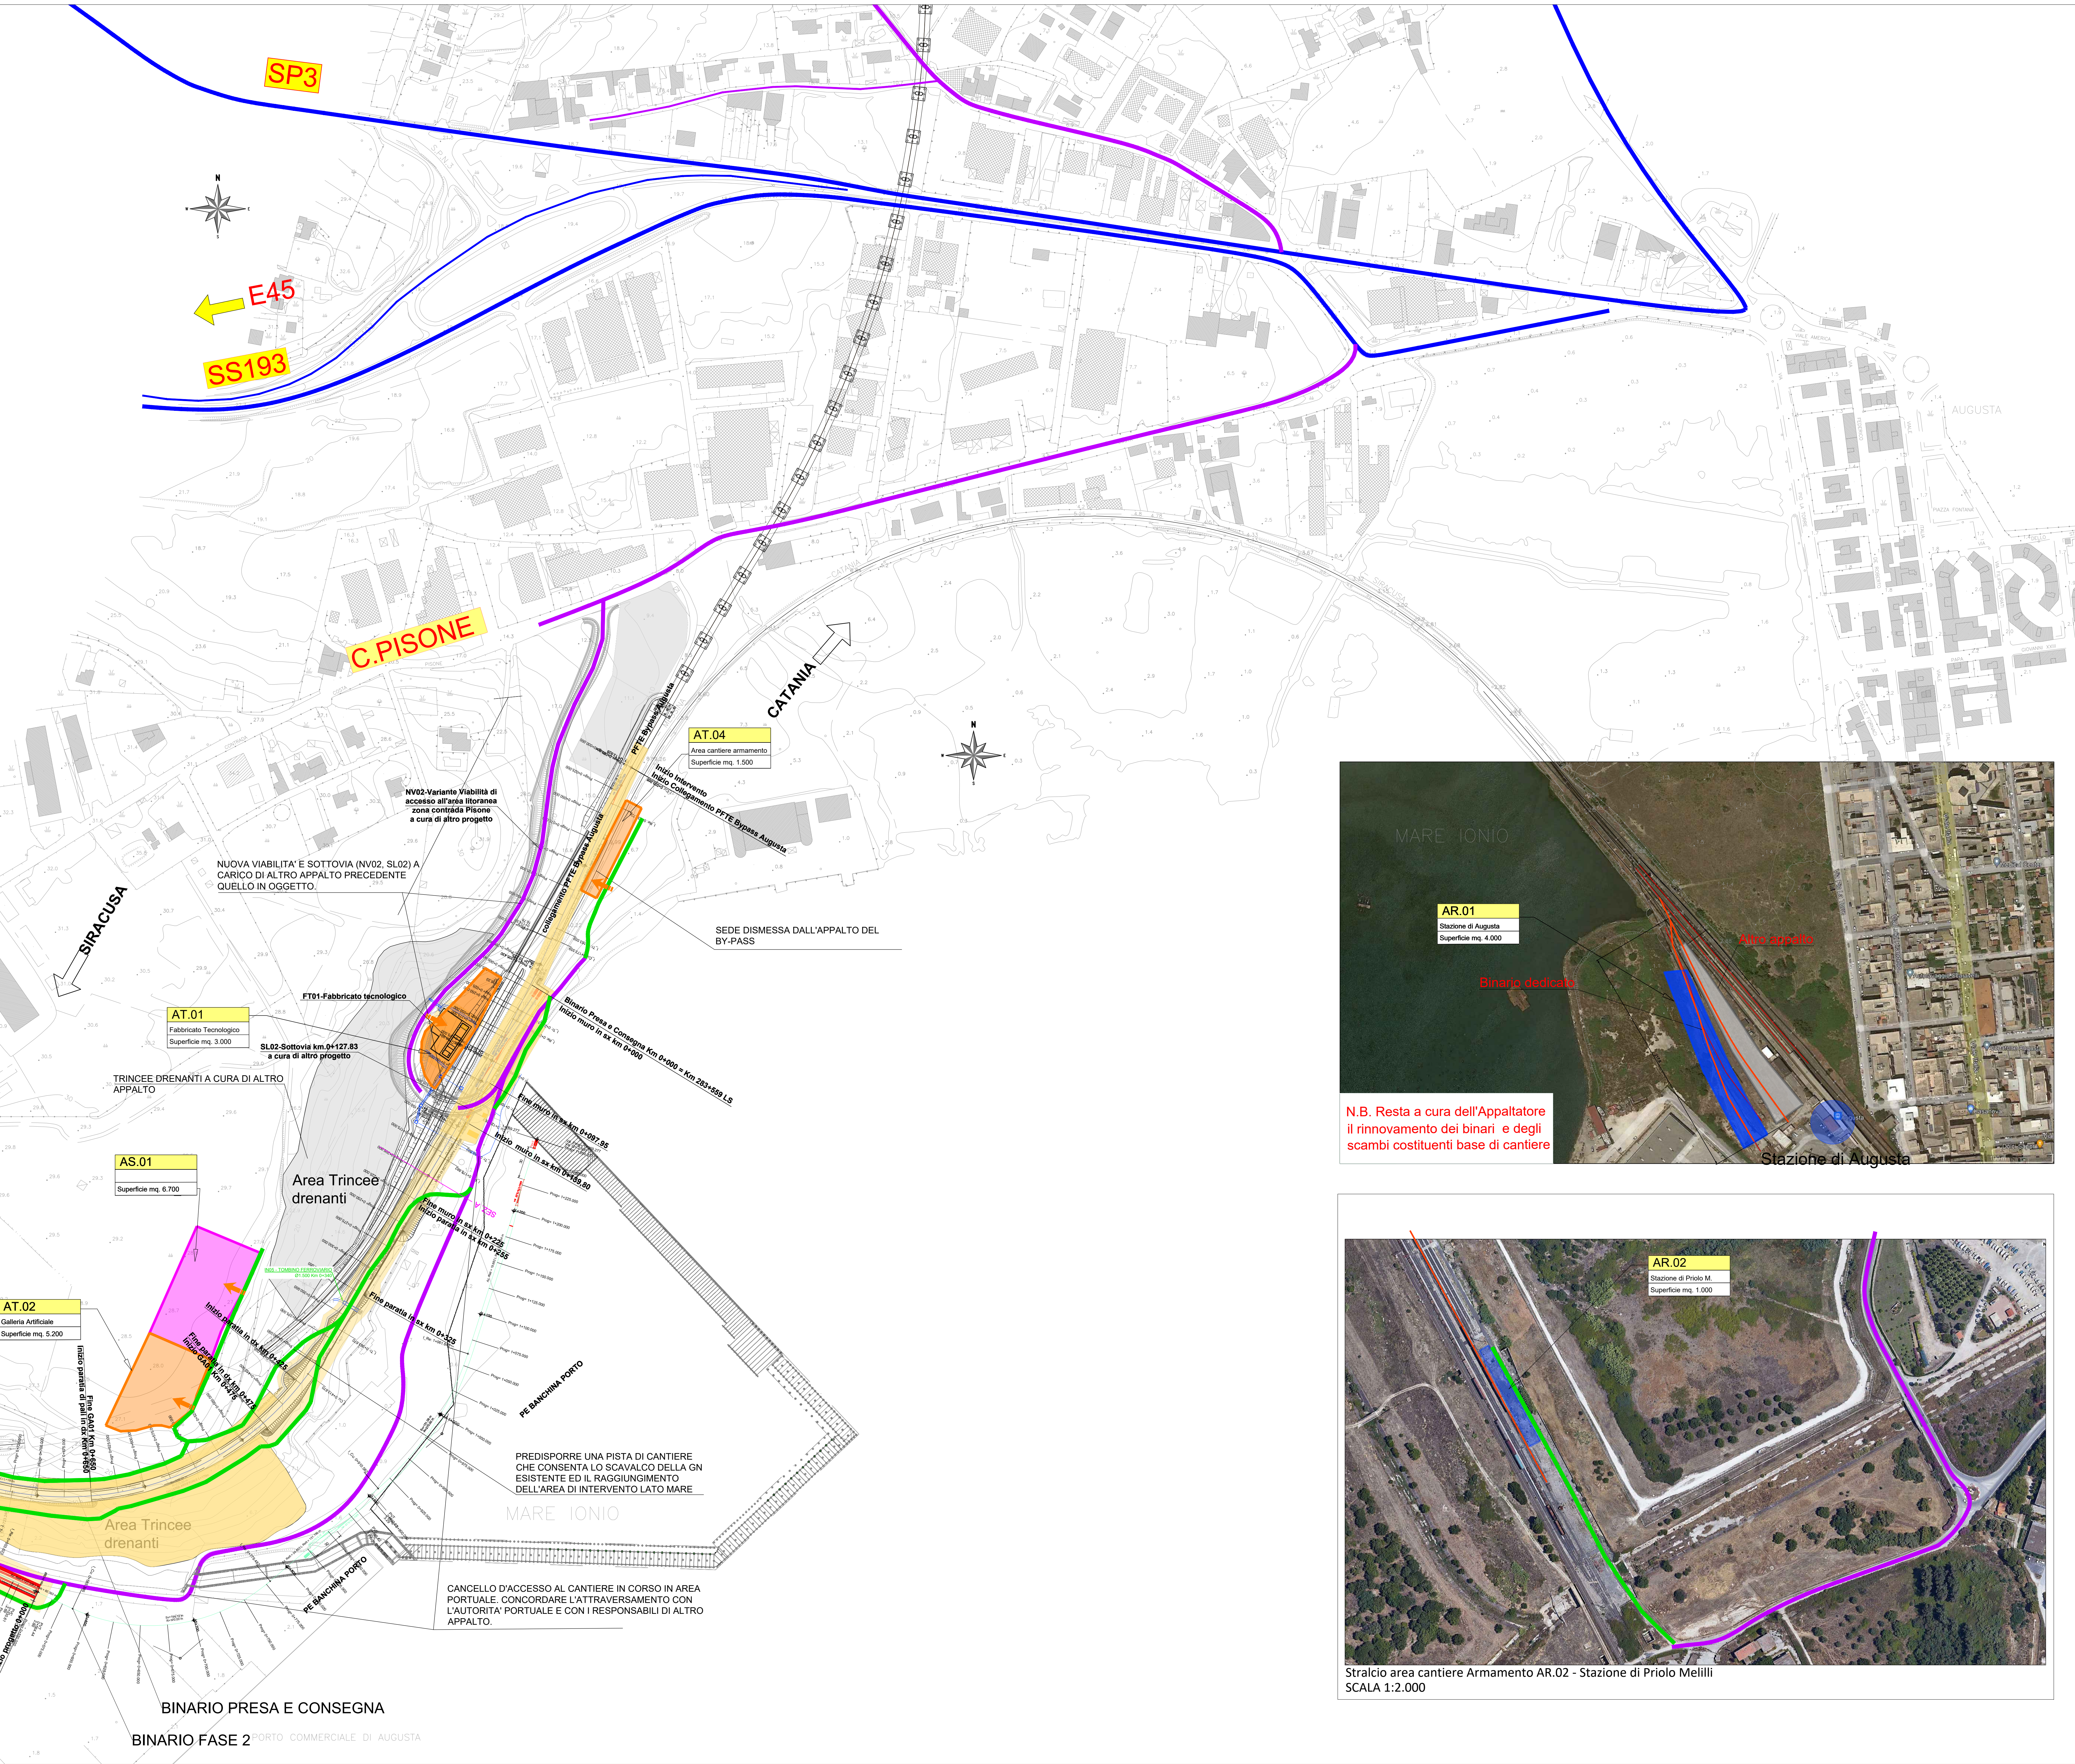

LEGENDA			
	CB - CANTIERE BASE		VIABILITA' PRINCIPALE
	CO - CANTIERE OPERATIVO		VIABILITA' SECONDARIA
	AREE OCCUPATE DA ALTRO APPALTO		VIABILITA' LOCALE
	AS- AREA DI STOCCAGGIO		PISTA DI CANTIERE
	AR - CANTIERE DI ARMAMENTO ED ATTREZZAGGIO TECNOLOGICO		ACCESSO AI CANTIERI
	AREA DI LAVORO		LINIA FERROVIARIA DI PROGETTO
			LINIA FERROVIARIA ESISTENTE
			OPERA LINEA FERROVIARIA IN DEMOLIZIONE
			OPERA LINEA FERROVIARIA REALIZZATE IN FASI PRECEDENTI

- NOTA
- LA FASE 1A PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI:
- BINARIO DI PRESA E CONSEGNA FINO AL CANCELLO;
 - BINARIO DI CARICO/SCARICO CONTENITORI MODULO 250 M AFFIANCATO DA UN PIAZZALE DELLA MEDESIMA LUNGHEZZA;
 - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO DELLE BANCINE PORTUALI AL PIAZZALE;
 - FABBRICATO TECNOLOGICO CON ANNESSO PIAZZALE;
 - TUTTE LE TECNOLOGIE PER LA GESTIONE MOVIMENTO TRENO.


L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO CHE PORTA ALLA CONFIGURAZIONE COMPLETA DELLA FASE 1B, PREVEDE LE SEGUENTI ATTIVITA':

- COMPLETAMENTO DEL FASCIO DI BINARI PER CARICO/SCARICO CONTENITORI E COMPOSIZIONE/SCOMPOSIZIONE TRENI (N. 3 BINARI MODULO 600 M);
- ESTENSIONE DEL RELATIVO PIAZZALE DI MOVIMENTAZIONE PER L'INTERA LUNGHEZZA DEL FASCIO DI BINARI.

L'INTERVENTO PRESENTA ALCUNI BREVI TRATTI ADIACENTI ALLA SEDE ATTUALE (OPERE DI SOSTEGNO IN PROSSIMITA' O IN CORRISPONDENZA DEL PIAZZALE INTERMODALE). IN TALI CASI SI PREVEDE DI OPERARE IN INTERRUZIONI PROGRAMMATE D'ORARIO O PROLUNGATE NEL FINE SETTIMANA.

LUNGO LE PISTE DI CANTIERE DOVRANNO ESSERE PREDISPOSTE PIAZZOLE DI INCROCIO MEZZI CIRCA OGNI 200/250M.

ONDE GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE PISTE DI CANTIERE IN CORRISPONDENZA DEI CORSI D'ACQUA O ZONE DI IMPLUVIO VERRANNO PREDISPOSTE TUBATURE PROVVISORIE DI CONTINUITA' COME ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO DI CANTIERE.

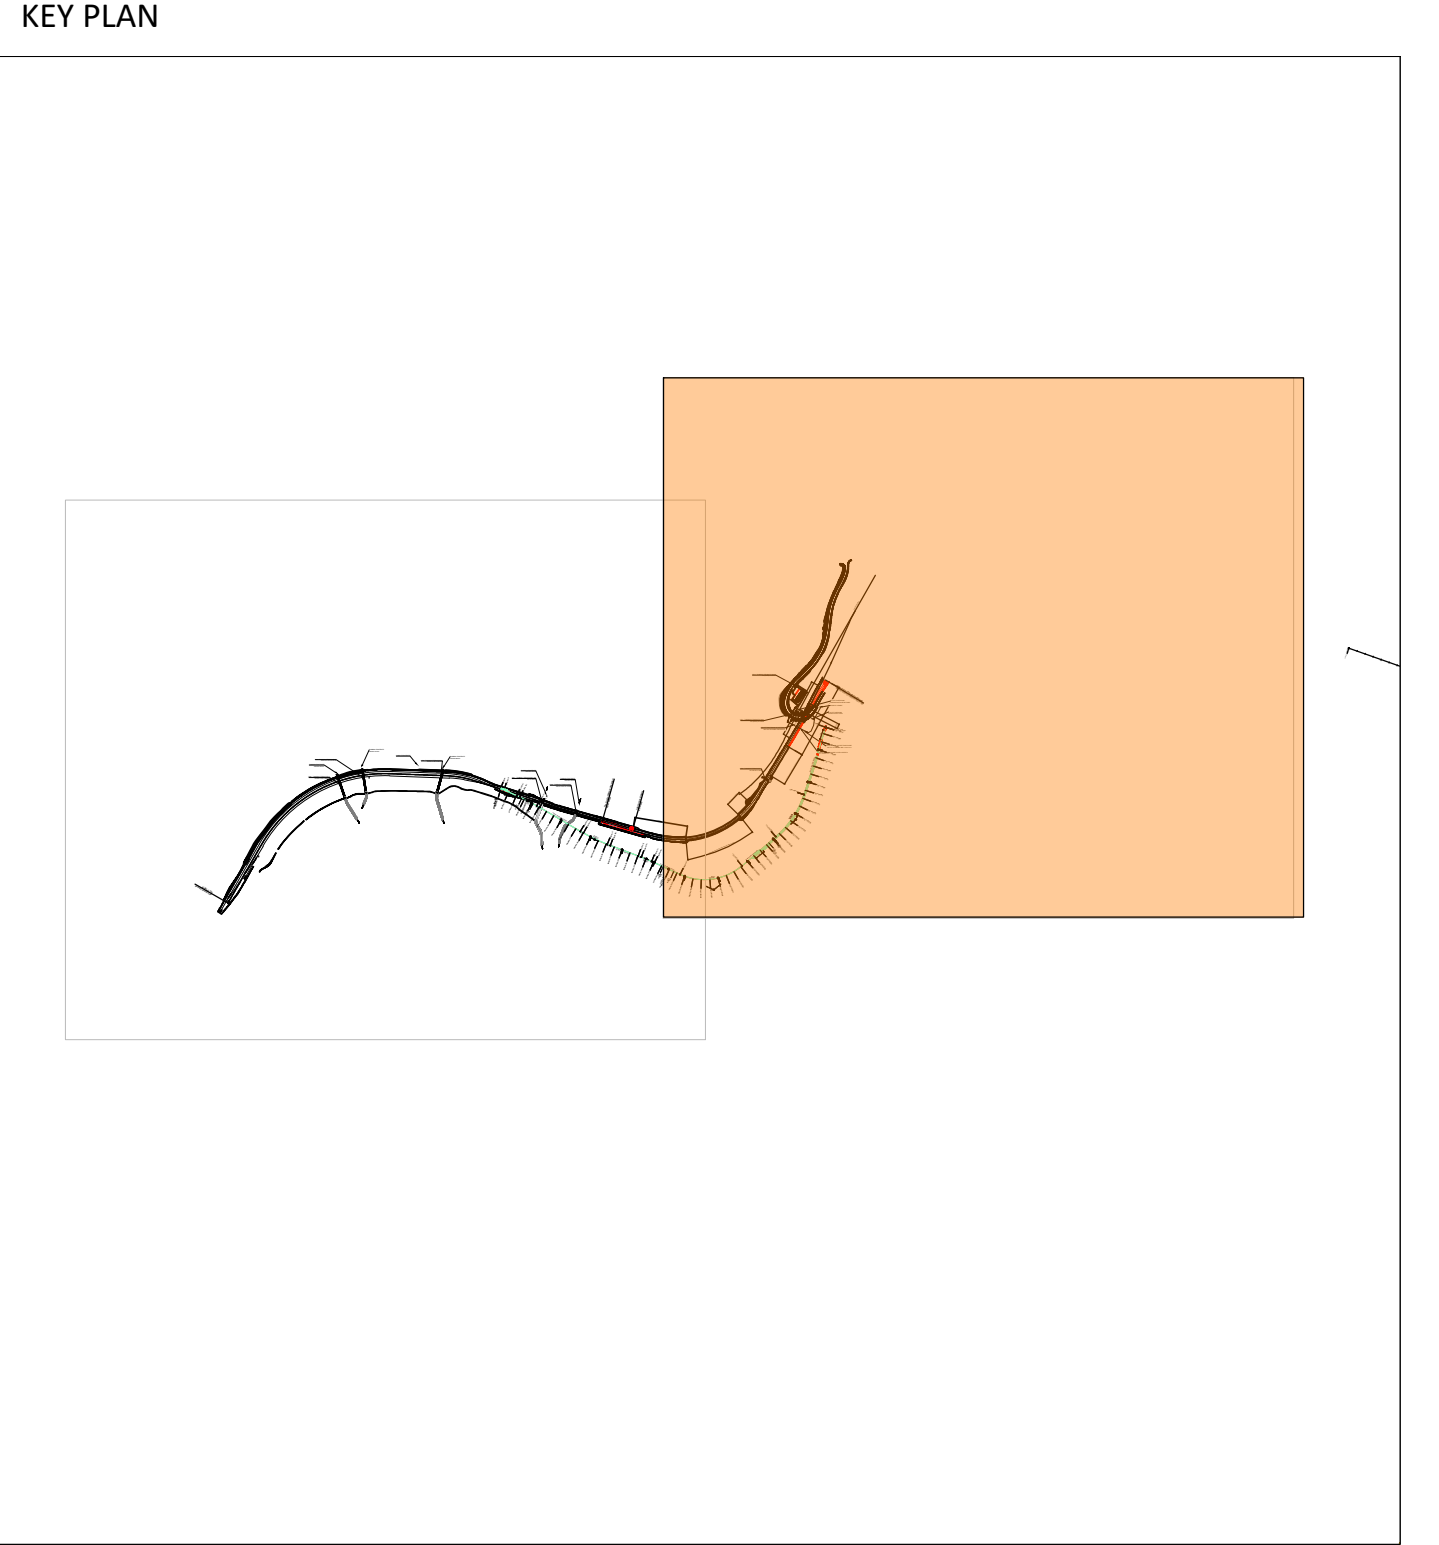

COMMITTENTE:								
PROGETTAZIONE:								
LINEA CATANIA - SIRACUSA								
DIREZIONE INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI S.O. CANTIERIZZAZIONE, INTERFERENZE E PROGRAMMA LAVORI								
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA								
Collegamento ferroviario con il Porto di Augusta Fase 1A-Fase 1B								
CANTIERIZZAZIONE Planimetria con indicazione delle aree di cantiere, accessi e viabilità								
Tav. 2 di 2								
SCALA : 1:2000								
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
RS62	01	R	53	P6	CA0000	002	C	
Rev.	Descrizione	Realizzato	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Disegnato/Verificato
A	Emissione esecutiva	PIV	Dic. 2023	M. Camberti	Dic. 2023	P. Carlesimo	Dic. 2023	S. Manno
B	Rimessione per iter autorizzativo	M. Camberti	Apr. 2023	M. Camberti	Apr. 2023	P. Carlesimo	Apr. 2023	S. Manno
C	Recupero prescrizioni AdSP	M. Camberti	Set. 2023	M. Camberti	Set. 2023	P. Carlesimo	Set. 2023	S. Manno
FIR:RS6201R53P6CA0000002C								n. Elab.:
