



PLANIMETRIA DELLA CANTIERIZZAZIONE
FASI COSTRUTTIVE - FASE 1

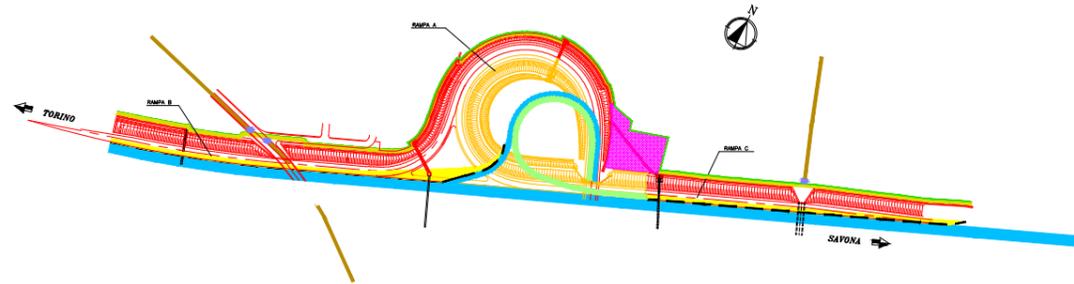


- FASE 0**
- Allestimento area di cantiere
 - Chiusura parziale rampe in affiancamento all'autostrada con new jersey a protezione dell'area di lavoro.
 - Bonifica da ordigni bellici
- FASE 1**
- Realizzazione dei prolungamenti dei sottovia e della deviazione della strada interpodereale.
 - Realizzazione dei nuovi muri in c.a.
 - Realizzazione della nuova corsia di accelerazione (Rampa B), del primo tratto della nuova corsia di decelerazione (Rampa C), e del tratto terminale della Rampa C.
 - Realizzazione parziale della Rampa A.
 - Realizzazione del tratto di raccordo con la rampa in entrata esistente.
 - Realizzazione parziale rete di smaltimento acque meteoriche
 - Realizzazione dei nuovi tombini e dei prolungamenti dei tombini circolari.
 - Realizzazione parziale dell'impianto di illuminazione.
 - Montaggio barriere di sicurezza e segnaletica verticale nei tratti realizzati.
 - Realizzazione parziale impianto di guida ottica visiva.

PLANIMETRIA DELLA CANTIERIZZAZIONE
FASI COSTRUTTIVE - FASE 2




- FASE 2**
- Chiusura rampa in ingresso esistente con new jersey a protezione dell'area di lavoro.
 - Apertura nuova rampa in entrata (Rampa B)
 - Chiusura pista di cantiere e sistemazione aree interessate.
 - Smantellamento parte rampa dismessa.
 - Realizzazione della nuova rampa in uscita (Rampa C), esistente.
 - Realizzazione tratto di raccordo con la rampa in uscita esistente.
 - Realizzazione cavidotto con perforazione teleguidata.
 - Realizzazione parziale dell'impianto di illuminazione.
 - Montaggio barriere di sicurezza e segnaletica verticale nei tratti realizzati.
 - Realizzazione parziale impianto di guida ottica visiva.

PLANIMETRIA DELLA CANTIERIZZAZIONE
FASI COSTRUTTIVE - FASE 3

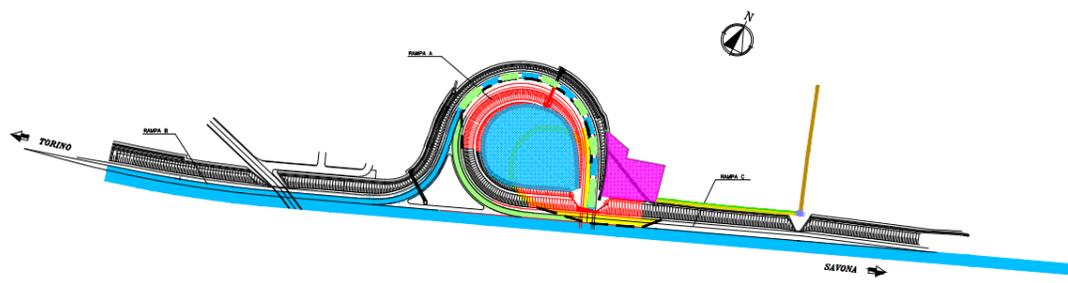

- FASE 3**
- Apertura nuova rampa in uscita (Rampa C)
 - Realizzazione tratto della corsia in uscita rampa A.
 - Chiusura tratto della rampa in uscita (Rampa C) con new jersey a protezione dell'area di lavoro per ultimazione lavori.
 - Smantellamento rampe dismesse, rimodellamento del terreno e opere a verde.
 - Ultimazione rete smaltimento acque meteoriche.
 - Ultimazione impianto illuminazione esterna.

PLANIMETRIA DELLA CANTIERIZZAZIONE
FASI COSTRUTTIVE - FASE 4

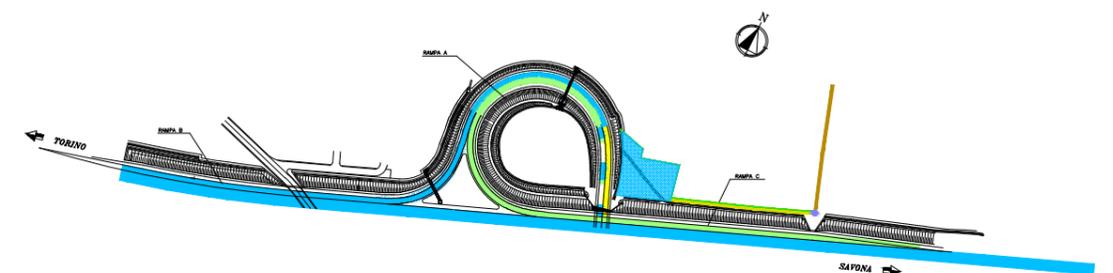

- FASE 4**
- Apertura nuova rampa in uscita (Rampa C)
 - Chiusura tratto della corsia in entrata rampa A per adeguamento della stessa.
 - Sostituzione delle barriere di sicurezza e rifacimento del manto stradale.
 - Ultimazione impianto di guida ottica visiva.
 - Realizzazione segnaletica verticale e orizzontale.
 - Ripristino a verde dell'area di cantiere
- Esecuzione usura drenante e segnaletica orizzontale definitiva

LEGENDA

- Recinzione di cantiere
- Ingressi al cantiere
- Viabilità di cantiere
- Pista di cantiere
- Area di cantiere
- Interventi da realizzare nelle fasi successive
- Interventi da realizzare in questa fase
- Area di cantiere in autostrada - Chiusura parziale rampe in affiancamento - Possibilità di esecuzione di lavori in presenza di traffico veicolare
- Circolazione veicolare direzione Niella Tanaro
- Circolazione veicolare direzione Torino
- New jersey provvisori
