

Pianta - Stato di fatto

(1:100)



MACROFASI

MACROFASE A

- 1) rimozione della paratoia esistente all'imbotto del condotto di scarico;
- 2) costruzione della nuova paratoia su rilievo di quella esistente;
- 3) installazione della nuova paratoia, con relativi sistemi di movimentazione;
- 4) gestione ed allontanamento delle eventuali perdite residue;
- 5) intervento subacqueo per plug della presa del by-pass sul paramento di monte;
- 6) rimozione del sistema di by-pass esistente (tubazione, valvola);
- 7) plug definitivo della presa di by-pass dall'interno del condotto di scarico;
- 8) riverniciatura della tubazione esistente.

Durante le lavorazioni sopra elencate (da n. 4 a n. 7) la quota dell'invaso dovrà essere mantenuta alla quota di minima regolazione.

MACROFASE B


- 1) rimozione della valvola a farfalla esistente;
- 2) installazione di una flangia cieca nella terminazione della tubazione in acciaio esistente al fine di avere almeno due elementi di tenuta durante la maggior parte delle lavorazioni effettuate a valle dello scarico esistente;
- 3) rimozione della tubazione a valle della valvola e demolizione dei relativi ancoraggi;
- 4) esecuzione delle opere civili di fondazione per le nuove paratoie;
- 5) rimozione della flangia cieca e installazione delle nuove parti da inghisare (blindaggi, casse paratoie);
- 6) esecuzione dei getti di calcestruzzo;
- 7) installazione dei diaframmi delle paratoie e del sistema di rilascio DMV;
- 8) installazione dell'impianto oleodinamico ed elettrico di comando.

Note :

1. Il rilievo topografico eseguito nel 2019 indica delle quote altimetriche in generale maggiori di 10.17m rispetto alle quote originali del progetto; tale differenza di quota sussiste per l'intera asta idroelettrica. In particolare, il coronamento è stato rilevato ad una quota di 1284.27 m s.l.m., mentre il progetto originale indicava una quota di coronamento pari a 1274.10 m s.l.m. Le presenti tavole si riferiscono tutte alle quote altimetriche misurate nel rilievo del 2019. Le quote riportate nel progetto originale sono quindi state tutte traslate verso l'alto di un delta pari a +10,17 m
2. Tutte le quote sono in metri salvo dove diversamente indicato


Legenda:

- Demolizione strutture esistenti
- Demolizione tratto di tubo scarico di fondo



Pianta - Stato di progetto

(1:100)

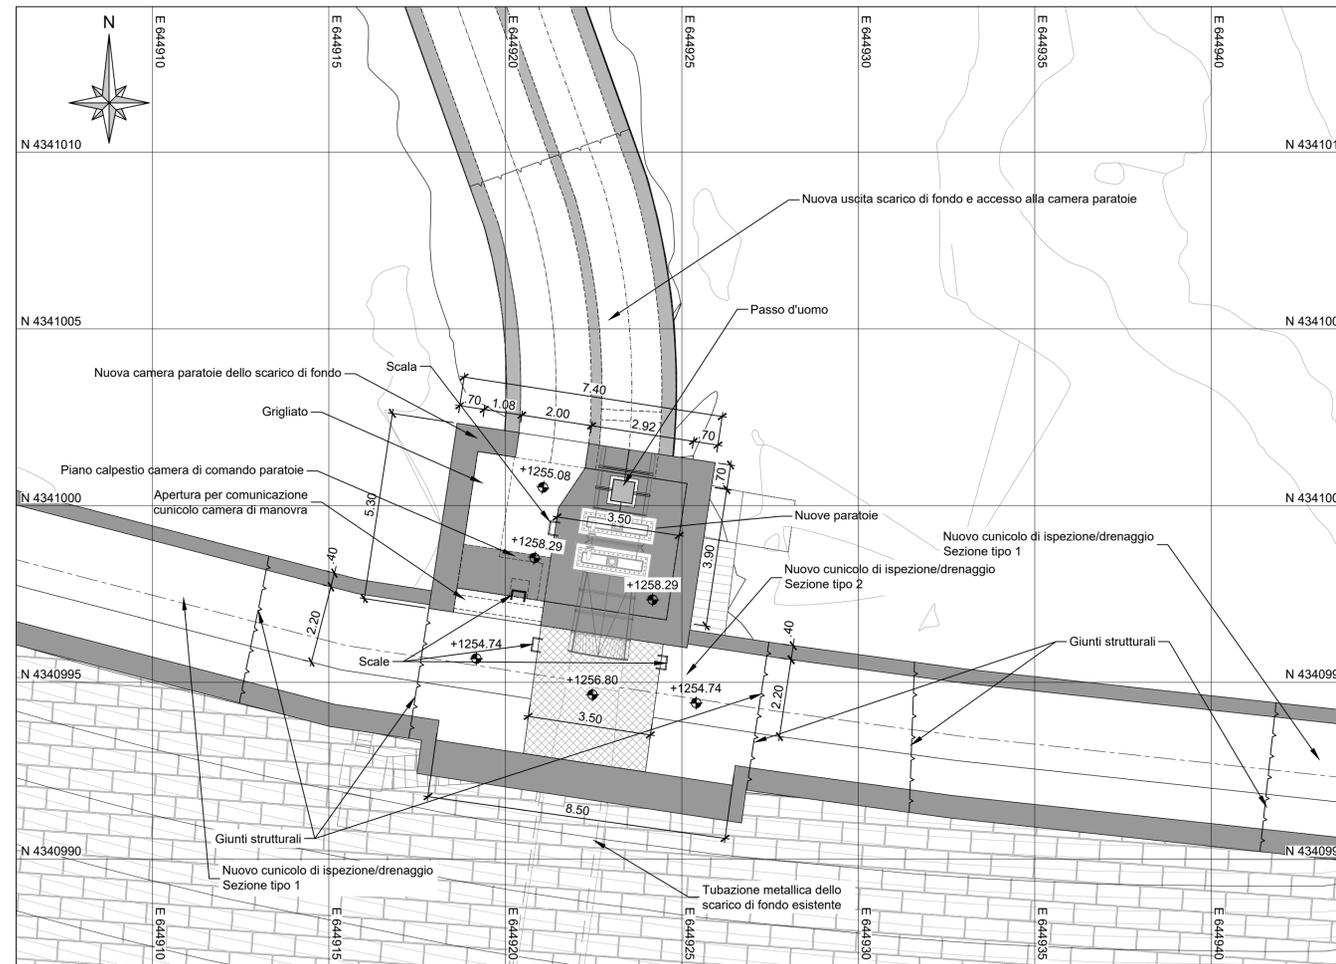

Pianta - Stato di progetto

Quota grigliato

(1:100)



 Sede Legale: Via Lamarmora 230, 25124 Brescia Sede direzionale e amministrativa: Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano AZA/DGE/BGT/IMS/IOIC	Pratica:	10320	Intervento di miglioramento sismico della diga di Trepidò		
	N° Documento:	10320-C-OR-DTR-C-DS-241-1			
	Note:	Rif.: M. Inf. dighe del registro ufficiale. u.0009203.11-04-2019			
IMPIANTO IDROELETTRICO DI		DIGA DI			
ORICHELLA		TREPIDO'			
OGGETTO: Progetto Definitivo per l'intervento di miglioramento sismico della Diga di Trepidò					
TITOLO: SCARICO DI FONDO E CAMERA PARATOIE Planimetria					
Scala 1:100					
CONSULENTE:			CONCESSIONARIO:		
Per il consulente: Il progettista:	Ing. M. Braghini	Per il concessionario: Visto l'ingegnere Responsabile della diga:	Ing. P. Valgói	Per il concessionario: Visto il Legale Rappresentante:	Roberto Scottoni
TIPO DOCUMENTO: DISEGNO TECNICO					
		LOMBARDI		AZA	
1	20.10.2023	Prima emissione	I. Maffoni	C. Crème/C. Rossi	M. Braghini, P. Valgói, R. Castellano
0	21.04.2023	Emissione per commenti	I. Maffoni	C. Crème/C. Rossi	M. Braghini, P. Valgói, R. Castellano
REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
AZA/DGE/BGT/IMS/IOIC - Opere Idrauliche e Civili					
Questo documento è proprietà di AZA S.p.A. non può essere utilizzato, trasmesso a terzi o riprodotto senza autorizzazione della stessa. AZA S.p.A. tutela i propri diritti a norma di legge.					
