
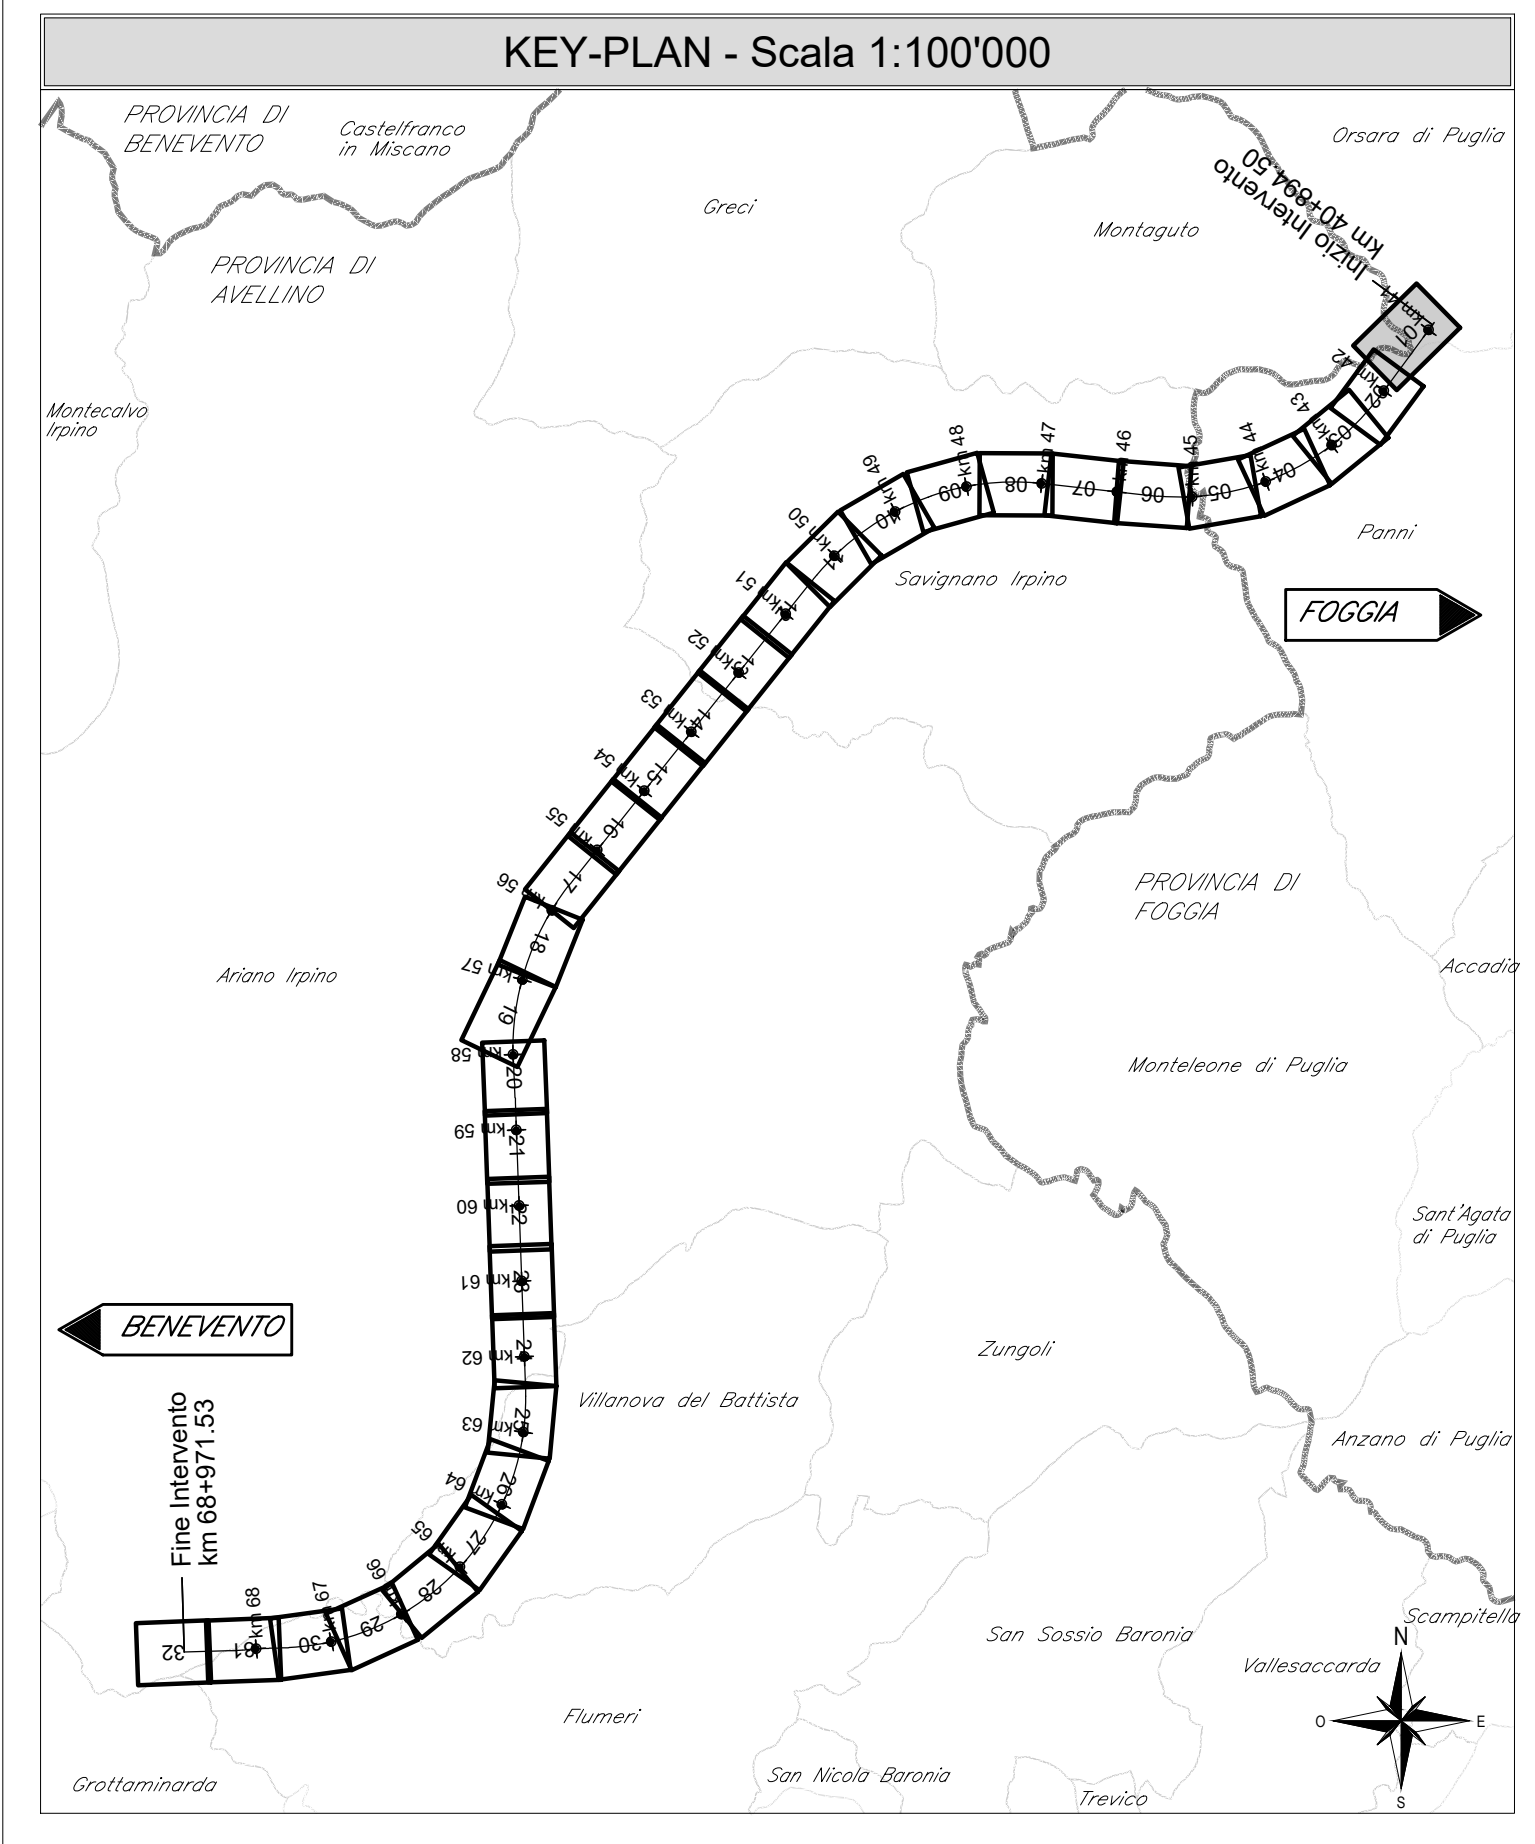



MACROFASE 2

- Tutti gli interventi della tratta Hirpinia-Orsara sono completi e realizzati nelle fasi precedenti, ad eccezione del parcheggio della stazione di Orsara.
- Completamento dei marciapiedi di stazione.
- Interruzione prolungata di 14h per demolizione armamento del raccordo provvisorio e allaccio binari della tratta Bovino-Orsara con i binari della tratta Orsara-Hirpinia (da km 40+894.50 a km 41+042.91).
- Messa in esercizio della tratta Bovino-Hirpinia a velocità di linea ad eccezione delle zone di allaccio in cui la velocità sarà limitata a 80 km/h fino al raggiungimento del tonnellaggio per l'assetto della sede.
- Demolizione del rilevato del raccordo provvisorio e opere di cantierizzazione residue (nell'area in cui si realizzerà il parcheggio della fermata di Orsara e il marciapiede antistante il fabbricato viaggiatori la demolizione del corpo del rilevato sarà spinta fino alla quota d'imposta dello strato di fondazione del pacchetto stradale e del marciapiede).

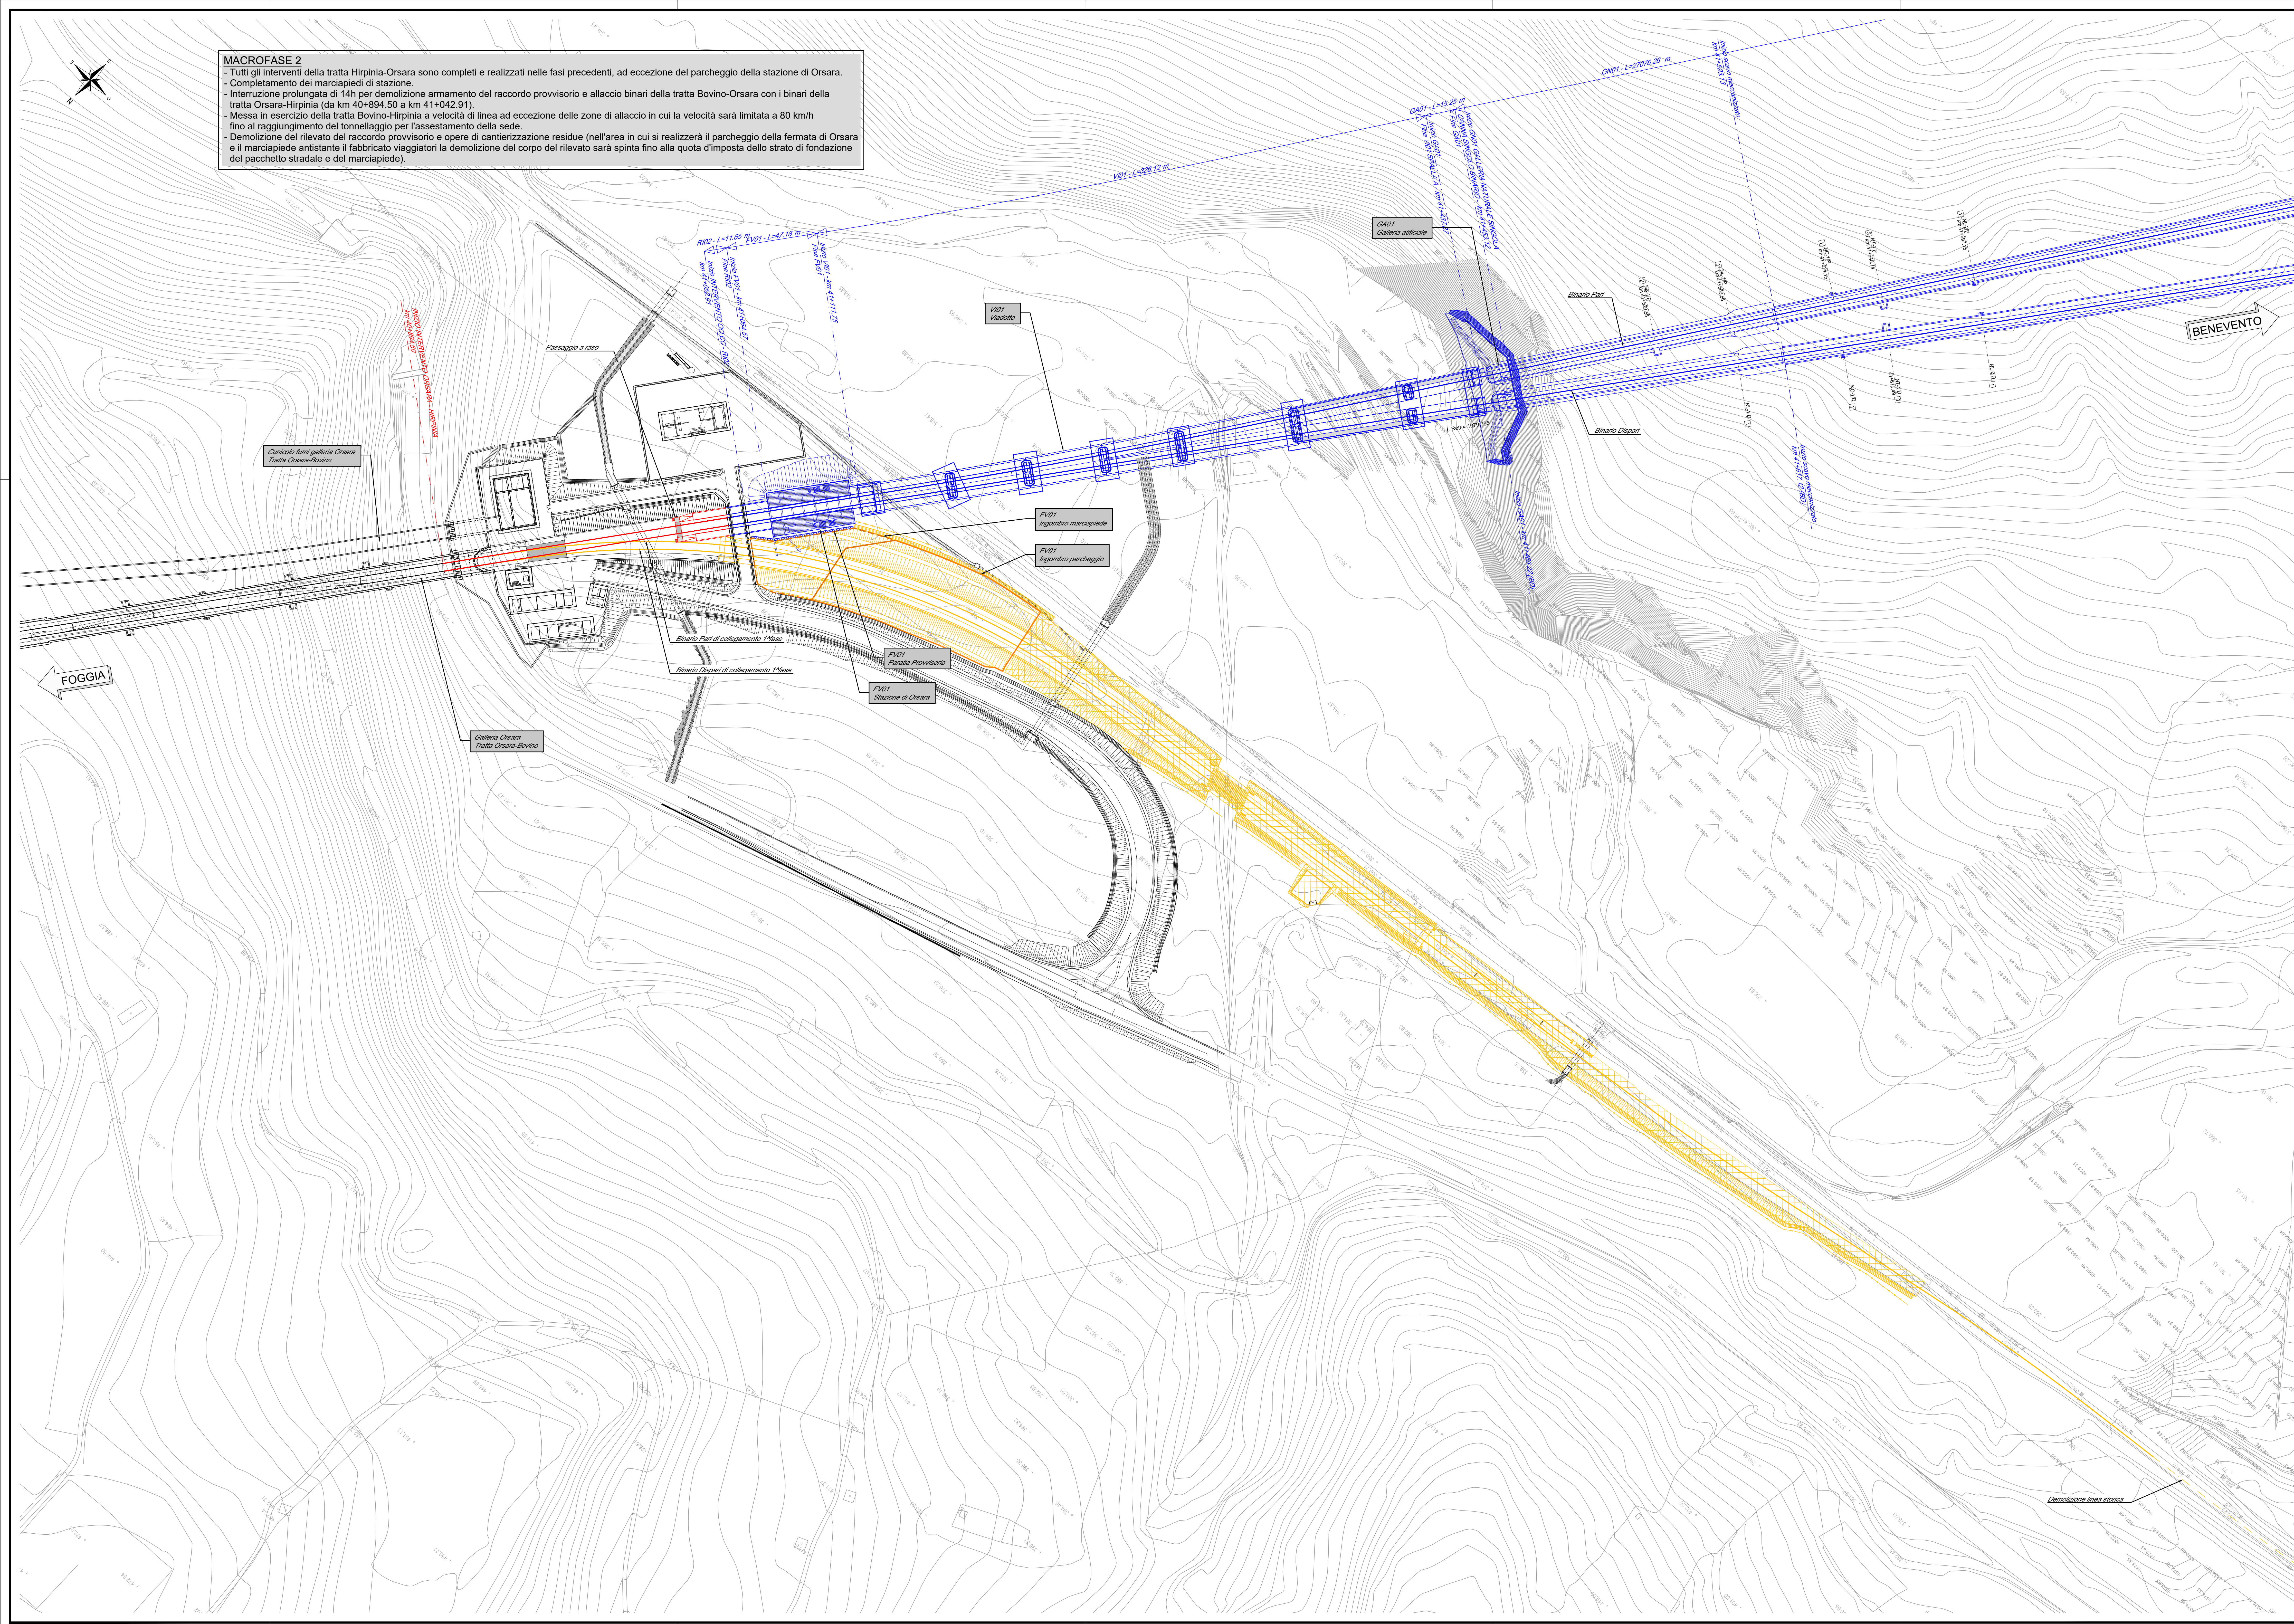

LEGENDA

- IN COSTRUZIONE
- IN COSTRUZIONE PROVVISORIO
- COSTRUITO NELLE FASI PRECEDENTI PROVVISORIO
- COSTRUITO NELLE FASI PRECEDENTI
- IN DEMOLIZIONE
- COSTRUITO NELLA TRATTA PRECEDENTE ORSARA - BOVINO

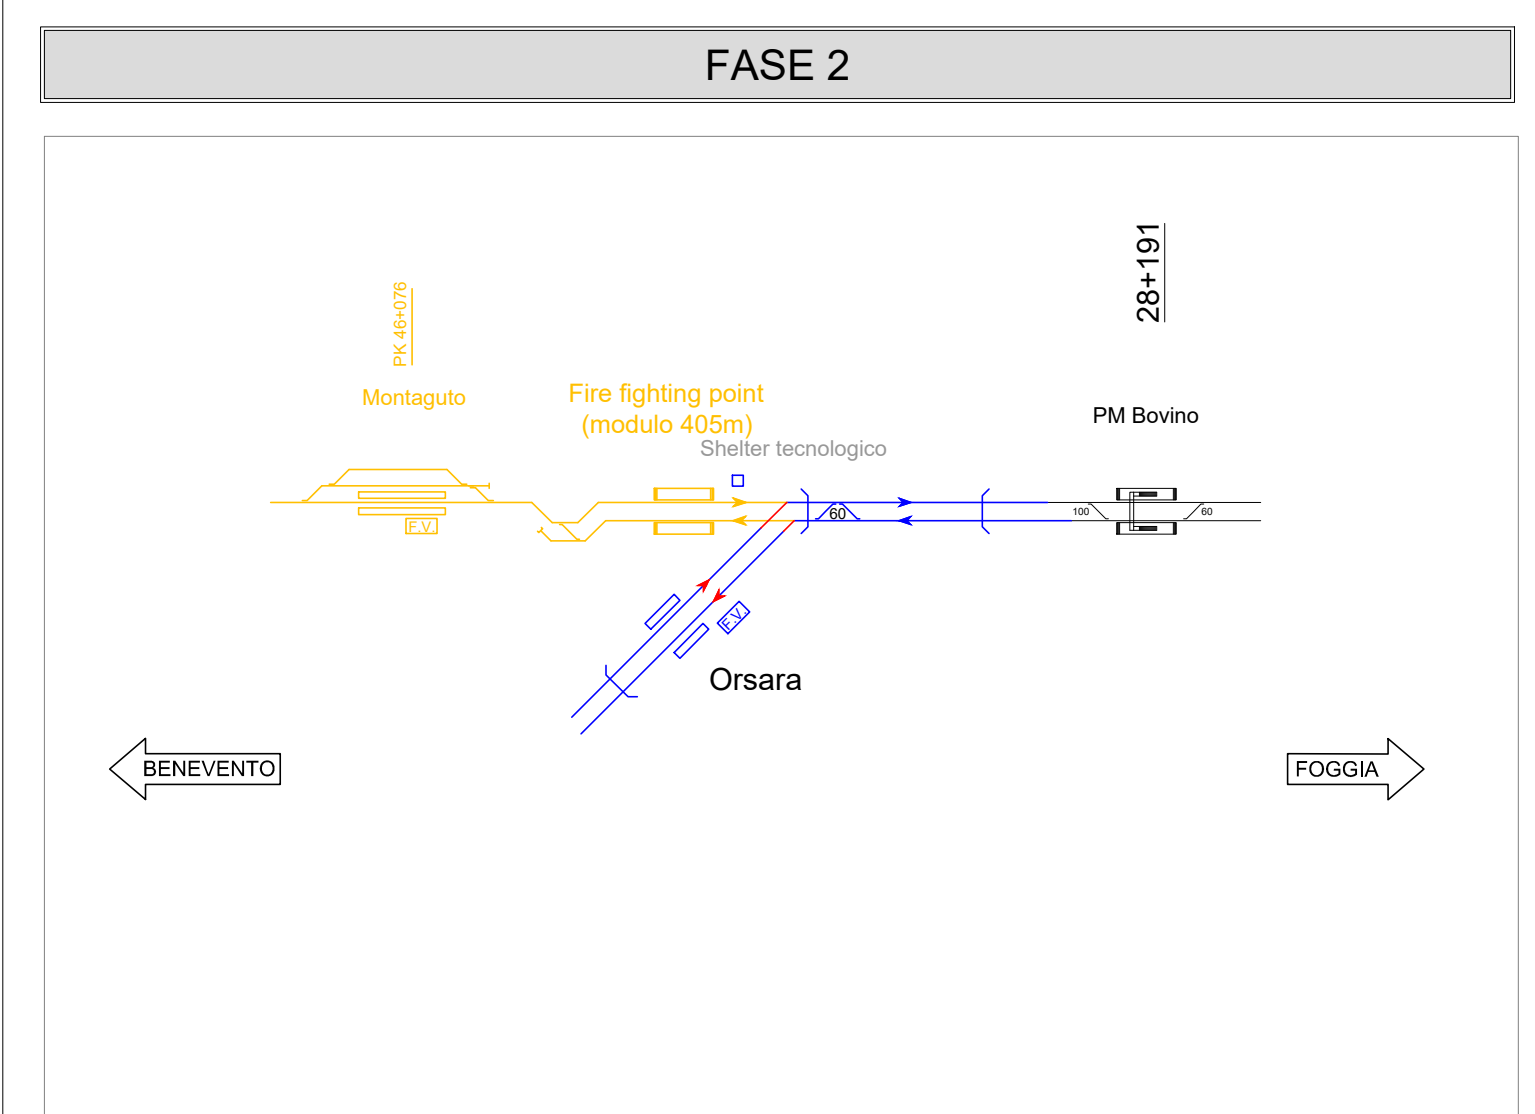

COMMITENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
TRACCIATO FERROVIARIO
STAZIONE ORSARA

Planimetria delle fasi di dismissione del raccordo provvisorio - Tav. 2 di 3

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| APPALTATORE: Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Divisione Tecnica Ing. P. M. Giannone 30/09/2022 | DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Il Responsabile progettazione fra le varie specializzazioni specialistiche Ing. G. Cassari | PROGETTISTA: Ing. S. Eandi |
|--|--|-----------------------------------|

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERADISCIPLINA | PROGR. | REV. | SCALA: |
|----------|-------|------|------|-----------|-----------------|--------|------|--------|
| I F 3 A | 0 2 | E | Z Z | P 7 | I F 2 0 2 0 | 0 0 2 | C | 1:1000 |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Verificato | Data | Approvato | Autorizzato | Data |
|------|------------------------------------|-------------|------------|----------|---------------|---------------|----------|
| A | C 00.0 - Creazione 10pg | M. Lombardi | N. Zatta | 09/03/22 | T. Ficochetti | Ing. S. Eandi | 09/03/22 |
| B | C 01.01 - A valle dell'armamento | M. Lombardi | N. Zatta | 09/03/22 | A. Calabro | | 09/03/22 |
| C | C 01.03 - A valle del corrobondato | M. Lombardi | N. Zatta | 09/03/22 | A. Calabro | | 09/03/22 |

File: IF3A02EZP7IF0200002C.dwg n. Elab. -
