

NOTA BENE: IL SIFONE ESISTENTE SI POSSONO DEMOLIRE SOLO PREVIA MESSA IN FUNZIONE DEL NUOVO SIFONE, IN SEGUITO VERRA' ULTIMATA LA PAVIMENTAZIONE DI PROGETTO CARREGGIATA EST

TRANSIZIONE TR10
CONFRONTA QUADERNO DELLE TRANSIZIONI

LEGENDA

- AREA DI CANTIERE
- S.P. EX S.S. 35 - VIABILITA' IN ESERCIZIO
- DIREZIONE DEL DEFLUSSO VEICOLARE NELLE CARREGGIATE ATTIVE
- NEW JERSEY ESISTENTE
- NEW JERSEY IN CLS b=0,60m
- NEW JERSEY IN CLS CON RETE SCHERMANTE b=0,60m
- RETE DI CANTIERE
- VIABILITA' IN COSTRUZIONE
- LIMITE D'ESPROPRIO
- NEW JERSEY ESISTENTE
- NEW JERSEY DI CANTIERE
- RIMOZIONE NEW JERSEY

FASE 4

- ◆ Chiusure viabilità: via Vignazzola
- ◆ Traffico:
 - dir. Lentate sul Seveso
 - prima della pk 6+275 su viabilità di progetto (carreggiata dir. Milano);
 - dopo la pk 6+275 su viabilità esistente Superstrada Milano-Meda (deviazione provvisoria realizzata in fase 3);
 - dir. Milano
 - prima della pk 6+275 su viabilità di progetto;
 - dopo la pk 6+275 su viabilità esistente Superstrada Milano-Meda (deviazione provvisoria realizzata in fase 3);
- ◆ Attività generali:
 - Accantieramento sui lati esterni delle viabilità deviate;
 - Accesso alle aree di cantiere direttamente dalla viabilità in esercizio con corsie di accelerazioni/deviazioni dedicate;
 - Realizzazione impronta per deviazioni stradali fasi successive;
 - Completamento e messa in esercizio sifone 1761 (B2A00SN05);
 - Demolizione parziale sifone esistente (camerette);
- ◆ Attività carreggiata lato ovest:
 - Sbancamenti per trincea e realizzazione deviazione stradale dir. Lentate sul Seveso per fase successiva;
- ◆ Attività carreggiata lato est:
 - Sbancamenti per trincea e realizzazione deviazione stradale dir. Milano per fase successiva;


KEY-PLAN




QUADRO DI UNIONE GENERALE



FASE 4 - SEZIONE 249

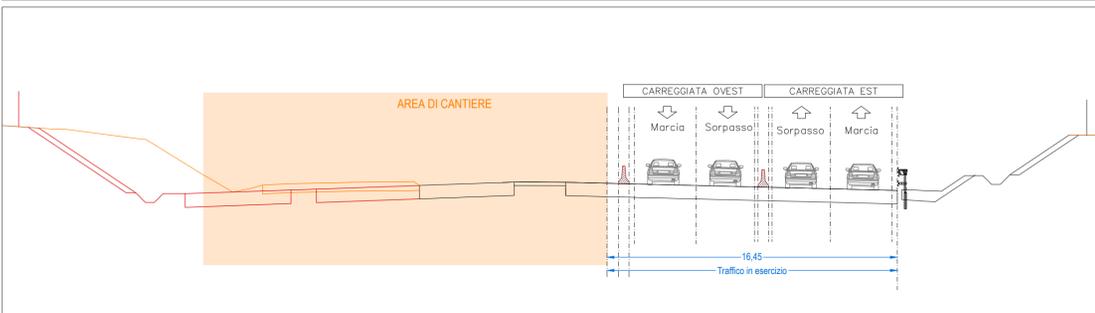

FASE 4 - SEZIONE 253

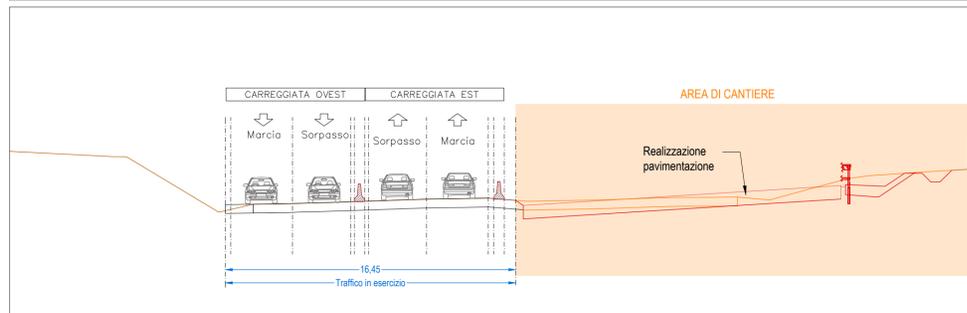

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE

CODICE C.U.P. F119080027007

PROGETTO ESECUTIVO TRATTA B2

CANTIERIZZAZIONE FASI DI LAVORO TRATTA 4

SUBTRATTA 4.2 - FASE 4 - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO				CONTRAENTE GENERALE			
FASE PROGETTUALE	AMBITO	TRATTA	OPERA	PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.			
CN	B2	A00CN09	999 FS 081 A				
DATA	31 Luglio 2023	REVISIONE		ELABORAZIONE PROGETTUALE			
SCALA	VERE			DATA	REVISIONE	PROGETTISTI	RESPONSABILE
				Aprile 2023	Bozza	Ing. Alberto Biondi	INGEGNERIA
				31 Luglio 2023	Consuepe	Ing. Roberto Frascarelli	PRESTAZIONI
						Ing. Andrea Nibbi	SPECIALISTICHE
						Ing. Enrico Morini	ING. CALCOLO
CONCEDENTE				PROGETTISTA			
CONCESSIONARI				PROGER			
