
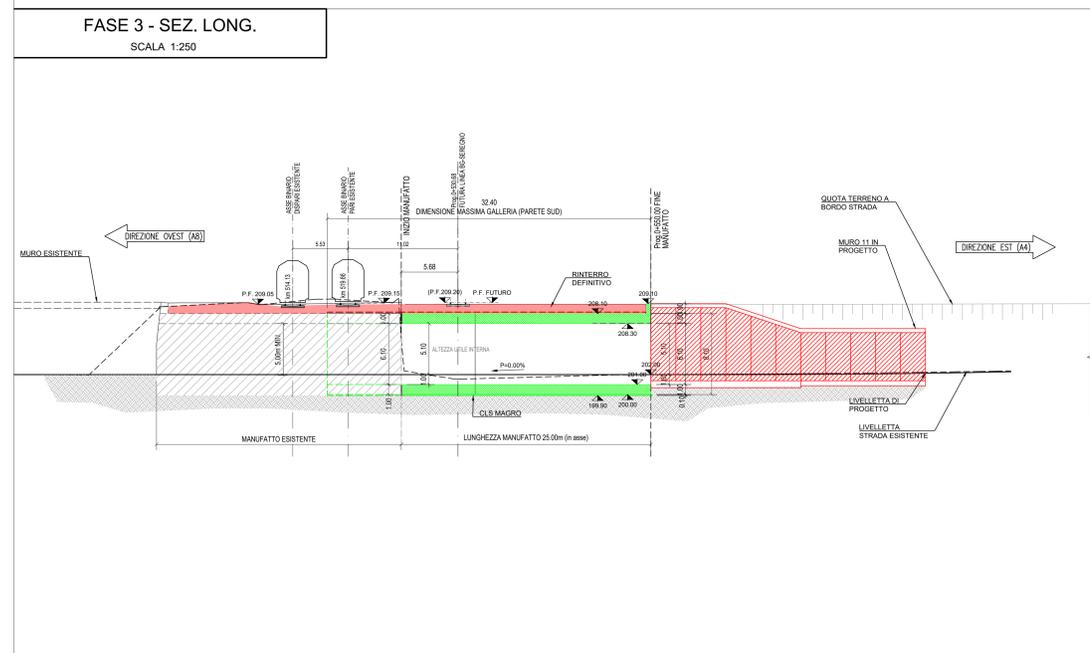
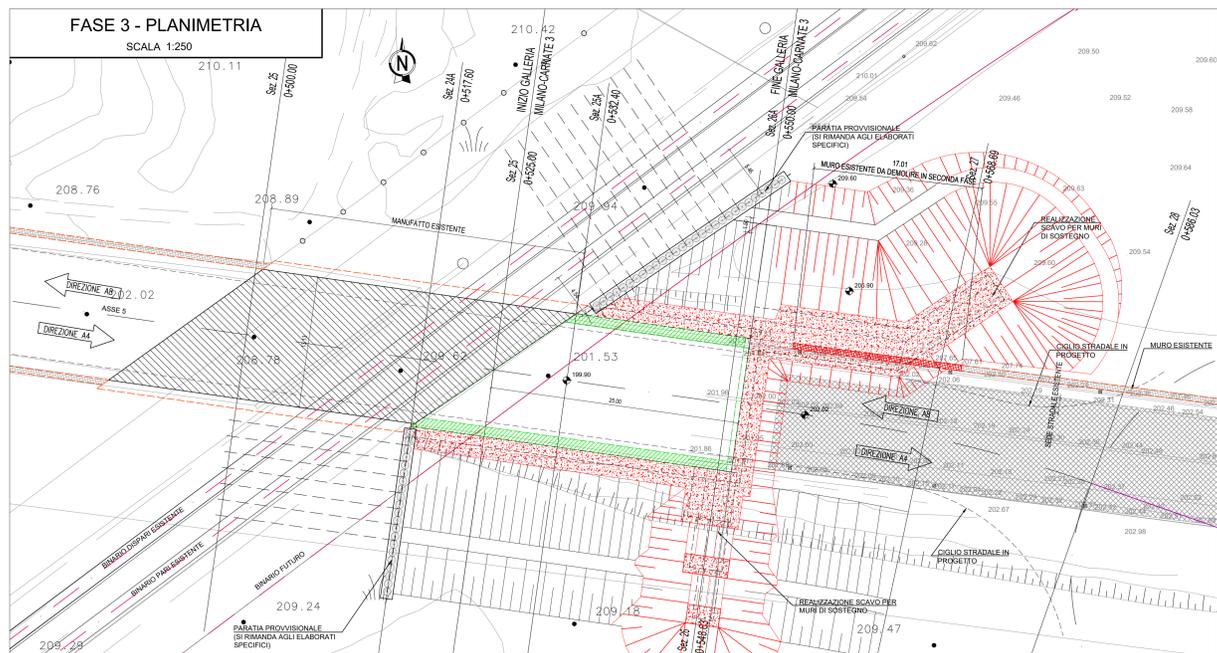
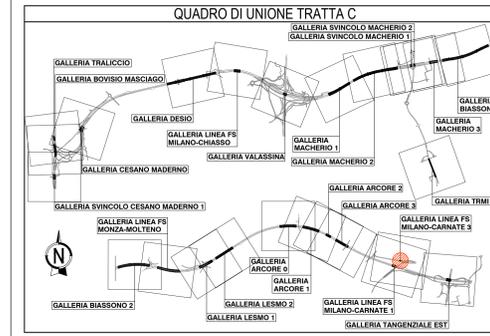
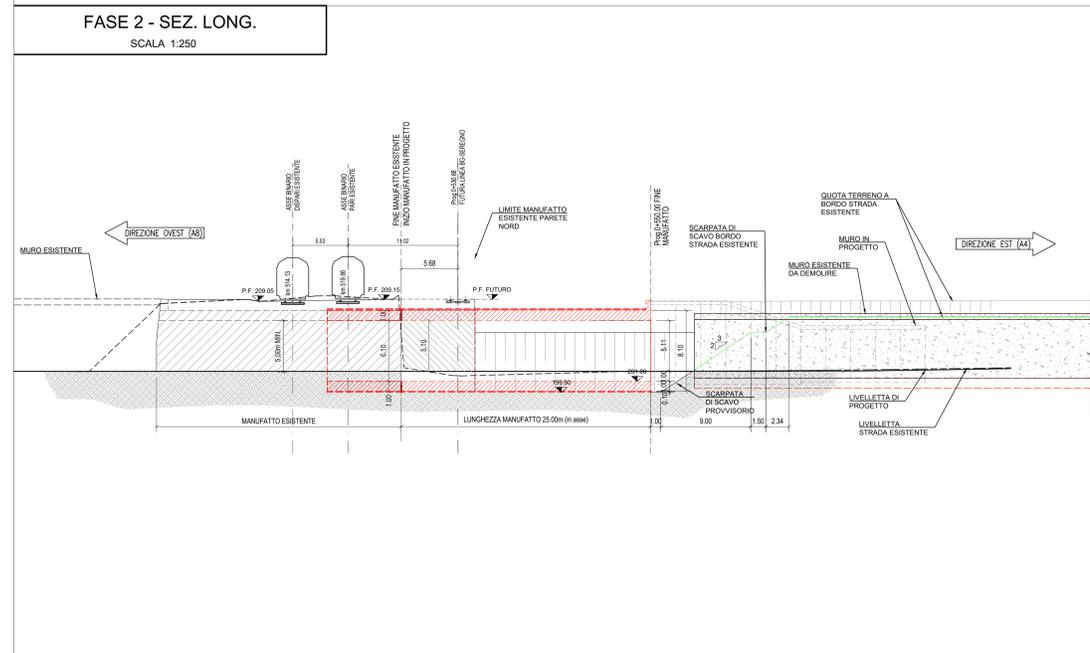


DESCRIZIONE FASI COSTRUTTIVE

- FASE 01:**
 A. REALIZZAZIONE DELLE PARATE PROVVISORIE A PROTEZIONE DELLA MASSICCIA FERROVIA
 B. INTERROCCO DEL TRATTO LUNGO LA VARIANTE ESISTENTE
 C. APPROFONDIMENTO DELLO SCAVO DI SBANCAMENTO PER FASI SUCCESSIVE E CONTESTUALE REALIZZAZIONE DEI 2 GRADI DI TRAVI DI ANCORAGGIO DELLE PARATE PROVVISORIE
- FASE 02:**
 A. ESECUZIONE DELLA SOTTOFONDAZIONE
 B. ESECUZIONE DELLA SOLETTA DI FONDAZIONE DEL MANIFATTO
 C. GETTO DELLE PARETI LATERALI DEL MANIFATTO
 D. COMPLETAMENTO MANIFATTO CON IL GETTO DELLA SOLETTA SUPERIORE E DEI MURETTI DI TESTATA
 E. REALIZZAZIONE MASSETTO DI PENNENZA SULLA COPERTURA
 F. POSA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE SU PARETI E SOLETTA DI COPERTURA E GETTO DI PROTEZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE SU SOLETTA
- FASE 03:**
 A. PARATE RIENTRO A TERZO GALLERIA PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DEI MURI DI TESTATA
 B. DEMOLIZIONE PARZIALE 2° TRATTO MURLO ESISTENTE
 C. REALIZZAZIONE DI MURI DI TESTATA 10 E 11
 D. ESECUZIONE DI RINTERRO INTERNO E POSA DELLE FONDAZIONI STRADALI
 E. ESECUZIONE DEL RITORNAMENTO ESTERNO
 F. REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO

LEGENDA COLORI

- █ OPERE ESEGUITE NELLA FASE CONSIDERATA
- █ OPERE ESEGUITE NELLE PRECEDENTI FASI

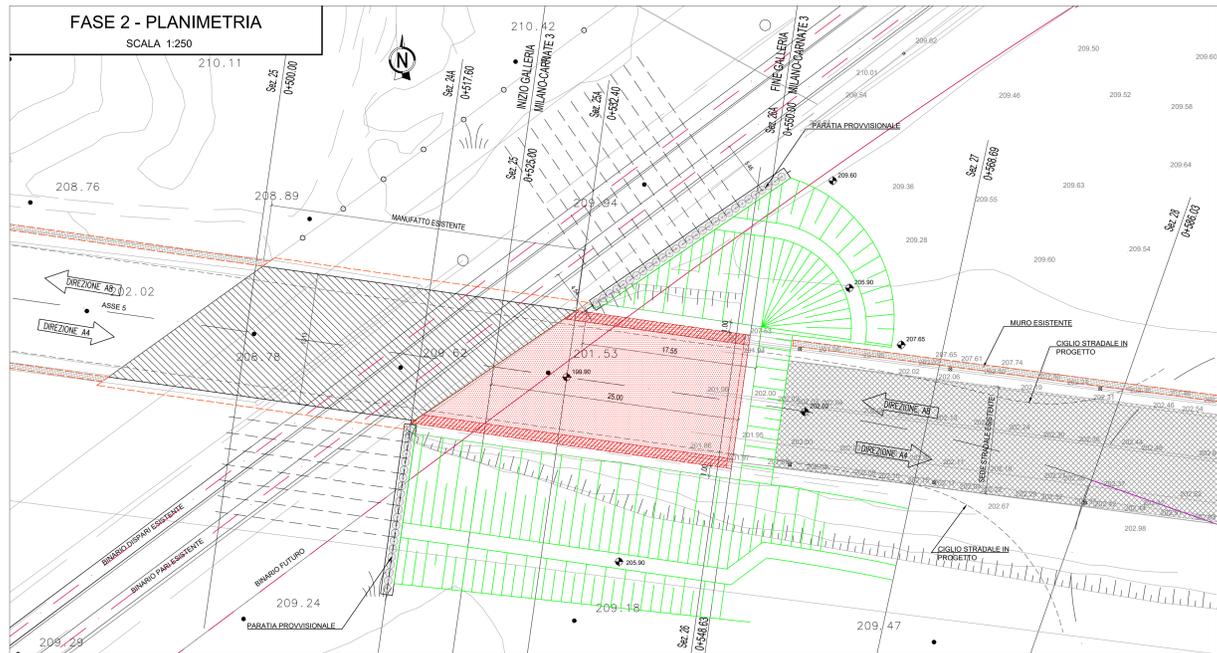

CONTRANTE GENERALE
PEDELOMBARDA NUOVA S.p.A.

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
 DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE

PROGETTO ESECUTIVO
 TRATTA C

OPERE D'ARTE MAGGIORI
 GALLERIA ARTIFICIALE FS MILANO-CARNATE 3
 FASI ESECUTIVE - PIANTE E PROFILO

IDENTIFICAZIONE ELABORAZIONE		CONTRANTE GENERALE	
DATA	REVISIONE	DATA	REVISIONE
20/07/2023	Emessa	20/07/2023	Emessa

RESPONSABILI PROGETTO: [NOME]
 RESPONSABILI INTERNO: [NOME]
 RESPONSABILI ESTERNO: [NOME]
 INGEGNERE: [NOME]
 ARCHITETTO: [NOME]
 INGEGNERE: [NOME]
 ARCHITETTO: [NOME]
